SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	20453	Proyecto De Desarollo Agricola Bajo Riego (Pdabr)

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Desarollo Agricola Bajo Riego (Pdabr)				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Desarrollo Económico				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 172 - Banco Centroamericano De Integración Económica				
Convenio	BCIE-2101				
***Monto Total de Financiamiento USD:**	55,123,721.52				
Monto Financiamiento L:	1,472,812,128.69				
Plazo de Ejecución:	144 meses	**Fecha de Inicio**	13/12/2014	**Fecha de Fin**	30/11/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversión Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

* El costo del proyecto no considera la desobligación de US$14,244,756.60 del Financiamiento BCIE 2101 y autorizado por el BCIE en Oficio GERHON-0144/2025. Al respecto, el costo actual del proyecto sería de US$40,878,964.92

2. Objetivo Estratégico

Objetivo de Desarrollo (Fin). Contribuir a la reducción de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el proyecto. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Por otra parte se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. Por otra parte el programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de linea de base que se realice.

3. Cobertura

Departamentos	Comayagua, El Paraiso, Francisco Morazan, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	Comayagua, Ajuterique, Lamaní, Lejamaní, San Sebastián, Teupasenti, Reitoca, Juticalpa, Catacamas, Guayape, San Jose De Colinas, Goascorán, El Negrito, Morazán, Sulaco, Victoria

Beneficiarios:	3,371
Generación de empleo	12,784.00

Beneficiarios





3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
400 - Componente 1. Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	1,205,977,418.46	-	43,769,292.56	1,249,746,711.02
402 - Componente 2: Asistencia Técnica y Comercialización	24,667,705.76	-	3,202,628.69	27,870,334.45
404 - Componente 3: Organización y Desarrollo Local.	27,452,713.17	-	3,202,629.91	30,655,343.08
405 - Componente 4 Gestión Ambiental	11,652,105.67	-	2,135,093.52	13,787,199.19
406 - Componente 5 Unidad Coordinadora del Programa	118,931,732.03	-	31,820,808.91	150,752,540.94
TOTAL	**1,388,681,675.08**	**0.00**	**84,130,453.60**	**1,472,812,128.69**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 172 - Banco Centroamericano De Integración Económica
Monto Contratado:	55.10
Desembolsado Acumulado	38.00
Disponible:	17.10
% Desembolso:	69%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	33,642,122.0	-	38,459,090.0	**72,101,212.0**
Presupuesto Vigente:	33,642,122.0	-	38,459,090.0	**72,101,212.0**
Ejecutado al 30/06/2026	17,706,473.0	-	1,130,303.2	**18,836,776.2**
% Ejecución al 30/06/2026	**52.6%**		**2.9%**	**26.1%**


Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	203,330,607.00	-	32,947,958.00	236,278,565.00	113,743,273.94	-	1,643,191.68	115,386,465.62	48.83%
2021	406,665,652.00	-	6,958,624.00	413,624,276.00	123,647,390.17	-	6,958,616.79	130,606,006.96	31.58%
2022	216,604,399.00	-	5,557,437.00	222,161,836.00	162,727,859.22	-	4,508,005.25	167,235,855.47	75.28%
2023	184,941,961.00	-	17,216,651.00	202,158,612.00	16,089,643.74	-	1,794,360.05	17,884,003.79	8.85%
2024	74,613,131.00	-	-	74,613,131.00	7,047,249.49	-	-	7,047,249.49	9.45%
2025	52,827,339.00	-	87,910.00	52,915,249.00	14,778,233.30	-	87,909.17	14,866,142.47	28.09%
2026	33,642,122.00	-	38,459,090.00	72,101,212.00	17,706,472.99	-	1,130,303.19	18,836,776.18	26.13%
TOTAL	**1,909,080,438.00**	**-**	**146,908,788.33**	**2,055,989,226.33**	**940,983,880.15**	**-**	**27,525,579.14**	**968,509,459.29**	**47%**

Área visual presupuesto vigente histórico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
2	0	0	2	0	74%	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	20453	Proyecto De Desarollo Agricola Bajo Riego (Pdabr)

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Desarollo Agricola Bajo Riego (Pdabr)

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a agua para riego en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	**5421**	4055	75%	322.00	272.00			**594.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0%**	(594.00)	● **CON RETRASO**	
Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilómetros	**37.7**	0	0%	37.70	19.70			**57.40**	**2.30**	**1.57**			**3.87**	**7%**	(53.53)	● **CON RETRASO**	
TOTAL / PROMEDIO		**2729.35**	**2027.50**	**3%**	**359.70**	**291.70**	**0.00**	**0.00**	**651.40**	**2.30**	**1.57**	**0.00**	**0.00**	**1.94**	**0%**	**(649.47)**		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto presentó un desempeño inferior al programado en sus principales indicadores físicos, alcanzando únicamente 0.63 kilómetros de tubería instalada frente a los 5.6 kilómetros previstos y sin registrar avances en la meta de incorporación de 272 hectáreas bajo riego. A pesar de mantener una ejecución acumulada histórica del 81% en la vida del proyecto, se observa una desaceleración operativa producto de ajustes técnicos en las obras, retrasos en el suministro de materiales importados y dificultades administrativas para la gestión de pagos y aprobación de documentación contractual.

Principales Riesgos Identificados

Existe un riesgo elevado de incumplimiento de metas físicas al cierre del proyecto; debido a la persistencia de retrasos constructivos y administrativos. Asimismo, la dependencia de materiales importados, las modificaciones en diseños y la lentitud en la revisión documental generan presión sobre el cronograma restante de ejecución. La principal preocupación radica en que el proyecto podría finalizar con una ejecución financiera aceptable, pero sin alcanzar plenamente los beneficios esperados para los productores.

Acciones Recomendadas

Implementar un plan de recuperación de cronograma con seguimiento semanal a las obras críticas, fortalecer los mecanismos de control sobre contratistas, agilizar los procesos de aprobación de estimaciones y priorizar la culminación de los sistemas de riego con mayor nivel de avance para garantizar la generación efectiva de beneficios antes del cierre del programa.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El proyecto evidencia una brecha preocupante entre la ejecución financiera y los resultados físicos alcanzados. La organización debe enfocarse inmediatamente en la recuperación del cronograma físico, ya que la principal amenaza no es la disponibilidad de recursos sino la capacidad de completar las obras comprometidas dentro del tiempo restante de ejecución.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23628

Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
Tipo de proyecto: Inversión Pública

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Infraestructura Productiva				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA-6448-HN				
***Monto Total de Financiamiento USD:**	75,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	2,003,872,500.00				
Plazo de Ejecución:	71 meses	**Fecha de Inicio**	12/4/2020	**Fecha de Fin**	31/8/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

* El costo del proyecto no considera la disminución de US$25,000,000.0 y la desobligación de US$7,500,266.44 para el Financiamiento 6448-HN aprobados por el Banco Mundial. Al respecto el costo actual del proyecto es de US$42,499,734

2. Objetivo Estratégico

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR´s) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.

3. Cobertura

	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazan, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Yuscarán, Distrito Central, La Esperanza, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios:	19,700
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	18,700.00

Beneficiarios del Proyecto





3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1648 - Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de las iniciativas agroindustriales.	1,456,147,350.0	-	-	1,456,147,350.0
1651 - Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de Honduras	259,167,510.0	-	-	259,167,510.0
1652 - Apoyo a la gestión del proyecto (Administración y Evaluación)	288,557,640.0	-	-	288,557,640.0
TOTAL	**2,003,872,500.0**	**-**	**-**	**2,003,872,500.0**

Area visual Costo Total de Proyecto
(Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	75.0
Desembolsado Acumulado	60.0
Disponible:	15.0
% Desembolso:	80.0%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	86,690,133.0	-	-	**86,690,133.0**
Presupuesto Vigente:	86,690,133.0	-	-	**86,690,133.0**
Ejecutado al 30/06/2026	51,026,568.4	-	-	**51,026,568.4**
% Ejecución al 30/06/2026	**58.9%**			**58.9%**


Presupuesto SIAFI 2026
(Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	39,503,020.0	-	-	39,503,020.0	39,503,020.0	-	-	39,503,020.0	100.0%
2021	240,685,165.0	-	-	240,685,165.0	221,891,209.9	-	-	221,891,209.9	92.2%
2022	638,692,100.0	-	-	638,692,100.0	129,503,289.6	-	-	129,503,289.6	20.3%
2023	476,495,835.0	-	-	476,495,835.0	85,819,644.5	-	-	85,819,644.5	18.0%
2024	220,978,549.0	-	-	220,978,549.0	142,003,992.6	-	-	142,003,992.6	64.3%
2025	247,145,576.0	-	-	247,145,576.0	166,416,030.8	-	-	166,416,030.8	67.3%
2026	86,690,133.0	-	-	86,690,133.0	51,026,568.4	-	-	51,026,568.4	58.9%
TOTAL	**1,950,190,378.0**	**-**	**-**	**1,950,190,378.0**	**836,163,755.8**	**-**	**-**	**836,163,755.8**	**42.9%**

Area visual presupuesto vigente histórico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
3	0	0	3	0	96%	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23628

Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
Tipo de proyecto: Inversión Pública

Seguimiento Físico De Metasintegrando La Innovación Para La Competitividad Rural (Comrural Ii)Tipo De Proyecto: Inversión Pública

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Implmentación de 168 Planes de Negocios de Ventanilla No.1	Plan	**168**	168	100%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
Implmentación de 75 Planes de Negocios de Ventanilla No.2	Plan	**75**	68	91%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	**1**	0	0%	-	-	1.00	-	**1.00**	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	(1.00)	● **CON RETRASO**	
Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*	Informe	**1**	0	0%	-	-	1.00	-	**1.00**	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	(1.00)	● **CON RETRASO**	
Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	**1**	0	0%	-	-	1.00	-	**1.00**	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	(1.00)	● **CON RETRASO**	
TOTAL / PROMEDIO		**246.00**	**236.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**(3.00)**		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

La Unidad Ejecutora de SAG no presento información respecto a los avances y situación actual del proyecto en el Informe presentado al II Trimestre 2026

Principales Riesgos Identificados

La Unidad Ejecutora de SAG no presento información respecto a los avances y situación actual del proyecto en el Informe presentado al II Trimestre 2026

Acciones Recomendadas

Mensaje Clave para Alta Dirección

La unidad ejecutora del proyecto debe enviar con el tiempo adecuado los informes de avance físico y financiero de los proyectos de conformidad a las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23851

Proyecto Integral De Desarrollo Rural Y Productividad

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto Integral De Desarrollo Rural Y Productividad				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo, 165 - Instituto Crédito Oficial - España				
Convenio	4936/BL-HO, 4940/BL-HO, GRT/WE-20251-HO, ICO-FONPRODE				
Monto Total de Financiamiento USD:	91,400,000.00				
Monto Financiamiento L:	2,442,052,620.00				
Plazo de Ejecución:	86 meses	**Fecha de Inicio**	21/5/2020	**Fecha de Fin**	21/7/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico

El objetivo general consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSH. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

3. Cobertura

Departamentos	Copán, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara
Municipios	Santa Rosa De Copán, Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquín, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Trinidad De Copán, Veracruz, La Esperanza, Dolores, Intibucá, Jesús De Otoro, Masaguara, San Isidro, San Juan, San Marcos De Sierra, San Miguelito, Yamaranguila, San Francisco De Opalaca, Cabañas, Chinacla, Guajiquiro, Marcala, Mercedes De Oriente, Opatoro, San José, San Juan, Santa Ana, Santa Elena, Santa María, Santiago De Puringla, Yarula, Gracias, Belén, Cololaca, Erandique, Guarita, La Campa, La Iguala, Las Flores, La Unión, Lepaera, San Francisco, San Manuel Colohete, San Rafael, San Sebastián, Santa Cruz, Talgua, San Marcos De Caiquín, Belén Gualcho, Dolores Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna, Mercedes, San Francisco Del Valle, San Marcos, Sensentí, Santa Bárbara, Arada, Atima, Azacualpa, Ceguaca, San Jose De Colinas, Concepción Del Sur, El Níspero, Gualala, Ilama, Macuelizo, San Francisco De Ojuera, San Luis, San Nicolás, San Pedro Zácapa, Santa Rita, San Vicente Centenario, Trinidad

Beneficiarios:	30,000
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	30,000.00





3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1762 - Fortalecimiento del desarrollo productivo	1,229,041,800.0	36,470,479.5	-	1,265,512,279.5
1763 - Acceso a financiamiento -ICO FONPRODE	468,605,278.2	-	-	468,605,278.2
1766 - Sistema de monitoreo y evaluación	80,154,900.0	-	-	80,154,900.0
1767 - Gastos de administración y otros	173,668,950.0	935,140.5	-	174,604,090.5
2789 - Acceso a financiamiento -BID-4936	453,176,071.8	-	-	453,176,071.8
TOTAL	**2,404,647,000.0**	**37,405,620.0**	**-**	**2,442,052,620.0**

Área visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo, 165 - Instituto Crédito Oficial - España
Monto Contratado:	91.4
Desembolsado Acumulado	34.6
Disponible:	56.8
% Desembolso:	37.9%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	131,881,683.0	18,086,250.0	-	**149,967,933.0**
Presupuesto Vigente:	131,881,683.0	18,086,250.0	-	**149,967,933.0**
Ejecutado al 30/06/2026	48,599,221.3	-	-	**48,599,221.3**
% Ejecución al 30/06/2026	**36.9%**	**0.0%**		**32.4%**


Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	5,710,802.0	-	-	5,710,802.0	-	-	-	-	0.0%
2021	124,152,421.0	-	-	124,152,421.0	110,092,674.1	-	-	110,092,674.1	88.7%
2022	179,286,612.0	3,765,121.0	-	183,051,733.0	10,727,111.7	-	-	10,727,111.7	5.9%
2023	150,255,922.0	-	-	150,255,922.0	57,333,226.4	-	-	57,333,226.4	38.2%
2024	316,781,634.0	-	-	316,781,634.0	235,104,633.6	-	-	235,104,633.6	74.2%
2025	504,341,947.0	13,500,000.0	-	517,841,947.0	327,933,375.9	-	-	327,933,375.9	63.3%
2026	131,881,683.0	18,086,250.0	-	149,967,933.0	48,599,221.3	-	-	48,599,221.3	32.4%
TOTAL	**1,412,411,061.0**	**35,351,371.0**	**-**	**1,447,762,432.0**	**789,790,242.9**	**-**	**-**	**789,790,242.9**	**54.6%**

Área visual presupuesto vigente histórico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
7	4	0	0	0	34220%	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23851	Proyecto Integral De Desarrollo Rural Y Productividad

Seguimiento Físico De Metasproyecto Integral De Desarrollo Rural Y Productividad

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	300	13	4%	0.00	0.00			0.00	0.00	75.00			75.00	100%	-	● COMPLETADO	
(PI)Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	300	77	26%	0.00	0.00			0.00	0.00	25.00			25.00	100%	-	● COMPLETADO	
(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	1200	361	30%	0.00	0.00			0.00	0.00	150.00			150.00	100%	-	● COMPLETADO	
(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	25		0%	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0%	-		
(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	25		0%	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0%	-		
Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	860	100	12%	0.00	0.00			0.00	0.00	92.00			92.00	100%	-	● COMPLETADO	
Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1		0%	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0%	-		
TOTAL / PROMEDIO		2711.00	551.00	3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00	0%	342.00		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

El proyecto mantiene avances positivos en materia de tecnologías climáticamente inteligentes, asistencia técnica y acceso al financiamiento productivo, registrando una ejecución financiera acumulada superior al 32%. Asimismo, continúa gestionando una ampliación de plazo y una propuesta de expansión territorial que incrementaría significativamente su cobertura geográfica antes del cierre previsto en 2027.

Principales Riesgos Identificados

La ampliación de la cobertura territorial podría generar una dispersión de recursos y esfuerzos en una etapa donde deberían consolidarse los resultados alcanzados. Adicionalmente, persisten desafíos relacionados con la implementación definitiva del sistema de monitoreo y evaluación y con el cumplimiento de actividades estratégicas aún pendientes de ejecución.

Acciones Recomendadas

Priorizar la consolidación de los componentes más avanzados, finalizar la implementación del sistema de monitoreo y evaluación, enfocar los esfuerzos en resultados sostenibles y evaluar cuidadosamente el impacto de cualquier expansión territorial sobre los recursos disponibles y la fecha de cierre del proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El proyecto presenta resultados favorables y evidencia capacidad de ejecución; sin embargo, debe evitarse el incremento del alcance operativo sin antes asegurar el cumplimiento de los compromisos estratégicos y resultados originalmente pactados con el BID.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24155	Proyecto De Seguridad Hidrica En El Corredor Seco De Honduras

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Seguridad Hidrica En El Corredor Seco De Honduras				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Infraestructura Productiva				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA-6680-HN				
Monto Total de Financiamiento USD:	65,500,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,750,048,650.00				
Plazo de Ejecución:	83 meses	**Fecha de Inicio**	1/4/2021	**Fecha de Fin**	31/3/2028
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

3. Cobertura

Departamentos	Choluteca, Francisco Morazan, Intibuca, La Paz, Valle
Municipios	Pespire, San Antonio De Flores, Curarén, La Venta, Intibucá, La Paz, Nacaome, San Lorenzo

Beneficiarios:	105,650
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	27,504.00






3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1902 - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DE NACAOME	26,718,300.00	-	0.00	26,718,300.00
1903 - PROMOCION DE UN ENFOQUE DE GESTION DE MICROCUENCAS INTEGRADO Y MULTIPROPOSITO EN EL CORREDOR SECO	641,239,200.00	-	0.00	641,239,200.00
1904 - Gestión del Proyecto	213,746,400.00	-	13,359,150.00	227,105,550.00
2545 - GOBERNANZA DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	96,185,853.28	-	0.00	96,185,853.28
2546 - CREACION DE CAPACIDADES	26.72	-	0.00	26.72
2547 - MAXIMIZANDO LOS BENEFICIOS MULTIPROPOSITO DE LA REPRESA "JOSE CECILIO DEL VALLE" EN NACAOME.	705,363,120.00	-	53,436,600.00	758,799,720.00
TOTAL	**1,683,252,900.00**	**0.00**	**66,795,750.00**	**1,750,048,650.00**

Área visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	65.5
Desembolsado Acumulado	5.8
Disponible:	59.7
% Desembolso:	9%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	98,157,961.00	-	5,761,700.00	**103,919,661.00**
Presupuesto Vigente:	98,157,961.00	-	5,761,700.00	**103,919,661.00**
Ejecutado al 30/06/2026	16,406,629.74	-	-	**16,406,629.74**
% Ejecución al 30/06/2026	**17%**		**0%**	**15.8%**


Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	8,492,004.00	-	-	8,492,004.00	2,231,292.30	-	-	2,231,292.30	26.28%
2022	89,595,285.00	-	-	89,595,285.00	11,799,214.15	-	-	11,799,214.15	13.17%
2023	190,041,562.00	-	-	190,041,562.00	8,114,923.01	-	-	8,114,923.01	4.27%
2024	128,718,928.00	-	-	128,718,928.00	15,314,833.09	-	-	15,314,833.09	11.90%
2025	72,245,477.00	-	-	72,245,477.00	38,822,915.04	-	-	38,822,915.04	53.74%
2026	98,157,961.00	-	5,761,700.00	103,919,661.00	16,406,629.74	-	-	16,406,629.74	15.79%
TOTAL	**387,251,217.00**	**-**	**5,761,700.00**	**593,012,917.00**	**92,689,807.33**	**-**	**-**	**92,689,807.33**	**16%**

Área visual presupuesto vigente histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24155	Proyecto De Seguridad Hidrica En El Corredor Seco De Honduras

Información Fisica del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
5	0	0	0	0	0%	0%

Seguimiento Fisico De Metasproyecto De Seguridad Hidrica En El Corredor Seco De Honduras

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Construcción de 4 Sistemas Integrales (SIAS)	Sistemas de Agua Potables	100%	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0%	-		
Mantenimiento, Suministro, Instrumentación para Seguridad de la Presa José Cecilio del Valle, JCV	PORCENTAJE	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0%	-		
Optimización de Plantas de Tratamiento San Lorenzo y Nacaome (Suministro del Sistema)	PORCENTAJE	100	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0%	-		
Plan de Optimización Implementándose para la Modernización de Servicios Hidrológicos y Climáticos	Plan	4	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0%	-		
4 Planes de acción o manejo de microcuencas aprobados para el fortalecimiento de la gobernanza hídrica	Plan	4	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0%	-		
TOTAL / PROMEDIO		110.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

El proyecto experimentó una reestructuración significativa que redujo el financiamiento de US$65.5 millones a US$45.5 millones, redefiniendo alcance, metas e inversiones prioritarias. Si bien la ejecución financiera del trimestre alcanzó niveles satisfactorios respecto de la programación, la mayor parte de las intervenciones clave continúa en etapas de diseño, estudios ambientales, procesos de contratación y preparación documental, con poca evidencia de ejecución física de infraestructura.

Principales Riesgos Identificados

El principal riesgo es la acumulación de actividades preparatorias sin lograr una transición oportuna hacia la ejecución de obras. La cancelación de inversiones inicialmente previstas, procesos de licitación declarados desiertos y dependencias asociadas a estudios ambientales y sociales incrementan significativamente el riesgo de retrasos estructurales en el cronograma global del proyecto.

Acciones Recomendadas

Establecer un mecanismo extraordinario de seguimiento ejecutivo para adquisiciones críticas, acelerar la contratación de obras prioritarias, implementar una gestión intensiva de riesgos y asegurar una coordinación permanente con el Banco Mundial para evitar nuevos retrasos derivados de procedimientos fiduciarios y técnicos.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Actualmente este proyecto representa uno de los mayores riesgos de la cartera institucional debido a que el tiempo consumido en reestructuración y preparación técnica reduce progresivamente la ventana disponible para ejecutar infraestructura y alcanzar resultados visibles antes del cierre del financiamiento.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24173	Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (Proinorte)

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (Proinorte)				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Desarrollo Económico				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 237 - International Fund For Agricultural Development (Fida), 246 - Opec Fund For International Development				
Convenio	2000002595, LOAN No. 13754P				
Monto Total de Financiamiento USD:	39,087,574.00				
Monto Financiamiento L:	1,044,353,528.40				
Plazo de Ejecución:	78 meses	**Fecha de Inicio**	10/9/2021	**Fecha de Fin**	31/3/2028
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

Cobertura



2. Objetivo Estratégico

El objetivo del proyecto es incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Olancho, Yoro
Municipios	Jutiapa, Trujillo, Balfate, Limón, Sabá, Santa Fe, Santa Rosa De Aguán, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental, El Rosario, Esquipulas Del Norte, Gualaco, Guata, Jano, La Unión, Mangulile, San Esteban, Yocón, Arenal, Jocón, Olanchito

Beneficiarios:	69,450
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	1,199.00



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1922 - Alianzas comerciales, fortalecimiento Organizacional e innovación	234,025,589.70	13,359,150.00	13,206,161.01	260,590,900.71
1923 - Desarrollo Productivo y Resiliencia	604,501,537.50	-	18,376,846.74	622,878,384.24
1924 - Administración y Gestión de Proyecto	132,148,711.80	-	28,735,531.65	160,884,243.45
TOTAL	**970,675,839.00**	**13,359,150.00**	**60,318,539.40**	**1,044,353,528.40**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 237 - International Fund For Agricultural Development (Fida), 246 - Opec Fund For International Development
Monto Contratado:	39.10
Desembolsado Acumulado	12.20
Disponible:	26.90
% Desembolso:	31%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	105,138,232.00	-	19,705,500.00	**124,843,732.00**
Presupuesto Vigente:	105,138,232.00	-	19,705,500.00	**124,843,732.00**
Ejecutado al 30/06/2026	48,759,576.19	-	1,942,347.34	**50,701,923.53**
% Ejecución al 30/06/2026	**46%**		**10%**	**40.6%**

Área Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2022	61,037,831.00	12,000,000.00	228,490.00	73,266,321.00	-	-	228,486.96	228,486.96	0.31%
2023	152,052,227.00	-	4,605,612.00	156,657,839.00	14,266,248.84	-	4,605,605.62	18,871,854.46	12.05%
2024	108,177,539.00	-	7,017,703.00	115,195,242.00	54,074,166.40	-	7,017,694.08	61,091,860.48	53.03%
2025	168,719,717.00	-	5,184,066.00	173,903,783.00	111,500,297.34	-	5,184,058.49	116,684,355.83	67.10%
2026	105,138,232.00	-	19,705,500.00	124,843,732.00	48,759,576.19	-	1,942,347.34	50,701,923.53	40.61%
TOTAL	**595,125,546.00**	**12,000,000.00**	**36,741,371.00**	**643,866,917.00**	**228,600,288.77**	**-**	**18,978,192.49**	**247,578,481.26**	**38%**

Área visual presupuesto vigente histórico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
4	0	1	1	0	17%	48%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24173	Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (Proinorte)

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (Proinorte)

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores.	Plan	**175**	68	39%	34.00	10.00	-	-	**44.00**	**12.00**	**12.00**			**24.00**	**55%**	(20.00)	● **EN RIESGO**	
Becas aprobadas a jóvenes rurales, beneficiando al 30% de las mujeres.	Becas	**220**	11	5%	-	-	-	-	**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0%**	-		
Planes de inversión en servicios eco sistémicos, implementados por las organizaciones de productoras/as garantizando la gestión integral del riesgo de las microcuencas	Plan	**12**	2	17%	6.00	-	-	-	**6.00**	**0.00**				**0.00**	**0%**	(6.00)	● **CON RETRASO**	
Implementación de planes de inversión en dinamización territorial (rehabilitación comunal caminos rurales claves)	Km	**220**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**					**0.00**	**0%**	-		
TOTAL / PROMEDIO		**627.00**	**81.00**	**2%**	**40.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**24.00**	**48%**	**(26.00)**		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

PROINORTE continúa mostrando un desempeño positivo tanto en términos financieros como operativos, registrando avances significativos en la implementación de planes de negocio, fortalecimiento organizacional, inclusión de mujeres y jóvenes y adopción de innovaciones tecnológicas. Además, mantiene un comportamiento financiero estable que refleja una adecuada continuidad en la ejecución programada.

Principales Riesgos Identificados

Se identifican riesgos operativos asociados a la renuncia de personal clave y a la reprogramación de actividades relacionadas con género, ambiente, nutrición y campañas de sensibilización. Aunque su impacto actual es moderado, la acumulación de estos retrasos podría afectar el cumplimiento integral de indicadores sociales y transversales del proyecto.

Acciones Recomendadas

Fortalecer los mecanismos de continuidad operativa, acelerar las actividades reprogramadas, asegurar la cobertura de vacantes estratégicas y mantener el enfoque en la calidad de los resultados además de la ejecución financiera y física.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El proyecto se posiciona como uno de los más sólidos de la cartera; sin embargo, su buen desempeño no debe generar una falsa sensación de seguridad, ya que algunos componentes sociales presentan señales tempranas de retraso que requieren atención preventiva

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24253

Fortalecimiento Del Abastecimiento De Agua Urbana

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento Del Abastecimiento De Agua Urbana				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Infraestructura Productiva				
Organismo Financiador	013 - Municipios, 171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA 6696-HN				
Monto Total de Financiamiento USD:	46,500,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,242,400,950.00				
Plazo de Ejecución:	73 meses	**Fecha de Inicio**	7/6/2021	**Fecha de Fin**	30/7/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

Cobertura



2. Objetivo Estratégico

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19.

3. Cobertura

Departamentos	Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Gracias A Dios, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara
Municipios	Trujillo, Comayagua, Ajuterique, La Libertad, Siguatepeque, Las Lajas, Santa Rosa De Copán, Copán Ruinas, Corquín, Florida, Choloma, Puerto Cortés, San Manuel, El Triunfo, San Marcos De Colón, Danlí, Teupasenti, Puerto Lempira, La Esperanza, Intibucá, La Paz, Gracias, Ocotepeque, San Marcos, Juticalpa, San Esteban, San Francisco De La Paz, Macuelizo, Quimista, San Francisco De Ojuera, San Luis, San Marcos, Trinidad

Beneficiarios:	992,888
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	2,806.00



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1957 - Mejoramiento del abastecimiento de servicios de suministro de agua potable en los prestadores urbanos de servicio de agua potable elegibles	1,068,732,000.00	-	40,077,450.00	1,108,809,450.00
1958 - Fortalecimiento Institucional de ERSAPS	40,077,450.00	-	0.00	40,077,450.00
1959 - Gestión, Comunicación, divulgación, monitoreo y evaluación del proyecto	93,514,050.00	-	0.00	93,514,050.00
TOTAL	**1,202,323,500.00**	**0.00**	**40,077,450.00**	**1,242,400,950.00**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	013 - Municipios, 171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	46.5
Desembolsado Acumulado	12.1
Disponible:	34.4
% Desembolso:	26%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	119,639,594.00	-	-	**119,639,594.00**
Presupuesto Vigente:	119,639,594.00	-	-	**119,639,594.00**
Ejecutado al 30/06/2026	50,353,519.29	-	-	**50,353,519.29**
% Ejecución al 30/06/2026	**42.1%**			**42.1%**


Área Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2021	5,759,911.00	-	-	5,759,911.00	816,846.80	-	-	816,846.80	14.18%
2022	97,483,404.00	-	-	97,483,404.00	6,047,485.39	-	-	6,047,485.39	6.20%
2023	242,285,548.00	-	-	242,285,548.00	10,840,228.20	-	-	10,840,228.20	4.47%
2024	38,207,697.00	-	-	38,207,697.00	30,684,037.00	-	-	30,684,037.00	80.31%
2025	154,980,330.00	-	-	154,980,330.00	108,290,779.92	-	-	108,290,779.92	69.87%
2026	119,639,594.00	-	-	119,639,594.00	50,353,519.29	-	-	50,353,519.29	42.09%
TOTAL	**658,356,484.00**	**-**	**-**	**658,356,484.00**	**207,032,896.60**	**-**	**-**	**207,032,896.60**	**31%**

Área visual presupuesto vigente histórico



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
2	2	0	0	0	511%	102%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24253	Fortalecimiento Del Abastecimiento De Agua Urbana

Seguimiento Físico De Metasfortalecimiento Del Abastecimiento De Agua Urbana

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Pros	T2 Pros	T3 Pros	T4 Pros	Total Pros 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Pros 2026-27
13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	**100**	0	0%	0%				**0%**	**1%**	**10%**			**0.11**	**100%**	-	● **COMPLETADO**	
Plan de Asistencia Técnica aprobado	Plan		-	-	2.00	3.00			**5.00**	**2.00**	**3.00**			**5.00**	**100%**	-	● **COMPLETADO**	
TOTAL / PROMEDIO		**100.00**	**0.00**	**0%**	**2.00**	**3.00**	**-**	**-**	**5.00**	**2.01**	**3.10**	**-**	**-**	**5.11**	**1.02**	**0.11**		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

El proyecto continúa ejecutando inversiones estratégicas en los municipios priorizados; sin embargo, durante el trimestre fue objeto de una importante reestructuración acordada con el Banco Mundial, la cual incluyó la reducción del financiamiento a US$37 millones, la cancelación de algunos subproyectos y la solicitud de ampliación del plazo de ejecución. Paralelamente, se registró una ejecución financiera superior a la programación trimestral debido a pagos asociados a obras, supervisión y asistencia técnica. La sobre ejecución del avance de los sistemas de agua es debido a que la proyección de SAG ha sido conservadora respecto a lo realizado en el trimestre.

Principales Riesgos Identificados

La reducción del financiamiento y la cancelación de proyectos reflejan riesgos históricos asociados a la capacidad de ejecución. Persisten riesgos relacionados con la disponibilidad presupuestaria para componentes futuros, procesos de adquisición pendientes de aprobación, dependencia de autorizaciones del Banco Mundial y desafíos en la gestión ambiental y social de algunos contratistas.

Acciones Recomendadas

La reestructuración constituye una señal clara de que la estrategia inicial del proyecto superó la capacidad real de implementación. A partir de este momento, la prioridad debe centrarse en maximizar resultados concretos en las inversiones que continúan vigentes y evitar la dispersión de recursos en actividades de bajo impacto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Concentrar los recursos financieros y técnicos en los subproyectos con mayor viabilidad de culminación, fortalecer el monitoreo de avance físico mediante indicadores de cumplimiento contractual, mantener seguimiento permanente con el Banco Mundial y acelerar la toma de decisiones relacionadas con adquisiciones estratégicas pendientes.


SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25056	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)			
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería			
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social			
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento			
Convenio	IDA-6917-HN, TF0C1874			
Monto Total de Financiamiento USD:	108,500,000.00			
Monto Financiamiento L:	2,898,935,550.00			
Plazo de Ejecución:	60 meses	**Fecha de Inicio**	30/12/2022	**Fecha de Fin** 30/12/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución			
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano			
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183			

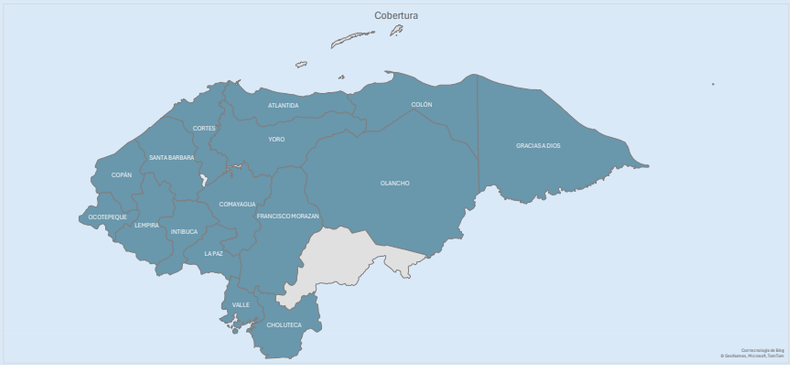

2. Objetivo Estratégico

Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible.

3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias A Dios, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, El Paraíso, Distrito Central, Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuás, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpi, Jesús De Otoro, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, San Lorenzo, El Progreso


Beneficiarios:	26,500
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	20,078.00



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L) Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2417 - Pre-inversión para la preparación de subproyectos	320,619,600.00	-	0.00	320,619,600.00
2418 - Ventana 1: Agricultura de subsistencia: Financiar vínculos productivo a través de grupos informales de productores	374,056,200.00	-	0.00	374,056,200.00
2419 - Ventana 2: Agricultura de Transición	694,675,800.00	-	0.00	694,675,800.00
2420 - Ventana 3: Agricultura comercial	400,774,500.00	-	0.00	400,774,500.00
2421 - Ventana 4: Financiar servicios agrologísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala	293,901,300.00	-	0.00	293,901,300.00
2422 - Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios	320,619,600.00	-	0.00	320,619,600.00
2427 - Apoyo a la Gestión del Proyecto	267,183,000.00	13,359,150.00	0.00	280,542,150.00
2713 - Fortalecimiento Organizacional y apoyo a las Alianzas Productivas (Moskitia)	-	106,873,200.00	0.00	106,873,200.00
2714 - Mejora del estado Nutricional e Inversión en las Comunidades Locales (Moskitia)	-	69,467,580.00	0.00	69,467,580.00
2715 - Fortalecimiento Institucional, multicultural y multiétnico (Moskitia)	-	37,405,620.00	0.00	37,405,620.00
TOTAL	**2,671,830,000.00**	**227,105,550.00**	**0.00**	**2,898,935,550.00**

Área visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)

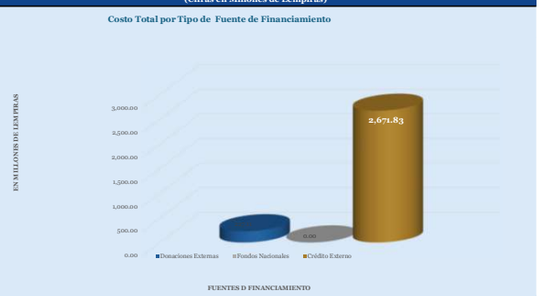

Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	108.5
Desembolsado Acumulado	14.2
Disponible:	94.3
% Desembolso:	13%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	168,217,503.00	60,456,014.00	-	**228,673,517.00**
Presupuesto Vigente:	168,217,503.00	60,456,014.00	-	**228,673,517.00**
Ejecutado al 30/06/2026	91,788,341.88	2,427,158.72	-	**94,215,500.60**
% Ejecución al 30/06/2026	**55%**	**4%**		**41.2%**


Área Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Ejecución Histórica Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	121,999,242.00	8,500,000.00	-	130,499,242.00	2,027,694.70	-	-	2,027,694.70	1.55%
2025	255,378,500.00	70,578,051.00	-	325,956,551.00	210,020,609.20	9,884,044.23	-	219,904,653.43	67.46%
2026	168,217,503.00	60,456,014.00	-	228,673,517.00	91,788,341.88	2,427,158.72	-	94,215,500.60	41.20%
TOTAL	**545,595,245.00**	**139,534,065.00**	**-**	**685,129,310.00**	**303,836,645.78**	**12,311,202.95**	**-**	**316,147,848.73**	**46%**

Área visual presupuesto vigente histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25056	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
7	3	0	0	0	2%	250%

Seguimiento Físico De Metascompetitividad Rural (Comrural Iii)

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Planes de Negocios formulados para Ventana 1	PLANES DE NEGOCIOS	224	0	0%	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	4.00	100%	-	COMPLETADO	
Planes de Negocios formulados para Ventana 2	PLANES DE NEGOCIOS	124	5	4%	-	4.00	-	-	4.00	-	4.00	-	-	4.00	100%	-	COMPLETADO	
Planes de Negocios formulados para Ventana 3 y	PLANES DE NEGOCIOS	62	0	0%	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	2.00	100%	-	COMPLETADO	
Planes de Negocios formulados para Ventana 4.	PLANES DE NEGOCIOS	100	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión productiva en la Mosquita y Costa Atlántica de Honduras	PLANES DE NEGOCIOS	60	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		
Planes Comunitarios de Higiene y nutrición en la Mosquita.	PLANES COMUNITARIOS	30	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		
Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	7	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		
TOTAL / PROMEDIO		607.00	5.00	0%	-	4.00	-	-	4.00	4.00	6.00	-	-	10.00	250%	6.00		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

Atraviesa un proceso de reestructuración que contempla la reducción del financiamiento de US$60 millones a US$40 millones, así como ajustes presupuestarios y modificaciones al alcance de diversas intervenciones. Aunque se reportan avances en algunos procesos de contratación y aprobación de planes de negocio, estos todavía no se reflejan en resultados físicos relevantes. La sobre ejecuciónde Planes de Negocios es debido a que la proyección de SAG ha sido conservadora respecto a lo realizado en el trimestre.

Principales Riesgos Identificados

La combinación de procesos administrativos pendientes, reducción del financiamiento y retrasos en contrataciones constituye una condición de riesgo alto para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Existe además el riesgo de que las nuevas restricciones de financiamiento que limiten el alcance originalmente previsto de las intervenciones.

Acciones Recomendadas

Implementar un plan de recuperación con metas trimestrales obligatorias, acelerar la aprobación de modificaciones presupuestarias, priorizar las contrataciones críticas para la implementación de planes de negocio y establecer un mecanismo de seguimiento ejecutivo permanente hasta normalizar los niveles de ejecución física y financiera.

Mensaje Clave para Alta Dirección

COMRURAL III representa actualmente la principal alerta de la cartera institucional. La ejecución observada no es consistente con la etapa del proyecto y requiere acciones gerenciales inmediatas para evitar que los problemas actuales comprometan irreversiblemente el logro de resultados comprometidos con el organismo financiador.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25733	Proyecto De Fortalecimiento De La Innovación, Resiliencia Y Sostenibilidad De Los Sistemas Agroalimentarios (Innovasan) En 21 Municipios De La Región Norte Central De Honduras

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Fortalecimiento De La Innovación, Resiliencia Y Sostenibilidad De Los Sistemas Agroalimentarios (Innovasan) En 21 Municipios De La Región Norte Central De Honduras				
Entidad Ejecutora:	0140 - Secretaría De Agricultura Y Ganadería				
Sector:	Desarrollo Económico				
Organismo Financiador	237 - International Fund For Agricultural Development (Fida), 246 - Opec Fund For International Development, 001 - Tesorería General De La República - Efectivo				
Convenio	BRAM No.2000005029, GAFSP INNOVASAN, LOAN NO. 15882P, PBAS No.2000005030				
Monto Total de Financiamiento USD:	60,317,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,510,038,161.10				
Plazo de Ejecución:	96 meses	**Fecha de Inicio**	5/9/2024	**Fecha de Fin**	4/9/2032
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				



2. Objetivo Estratégico

El Objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia al cambio climático de las familias de los pequeños productores rurales en condición de pobreza y población rural vulnerable, con el desarrollo de sistemas agroalimentarios sensibles a la nutrición y resilientes al cambio climático. Su fin es contribuir a la reducción de la pobreza y a la igualdad de oportunidades de las familias de pequeños productores rurales en condición de pobreza y población rural vulnerable en la región norte central de Honduras.

3. Cobertura

Departamentos	Comayagua, Cortes, Francisco Morazan, Yoro
Municipios	El Negrito, Orica, Santa Cruz De Yojoa, Sulaco, Victoria, Cedros, El Porvenir, Marale, San Ignacio, Talanga, Vallecio, Esquias, La Libertad, Minas De Oro, San Jeronimo, San Jose Del Potrero, San Luis, Las Lajas


Beneficiarios:	163,327
Generacion de empleo	58,857.00



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2747 - Inversiones en capital humano, social, económico y natural de las familias de los pequeños productores en condición de pobreza - PBAS	409,996,322.31	304,989,394.50	99,926,442.00	814,912,158.81
2748 - Fortalecimiento de las capacidades y la coordinación del gobierno y otros actores en el territorio - PBAS	114,689,415.83	123,251,517.90	44,138,631.60	282,079,565.33
2749 - Gestión, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento - PBAS	76,516,758.06	52,688,487.60	11,355,277.50	140,560,523.16
2750 - Inversiones en capital humano, social, económico y natural de las familias de los pequeños productores en condición de pobreza - BRAM	183,363,684.09	-	0.00	183,363,684.09
2751 - Fortalecimiento de las capacidades y la coordinación del gobierno y otros actores en el territorio - BRAM	46,074,595.27	-	0.00	46,074,595.27
2752 - Gestión, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento - BRAM	43,047,634.44	-	0.00	43,047,634.44
TOTAL	**873,688,410.00**	**480,929,400.00**	**155,420,351.10**	**1,510,038,161.10**

Area visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	237 - International Fund For Agricultural Development (Fida), 246 - Opec Fund For International Development, 001 - Tesorería General De La República - Efectivo
Monto Contratado:	60.30
Desembolsado Acumulado	0.35
Disponible:	59.95
% Desembolso:	1%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	50,300,000.00	16,200,000.00	13,800,000.00	**80,300,000.00**
Presupuesto Vigente:	50,300,000.00	16,200,000.00	13,800,000.00	**80,300,000.00**
Ejecutado al 30/06/2026	-	-	-	**-**
% Ejecución al 30/06/2026	**0%**	**0%**	**0%**	**0.0%**

Area Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	50,300,000.00	16,200,000.00	13,800,000.00	80,300,000.00	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**50,300,000.00**	**16,200,000.00**	**13,800,000.00**	**80,300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**

Area visual presupuesto vigente historico



Información Fisica del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
7	0	0	0	0	0%	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	25733	Proyecto De Fortalecimiento De La Innovación, Resiliencia Y Sostenibilidad De Los Sistemas Agroalimentarios (Innovasan) En 21 Municipios De La Región Norte Central De Honduras

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Fortalecimiento De La Innovación, Resiliencia Y Sostenibilidad De Los Sistemas Agroalimentarios (Innovasan) En 21 Municipios De La Región Norte Central De Honduras

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
280 Planes de Negocio y Plan de Fortalecimiento Organizacional	Planes	**280**	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
105 Planes para Formación de microempresa rurales	Planes	**105**	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
Construcción de 42 sistemas de tratamiento primario con desinfección de agua	Sistemas	**42**	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
Inversiones en rehabilitacion de condiciones higienico-sanitarias de 1,000 hogares familiares	Hogares	**1000**	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
Construcción de 500 sistemas de cosecha de agua de lluvia con geomembrana para familias.	sistemas	**500**	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**	**0%**	-		
TOTAL / PROMEDIO		**1927.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**-**		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situacion Actual

INNOVASAN se encuentra en su fase inicial de implementación y durante el segundo trimestre no registró ejecución física ni financiera debido a que las actividades estuvieron orientadas al cumplimiento de condiciones de inicio, preparación institucional y contratación de la estructura operativa requerida para la puesta en marcha del proyecto.

Principales Riesgos Identificados

El principal riesgo es la prolongación de la etapa de preparación administrativa, lo que podría generar retrasos tempranos y trasladar una presión innecesaria sobre el cumplimiento de metas futuras. La dependencia de la contratación de consultores y personal técnico constituye actualmente el principal cuello de botella.

Acciones Recomendadas

Acelerar la contratación del equipo técnico, establecer hitos de implementación para los próximos seis meses, definir indicadores tempranos de desempeño y fortalecer la gobernanza del proyecto desde sus primeras etapas para evitar desviaciones futuras.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Aunque el comportamiento observado es normal para una fase de arranque, resulta fundamental evitar que el primer año de ejecución se consuma en actividades administrativas, comprometiendo la curva de aprendizaje y el ritmo de implementación previsto para los próximos años.
