SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Informe No. 0022-003-2026

Tegucigalpa, octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS 6
La mayor parte de la inversión acumulada al III trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos: 6
1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V) 6
2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) 6
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) 6
4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE). 6
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 6
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 8
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 13
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 13
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 13
G. CONCLUSIONES 14
H. RECOMENDACIONES 14
ANEXO 1 15
ANEXO 2 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), tiene como finalidad promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Al Tercer trimestre del 2026 la institución cuenta con un presupuesto vigente de L777.02 millones y una ejecución de L233.4 millones que representa 30.0%, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**752,207,037.0**
Inversión Productiva	715,790,026.0
Formación Bruta de Capital	36,417,011.0
Presupuesto Vigente	**777,024,966.0**
Inversión Productiva	740,607,955.0
Formación Bruta de Capital	36,417,011.0
Ejecutado III Trimestre	**77,013,875.4**
Inversión Productiva	77,013,875.4
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**9.9%**
Ejecutado Anual	**233,436,893.2**
Inversión Productiva	197,101,856.8
Formación Bruta de Capital	36,335,036.4
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**30.0%**
Compromiso Aprobado	**243,143,949.0**
Inversión Productiva	206,808,912.6
Formación Bruta de Capital	36,335,036.4
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**31.3%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

Dicha ejecución se llevó a cabo con un presupuesto vigente para inversión productiva de L 740.6 millones y formación bruta de capital de L 36.42 millones, a través de proyectos enfocados en infraestructura Social, Escolar y Caminos Rurales; Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes; Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica.

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 y PCM 013-2026 fecha 25 de febrero y 30 de junio 2026 respectivamente, donde se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en diciembre del 2026.


B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La mayor parte de los proyectos que ejecuta el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) provienen de financiamiento externo del Banco Mundial (BM) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania KFW, sumando las donaciones externas; en su conjunto alcanzan el 91.0%; mientras que el 9.0% se financia con fondos nacionales.

Del total del presupuesto vigente (L 777.02 millones), el 76% corresponde a fondos provenientes de crédito externo con un monto asignado de L 590.8 millones con una ejecucion de L 172.1 millones, los fondos nacionales que corresponden a contrapartes para gastos operativos de proyectos con un monto vigente de L 79.3 millones con una ejecucion de L 38.8 millones. y Los fondos de donaciones L 106.9 millones con ejecucion de L 22.5 millones tal como se muestra en el **gráfico No 1.**

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

GRÁFICO 1

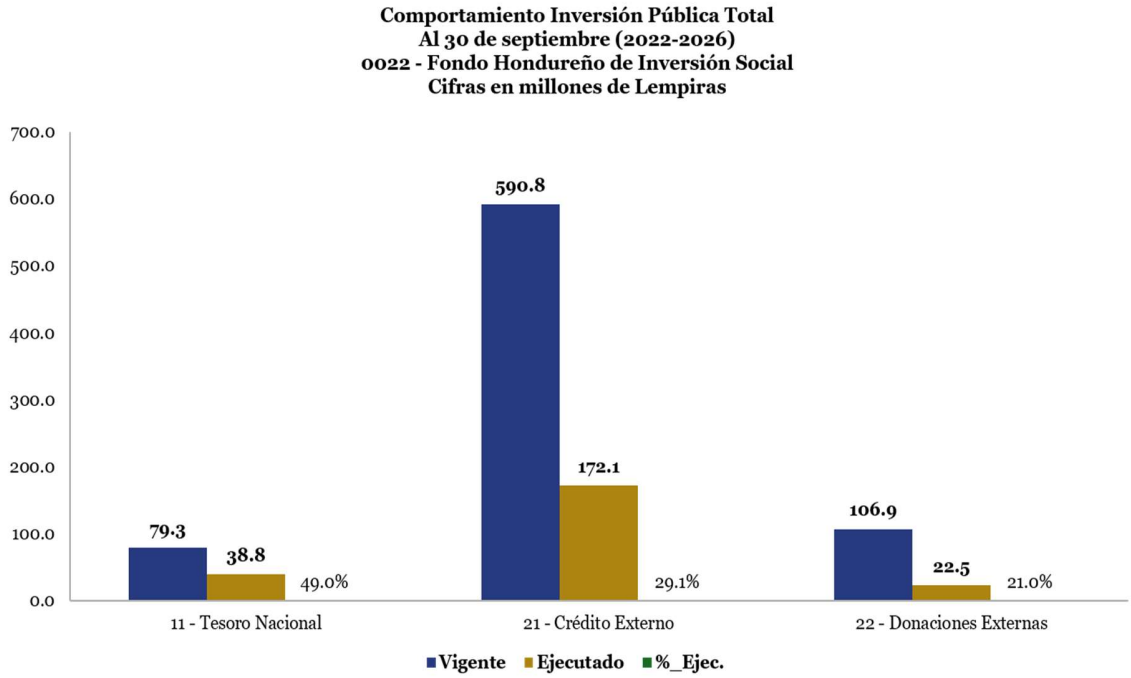

Fuente: SIAFI

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento histórico de la inversión pública ejecutada al tercer trimestre durante el período 2022-2026, con base en el presupuesto vigente y los montos efectivamente ejecutados.

En 2022, el presupuesto vigente ascendió a L 1,885.8 millones, de los cuales se ejecutaron L 127.7 millones, equivalente a un 6.8% de ejecución al tercer trimestre, reflejando el nivel más bajo de avance financiero del período analizado.

Para 2023, el presupuesto vigente se redujo a L 1,727.3 millones, lo que representó una disminución de 8.4% respecto a 2022. No obstante, la ejecución alcanzó L 751.7 millones, equivalente al 43.5%, evidenciando una mejora sustancial tanto en el volumen de recursos ejecutados como en el ritmo de ejecución institucional.

En 2024, el presupuesto vigente disminuyó a L 1,631.5 millones, registrando una reducción aproximada de 5.5% en comparación con 2023. La ejecución se situó en L 716.5 millones, equivalente al 43.9%; aunque el monto ejecutado fue ligeramente menor, el porcentaje de ejecución mostró una mejora de 0.4 puntos porcentuales.


AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Durante 2025, el presupuesto vigente aumentó a L 2,017.5 millones, equivalente a un incremento de 23.7% respecto a 2024. La ejecución alcanzó L 931.1 millones, con un 46.2%, el porcentaje más alto del período analizado al tercer trimestre, reflejando un fortalecimiento en la capacidad de gestión y ejecución de la cartera de proyectos.

Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto vigente se redujo considerablemente a L 777.0 millones, lo que representa una disminución aproximada de 61.5% respecto a 2025. Al cierre del tercer trimestre se registró una ejecución de L 233.4 millones, equivalente al 30.0% del presupuesto vigente. Esta disminución coincide con el proceso de reorganización institucional derivado de la transición de programas y proyectos hacia la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), así como con la reducción de la cartera de inversión administrada, factores que incidieron en el ritmo de ejecución durante el período.

En términos generales, durante el período 2022-2026 se observa una mejora significativa en los niveles de ejecución al tercer trimestre, al pasar de 6.8% en 2022 a un máximo de 46.2% en 2025. En 2026, el porcentaje de ejecución se situó en 30.0%, en un contexto de disminución significativa del presupuesto vigente y de cambios institucionales en la administración de los proyectos. En conjunto, la inversión pública registró un presupuesto vigente acumulado de L 8,039.1 millones y una ejecución acumulada de L 2,760.4 millones, equivalente al 34.3% del presupuesto vigente del período analizado. **Ver Gráfico 2.**

GRÁFICO 2

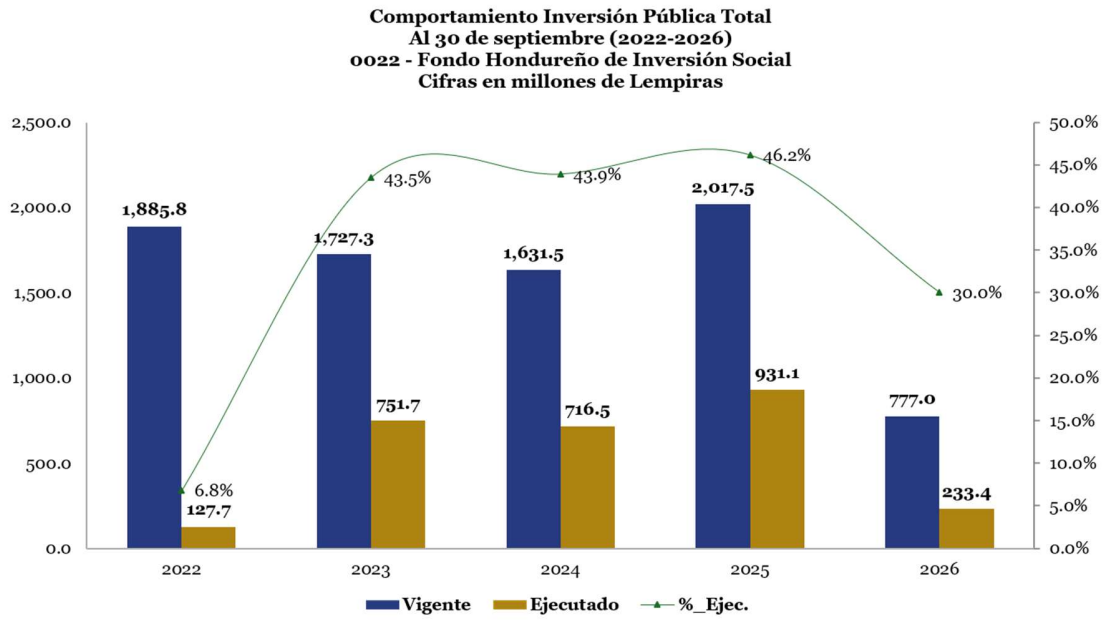

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La mayor parte de la inversión acumulada al III trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V)

2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)**

   El PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	8	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

No se reporta proyectos finalizados en este periodo, en vista que no se han realizado los pagos para la continuación de las obras.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Proyectos en Ejecución 2026/ PROMINE

No	Nombre del Proyecto	Depto	Monto	Avance Físico	Avance Financiero	Estatus	Ejecutor
1	Ampliación Ceb Sat America Y Cepb Rosa Canelo	GRACIAS A DIOS	27,902,374.13	39.10%	33.76%	Suspendido	Servicios De Diseño Y Construcción S. De R.L. (Serdicon)
2	Ampliación Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán	FRANCISCO MORAZÁN	23,110,444.63	77.23%	79.13%	Ejecución	A.M. Sabanagrande
3	Reposición Ceb Cerro Grande Zona 2	FRANCISCO MORAZÁN	26,431,249.40	70.00%	55.44%	Suspendido	Servicios De Ingeniería Para Telecomunicaciones, Electricidad Y Constr Sintec, S.A.
4	Reposición Escuela Y Jardin De Niños Jesus Mejia Paz	GRACIAS A DIOS	12,832,143.80	54.29%	29.00%	Ejecución	Construcciones Diversas S De R.L De C.V
5	Reposición Ceb Republica De Costa Rica Y Jn Stanley Goff	GRACIAS A DIOS	17,374,544.72	22.90%	25.44%	Suspendido	Servicios De Diseño Y Construcción S. De R.L. (Serdicon)
6	Reposición Cepb José Dolores Urquía	COMAYAGUA	2,683,379.76	0.00%	0.00%	Proceso de contratación	A.M. Lamani
7	Reposición Cepb Adalid Arauz,	COMAYAGUA	3,377,977.65	0.00%	0.00%	Proceso de contratación	A.M. Ajuterique
8	Reposición Ceb Enrriqueta Orellana Y Ccpreb Mundo Infantil	LEMPIRA	7,449,351.54	0.00%	0.00%	Proceso de contratación	A.M. Las Flores
9	Ceb Independencia	SANTA BARBARA	9,630,000.00	0.00%	0.00%	Formulación	A.M. Macuelizo/ Cep

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Evaluación Financiera III trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V)	2016 68 763	10,750,000.00 €	L295,947,500.00	02/04/2018-31/10/2027
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	55,095,857.00	55,095,857.00	10,107,811.13	18%
Acumulado 2026	55,095,857.00	55,095,857.00	13,405,459.21	24%
Acumulado Vida del Proyecto *	L295,947,500.00	L295,947,500.00	191,244,357.49	62%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/9/2026, L26.7183 por $1.00

A la fecha se reporta una baja ejecución presupuestaria, teniendo pagos pendientes por un monto de L. 9,556,390.26. Es importante indicar que para concretar estos pagos se requiere en algunos casos la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.

Hay que indicar que el proyecto está en proceso de ampliación de plazo para la contratación, ejecución y finalización de las obras de los centros escolares.

2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE).

Consiste en la implementación de la metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura incluye la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	0	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

El proyecto se encuentra en etapa de cierre, por lo que está en proceso para realizar pagos contractuales y la culminación de obras correspondientes a 29 centros educativos.

Evaluación Financiera III trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	US$80,000,000	L 2,137,304,000	02/04/2021-**31/3/2026**
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	L 98,494,585.00	L 98,494,585.00	9,888,312.96	10%
Acumulado 2026	L 98,494,585.00	L 98,494,585.00	20,758,263.51	20%
Acumulado Vida del Proyecto *	L 2,137,304,000	L 2,137,304,000	L 724,690,370.73	34%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/9/2026, L26.7183 por $1.00

Es importante indicar que para concretar pagos se requiere la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.

Nota técnica: Se informa que al Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) se le desestimaron fondos por un monto de **$ 49,833,582.98**. Asimismo, la fecha de cierre contractual del proyecto se encuentra vencida (31/03/2026), por lo que se requiere la revisión del estado administrativo y financiero, así como la definición de las acciones correspondientes para su regularización y cierre.

3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al III Trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Espacios Públicos recuperados	Obra	9	0	0%	1	0	0%
Jóvenes Capacitados	Capacitación	14	0	0%	1	0	0%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

A continuación, se presenta una tabla de la situación actual de los proyectos priorizados para ejecutar 2026.

Departamento	Municipio	Colonia	Nombre del Proyecto	Método de adquisición	Estatus
La Paz	La Paz	Bo. San Juan	Plaza de Convivencia La Paz	Modalidad PEC	Revisión Control y Calidad
El Paraíso	Danlí	Bo. Nueva Esperanza	Parque Recreativo Nueva Esperanza	Modalidad PEC	Diseño Conceptual
La Paz	La Paz	Bo. San José	Casa CONVIVIR La Paz	Modalidad PEC	Diseño Anteproyecto
El Paraíso	Danlí	Bo. La Concepción	Plaza Concepción Los Sueños	Modalidad PEC	Pendiente
La Paz	La Paz	Bo. La Merced	La Perolera	Modalidad PEC	Diseño Anteproyecto
La Paz	La Paz	Bo. San Antonio	Centro de Formación La Raiz	Modalidad PEC	Pendiente
Yoro	El Progreso	Col. San Jorge	Plaza San Jorge	Modalidad PEC	Pendiente
Yoro	El Progreso	Casa Joven El Progreso	Casa Joven El Progreso	Modalidad PEC	Pendiente
Yoro	Yoro	Col. Primero de Mayo	Plaza de Convivencia Lluvia de Peces	Modalidad PEC	Pendiente

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el Proyecto de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase IIII , En el ámbito físico, las acciones ejecutadas se concentraron principalmente en la planificación, formulación y preparación de las intervenciones de la Fase III, destacando la revisión integral de la cartera de proyectos de infraestructura, la formulación del proyecto "Plaza La Convivencia" en el municipio de La Paz, la definición de criterios para la distribución de recursos entre los municipios beneficiarios y el fortalecimiento de la coordinación con la Asistencia Técnica, los gobiernos municipales y las dependencias institucionales.

A continuación, se reporta la ejecución financiera histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) al III trimestre de 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)	Fase III 2018 67563	11,000,000.00	L 336,743,000	02/04/2021-6/4/2028
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	L 142,666,062.00	L 64,666.062	1,591,748.20	2%
Acumulado 2026	L 142,666,062.00	L 64,666.062	11,593,965.98	3%
Acumulado Vida del Proyecto *	L 336,743,000	L 336,743,000	L 41,929,116.37	12.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026, L26.7183 por $1.00

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Durante el III trimestre del 2026, no se han realizado contratos de bienes, servicios u obras.

4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial).

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

Los principales avances físicos al III trimestre de 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Centros educativos rehabilitados	Centro Educativo	9	0	0%	0	0	0%
Sistemas de agua rehabilitados	Sistema de Agua	7	1	14.3%	1	1	100%
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida	Kilometro	2	0	0%	0	0	0%
Centros de salud pública rehabilitados	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: FHIS

Durante el tercer trimestre de 2026, no se han registrado nuevas adjudicaciones de contratos de Obras, Bienes, Servicios de Consultorías (firmas e Individuales) o Servicios de No Consultoría. Los procesos activos en cada categoría de contratación y su estado actual a octubre de 2026 se presentan a continuación:

No.	Descripción	Estado actual al 31 de octubre de 2026
OBRAS		
1	**PROCESO HN-SEDECOAS-371603-CW-RFB** Enmienda No. 1 al Contrato No. SDO-O-FHIS-07-2024 LOTE No. 2 Reposición Sistema de Agua Potable en Aldea Casco Urbano, Municipio de Apacilagua en el Departamento de Choluteca, Código 109073	A la espera de la subsanación correspondiente al Acta 1726 de Comité de Operaciones FHIS en la cual se detalla la Empresa se consigna a la Empresa HJJ siendo lo correcto SERPIC, S. de R.L.
2	**Proceso HN-SEDECOAS-423139-CW-RFB Enmienda No. 1 al** Contrato No. SDO-O-FHIS-11-2024 Reposición de Sistema de Agua Potable en el Departamento de Cortes, Código 108878, Lote No. 1	En elaboración de la Enmienda al Contrato

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

No.	Descripción	Estado actual al 31 de octubre de 2026
3	**Proceso HN-SEDECOAS-371464-CW-RFB** Enmienda 3 Contrato No. SDO-O-FHIS-15-2023, Lote 3 Reposición CEPB Lic. Evaristo Euceda en Cortés Código 108457 y Reparación Instituto José Manuel Diaz Palma en Atlántida Código 108253	Formalizado por ambas partes. Proceso Finalizado.
4	**Proceso HN-SEDECOAS-341535-CW-RFB Enmienda 3,** Contrato No. SDO-O-FHIS-01-2023 Lote 1: Reparación y/o Reposición CEB en Comayagua Códigos 108628 y 108511	A la espera de la subsanación al Acta 1728 de Comité de Operaciones FHIS en la cual se detalla la Empresa se consigna a la empresa Grupo LOGA, S. de L.R. siendo lo correcto Grupo LOGA, S.
3	**CPN-SEDECOAS-FHIS-28-2021** Supervisión Técnica de Obras de Rehabilitación y Reconstrucción de Escuelas, Paquetes No.1,4,6 y 7, Departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés, Yoro e Islas de la Bahía Enmienda No. 1 Contrato No. CPN-F-FHIS-02-2022	Con fecha 30 de junio de 2026, se remite el expediente con la Enmienda 1 para la firma del Ministro.
4	**CPN-FHIS-16-2022** Supervisión de Escuelas Paquete No.2 Ubicadas en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Lempira. Enmienda No. 1 Contrato No. CPN-F-FHIS-03-2022	Con fecha 30 de junio de 2026, se remite el expediente con la Enmienda 1 para la firma del Ministro.
5	**Proceso HN-SEDECOAS-407817-CW-RFB** Enmienda 1 al Contrato No. SDO-O-FHIS-08-2024 Lote 1: Reposición CEPB Federico Froebel en Colón Código 110028	En elaboración de la Enmienda al Contrato

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) al III trimestre de 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	BCIE - 2261	US$124,211,000	L 3,318,706,761.30	25/05/2021-30/06/2028
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	L 481,522,205.00	L 481,522,205.00	L 55,426,003.13	12%
Acumulado 2026	L 481,522,205.00	L 481,522,205.00	L 149,189,689.36	31%
Acumulado Vida del Proyecto *	L 2,456,479,795.00	L 2,456,479,795.00	1,478,173,827.76	60%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 33/09/2026 (BCH): L26.7183 por $1.00

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Asimismo, el resto de los proyectos ejecutados por el FHIS, no reportan avances:

1. Proyecto "Agua de Gracias" es financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está en proceso de cierre, no se han registrado avances físicos ni financieros significativos en su desarrollo el convenio fue desobligado en su totalidad.
2. Proyecto Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.
3. Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López

Los dos últimos son financiados con recursos del tesoro nacional no reportan ejecución y se encuentran en proceso de cierre 2026.

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

No se registran adquisiciones para este trimestre.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
- En atención a lo indicado en el PCM-004-2026, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas emite Dictamen de Enmienda favorable para realizar cambio de ejecutor de todos los proyectos ejecutados por FHIS para ser ejecutados en SIT.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

- La transición institucional hacia la SIT continúa siendo el principal factor que afecta la velocidad de ejecución de varios programas.
- Los principales riesgos son administrativos más que técnicos, destacando retrasos en contrataciones, aprobación de contratos y pagos.
- PRE, PROMINE y CONVIVIR concentran la mayor necesidad de seguimiento ejecutivo por su impacto financiero y compromisos con organismos internacionales.
- Ejecutar el cronograma de transición a la SIT, el cual se ha trabajado con algunos retrasos y se contempla finalizar la transición a la SIT en el mes de diciembre según PCM-013-2026.
- Al 30 de septiembre de 2026 los contratos enviados a ratificación por el Congreso Nacional aún se encuentran pendientes de aprobación.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

G. CONCLUSIONES

El Fondo Hondureño de Inversión Social se encuentra en etapa de transición a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, esto ha generado fragilidad en los procesos de los proyectos (administrativos, avances físicos y ejecución), por lo que se espera que para el siguiente trimestre se refleje un mejor panorama con respecto a los avances de cada uno de los proyectos.

H. RECOMENDACIONES

Agilizar los procesos internos a fin de cumplir con los lineamientos compartidos por la SEFIN con respecto al cronograma de transición.

Realizar las gestiones necesarias para la solicitud de usuarios y perfiles, a fin de actualizar la información de los proyectos y la formulación 2027.

SECRETARÍA DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso
90	**1. Inversión Productiva**		**49,407,087**	**666,382,939**	**715,790,026**	**42,901,185**	**697,706,770**	**740,607,955**	**1,077,865**	**75,936,011**	**77,013,875**	**10.4%**	**2,511,861**	**194,589,995**	**197,101,857**	**26.6%**	**3,148,925**	**203,659,987**	**206,808,913**	**27.9%**
6	**0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social**		**49,407,087**	**666,382,939**	**715,790,026**	**42,901,185**	**697,706,770**	**740,607,955**	**1,077,865**	**75,936,011**	**77,013,875**	**10.4%**	**2,511,861**	**194,589,995**	**197,101,857**	**26.6%**	**3,148,925**	**203,659,987**	**206,808,913**	**27.9%**
1	Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.	FN-25984-1	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona,		**30,000,000**	**-**	**30,000,000**	**30,000,000**	**-**	**30,000,000**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS	KfW	9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,846,678	54,819,384	64,666,062	664,148	927,600	1,591,748	2.5%	1,818,815	9,775,151	11,593,966	17.9%	2,445,215	10,741,551	13,186,766	20.4%
	TOTAL - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS		**9,846,678**	**132,819,384**	**142,666,062**	**9,846,678**	**54,819,384**	**64,666,062**	**664,148**	**927,600**	**1,591,748**	**2.5%**	**1,818,815**	**9,775,151**	**11,593,966**	**17.9%**	**2,445,215**	**10,741,551**	**13,186,766**	**20.4%**
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BMZ 2016 68 763	3,054,507	52,041,350	55,095,857	3,054,507	52,041,350	55,095,857	413,717	9,694,095	10,107,811	18.3%	693,047	12,712,413	13,405,459	24.3%	703,710	13,090,013	13,793,723	25.0%
	TOTAL - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROM		**3,054,507**	**52,041,350**	**55,095,857**	**3,054,507**	**52,041,350**	**55,095,857**	**413,717**	**9,694,095**	**10,107,811**	**18.3%**	**693,047**	**12,712,413**	**13,405,459**	**24.3%**	**703,710**	**13,090,013**	**13,793,723**	**25.0%**
3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	98,494,585	98,494,585	-	98,494,585	98,494,585	-	9,888,313	9,888,313	10.0%	-	20,758,264	20,758,264	21.1%	-	20,758,264	20,758,264	21.1%
	TOTAL - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAEST RUCT U		**-**	**98,494,585**	**98,494,585**	**-**	**98,494,585**	**98,494,585**	**-**	**9,888,313**	**9,888,313**	**10.0%**	**-**	**20,758,264**	**20,758,264**	**21.1%**	**-**	**20,758,264**	**20,758,264**	**21.1%**
4	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261	-	10,829,246	10,829,246	-	10,829,246	10,829,246	-	-	-	0.0%	-	2,154,479	2,154,479	19.9%	-	2,171,016	2,171,016	20.0%
	TOTAL - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIST EMA DE ABAST ECIMIENTO D		**-**	**10,829,246**	**10,829,246**	**-**	**10,829,246**	**10,829,246**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**2,154,479**	**2,154,479**	**19.9%**	**-**	**2,171,016**	**2,171,016**	**20.0%**
5	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	481,522,205	481,522,205	-	481,522,205	481,522,205	-	55,426,003	55,426,003	11.5%	-	149,189,689	149,189,689	31.0%	-	156,899,144	156,899,144	32.6%
		TF0D1700-HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales		**-**	**481,522,205**	**481,522,205**	**-**	**481,522,205**	**481,522,205**	**-**	**55,426,003**	**55,426,003**	**11.5%**	**-**	**149,189,689**	**149,189,689**	**31.0%**	**-**	**156,899,144**	**156,899,144**	**32.6%**
6	Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho		6,505,902	-	6,505,902	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, ubicado en		**6,505,902**	**-**	**6,505,902**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		**36,417,011**	**-**	**36,417,011**	**36,417,011**	**-**	**36,417,011**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**36,335,036**	**-**	**36,335,036**	**58.9%**	**36,335,036**	**-**	**36,335,036**	**60.2%**
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		**36,417,011**	**-**	**36,417,011**	**36,417,011**	**-**	**36,417,011**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**36,335,036**	**-**	**36,335,036**	**99.8%**	**36,335,036**	**-**	**36,335,036**	**99.8%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	INFRAESTRUCTURA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)		36,417,011	-	36,417,011	36,417,011	-	36,417,011	-	-	-	0.0%	36,335,036	-	36,335,036	99.8%	36,335,036	-	36,335,036	99.8%
	TOTAL - INFRAEST RUCT URA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)		**36,417,011**	**-**	**36,417,011**	**36,417,011**	**-**	**36,417,011**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**36,335,036**	**-**	**36,335,036**	**99.8%**	**36,335,036**	**-**	**36,335,036**	**99.8%**
	Total general		**85,824,098**	**666,382,939**	**752,207,037**	**79,318,196**	**697,706,770**	**777,024,966**	**1,077,865**	**75,936,011**	**77,013,875**	**9.9%**	**38,846,898**	**194,589,995**	**233,436,893**	**30.0%**	**39,483,962**	**203,659,987**	**243,143,949**	**31.3%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0022- Fondo Hondureño de Inversión Social								
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)	Infraestructura Escolar	Centro Educativo	8	0	0%	0	0	0%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE).	Infraestructura Escolar	Centro Educativo	0	0	0%	0	0	0%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)	Espacios Públicos recuperados	Obra	9	0	0%	0	0	0%
	Jóvenes Capacitados	Capacitación	14	0	0%	0	0	0%
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial)	Centros educativos rehabilitados	Centro Educativo	19	0	0%	0	0	0%
	Sistemas de agua rehabilitados	Sistema de Agua	7	1	14.30%	1	1	100%
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida	Kilometro	2	0	0%	0	0	0%
	Centros de salud pública rehabilitados	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
