SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)

Informe No. 413-003-2026

Tegucigalpa, octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS 6
D.1.1. Proyecto: Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional 6
D.1.2. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 6
D.1.3. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 7
D.2.1. Proyecto Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional 7
D.2.2. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 8
D.2.3. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 9
D.3.1. Proyecto Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional. 9
D.3.2. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 9
D.3.3. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 10
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 11
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 11
G. CONCLUSIONES 11
H. RECOMENDACIONES 11
ANEXO 1 13
ANEXO 2 14

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) es la institución rectora del deporte, educación física y recreación, encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva. Con la finalidad de incentivar la práctica del deporte de toda la población sin discriminación de ninguna naturaleza y promover un estado de vida saludable.

En el marco del Plan de Gobierno ¡Juntos Vamos a Estar Bien! 2026–2030, se promoverá la inversión para la construcción de infraestructura para la práctica deportiva de acceso público.

Al cierre del III Trimestre de 2026, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L965.8** millones, de los cuales **L154.0** millones corresponden a Inversión Productiva y **L811.8** millones a Formación Bruta de Capital. Al 30 de septiembre de 2026, la ejecución presupuestaria acumulada ascendió a **L190.0** millones, equivalente al **19.7%** del presupuesto vigente. De este monto, **L132.7** millones corresponden a Inversión Productiva y **L57.3** millones a Formación Bruta de Capital. Asimismo, los compromisos aprobados alcanzaron **L190.0** millones, representando el **19.7%** del presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**964,855,337.0**
Inversión Productiva	0.0
Formación Bruta de Capital	964,855,337.0
Presupuesto Vigente	**965,829,837.0**
Inversión Productiva	153,981,432.0
Formación Bruta de Capital	811,848,405.0
Ejecutado III Trimestre	**180,224,659.7**
Inversión Productiva	132,652,454.3
Formación Bruta de Capital	47,572,205.5
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**18.7%**
Ejecutado Anual	**189,994,852.6**
Inversión Productiva	132,652,454.3
Formación Bruta de Capital	57,342,398.4
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**19.7%**
Compromiso Aprobado	**189,994,852.6**
Inversión Productiva	132,652,454.3
Formación Bruta de Capital	57,342,398.4
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**19.7%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

La ejecución registrada durante el período se realizó mediante los proyectos “Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para Uso de la Población a Nivel Nacional”; “Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional”; y

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

"Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional".

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la totalidad de los recursos corresponden a fondos provenientes de fondos nacionales proveniente de la Tesorería General de la República, con un monto de **L965.8 millones**, Dicha inversión es financiada por la TGR con 100%.

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

En el período comprendido entre 2022 y 2026, los proyectos de inversión pública de la institución han presentado variaciones significativas en la asignación presupuestaria y en los niveles de ejecución financiera. El presupuesto vigente refleja el comportamiento de los recursos destinados a la inversión, mientras que la ejecución evidencia el avance en la utilización de dichos recursos durante cada ejercicio fiscal. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento histórico de la inversión institucional para el período 2022-2026:

- En **2022**, la institución contó con un presupuesto vigente de **L275.1** millones, sin registrar ejecución presupuestaria al cierre del período, equivalente al **0.0%.** Este resultado evidencia la ausencia de ejecución financiera durante el ejercicio fiscal, por lo que resulta importante revisar las condiciones iniciales de implementación de los proyectos y los procesos administrativos y de contratación correspondientes.
- **Para 2023,** el presupuesto vigente aumentó a **L516.6** millones, mientras que la ejecución alcanzó **L169.2** millones, equivalente al **32.8%** del presupuesto vigente. Este comportamiento refleja un incremento en la utilización de los recursos asignados, mostrando avances en la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública.
- **En 2024**, el presupuesto vigente alcanzó su nivel más alto del período, con **L1,107.9** millones. Sin embargo, la ejecución fue de **L163.0** millones, equivalente al **14.7%** del presupuesto vigente. A pesar de la disponibilidad de mayores recursos presupuestarios, el porcentaje de ejecución disminuyó respecto al año anterior, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y agilizar los procesos de contratación, ejecución y seguimiento de las inversiones.
- **Durante 2025,** la institución registró un presupuesto vigente de **L1,103.5** millones, con una ejecución de **L667.3** millones, equivalente al **60.5%** del presupuesto vigente. Este resultado representa el mayor nivel de ejecución del período analizado, reflejando una mejora significativa en la capacidad de ejecución financiera y en la utilización de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública.


AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Al cierre del **III Trimestre de 2026**, la institución registró un presupuesto vigente de L965.8 millones y una ejecución acumulada de **L190.0** millones, equivalente al **19.7%** del presupuesto vigente. Este resultado refleja una disminución en el ritmo de ejecución respecto a 2025, por lo que será importante fortalecer el seguimiento de los proyectos, acelerar los procesos administrativos y de contratación, y dar cumplimiento a la programación física y financiera prevista para el último trimestre del ejercicio fiscal.

Conclusión ejecutiva

La serie histórica evidencia que el presupuesto vigente experimentó un crecimiento importante entre 2022 y 2024, al pasar de **L275.1** millones a **L1,107.9** millones, manteniéndose en un nivel similar durante 2025. No obstante, el mayor porcentaje de ejecución se registró en 2025, con un **60.5%**, mientras que en 2024 se observó una ejecución de apenas el **14.7%,** pese a contar con el mayor presupuesto del período. Al cierre del III Trimestre de 2026, la ejecución alcanzó el **19.7%,** equivalente a L190.0 millones, lo que evidencia la necesidad de adoptar medidas correctivas para acelerar la ejecución presupuestaria durante el último trimestre y mejorar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos de inversión pública.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Cifras en millones de Lempiras

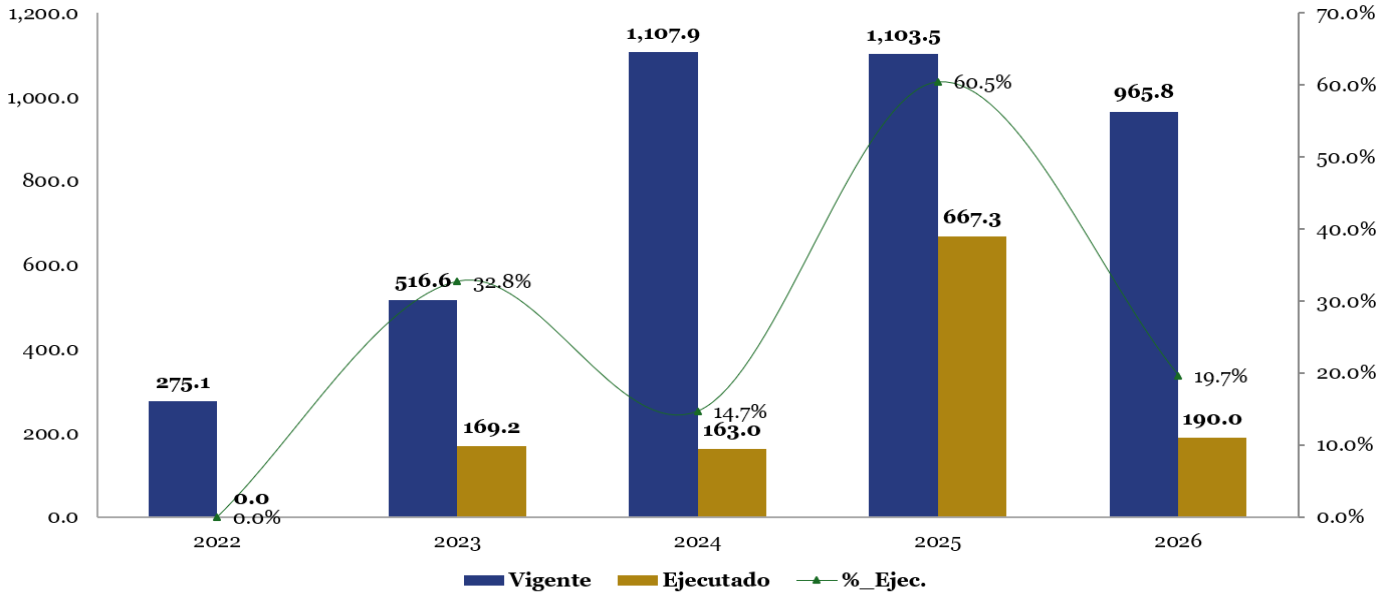

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1.1. Proyecto: Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional

D.1.2. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

El Proyecto se enfoca en incentivar bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, implementando la construcción de 25 canchas deportivas (16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona

Los principales avances físicos al tercer trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programa-ción	Ejecu-ción	% Ejec	Programa-ción	Ejecu-ción	% Ejec
413-La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)								
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	25	25	100%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Al cierre del III Trimestre de 2026, se revisó el avance físico y financiero de las dos canchas deportivas pendientes de finalización, reportándose un avance físico del 70% en San Manuel, donde se encontraba en proceso la instalación de la grama sintética, y del 50% en Choloma, cuya

obra continuaba en ejecución. En el ámbito financiero, CONDEPOR informó que se había procesado el pago correspondiente a ambas empresas mediante la carga del formulario F-01. Asimismo, se reiteró la importancia de concluir las obras dentro del plazo establecido, considerando la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026, a fin de garantizar la finalización de las dos canchas y el cumplimiento de los compromisos contractuales.

D.1.3. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Evaluación Financiera III trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	US$		20/9/2023
		Lempiras	L402,000,000.00	31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III -Trimestre 2026	0	157,510.0	0	0.0%
Acumulado 2026	0	157,510.0	0	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto **	**402,000,000.0**	**402,000,000.0**	**366,627,796.2**	**91.2%**

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D.2.1. Proyecto Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional

Para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos, además del retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 32 canchas deportivas; las cuales se dividen en 15 canchas sintéticas de futbol 11, 4 canchas sintéticas de futbol 7; y 13 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional. Así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha y Estadio Francisco Morazán.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.2.2. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Los principales avances físicos al tercer trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Program a-ción	Ejecu-ción	% Ejec	Progra ma-ción	Ejec u-ción	% Ejec
413-La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)								
Proyecto Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional	Estadios	Estadio	3	3	100%	3	3	100%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Al cierre del III Trimestre de 2026, se reportó que las 30 canchas deportivas contempladas en el proyecto han sido concluidas e inauguradas en su totalidad. Asimismo, de los tres estadios programados, dos ya fueron inaugurados y también el Estadio Francisco Morazán. En relación con la remodelación del Estadio José de la Paz Herrera, se finalizaron los trabajos de instalación del techado del sector Sol Centro y la colocación de las butacas, alcanzando un 100 % de avance físico de las obras. Estos resultados reflejan avances importantes en el cumplimiento de las metas de infraestructura deportiva, orientadas a mejorar las instalaciones y ampliar los espacios disponibles para la práctica del deporte y la recreación de la población. La unidad ejecutora de CONDEPOR informó que el Proyecto 1 se encuentra en su etapa de finalización y pago y cierre del proyecto.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.2.3. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	BCH-24789-1	US$		28/8/2022
		Lempiras	L552,700,000.0	31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III -Trimestre 2026	0	4,617,499.0	4,066,053.6	88.1%
Acumulado 2026	0	4,617,499.0	4,066,053.6	88.1%
Acumulado Vida del Proyecto **	**552,700,000.0**	**552,700,000.0**	**536,511,755.8**	**97.1%**

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D.3.1. Proyecto Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.

El proyecto consiste implementar la Construcción y Mejoramiento de 60 instalaciones deportivas y recreativas en 9 departamentos y 16 municipios.

D.3.2. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Los principales avances físicos al tercer trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Program a-ción	Ejecu- ción	% Ejec	Progra ma-ción	Ejecu -ción	% Ejec
413-La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)								
Proyecto Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.	Canchas	Cancha	60	60	100%	60	60	100%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

La Unidad ejecutora de Infraestructura de CONDEPOR informó que al III-Trimestre el Proyecto 3 comprende 60 canchas deportivas. Durante la reunión se indicó que 27 obras se encontraban concluidas y que existían 33 contratos en proceso de ejecución o cierre, según la situación particular de cada obra. También se esperaba la entrega de dos canchas adicionales durante el fin de semana posterior a la reunión; la cifra debía actualizarse.

Se mencionaron como dificultades las lluvias, especialmente en la zona atlántica, los atrasos de las empresas contratistas y la reactivación de proyectos que habían permanecido paralizados. Algunas obras podrían finalizar durante 2026 y otras trasladarse a 2027.

D.3.3. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional	DI-25813	US$		30/9/2024
		Lempiras	L1,374,714,404.0	31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
lll-Trimestre 2026	0.00	149,206,423.0	128,586,400.7	86.2%
Acumulado 2026	0.00	149,206,423.0	128,586,400.7	86.2%
Acumulado Vida del Proyecto **	**1,374,714,404.0**	**1,374,714,404.0**	**959,630,678.9**	**69.8%**

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Reuniones Monitoreo y Seguimiento.
- ✓ Modificación Presupuestaria de Incorporación de Recursos.
- ✓ Proyecciones ejecución.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

- Durante el III Trimestre de 2026, los proyectos de infraestructura deportiva de CONDEPOR presentaron dificultades relacionadas con las lluvias, los atrasos de las empresas contratistas y la reactivación de obras paralizadas, afectando el cumplimiento de los plazos previstos. Como acciones de seguimiento, se realizaron reuniones de monitoreo para revisar los avances físicos y financieros, dar seguimiento a los pagos mediante el formulario F-01 y agilizar los procesos administrativos y contractuales, priorizando la finalización de las obras pendientes antes del 31 de diciembre de 2026 y la actualización de las proyecciones de ejecución.

G. CONCLUSIONES

- CONDEPOR reportó avances importantes en los proyectos deportivos. Se registró el cumplimiento de la meta de 25 canchas en el primer proyecto, la finalización de 30 canchas y avances en estadios en el segundo, mientras que, del proyecto de 60 canchas, 27 estaban concluidas y 33 contratos continuaban en ejecución o cierre.
- La ejecución acumulada alcanzó el 91.2% en el proyecto de rehabilitación de espacios deportivos, el 97.1% en el proyecto de remodelación de instalaciones y estadios, y el 69.8% en el proyecto de construcción y mejoramiento de instalaciones deportivas.
- Persisten atrasos por lluvias, demoras de contratistas y reactivación de obras paralizadas, lo que podría ocasionar que algunas intervenciones se extiendan hasta 2027.
- Se requiere fortalecer el monitoreo físico y financiero, agilizar los pagos y trámites contractuales, y actualizar las proyecciones de ejecución para asegurar la finalización y el cierre de los proyectos conforme a los plazos establecidos.

H. RECOMENDACIONES

- Agilizar la ejecución de las obras pendientes, priorizando aquellas que puedan finalizarse antes del 31 de diciembre de 2026.
- Fortalecer el seguimiento físico y financiero mediante reuniones periódicas con CONDEPOR para verificar avances, pagos y cumplimiento de los contratos.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Actualizar las proyecciones de ejecución, identificando las obras que podrían extenderse hasta 2027 y estableciendo medidas correctivas para reducir los atrasos.
- Agilizar los trámites administrativos y financieros, incluyendo los pagos pendientes y el cierre contractual de los proyectos finalizados.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Total Fondos Nacionales	Total General	Total Fondos Nacionales	Total General	Total Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
3	**0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación**		**-**	**-**	**153,981,432**	**153,981,432**	**132,652,454**	**132,652,454**	**86.1%**	**132,652,454**	**132,652,454**	**86.1%**
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	FN-25813	-	-	149,206,423	149,206,423	128,586,401	128,586,401	86.2%	128,586,401	128,586,401	86.2%
	TOTAL - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PA		**-**	**-**	**149,206,423**	**149,206,423**	**128,586,401**	**128,586,401**	**86.2%**	**128,586,401**	**128,586,401**	**86.2%**
2	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	-	-	157,510	157,510	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	TOTAL - Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Admini		**-**	**-**	**157,510**	**157,510**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**
3	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	-	-	4,617,499	4,617,499	4,066,054	4,066,054	88.1%	4,066,054	4,066,054	88.1%
	TOTAL - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE		**-**	**-**	**4,617,499**	**4,617,499**	**4,066,054**	**4,066,054**	**88.1%**	**4,066,054**	**4,066,054**	**88.1%**
	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		**964,855,337**	**964,855,337**	**811,848,405**	**811,848,405**	**47,572,205**	**47,572,205**	**5.9%**	**57,342,398**	**57,342,398**	**7.1%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		13,206,786	13,206,786	28,206,786	28,206,786	7,460,494	7,460,494	26.4%	8,058,229	8,058,229	28.6%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**13,206,786**	**13,206,786**	**28,206,786**	**28,206,786**	**7,460,494**	**7,460,494**	**26.4%**	**8,058,229**	**8,058,229**	**28.6%**
	ACTIVIDADES RECREATIVAS, FORMACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO		300,000	300,000	300,000	300,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES RECREATIVAS, FORMACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE ATLETAS DE AL		**300,000**	**300,000**	**300,000**	**300,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL		951,348,551	951,348,551	783,341,619	783,341,619	40,111,712	40,111,712	5.1%	49,284,169	49,284,169	6.3%
	TOTAL - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, R		**951,348,551**	**951,348,551**	**783,341,619**	**783,341,619**	**40,111,712**	**40,111,712**	**5.1%**	**49,284,169**	**49,284,169**	**6.3%**
	TOTAL -413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		**964,855,337**	**964,855,337**	**965,829,837**	**965,829,837**	**180,224,660**	**180,224,660**	**18.7%**	**189,994,853**	**189,994,853**	**19.7%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación								
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	25	25	100%
Proyecto Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional	Estadios	Estadio	3	3	100%	3	3	100%
Proyecto Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.	Canchas	Cancha	60	60	100%	60	60	100%

Nota **:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
