# SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

# Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

**Informe No. 0505-003-2026**

**Tegucigalpa, Octubre 2026**

# Contenido

Contenido ..... 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN ..... 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ..... 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ..... 3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS ..... 5
D.1 Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos ..... 5
D.2 Proyecto “Construcción, promoción, conservación, fortalecimiento y valoración histórica de sitios Arqueológicos y bienes que conforman el Patrimonio Cultural en 13 departamentos de Honduras” ..... 6
E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL III TRIMESTRE 2026 ..... 9
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN ..... 9
G. CONCLUSIONES ..... 9
H. RECOMENDACIONES ..... 9
ANEXO 1 ..... 10
ANEXO 2 ..... 11



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

## A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

El Gobierno de la República pretende fomentar la conservación, participación y el disfrute del Patrimonio Cultural en la ciudadanía. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAH pretende impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y el territorio hondureño.

Cuadro No. 01
**Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026**
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|---|
| **Presupuesto Aprobado** | **103,083,553** |
| Inversión Productiva | 22,618,483 |
| Formación Bruta de Capital | 80,465,070 |
| **Presupuesto Vigente** | **76,132,113** |
| Inversión Productiva | 11,003,978 |
| Formación Bruta de Capital | 65,128,135 |
| **Ejecutado III Trimestre** | **3,233,768** |
| Inversión Productiva | 239,809 |
| Formación Bruta de Capital | 2,993,959 |
| **% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)** | **4.2%** |
| **Ejecutado Anual** | **7,208,079** |
| Inversión Productiva | 239,809 |
| Formación Bruta de Capital | 6,968,270 |
| **% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)** | **9.5%** |
| **Compromiso Aprobado** | **7,403,079** |
| Inversión Productiva | 434,809 |
| Formación Bruta de Capital | 6,968,270 |
| **% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)** | **9.7%** |

***Nota:*** SIAFI, 30/09/2026

## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Al tercer trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L76.1 millones,** detallado para la Inversión productiva **L11.0 millones** y la formación bruta de capital **L 65.1 millones**; la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2026 fue por un monto de **L 7.2 millones,** lo que representa el **9.5%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

En el presente año, para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) la asignación presupuestaria de la Inversión Productiva de **L11.0 millones** corresponden a los proyectos "Fortalecimiento integral IHAH para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios Arqueológicos" y el Proyecto "Construcción, promoción, conservación, fortalecimiento y valoración histórica de sitios Arqueológicos y bienes que conforman el Patrimonio Cultural en 13 departamentos de Honduras", este segundo, muestra una ejecución presupuestaria




AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

baja considerando que su presupuesto fue incorporado hasta finales del mes de septiembre del presente año. Mientras que la Inversión Formación Bruta de Capital de **L 65.1 millones** está contemplada en el Programa de Promoción y Desarrollo de la Cultura, Artes y Deportes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

Durante los años 2022 al 2026 el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) ha ejecutado cinco (5) Proyectos de Inversión Pública, financiados principalmente con fondos nacionales. Estos Proyectos estaban enfocados al acondicionamiento, promoción cultural y turística de Parques Arqueológicos, así como la preservación de documentos históricos y la capacitación en restauración de Bienes culturales en el Museo Villa Roy, centros y sitios arqueológicos a nivel nacional.

**Comportamiento Inversión Pública Total**
**Al 30 de septiembre (2022-2026)**
**0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia**
**Cifras en millones de Lempiras**

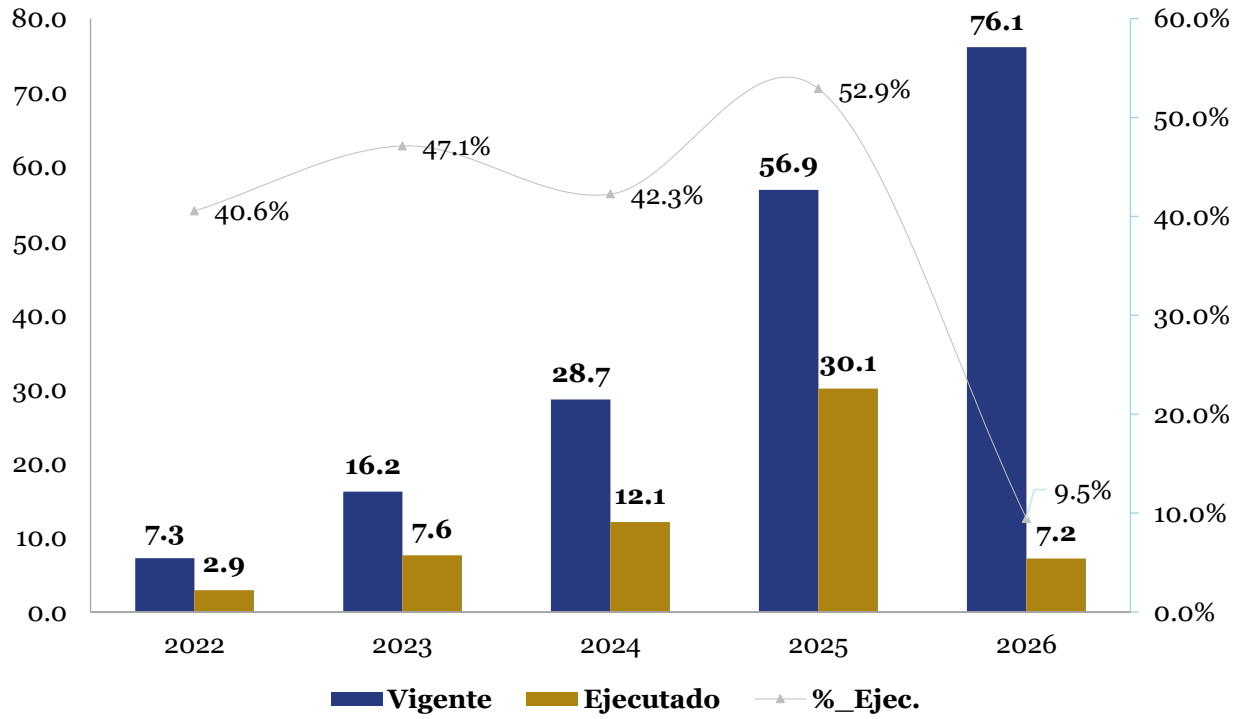


**Fuente:** SIAFI



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

La Gráfica No. 2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los años 2022 al 2026, que para el año 2026 cuenta con un presupuesto vigente mayor a los años anteriores.

De acuerdo con la Gráfica No. 2 el presupuesto asignado al IHAH ha tenido un crecimiento exponencial desde 2023, con la ejecución de programas y proyectos de Inversión Pública. Esto refleja una clara priorización de la inversión en la conservación y promoción de los Bienes históricos y la conservación de sitos y documentos que realzan el patrimonio cultural de Honduras.

## D. PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### D.1 Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos

#### *D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026*

El proyecto contempló la restauración y rehabilitación de cinco (5) inmuebles de patrimonio (Museo Villa Roy, Casa Valle, Casa Fortín, Antigua Comandancia Santa Barbara y Fortaleza San Fernando) la investigación y consolidación de tres (3) sitios arqueológicos (Cerro Palenque, Comunidad Garífuna de Guadalupe, Centro Histórico Copan Ruinas) y los registros de nuevos asentamientos arqueológicos en dos (2) cuencas del país, incluye además siete (7) investigaciones históricas y etnohistóricas, así como la creación de un Sistema de Gestión Documental y el desarrollo de un plan Estratégico Institucional, este proyecto será implementado y ejecutado en nueve (9) departamentos del país, abarcando dieciséis (16) municipios.

El alcance del proyecto consistirá en la entrega de un estudio estructural y de presupuesto del inmueble Villa Roy; de cinco (5) inmuebles restaurados y rehabilitados; de doce (12) investigaciones arqueológicas, históricas y etnohistóricas y un Sistema de Información documental, con lo que se pretende que la población hondureña y los extranjeros que visitan estos monumentos restaurados y utilizados en ocasiones como museos o casas de época para el deleite de quienes los visitan, así mismo se beneficien del conocimiento de la existencia de nuevos asentamientos arqueológicos de los resultados de las investigaciones históricas y etnohistóricas a disposición del público y de un Sistema Información Documental implementado y constantemente actualizado.

El proyecto finalizó su ejecución física, el 27 de febrero de 2026 y que logró completar las siguientes actividades:

- Estudio Estructural y presupuesto, estabilización del terrero y restauración del inmueble del Museo Villa Roy, ubicado en Tegucigalpa.
- Restauración de la cubierta del inmueble de la Casa Valle, Choluteca, Choluteca.
- Restauración y rehabilitación de la Casa Fortín, ubicada en Yuscarán, El Paraíso.
- Restauración de la Antigua comandancia de la Fortaleza de Santa Bárbara, Trujillo.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Restauración y conservación del techo del museo de Comayagua, ubicado en Comayagua.
- Acceso inclusivo en la Fortaleza de San Fernando de Omoa.
- Instalación de dos (2) accesos inclusivos para la movilidad de sillas de ruedas y camillas en la Fortaleza de Santa Bárbara, ubicada en Trujillo.
- Desarrollo de cinco (5) investigaciones, Centro histórico de Siguatepeque, Investigación Antropológica en comunidad Garífuna de Guadalupe, Colon, Municipio de Copan Ruinas, Municipio de Omoa Cortes, Investigación Etnohistorica de San Andrés, La Unión, Copan.
- Gira de Presentación de investigación Etnohistorica de la Tribu Tolupán de Agalteca, Olanchito, Yoro.
- Se realizaron investigaciones en sitios Arqueológicos claves en el país.
- Investigación arqueológica en el sitio Cerro Palenque.
- Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.

### *D. 1. 2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026*

Evaluación Financiera III trimestre 2026

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos | FN-25617-1 | Lempiras | 31,707,186.00 | 01/04/2024 – 27/02/2026 |
| | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecutado (Devengado)** | **% Ejecución** |
| III Trimestre 2026 | 167,043.00 | 167,043.00 | 0.00 | 0.0% |
| Acumulado 2026 | 167,043.00 | 167,043.00 | 0.00 | 0.0% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 31,707,186.00 | 31,707,186.00 | 31,540,143.70 | 99.5% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## D.2 Proyecto “Construcción, promoción, conservación, fortalecimiento y valoración histórica de sitios Arqueológicos y bienes que conforman el Patrimonio Cultural en 13 departamentos de Honduras”

### *D.2.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026*

El proyecto tiene como objetivo mejorar la proyección, conservación, restauración y fortalecimiento del patrimonio cultural, promoviendo la habilitación de nuevos sitios arqueológicos, su valoración y transmisión a las futuras generaciones, a fin de fortalecer la identidad cultural y la memoria histórica de la población en trece (13) departamentos de Honduras.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Este proyecto tiene las siguientes metas físicas:

- Habilitación para la apertura al público 2 sitios arqueológicos de Cerro Palenque en Cortés y de Yarumela en la Paz.
- Instalación de una cerca perimetral, en el sitio Eco arqueológico Los Naranjos, Santa Cruz de Yoa, Cortés.
- Restauración de 83 bienes de patrimonio muebles en papel, cerámica, madera, pintura y escultura.
- Restauración del Muro en la Fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo.
- Preservación del Patrimonio Documental de un archivo etnohistórico y de 4 bibliotecas especializadas del IHAH.
- Actualización y socialización del inventario de bienes culturales muebles y religiosos en la zona Lenca de la Paz.
- Capacitación de 40 personas de las áreas técnico, legal y el recurso humano que interviene en la protección del patrimonio cultural de la nación en 5 municipios de Honduras; Copán Ruinas, Talgua, Trujillo, La Lima, y Tegucigalpa.
- 80 niños y jóvenes, capacitados en temas relacionados al Patrimonio Cultural; en las comunidades de Trujillo en Colón y Talgua en Catacamas, Olancho.
- Implementación de 9 talleres de asistencia técnica para fortalecimiento institucional del IHAH.
- Cuatro investigaciones etnohistóricas y antropológicas realizadas en 32 comunidades del país que es la zona de influencia del Proyecto.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el IHAH ha avanzado con la gestión para la contratación de procesos para iniciar con las obras de restauración, rehabilitación y habilitación de sitios arqueológicos, así como documentos e investigaciones.

Cuadro No. 2

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prog, | Ejec. | % Ejec. | Prog. | Ejec. | % Ejec. |
| Promocionado y revalorizado el patrimonio cultural en los diferentes sitios de patrimonio cultural de Honduras | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Asistencia Técnica para el fortalecimiento institucional del IHAH. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Avance para la instalación de exposiciones museográficas permanentes y exposiciones museográficas temporales, realizadas | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Elaboración de manuales técnicos para potenciar el recurso humano en el manejo del Patrimonio Cultural del país | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Elaboración de planes de manejo de los Sitios de Patrimonio del Parque Arqueológico Los Naranjos en Santa Cruz de Yojoa, Cortes y La Fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo, Colón. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Fortalecer la Unidad de Proyectos | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Investigaciones preminares históticas y antropológicas en 32 municipios del país | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

| Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prog, | Ejec. | % Ejec. | Prog. | Ejec. | % Ejec. |
| Porcentaje de Avance en la construcción de 156.56 mts2 para un centro interpretativo en el Sitio Arqueológico Cerro Palenque en Santiago, Pimienta, Cortés; considerando su conservación ambiental | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Preservado el Patrimonio Bibliográfico de las Bibliotecas Especializadas del IHAH, en Omoa, Comayagua, Copán y Tegucigalpa | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Preservado el Patrimonio Documental del Archivo Etnohitórico | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Restauración de bienes culturales muebles en Omoa, Copán, Comayagua y Tegucigalpa, apoyados de profesionales especializados en Madera, metal, papel, pintura y cerámica. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Supervisar obras físicas en los sitios arqueológicos de Yarumela, Cerro Palenque, Los Naranjos y en la Fortaleza de Santa Bárbara. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

Fuente: SIAFI

### *D.2.1 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026*

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Construcción, promoción, conservación, fortalecimiento y valoración histórica de sitios Arqueológicos y bienes que conforman el Patrimonio Cultural en 13 departamentos de Honduras al tercer trimestre de 2026:

**Ejecución Histórica del Proyecto**

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Construcción, promoción, conservación, fortalecimiento y valoración histórica de sitios Arqueológicos y bienes que conforman el Patrimonio Cultural en 13 departamentos de Honduras | FN-26073-1 | Lempiras | L 66,640,319.0 | 11/5/2026 - 11/2/2028 |
| | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecutado (Devengado)** | **% Ejecución** |
| III-Trimestre 2026 | 0.0 | 10,836,935.0 | 239,809.9 | 2.2% |
| Acumulado 2026 | 0.0 | 10,836,935.0 | 239,809.9 | 2.2% |
| Acumulado Vida del Proyecto ** | 66,640,319.0 | 66,640,319.0 | 239,809.9 | 0.3% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L 26.7183 por US$1.00



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL III TRIMESTRE 2026

Al cierre del tercer trimestre de 2026 las principales adquisiciones del Programa son las siguientes:

- Construcción del Centro de Visitantes y Senderos en el Sitio Arqueológico Cerro Palenque
- Restauración y limpieza de azulejos de Arturo López Rodezno.
- Contratación de Historiadores y Archivistas.
- Contratación de un administrador del sistema KOHA y Técnico en inventariado bibliográfico.
- Contratación para la elaboración de tres manuales del área de Recursos Humanos.

## F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se gestionó la incorporación de presupuesto para el proyecto "Construcción, promoción, conservación, fortalecimiento y valoración histórica de sitios Arqueológicos y bienes que conforman el Patrimonio Cultural en 13 departamentos de Honduras" por un monto de L10.8 millones. Este presupuesto permite iniciar las actividades preliminares del proyecto.

## G. CONCLUSIONES

- El proyecto presentó una excelente ejecución física y financiera, amparada en los entregables detallados en la Nota de Prioridad No. 25617-1-03-24 y dentro del plazo aprobado para este (27/02/2026), presentando una ejecución presupuestaria del 99.5% equivalente a L31.5 millones (acumulado).

- Al cierre del tercer trimestre, el IHAH deberá reprogramar su planificación física y presupuestaria, con el propósito de gestionar oportunamente el inicio de las obras de restauración, rehabilitación y construcciones en sitios arqueológicos del país.

## H. RECOMENDACIONES

- Se debe realizar una visita de campo a las obras realizadas para evaluar el impacto de estas en mejoramiento de los bienes históricos del país.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026**
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado III Trimestre | | | | Ejecutado Anual (Devengado) | | | | Compromiso Aprobado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Compromiso (Comp./Vig.) |
| **90** | **1. Inversión Productiva** | | **22,618,483** | **-** | **22,618,483** | **11,003,978** | **-** | **11,003,978** | **239,809** | **-** | **239,809** | **2.2%** | **239,809** | **-** | **239,809** | **2.2%** | **434,809** | **-** | **434,809** | **4.0%** |
| **2** | **0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia** | | **22,618,483** | **-** | **22,618,483** | **11,003,978** | **-** | **11,003,978** | **239,809** | **-** | **239,809** | **2.2%** | **239,809** | **-** | **239,809** | **2.2%** | **434,809** | **-** | **434,809** | **4.0%** |
| 1 | CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN, FORTALECIMIENTO Y VALORACIÓN HISTÓRICA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO CULTURAL EN 13 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS | FN-26073 | 22,451,440 | - | 22,451,440 | 10,836,935 | - | 10,836,935 | 239,809 | - | 239,809 | 2.2% | 239,809 | - | 239,809 | 2.2% | 434,809 | - | 434,809 | 4.0% |
| | **TOTAL - CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN, FORTALECIMIENTO Y VALORACIÓN HISTÓRICA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO CULTURAL EN 13 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS** | | **22,451,440** | **-** | **22,451,440** | **10,836,935** | **-** | **10,836,935** | **239,809** | **-** | **239,809** | **2.2%** | **239,809** | **-** | **239,809** | **2.2%** | **434,809** | **-** | **434,809** | **4.0%** |
| 2 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN,REHABILITACIÓN,ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLOGICOS | FN-25617-1 | 167,043 | - | 167,043 | 167,043 | - | 167,043 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | **TOTAL - FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN,REHABILITACIÓN,ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLOGICOS** | | **167,043** | **-** | **167,043** | **167,043** | **-** | **167,043** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** |
| | **2. Formación Bruta de Capital Fijo** | | **80,465,070** | **-** | **80,465,070** | **65,128,135** | **-** | **65,128,135** | **2,993,959** | **-** | **2,993,959** | **4.6%** | **6,968,270** | **-** | **6,968,270** | **10.7%** | **6,968,270** | **-** | **6,968,270** | **10.7%** |
| | **0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia** | | **80,465,070** | **-** | **80,465,070** | **65,128,135** | **-** | **65,128,135** | **2,993,959** | **-** | **2,993,959** | **4.6%** | **6,968,270** | **-** | **6,968,270** | **10.7%** | **6,968,270** | **-** | **6,968,270** | **10.7%** |
| | PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES. | | 80,465,070 | - | 80,465,070 | 65,128,135 | - | 65,128,135 | 2,993,959 | - | 2,993,959 | 4.6% | 6,968,270 | - | 6,968,270 | 10.7% | 6,968,270 | - | 6,968,270 | 10.7% |
| | **TOTAL - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.** | | **80,465,070** | **-** | **80,465,070** | **65,128,135** | **-** | **65,128,135** | **2,993,959** | **-** | **2,993,959** | **4.6%** | **6,968,270** | **-** | **6,968,270** | **10.7%** | **6,968,270** | **-** | **6,968,270** | **10.7%** |
| | **Total general** | | **103,083,553** | **-** | **103,083,553** | **76,132,113** | **-** | **76,132,113** | **3,233,768** | **-** | **3,233,768** | **4.2%** | **7,208,079** | **-** | **7,208,079** | **9.5%** | **7,403,079** | **-** | **7,403,079** | **9.7%** |

***Nota:*** SIAFI, 30/09/2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# ANEXO 2

**SECRETARÍA DE FINANZAS**
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| **Instituto Hondureño de Antropología e Historia** | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN, FORTALECIMIENTO Y VALORACIÓN HISTÓRICA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO CULTURAL EN 13 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS | Promocionado y revalorizado el patrimonio cultural en los diferentes sitios de patrimonio cultural de Honduras | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Asistencia Técnica para el fortalecimiento institucional del IHAH. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Avance para la instalación de exposiciones museográficas permanentes y exposiciones museográficas temporales, realizadas | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Elaboración de manuales técnicos para potenciar el recurso humano en el manejo del Patrimonio Cultural del país | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Elaboración de planes de manejo de los Sitios de Patrimonio del Parque Arqueológico Los Naranjos en Santa Cruz de Yojoa, Cortes y La Fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo, Colón. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Fortalecer la Unidad de Proyectos | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Investigaciones preminares históticas y antropológicas en 32 municipios del país | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Porcentaje de Avance en la construcción de 156.56 mts2 para un centro interpretativo en el Sitio Arqueológico Cerro Palenque en Santiago, Pimienta, Cortés; considerando su conservación ambiental | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Preservado el Patrimonio Bibliográfico de las Bibliotecas Especializadas del IHAH, en Omoa, Comayagua, Copán y Tegucigalpa | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Preservado el Patrimonio Documental del Archivo Etnohitórico | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Restauración de bienes culturales muebles en Omoa, Copán, Comayagua y Tegucigalpa, apoyados de profesionales especializados en Madera, metal, papel, pintura y cerámica. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Supervisar obras físicas en los sitios arqueológicos de Yarumela, Cerro Palenque, Los Naranjos y en la Fortaleza de Santa Bárbara. | INFORME | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
