SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Informe No. 0511-003-2026

Tegucigalpa, octubre de 2026

Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS 5
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre del 2026 5
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre del 2026 6
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026 6
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2026 7
G. CONCLUSIONES 8
H. RECOMENDACIONES 8
ANEXO 1 9
ANEXO 2 10

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), anteriormente denominada Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), fue fundada en 1969. Es una institución de educación superior autónoma especializada en la formación de profesionales en el área forestal, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**32,979,703**
Inversión Productiva	12,200,000
Formación Bruta de Capital	20,779,703
Presupuesto Vigente	**55,284,026**
Inversión Productiva	12,200,000
Formación Bruta de Capital	43,084,026
Ejecutado III Trimestre	**12,853,408**
Inversión Productiva	2,279,812
Formación Bruta de Capital	10,573,596
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**23.2%**
Ejecutado Anual	**15,178,278**
Inversión Productiva	2,485,394
Formación Bruta de Capital	12,692,884
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**27.5%**
Compromiso Aprobado	**15,178,278**
Inversión Productiva	2,485,394
Formación Bruta de Capital	12,692,884
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**27.5%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el presupuesto vigente del Programa de Inversión Pública ascendió a L55.28 millones, de los cuales se ejecutaron de forma acumulada L15.18 millones, equivalente al 27.5% del presupuesto vigente. La asignación presupuestaria se concentró principalmente en Formación Bruta de Capital, con L43.08 millones (77.9%), seguida de Inversión Productiva, con L12.20 millones (22.1%).

En cuanto al desempeño de la ejecución durante el tercer trimestre, esta alcanzó L12.85 millones, representando el 23.2% del presupuesto vigente. Asimismo, el compromiso presupuestario acumulado alcanzó L15.18 millones, correspondiente al 27.5% del presupuesto vigente, reflejando que los recursos comprometidos coinciden con el monto ejecutado acumulado al cierre del trimestre.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) financia sus programas y proyectos, al tercer trimestre del 2026, exclusivamente con recursos provenientes del Tesoro Nacional (Fuente 11). Su presupuesto vigente asciende a L55.3 millones, constituyéndose en la única fuente de financiamiento para la ejecución de las inversiones institucionales durante el período analizado.


AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado para la UNACIFOR durante el período 2022 - 2026:

- En 2022, el presupuesto vigente fue de L15.9 millones y se ejecutaron L2.7 millones, lo que representa el 16.9%. Se ejecutó el menor monto del periodo.
- En 2023, el presupuesto vigente subió a L38.6 millones y se ejecutaron L11.9 millones, alcanzando el 30.8%. Esto refleja una mejora respecto al año anterior, tanto en el monto ejecutado como en el porcentaje de ejecución.
- En 2024, el presupuesto vigente aumentó a L61.9 millones, pero la ejecución bajó a L8.2 millones, equivalente al 13.2%. Esto muestra una disminución en la ejecución de los recursos, a pesar de contar con un presupuesto mayor que el año anterior.
- En 2025, el presupuesto vigente llegó a L78.2 millones y se ejecutaron L44.1 millones, lo que representa el 56.4%. Este fue el porcentaje de ejecución más alto del período, mostrando un mayor avance en el uso de los recursos destinados a la inversión pública.
- Al cierre del tercer trimestre de 2026, el presupuesto vigente fue de L55.3 millones y la ejecución acumulada alcanzó L15.2 millones, equivalente al 27.5%. Este porcentaje es menor al de 2025, pero el año fiscal aún no ha terminado, por lo que queda el último trimestre para aumentar la ejecución presupuestaria.

Gráfico No. 01
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0511 - Universidad de Ciencias Forestales
Cifras en millones de Lempiras

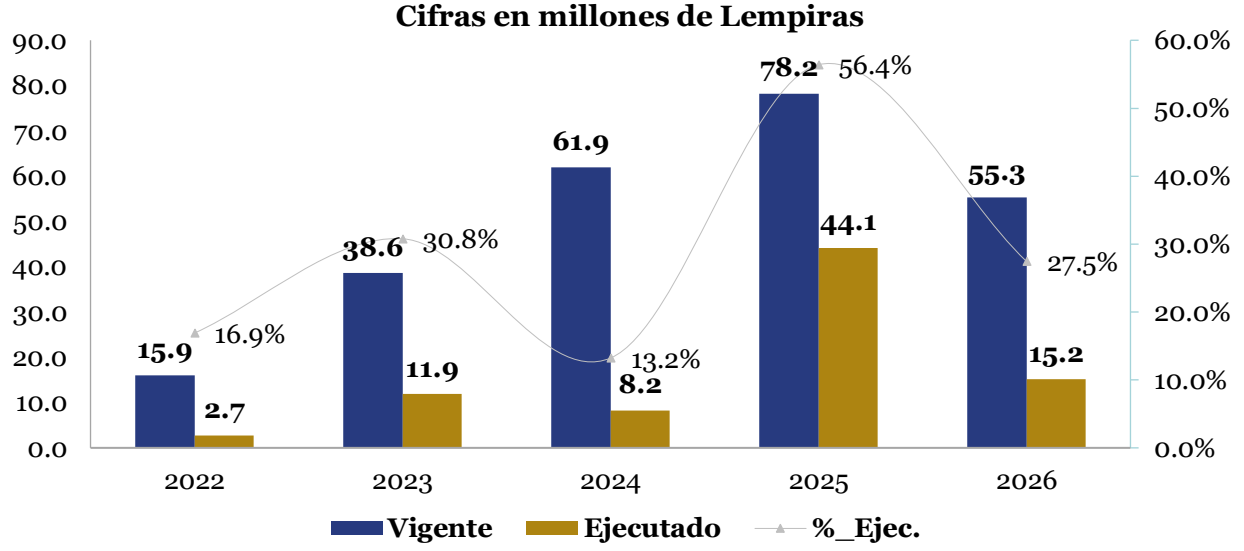

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva al tercer trimestre del 2026 se concentra en el proyecto de ***Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales***.

El objetivo general del proyecto es mejorar la infraestructura física del campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios académicos, estudiantiles y administrativos, mediante la remodelación, ampliación y construcción de obras que contribuyan a brindar espacios seguros, modernos y funcionales para la comunidad universitaria.

Entre los beneficios, se incluyen:

1. Mejora de la infraestructura académica: Remodelación de tres edificios institucionales y ampliación de un laboratorio de cómputo para ofrecer espacios adecuados para la enseñanza, la investigación y el aprendizaje.
2. Fortalecimiento de los servicios estudiantiles: Construcción de una clínica estudiantil que permitirá mejorar el acceso a servicios de atención médica para estudiantes, docentes y personal administrativo.
3. Optimización del acceso y funcionamiento del campus: Construcción de un pórtico principal de acceso sobre la carretera CA-5, facilitando el ingreso y la salida de la comunidad universitaria, así como mejorando la seguridad y el orden en las instalaciones.

Como resultado, el proyecto contempla la remodelación de la Cabaña 21, el Edificio de Enseñanza e Investigación y el Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA), incluyendo mejoras en la estructura de techos, sistemas eléctricos e hidrosanitarios y acabados; además de la ampliación de un laboratorio de cómputo y la construcción de una clínica estudiantil y un nuevo acceso principal al campus.

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre del 2026

Al cierre del tercer trimestre del 2026, el proyecto registra avances físicos, que corresponden principalmente a la planificación operativa, coordinación interinstitucional y desarrollo de acciones preparatorias orientadas a la implementación de las actividades contempladas en el programa, sentando las bases para su ejecución en los siguientes trimestres del año.

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III trimestre 2026		
			Prog.	Ejec.	% Ejecución	Programación	Ejecución	Prog. Ejecución
0511 - Universidad de Ciencias Forestales								
Construcción, ampliación y remodelación de	Ampliación y Remodelación de la Clínica Estudiantil	Obra	100%	100%	100%	100%	9.9%	9.9%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III trimestre 2026		
			Prog.	Ejec.	% Ejecución	Programación	Ejecución	Prog. Ejecución
obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	Ampliación y Remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA)	Obra	100%	60%	60%	100%	15.0%	15%
	Remodelación de la Cabaña No. 21	Obra	0	0	0%	0	0	0%
	Restauración del Laboratorio de Computación	Obra	0	0	0%	0	0	0%
	Remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación	Obra	0	0	0%	0	0	0%
	Construcción del pórtico de acceso por la CA-5	Obra	0	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Obras Civiles, UNACIFOR, Informe de Seguimiento de Avance de Proyectos de Inversión, III Trimestre 2026.

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre del 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica de la Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR al tercer trimestre del 2026:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR	FN-25715	US$	$1,310,790.11	20/6/2024 - 31/10/2026
		Lempiras	L35,251,996.0	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	12,200,000	12,200,000	2,279,812	18.7%
Acumulado 2026	12,200,000	12,200,000	2,485,394	20.4%
Acumulado Vida del Proyecto*	35,251,996.0	35,251,996.0	35,251,996.0	100.0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026

Durante el III trimestre de 2026, no se suscribieron nuevos contratos relacionados con obras, bienes, servicios, suministros o supervisión. Se mantuvieron los contratos formalizados en

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

períodos anteriores para la ejecución de las obras de infraestructura del campus central de la UNACIFOR.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

A continuación, se detallan las gestiones realizadas por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- La Unidad Ejecutora remitió a la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) la programación de ejecución correspondiente al III Trimestre de 2026, como parte del seguimiento a la planificación y ejecución del proyecto.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2026

Durante el III trimestre de 2026, la ejecución del proyecto presentó avances en las obras de infraestructura del campus central. A pesar de ello, algunas actividades continuaban pendientes de finalizar, por lo que se requiere mantener el seguimiento técnico y financiero para completar los trabajos programados.

Problemática identificada

- Obras pendientes de finalización: Al cierre del trimestre, el edificio DIFA registró un avance físico acumulado del 70.00%, mientras que la construcción del pórtico de acceso por la carretera CA-5 no reportó avance durante el trimestre. Estas actividades requieren seguimiento para determinar su avance y asegurar la continuidad de los trabajos pendientes.
- Revisión de ofertas y procesos de contratación: El informe señala que la remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación se encontraba en proceso de revisión de las ofertas recibidas. Esta situación requiere seguimiento administrativo para conocer el estado del proceso y las acciones necesarias para continuar con la intervención.
- Cumplimiento del plazo del proyecto: El informe establece como fecha de cierre del proyecto el 31 de octubre de 2026, conforme a la ampliación de plazo aprobada. A la vez, la programación presupuestaria incluye recursos para octubre, noviembre y diciembre, por lo que es necesario verificar la correspondencia entre la programación financiera y el plazo autorizado.

Acciones Ejecutadas Durante el Trimestre

- Seguimiento a las obras de infraestructura: Se continuó con la ejecución y supervisión de las obras contratadas, alcanzando un avance físico acumulado del 94.00% en el componente de infraestructura del campus central.
- Control de la ejecución financiera: Se dio seguimiento a los recursos destinados al proyecto, registrándose una ejecución de fondos de L5,580,756.41 durante el III trimestre y un acumulado financiero de L27,238,720.38 para los años 2025 y 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Programación presupuestaria para los meses siguientes: Se establecieron montos de ejecución para octubre, noviembre y diciembre de 2026, con el fin de dar seguimiento a los recursos previstos para las obras. Es necesario verificar que esta programación se ajuste al plazo de ejecución autorizado y a las actividades que aún se encuentran pendientes.

G. CONCLUSIONES

- Al cierre del III trimestre de 2026, la UNACIFOR registra un presupuesto vigente de L55.28 millones y una ejecución financiera acumulada de L15.18 millones, equivalente al 27.5% del presupuesto vigente. La ejecución durante el trimestre fue de L12.85 millones.
- El proyecto de infraestructura del campus central reporta un avance físico acumulado del 94.00%. La Clínica Estudiantil, la Cabaña No. 21, el Laboratorio de Computación y el Edificio de Enseñanza e Investigación registran un avance del 100%, mientras que el edificio DIFA alcanza el 70.00% y el pórtico de acceso por la CA-5 permanece pendiente de ejecución.
- La institución mantiene obras pendientes y una programación presupuestaria para los últimos meses de 2026. Se requiere dar seguimiento a estas actividades para completar los trabajos y verificar su correspondencia con el plazo de cierre autorizado del proyecto.

H. RECOMENDACIONES

- Fortalecer el seguimiento técnico y administrativo de las obras pendientes, especialmente la ampliación y remodelación del edificio DIFA y la construcción del pórtico de acceso por la CA-5, para conocer su situación y definir las acciones necesarias para su finalización.
- Dar seguimiento a la programación financiera de octubre, noviembre y diciembre de 2026, verificando la disponibilidad de recursos y su correspondencia con el plazo de ejecución autorizado.
- Mantener actualizado el registro de los avances físicos y financieros del proyecto, verificando la información reportada por la unidad ejecutora y dando seguimiento a las actividades pendientes para asegurar el cumplimiento de las metas de inversión pública.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total General	Fondos Nacionales	Total General	Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	**1. Inversión Productiva**		**12,200,000**	**12,200,000**	**12,200,000**	**12,200,000**	**2,279,812**	**2,279,812**	**18.7%**	**2,485,394**	**2,485,394**	**20.4%**
1	**0511 - Universidad de Ciencias Forestales**		**12,200,000**	**12,200,000**	**12,200,000**	**12,200,000**	**2,279,812**	**2,279,812**	**18.7%**	**2,485,394**	**2,485,394**	**20.4%**
1	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	2,279,812	2,279,812	18.7%	2,485,394	2,485,394	20.4%
	TOTAL - Construcción, ampliación y remodelación de o		**12,200,000**	**12,200,000**	**12,200,000**	**12,200,000**	**2,279,812**	**2,279,812**	**18.7%**	**2,485,394**	**2,485,394**	**20.4%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		**20,779,703**	**20,779,703**	**43,084,026**	**43,084,026**	**10,573,596**	**10,573,596**	**24.5%**	**12,692,884**	**12,692,884**	**29.5%**
	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		**20,779,703**	**20,779,703**	**43,084,026**	**43,084,026**	**10,573,596**	**10,573,596**	**24.5%**	**12,692,884**	**12,692,884**	**29.5%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		2,800,000	2,800,000	5,100,000	5,100,000	903,529	903,529	17.7%	1,642,359	1,642,359	32.2%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**2,800,000**	**2,800,000**	**5,100,000**	**5,100,000**	**903,529**	**903,529**	**17.7%**	**1,642,359**	**1,642,359**	**32.2%**
	FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA		14,679,703	14,679,703	34,684,026	34,684,026	8,777,679	8,777,679	25.3%	9,628,809	9,628,809	27.8%
	TOTAL - FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA		**14,679,703**	**14,679,703**	**34,684,026**	**34,684,026**	**8,777,679**	**8,777,679**	**25.3%**	**9,628,809**	**9,628,809**	**27.8%**
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		850,000	850,000	850,000	850,000	274,963	274,963	32.3%	466,068	466,068	54.8%
	TOTAL - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		**850,000**	**850,000**	**850,000**	**850,000**	**274,963**	**274,963**	**32.3%**	**466,068**	**466,068**	**54.8%**
	VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	617,424	617,424	25.2%	955,648	955,648	39.0%
	TOTAL - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		**2,450,000**	**2,450,000**	**2,450,000**	**2,450,000**	**617,424**	**617,424**	**25.2%**	**955,648**	**955,648**	**39.0%**
	Total general		**32,979,703**	**32,979,703**	**55,284,026**	**55,284,026**	**12,853,408**	**12,853,408**	**23.2%**	**15,178,278**	**15,178,278**	**27.5%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0511 - Universidad de Ciencias Forestales								
Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	Ampliación y Remodelación de la Clínica Estudiantil	Obra	100%	100%	100%	100%	9.9%	9.9%
	Ampliación y Remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA)	Obra	100%	60%	60%	100%	15.0%	15%
	Remodelación de la Cabaña No. 21	Obra	0	0	0%	0	0	0%
	Restauración del Laboratorio de Computación	Obra	0	0	0%	0	0	0%
	Remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación	Obra	0	0	0%	0	0	0%
	Construcción del pórtico de acceso por la CA-5	Obra	0	0	0%	0	0	0%

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
