SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

# PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

# Secretaría de Salud (SESAL)

**Informe No. 0060-003-2026**

**Tegucigalpa, Octubre 2026**

# Contenido

Contenido ..... 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN ..... 4
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ..... 4
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ..... 6
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) ..... 7
D. PRINCIPALES PROYECTOS ..... 8
D.1 Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH): ..... 8
D.1.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 ..... 9
D.1.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 ..... 10
D.1.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 ..... 10
D.2 Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras ..... 11
D.2.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 ..... 11
D.2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 ..... 13
D.2.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 ..... 13
D.3 Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO): ..... 14
D.3.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 ..... 14
D.3.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 ..... 15
D.3.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 ..... 16
D.4 Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE): ..... 16
D.4.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 ..... 16
D.4.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 ..... 18
D.4.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026 ..... 18
E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL ..... 18
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN ..... 19



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 ..... 20
H. CONCLUSIONES ..... 20
I. RECOMENDACIONES ..... 21
ANEXO 1 ..... 22
ANEXO 2 ..... 23



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

## A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la institución responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector Salud; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01
**Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026**
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|---|
| **Presupuesto Aprobado** | **2,868,391,243.0** |
| Inversión Productiva | 1,484,419,912.0 |
| Formación Bruta de Capital | 1,383,971,331.0 |
| **Presupuesto Vigente** | **1,836,144,340.0** |
| Inversión Productiva | 1,484,459,912.0 |
| Formación Bruta de Capital | 351,684,428.0 |
| **Ejecutado III Trimestre** | **429,068,116.8** |
| Inversión Productiva | 361,448,840.5 |
| Formación Bruta de Capital | 67,619,276.3 |
| **% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)** | **23.4%** |
| **Ejecutado Anual** | **745,218,462.8** |
| Inversión Productiva | 664,515,684.3 |
| Formación Bruta de Capital | 80,702,778.4 |
| **% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)** | **40.6%** |
| **Compromiso Aprobado** | **936,211,136.8** |
| Inversión Productiva | 843,424,880.6 |
| Formación Bruta de Capital | 92,786,256.2 |
| **% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)** | **51.0%** |

***Nota:*** SIAFI, 30/09/2026

El Plan de Gobierno "*Juntos vamos a estar bien* (2026-2030)", con la perspectiva que, creando sinergias entre la política pública y la política social, bien conducidas y ejecutadas pueden generar trabajo y cohesión social, prevenir y resolver conflictividad social, facilitar la gestión democrática y respeto a la Ley, bajo el principio de legalidad en un Estado de Derecho. Se prioriza particularmente dentro de este la "*Política de Salud*" principalmente orientada a la Reducción de la mora quirúrgica, Garantizar disponibilidad de medicamentos, Mejorar atención de accidentes viales, Regionalización de enfermedades crónicas y la Ampliación de infraestructura sanitaria.

Respecto a la **Inversión Pública,** para el año 2026 la Secretaría de Salud cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional por L2,868.4 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Proyectos de Inversión Pública (Inversión Productiva y Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

Al término del tercer trimestre, el presupuesto vigente total asignado se registró en L1,836.1 millones, de los cuales las asignaciones para la **Formación Bruta de Capital** (Bienes Capitalizables) se identifican en los Programas para la provisión de servicios de salud del Primer Nivel de atención (centros de salud, Unidades de Atención Primaria en Salud- UAPS y los Centros Integrales de Salud- CIS); Provisión de servicios de salud del Tercer Nivel de atención (servicios hospitalarios) y la rectoría de salud. Dicha inversión se registra en L351.6 millones y de lo cual se ejecutó L67.6 millones a nivel de devengado y L92.7 millones registrados en compromisos al término del trimestre.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

En consecuencia, la **Inversión Productiva** contó con una asignación vigente de L1,484.0 millones, para la ejecución de 77 proyectos de inversión pública, de los cuales se destaca la prioridad en la infraestructura hospitalaria. Al tercer trimestre del año 2026 se reportó una ejecución de L664.5 millones a nivel de devengado, con una ejecución de L361.45 millones durante el trimestre, y L843.4 millones a nivel de compromisos, con relación al presupuesto vigente asignado.

En su conjunto la inversión pública para la SESAL registró una ejecución presupuestaria de L429.2 millones (23.4%) a nivel de devengado para el tercer trimestre y acumulado en el año L745.2 millones (40.6%) y L936.2 millones (51%) a nivel compromisos en relación con el Presupuesto Vigente asignado, principalmente con orientación al **Sector Salud**. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.




AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Inversión Pública de la SESAL presenta un presupuesto vigente financiado con **Fondos Nacionales** por **L305.9 millones**, de los cuales se ejecutaron **L80.5 millones**, equivalentes al **26.3%**; con recursos de **Crédito Externo** por **L1,364.5 millones**, con una ejecución de **L590.7 millones**, que representa el **43.3%**; y con **Donaciones Externas** por **L165.8 millones**, de los cuales se ejecutaron **L74.0 millones**, equivalentes al **44.6%**. Estos resultados se representan en el Gráfico No. 01.

**Gráfico No. 01**
**Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente**
**Cifras en Millones de Lempiras**

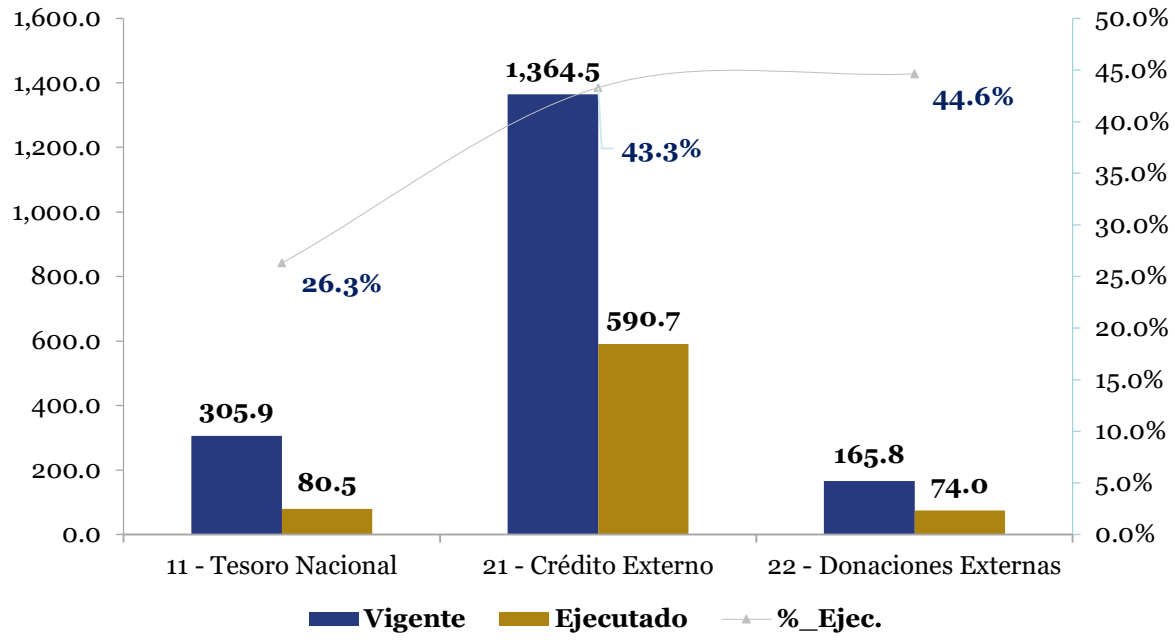


**Fuente: SIAFI**




AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

En el período comprendido de 2022 a 2026, la Inversión Pública de la SESAL presentó asignaciones presupuestarias anuales de **L1,068.7 millones** en 2022, **L2,835.0 millones** en 2023, **L2,186.2 millones** en 2024, **L3,145.5 millones** en 2025 y **L1,836.1 millones** en 2026. La ejecución correspondiente fue de **L305.7 millones**, **L336.4 millones**, **L730.1 millones**, **L1,151.5 millones** y **L745.2 millones**, respectivamente.

Durante dicho período, la SESAL contó con asignaciones presupuestarias acumuladas por **L11,071.5 millones** y una ejecución total de **L3,268.9 millones**. Los porcentajes de ejecución anual fueron de **28.6%** en 2022, **11.9%** en 2023, **33.4%** en 2024, **36.6%** en 2025 y **40.6%** en 2026, observándose en este último año el nivel porcentual más alto del período.

**Grafica N.2**

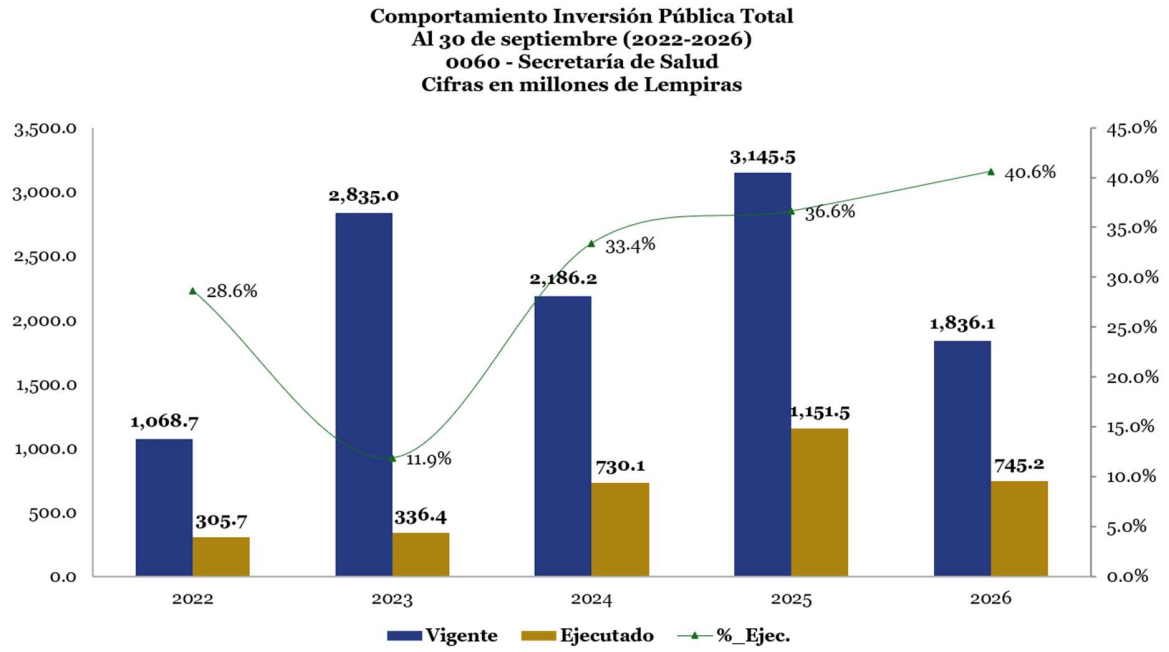


**Fuente:** SIAFI



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva para el año 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras | BCIE-2329 |
| 2 | Programa de Construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras | BID 5790/BL-HO |
| 3 | Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2) | BID 4713/BL-HO |
| 4 | Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE) | IDA 7142-HN<br>TF0B8564-HN<br>TF0C1861 |
| 5 | Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán. | Acuerdo Donación No 1660400 |
| 6 | Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3) | BID 5008/BL-HO |

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### D.1 Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH):

Tiene como propósito incrementar la cobertura en la atención de los servicios de salud a nivel hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca y Tocoa, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

### *D.1.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026*

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Meta Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programa-ción | Ejecución | % Ejecución | Programa-ción | Ejecución | % Ejecución |
| Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca. | Informe de obra | 21 | 8 | 38% | 6 | 5 | 83% |
| Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa | Informe de obra | 19 | 6 | 32% | 6 | 3 | 50% |
| Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales, | Taller de socialización | 17 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |
| Realizada la gestión de gastos administración del proyecto | Informe | 75 | 64 | 85% | 18 | 24 | 133% |

***Fuente:*** SESAL-PARH al 30/09/2026

Para el tercer trimestre 2026, la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:

- Hospital Regional del Sur en Choluteca:
  - ✓ Etapa (1) Preinversión: avance físico 100%, avance financiero 95% (US$1,128,614.07); fecha de fin prevista 29 septiembre de 2025.
  - ✓ Etapa (2) Construcción: avance físico 64.83%, avance financiero 62.90% (US$17,151,269.05); fecha de fin prevista 12 agosto de 2026.
  - ✓ Etapa (3) Equipamiento: avance físico 13.79%, avance financiero 9.45% (US$2,162,245.49); fecha de fin prevista 12 agosto 2026.
- Hospital San Isidro en Tocoa:
  - ✓ Etapa (1) Preinversión: avance físico 100%, avance financiero 95% (US$3,504,173.42); fecha de fin prevista 26 agosto de 2025.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- ✓ Etapa (2) Construcción: avance físico 25.67%, avance financiero 36.63% (US$15,180,392.20); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.
- ✓ Etapa (3) Equipamiento: avance físico 12.94%, avance financiero 20% (US$2,743,285.34); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.

### *D.1.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026*

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa al tercer trimestre 2026:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras | BCIE-2329 | US$ | 135,000,000 | 30/07/2024 01/08/2028 |
| | | Lempiras | 3,606,970,500 | |

| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| III Trimestre 2026 | 603,286,840 | 603,286,840 | 121,661,720.58 | 23.5% |
| Acumulado 2026 | 603,286,840 | 603,286,840 | 261,219,538.44 | 43.3% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 3,606,970,500 | 3,606,970,500 | 1,373,144,233 | 38% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

### *D.1.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026*

Al término del tercer trimestre, se mantienen en ejecución los contratos suscritos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 son los siguientes:

- Coordinación General, Contrato UEP-PARH-001-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista financiero, Contrato UEP-PARH-002-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista en adquisiciones, Contrato UEP-PARH-003-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista ambiental Social, Contrato UEP-PARH-004-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista biomédico, Contrato UEP-PARH-005-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Asistente administrativo, Contrato UEP-PARH-006-2026-SS (adjudicado 02/03/2026).



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## D.2 Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras

Mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán se mejorará la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).

### *D.2.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026*

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Meta Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán | Informe técnico | 15 | 17 | 113% | 8 | 8 | 100% |
| Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa | Informe técnico | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula | Informe técnico | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Desarrollo de competencias clínicas y gestión hospitalaria | Informe | 55 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |
| Fortalecimiento de la integración y gestión de redes de servicios priorizadas | Informe | 7 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2026 | Informe | 158 | 133 | 84% | 52 | 52 | 100% |

***Fuente:*** SESAL-GESALUD al 30/09/2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 9% y financiero de 9.7%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).

Así mismo al término de septiembre de los corrientes, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), reporta para la **Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán**, avance físico (obra) del 47.59% y supervisión en 100%, indicando las siguientes actividades en ejecución:

- Colocación de columnas metálicas Puente Técnico Actuación 100%
- Demolición de elementos de concreto o block para el reforzamiento del Edificio Existente.
- Corrección de refuerzo de vigas y columnas del Edificio Existente. Construcción de aplanado fino en sótano del Edificio Existente.
- Actuación 2 Construcción de enchape de azulejo blanco en Actuación 2. Construcción de Repello grueso en muros de block Actuación 5.
- Colocación de tubería de cobre de diferentes diámetros para instalación agua fría/caliente en el Edificio Existente nivel 2.
- Colocación de ducteria de lámina galvanizada para el sistema HVAC Actuación 2 nivel 2.

En cuanto a la Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma San Pedro Sula), Publicada Proceso de Licitación de la Construcción del Hospital de Trauma de SPS a partir del 30 de Julio hasta el 13 de octubre 2026 en proceso preparación de licitación de la Supervisión del Hospital de Trauma de SPS.

En relación con el Convenio de Becas entre SESAL y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se Suscribió formalmente el convenio de becas SESAL BID orientado a financiar médicos especialistas en áreas estratégicas se avanza con la UNAM en el proceso formal de admisión y médicos postulantes.

Se inició la elaboración de la *Hoja de Ruta* para la Reconfiguración de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Islas de la Bahia y la puesta en marcha de apertura del Hospital de Roatán, lo que conllevo a hacer ajustes en PEP para incorporar actividades e identificación de financiamiento para su ejecución.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

### *D.2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026*

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras registrada al tercer trimestre del 2026:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras | BID 5790/BL-HO | US$ | 230,163,200 | 15/04/2024 15/05/2030 |
| | | Lempiras | 6,149,569,427 | |
| | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecutado (Devengado)** | **% Ejecución** |
| III Trimestre 2026 | 575,566,138 | 331,636,892 | 77,912,130.87 | 23.5% |
| Acumulado 2026 | 575,566,138 | 331,636,892 | 163,450,114 | 49.3% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 6,149,569,427 | 6,149,569,427 | 594,633,453 | 9.7% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

### *D.2.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026*

En cuanto a los contratos reportados por GESALUD, bajo el Contrato BID 5790/BL-HO (*trascendieron período de Gobierno*) se encuentra en ejecución:

- Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán (EDUCTRADE).
- Supervisión para la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán (TASH)
- Auditoría de Estados financieros de Propósito Especial (BID/JICA).
- Servicios profesionales GESALUD (21 contratos).
- Consultorías de apoyo a la UTINH (7 contratos: Especialista Biomédico, Arquitecto, Especialista ambiental y social, Especialista en Ingeniería Mecánica, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico) y fortalecimiento (adquisición de equipo informático).
- Consultoría Individual Miembro del "Dispute Board" para el Contrato de Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## D.3 Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO):

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021, se autorizó a la SEFIN a realizar las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el BID aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Préstamo No. 4713/BL-HO, de fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

### *D.3.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026*

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Progra-mación | Ejecución | % Ejecución | Progra-mación | Ejecución | % Ejecución |
| Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL | Informe | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Adquiridos generadores eléctricos para para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Aníbal Murillo | Equipo | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales | Equipo | 601 | 596 | 99% | 5 | 0 | 0% |
| Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2026 | Informe | 80 | 10 | 13% | 18 | 19 | 106% |

***Fuente:*** SESAL-GESALUD al 30/09/2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Al tercer trimestre del 2026, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico del 90% y financiero del 87.8%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):

- En cuanto al Proceso de Adecuación del Centro de Datos de la SESAL, se tomó la decisión de no realizar esta actividad, reasignando el financiamiento para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria que consiste en la adquisición y reparación de equipo médico y no medico priorizado por la SESAL para beneficiar 4 hospitales del país (Hospital Escuela, Hospital Mario Catarino Rivas, Hospital del Tórax) en pro de contribuir a la mora quirúrgica.
- En la Adquisición de Generadores Eléctricos para 5 hospitales se presentó el Informe del Proceso en no objeción en el BID.
- En relación del Reemplazo de la Sub-Estación Eléctrica del Bloque Médico Quirúrgico del Hospital Escuela, se realizó el pago de estimaciones de obra correspondientes a la subestación eléctrica del Hospital Escuela.
- Asimismo, en las Gestiones administrativas, se realizó el pago de honorarios a consultores para la UTGP, UTINH, UGI; gestión y pago de viáticos a diferentes Regiones con el propósito de realizar entrega de equipo no médico salas neonatales hospitales priorizados, supervisión obras roatán y avances Hospital Traumas de San Pedro Sula; así mismo, la inspección de bodegas donde se almacena el equipo médico del Hospital de Roatán en San Pedro Sula.

### *D.3.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026*

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) registrada al tercer trimestre 2026:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) | BID 4713/BL-HO | US$ | 53,820,000 | 01/10/2021 31/03/2027 |
| | | Lempiras | 1,437,978,906 | |
| | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecutado (Devengado)** | **% Ejecución** |
| III Trimestre 2026 | 85,720,918 | 216,045,554 | 21,537,897.18 | 10.4% |
| Acumulado 2026 | 85,720,918 | 216,045,554 | 33,374,513.51 | 16.1% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 1,437,978,906 | 1,437,978,906 | 1,204,782,318 | 87% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

### *D.3.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026*

En cuanto a los contratos reportados por GESALUD, bajo el Contrato BID 4713/BL-HO (*trascendieron período de Gobierno*) se encuentra en ejecución:

- Adquisición de generadores eléctricos para para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Aníbal Murillo.
- Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales.
- Contratación de servicio de catering.
- Taller de Elaboración para la evaluación de medio término de la gestión 2026 y Taller de la Planificación para la Gestión 2027.

## D.4 Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE):

Con el propósito de mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias, fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias y en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder de manera rápida y efectiva a la misma.

### *D.4.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026*

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Meta Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional | Informe | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional | Informe | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto | Informe | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI) | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes. | Taller | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Meta Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional (GAVI) | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional (GAVI) | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (GAVI) | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

***Fuente:*** SESAL-PROSALH al 30/09/2026

Durante el tercer trimestre de 2026, el Proyecto RESHAPE registró avances relevantes en el fortalecimiento de los servicios de salud, la infraestructura sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la transformación digital del sistema de vacunación en Honduras.

- En el Componente 1, orientado al fortalecimiento de los servicios de salud, se completó el 100 % del diagnóstico de infraestructura y equipamiento de los 36 Servicios Materno-Infantiles (SMI) priorizados, así como el 100 % de las propuestas de diseño previstas, con 34 propuestas aprobadas. Asimismo, se avanzó en la elaboración de los planos y anteproyectos de diseño de los establecimientos restantes. En materia de vacunación, continuó la implementación de la estrategia nacional dirigida a niños cero dosis y parcialmente vacunados, incluyendo gestiones para la contratación de al menos 300 recursos humanos. También se formalizó el contrato con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para brindar asistencia técnica destinada a mejorar la calidad y el acceso de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva.
- En el Componente 2, relacionado con el fortalecimiento de la vigilancia y los sistemas de información en salud, se avanzó en el diseño de rehabilitación de 22 laboratorios regionales y en la formulación de una estrategia para fortalecer el sistema de laboratorios y la vigilancia epidemiológica. Destaca la expansión del Sistema Nacional de Vacunación (SNV), con capacitación en 295 de los 298 municipios del país y una implementación aproximada del 90 % en los establecimientos capacitados. Adicionalmente, se entregaron más de 2,400 dispositivos móviles con conectividad por 24 meses y se implementaron herramientas digitales, como el Tablero Nacional de Monitoreo de Vacunación y el Carnet Digital de Vacunación, para mejorar el registro, seguimiento y análisis de la información.
- En cuanto a la gestión ambiental y social, se actualizaron instrumentos y procedimientos para fortalecer la prevención de riesgos y el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial. Asimismo, se revisaron y aprobaron informes de cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad ocupacional correspondientes a obras de preinstalación de sistemas UPS en tres hospitales: Puerto Cortés, Básico San Marcos y Tela



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Integrado. También se dio seguimiento a las consultorías de infraestructura sanitaria y se aprobaron los informes mensuales de los 20 supervisores regionales de vacunación.

- En términos generales, los avances físicos reflejan progresos importantes en la preparación de diseños de infraestructura, la expansión de la cobertura operativa del sistema digital de vacunación y el fortalecimiento de los mecanismos de gestión ambiental y social. No obstante, permanecen actividades en proceso que requieren seguimiento, particularmente la finalización de los planos y expedientes de los SMI, la implementación integral del SNV en los establecimientos pendientes, el desarrollo de los diseños de rehabilitación de laboratorios y la ejecución de las intervenciones de salud sexual y reproductiva previstas en el contrato con UNFPA.

### *D.4.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026*

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE) registrados al tercer trimestre 2026:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE) | IDA 7142-HN TF0C1861 TF0B8564-HN | US$ | 69,000,000 | 15/03/2024 15/03/2029 |
| | | Lempiras | 1,843,562,700 | |
| | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecutado (Devengado)** | **% Ejecución** |
| III Trimestre 2026 | 192,144,171 | 282,144,171 | 124,367,491.42 | 44.1% |
| Acumulado 2026 | 192,144,171 | 282,144,171 | 181,590,838.06 | 64.4% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 1,843,562,700 | 1,843,562,700 | 350,475,414.1 | 19% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

### *D.4.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026*

Por su parte PROSALH, reporta 16 contratos suscritos, los que se detallan a continuación:

- Diagnóstico y Diseño de la Infraestructura de 36 Servicios Materno-Infantiles (SMI): 10 %
- Asistencia técnica para la planificación y fortalecimiento de la Red de Laboratorios y Vigilancia Epidemiológica de la SESAL: 87 %
- Compra y preinstalación de autoclaves a vapor para la red de servicios de la SESAL: 48 %
- Estudio y diseño de 19 laboratorios regionales, 3 laboratorios de biología molecular y el Laboratorio Nacional de Virología: 50 %
- Asistencias técnicas y consultorías (4 ingenieros de infraestructura, 1 especialista en vacunación y 1 coordinador nacional de vacunas): 69 %



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Actualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV): 54 %
- Contratación de empresa para el transporte de personal para las jornadas de vacunación a nivel nacional: 63 %
- Recurso humano UGI (16 facilitadores UGI, 2 administradores de base de datos y 2 administradores de calidad): 69 %
- Recurso humano PAI (3 oficiales administrativos y logísticos, 20 supervisoras PAI): 68 %
- Recurso humano PAI (330 vacunadoras): 43 %
- Contratación de asistencia técnica a través del UNFPA para mejorar la calidad y el acceso de los adolescentes a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR): 0 %

## E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

Al tercer trimestre, la SESAL cuenta con L351.6 millones asignados para Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) de los cuales al término del trimestre registró una ejecución de L80.7 millones a nivel de devengado y L92.7 millones en comprometido.

Bajo este esquema, se destacan las intervenciones para la provisión de servicios de salud del Primer Nivel de atención (centros de salud, Unidades de Atención Primaria en Salud- UAPS y los Centros Integrales de Salud- CIS); Provisión de servicios de salud del Tercer Nivel de atención (servicios hospitalarios) y la rectoría de salud.

## F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Gestión para aprobación de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de la programación considerada por las Unidades ejecutoras de Proyectos para el 2026.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se emitió Dictamen Técnico No.0052-2026 para la Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes al Proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

Al tercer trimestre se mantienen a la espera la ratificación de los contratos que trascendieron período de Gobierno por parte del Congreso Nacional correspondientes al financiamiento BID; implicando en muchos de los casos, que la información presentada a finales del año 2025 como parte del procedimiento establecido, generó pérdida de expedientes en las diferentes instancias internas y externas provocando que las unidades ejecutoras tuvieran que iniciar las gestiones de nuevo. Para el caso, al término del tercer trimestre, las diferentes unidades ejecutoras de proyectos de la SESAL no cuentan con la ratificación de contratos por el Congreso Nacional.

En adición a estas acciones, se presentó el problema de registro de contratos por servicios profesionales en SIREP, hasta contar con la ratificación de los contratos bajo los cuales se han generados dichos servicios.

En cuanto a los procesos relacionados con la construcción y equipamiento de hospitales de traumatología en San Pedro Sula, se espera adjudicar contrato en primer trimestre 2027.

Se reporta desfase de los contratistas adjudicados de los proyectos “Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca” y “Diseño, Construcción, Equipamiento y puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro de Tocoa, Honduras” en el avance de obras mostrando dificultades para cumplir las metas previstas debido a factores internos y externos a la construcción. Situaciones que fueron identificadas y se está trabajando en conjunto las estrategias constructivas que permitan recuperar el retraso en el tiempo contractual restante.

## H. CONCLUSIONES

- Durante el tercer trimestre del 2026, se mantuvo el ritmo de ejecución de procesos de contratación para el Proyecto “Servicios esenciales de salud y preparación ante emergencias”, el cual en dicho trimestre reportó 11 procesos en ejecución y 5 nuevos contratos suscritos en su plan de adquisiciones y contrataciones; incorporando todos sus financiamientos.
- Con respecto a los procesos relacionados con la construcción y equipamiento, así como supervisión de hospitales de traumatología se continua en espera del inicio de la ejecución de obras, una vez adjudicados los procesos.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## I. RECOMENDACIONES

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones conjuntas que permitan la eficiencia de los procesos y la gestión oportuna para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar y mantener actualizada la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# SECRETARÍA DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

# ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026**
Cifras en Lempiras

| .Proy | el Inversión / Institución / Programa o Proy | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado III Trimestre | | | | Ejecutado Anual (Devengado) | | | | Compromiso Aprobado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l Fondos Nacio | tal Fondos Exter | Total General | l Fondos Nacio | tal Fondos Exter | Total General | Fondos Nacio | l Fondos Exte | Total General | ución(Dev | l Fondos Nacion | tal Fondos Exter | Total General | ución(Dev | tal Fondos Nacion | tal Fondos Exter | Total General | miso(Com |
| **90** | **1. Inversión Productiva** | | **27,552,928** | **1,456,866,984** | **1,484,419,912** | **27,552,928** | **1,456,906,984** | **1,484,459,912** | **-** | **361,448,841** | **361,448,841** | **24.3%** | **-** | **664,515,684** | **664,515,684** | **44.6%** | **-** | **843,424,881** | **843,424,881** | **56.8%** |
| **7** | **0060 - Secretaría de Salud** | | **27,552,928** | **1,456,866,984** | **1,484,419,912** | **27,552,928** | **1,456,906,984** | **1,484,459,912** | **-** | **361,448,841** | **361,448,841** | **24.3%** | **-** | **664,515,684** | **664,515,684** | **44.8%** | **-** | **843,424,881** | **843,424,881** | **56.8%** |
| 1 | APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN S | 5008/BL-HO | - | - | - | - | 32,104,980 | 32,104,980 | - | 15,969,600 | 15,969,600 | 49.7% | - | 24,880,680 | 24,880,680 | 77.5% | - | 26,425,170 | 26,425,170 | 82.3% |
| | **TOTAL - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCI** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **32,104,980** | **32,104,980** | **-** | **15,969,600** | **15,969,600** | **49.7%** | **-** | **24,880,680** | **24,880,680** | **77.5%** | **-** | **26,425,170** | **26,425,170** | **82.3%** |
| 2 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | Acuerdo Don | 27,552,928 | 148,917 | 27,701,845 | 27,552,928 | 148,917 | 27,701,845 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | **TOTAL - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIF** | | **27,552,928** | **148,917** | **27,701,845** | **27,552,928** | **148,917** | **27,701,845** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** |
| 3 | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | BID 5790/BL | - | 575,566,138 | 575,566,138 | - | 331,636,892 | 331,636,892 | - | 77,912,131 | 77,912,131 | 23.5% | - | 163,450,114 | 163,450,114 | 49.3% | - | 283,986,203 | 283,986,203 | 85.6% |
| | **TOTAL - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMII** | | **-** | **575,566,138** | **575,566,138** | **-** | **331,636,892** | **331,636,892** | **-** | **77,912,131** | **77,912,131** | **23.5%** | **-** | **163,450,114** | **163,450,114** | **49.3%** | **-** | **283,986,203** | **283,986,203** | **85.6%** |
| 4 | PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIP | BCIE-2329 | - | 603,286,840 | 603,286,840 | - | 603,286,840 | 603,286,840 | - | 121,661,721 | 121,661,721 | 20.2% | - | 261,219,538 | 261,219,538 | 43.3% | - | 261,316,924 | 261,316,924 | 43.3% |
| | **TOTAL - PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQ** | | **-** | **603,286,840** | **603,286,840** | **-** | **603,286,840** | **603,286,840** | **-** | **121,661,721** | **121,661,721** | **20.2%** | **-** | **261,219,538** | **261,219,538** | **43.3%** | **-** | **261,316,924** | **261,316,924** | **43.3%** |
| 5 | PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD | IDA 7142-HN | - | 108,290,171 | 108,290,171 | - | 198,290,171 | 198,290,171 | - | 107,132,211 | 107,132,211 | 54.0% | - | 107,802,709 | 107,802,709 | 54.4% | - | 158,862,199 | 158,862,199 | 80.1% |
| | | TFoB8564-H | - | 81,894,000 | 81,894,000 | - | 58,780,700 | 58,780,700 | - | 9,724,949 | 9,724,949 | 16.5% | - | 49,853,628 | 49,853,628 | 84.8% | - | 49,903,332 | 49,903,332 | 84.9% |
| | | TFoC1861 | - | 1,960,000 | 1,960,000 | - | 25,073,300 | 25,073,300 | - | 7,510,331 | 7,510,331 | 30.0% | - | 23,934,501 | 23,934,501 | 95.5% | - | 23,934,501 | 23,934,501 | 95.5% |
| | **TOTAL - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SA** | | **-** | **192,144,171** | **192,144,171** | **-** | **282,144,171** | **282,144,171** | **-** | **124,367,491** | **124,367,491** | **44.1%** | **-** | **181,590,838** | **181,590,838** | **64.4%** | **-** | **232,700,032** | **232,700,032** | **82.5%** |
| 6 | PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL I | GRT/MM-17 | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | **TOTAL - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGION** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **600,000** | **600,000** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** | **-** | **-** | **-** | **0.0%** |
| 7 | RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PAR | BID 4713/BL | - | 85,720,918 | 85,720,918 | - | 206,985,184 | 206,985,184 | - | 21,537,897 | 21,537,897 | 10.4% | - | 33,374,514 | 33,374,514 | 16.1% | - | 38,996,551 | 38,996,551 | 18.8% |
| | **TOTAL - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA** | | **-** | **85,720,918** | **85,720,918** | **-** | **206,985,184** | **206,985,184** | **-** | **21,537,897** | **21,537,897** | **10.4%** | **-** | **33,374,514** | **33,374,514** | **16.1%** | **-** | **38,996,551** | **38,996,551** | **18.8%** |
| | **2. Formación Bruta de Capital Fijo** | | **276,615,120** | **1,107,356,211** | **1,383,971,331** | **278,307,458** | **73,376,970** | **351,684,428** | **67,448,300** | **170,977** | **67,619,276** | **19.2%** | **80,471,887** | **230,892** | **80,702,778** | **22.9%** | **92,555,365** | **230,892** | **92,786,256** | **26.4%** |
| | **0060 - Secretaría de Salud** | | **276,615,120** | **1,107,356,211** | **1,383,971,331** | **278,307,458** | **73,376,970** | **351,684,428** | **67,448,300** | **170,977** | **67,619,276** | **19.2%** | **80,471,887** | **230,892** | **80,702,778** | **22.9%** | **92,555,365** | **230,892** | **92,786,256** | **26.4%** |
| | ACTIVIDADES CENTRALES | | 20,440,580 | 1,107,356,211 | 1,127,796,791 | 9,972,257 | 55,018,539 | 64,990,796 | - | 153,792 | 153,792 | 0.2% | - | 213,707 | 213,707 | 0.3% | 344,764 | 213,707 | 558,471 | 0.9% |
| | **TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES** | | **20,440,580** | **1,107,356,211** | **1,127,796,791** | **9,972,257** | **55,018,539** | **64,990,796** | **-** | **153,792** | **153,792** | **0.2%** | **-** | **213,707** | **213,707** | **0.3%** | **344,764** | **213,707** | **558,471** | **0.9%** |
| | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE AT | | 55,077,288 | - | 55,077,288 | 56,889,505 | 18,358,431 | 75,247,936 | 5,186,899 | 17,185 | 5,204,084 | 6.9% | 7,226,861 | 17,185 | 7,244,046 | 9.6% | 11,476,891 | 17,185 | 11,494,076 | 15.3% |
| | **TOTAL - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRI** | | **55,077,288** | **-** | **55,077,288** | **56,889,505** | **18,358,431** | **75,247,936** | **5,186,899** | **17,185** | **5,204,084** | **6.9%** | **7,226,861** | **17,185** | **7,244,046** | **9.6%** | **11,476,891** | **17,185** | **11,494,076** | **15.3%** |
| | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE A | | 154,652,563 | - | 154,652,563 | 166,012,527 | - | 166,012,527 | 59,608,224 | - | 59,608,224 | 35.9% | 70,552,416 | - | 70,552,416 | 42.5% | 78,041,099 | - | 78,041,099 | 47.0% |
| | **TOTAL - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEG** | | **154,652,563** | **-** | **154,652,563** | **166,012,527** | **-** | **166,012,527** | **59,608,224** | **-** | **59,608,224** | **35.9%** | **70,552,416** | **-** | **70,552,416** | **42.5%** | **78,041,099** | **-** | **78,041,099** | **47.0%** |
| | RECTORIA DE SALUD | | 46,444,689 | - | 46,444,689 | 45,433,169 | - | 45,433,169 | 2,653,177 | - | 2,653,177 | 5.8% | 2,692,610 | - | 2,692,610 | 5.9% | 2,692,610 | - | 2,692,610 | 5.9% |
| | **TOTAL - RECTORIA DE SALUD** | | **46,444,689** | **-** | **46,444,689** | **45,433,169** | **-** | **45,433,169** | **2,653,177** | **-** | **2,653,177** | **5.8%** | **2,692,610** | **-** | **2,692,610** | **5.9%** | **2,692,610** | **-** | **2,692,610** | **5.9%** |
| | **Total general** | | **304,168,048** | **2,564,223,195** | **2,868,391,243** | **305,860,386** | **1,530,283,954** | **1,836,144,340** | **67,448,300** | **361,619,817** | **429,068,117** | **23.4%** | **22,311,417,472** | **3,799,560,490** | **26,110,977,962** | **54.2%** | **22,752,263,596** | **5,195,325,997** | **27,947,589,593** | **15%** |

***Nota:*** SIAFI, 30/09/2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| **0060 - Secretaría de Salud** | | | | | | | | |
| Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO) | Fortalecimiento de Servicios de Salud Materno Infantil | Informe | 129 | 146 | 113% | 41 | 41 | 100% |
| Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán (Acuerdo Donación No 1660400) | Construido el edificio administrativo y del laboratorio con equipo tecnológico y de oficina para el año 2025 | Informe de ejecución | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2025 | Equipo | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| | Adquirido, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de Salud | Equipo | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Programa de construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula | Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán | Informe técnico | 15 | 17 | 113% | 8 | 8 | 100% |



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras (BID 5790/BL-HO) | Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa | Informe técnico | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales | Informe | 55 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |
| | Reorganizar y fortalecer la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales | Informe | 7 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| | Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025 | Informe | 158 | 133 | 84% | 52 | 52 | 100% |
| Programa de diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa | Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca. | Informe de obra | 21 | 8 | 38% | 6 | 5 | 83% |



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (BCIE-2329) | Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa | Informe de obra | 19 | 6 | 32% | 6 | 3 | 50% |
| | Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales | Informe | 17 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |
| | Realizada la gestión de gastos administración del proyecto | Informe | 75 | 64 | 85% | 18 | 24 | 133% |
| Proyecto Servicios Esenciales de salud y preparación ante emergencias (RESHAPE) (TF01861) | Fortalecido el sistema de cadena de frío y realizada la jornadas de vacunación masivas a nivel nacional. | Informe | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Fortalecido el Sistema del Vigilancia de la Salud y laboratorio de virología nacional | Informe | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| | Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto | Informe | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI) | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| | Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes. | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional. | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Fortalecido el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto | Informe | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Proyecto Honduras Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM en Mesoamérica y República Dominicana) (GRT/MM-17339-40-HO) | Fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos de malaria . | Informe | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 100% |
| | Fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica de malaria | Informe | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% |
| | Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto. | Informe | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% |



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto | Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO) | Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL | Equipo | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| | Adquiridos generadores eléctricos para 5 hospitales | Equipo | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| | Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales de 5 hospitales | Equipo | 601 | 596 | 99% | 5 | 0 | 0% |
| | Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2025 | Informe | 80 | 10 | 13% | 18 | 19 | 106% |

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
