SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Informe No. 0140-003-2026

Tegucigalpa, octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 4
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 5
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 6
D. PRINCIPALES PROYECTOS 7
D.1. Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana 8
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 8
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 9
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 9
D.2. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) 10
D 2.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 10
D 2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 11
D 2.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 11
D.3. Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente) 11
D 3.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 11
D 3.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 13
D 3.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 13
D.4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) 14
D 4.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 14
D 4.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 17
D 4.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 17
D.5. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 17
D 5.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 17
D 5.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 20
D 5.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 20
D.6. Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR) 21
D 6.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 21

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D 6.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 22
D 6.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 22
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 22
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 22
G. CONCLUSIONES 24
H. RECOMENDACIONES 25
ANEXO 1 26
ANEXO 2 27

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios; así como diversificar la oferta de los productos de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**973,523,819.0**
Inversión Productiva	966,135,782.0
Formación Bruta de Capital	7,388,037.0
Presupuesto Vigente	**1,539,164,730.0**
Inversión Productiva	1,526,315,091.0
Formación Bruta de Capital	12,849,639.0
Ejecutado III Trimestre	**468,576,887.1**
Inversión Productiva	467,459,016.1
Formación Bruta de Capital	1,117,871.0
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**30.4%**
Ejecutado Anual	**801,132,957.7**
Inversión Productiva	797,599,155.1
Formación Bruta de Capital	3,533,802.5
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**52.0%**
Compromiso Aprobado	**868,204,949.2**
Inversión Productiva	860,169,831.7
Formación Bruta de Capital	8,035,117.5
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**56.4%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agroindustrial, mediante el fortalecimiento de la producción y productividad, garantías de seguridad alimentaria e impulso a la competitividad y el financiamiento; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y la Inversión de Formación Bruta de Capital. Para lo cual en el 2026 mediante la Inversión Productiva se desarrollan 8 proyectos de inversión, que cuentan con un presupuesto aprobado L973,523,819.0 los cuales L966,135,782.0 (99.2%) corresponden a inversión productiva con lo cual se tiene programado la implementación de 555 planes de Negocio que apoyarán necesidades agroalimentarias en todo el país a través de los proyectos de Competitividad Rural (COMRURAL II y III) y ejecución de 10 Sub-Proyectos agro-costeros; 272 hectáreas con sistemas de riego por goteo instalado y funcionando a través del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR); Implementación de 120 Becas, 40 Cajas rurales con financiamiento otorgado y ejecución de 68 Planes de Negocios mediante el Proyecto de Inclusión económica y social de pequeños productores rurales (PROINORTE); con el proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, se implementarán 43 planes de Inversión, 300 asistencias técnicas en tecnologías climáticamente Inteligentes para productores organizados, 10 planes de manejo de microcuencas y 21 estudios y diagnósticos para inversiones en infraestructura con el Proyecto de fortalecimiento de la Innovación, resiliencia y sostenibilidad de sistemas agroalimentarios (INNOVASAN).


Al tercer trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L1,539,164,730.0 de los cuales L1,526,315,091.0 corresponden a Inversión productiva y L12,849,639.0 a la Formación Bruta de Capital para el desarrollo de programas de gran importancia como ser el Programa del Sistema de Información Agroalimentaria (SISAGRO), Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Programa Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROPESCA) y Programa Nacional de Fomento a la Agricultura

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Irrigada (PRONAGRI). La ejecución presupuestaria del trimestre asciende a L468,576,887.1 que representan el 30.4% con relación al Presupuesto Vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 1
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería
Financiamiento de la Inversión por Fuente Cifras en Millones de Lempiras

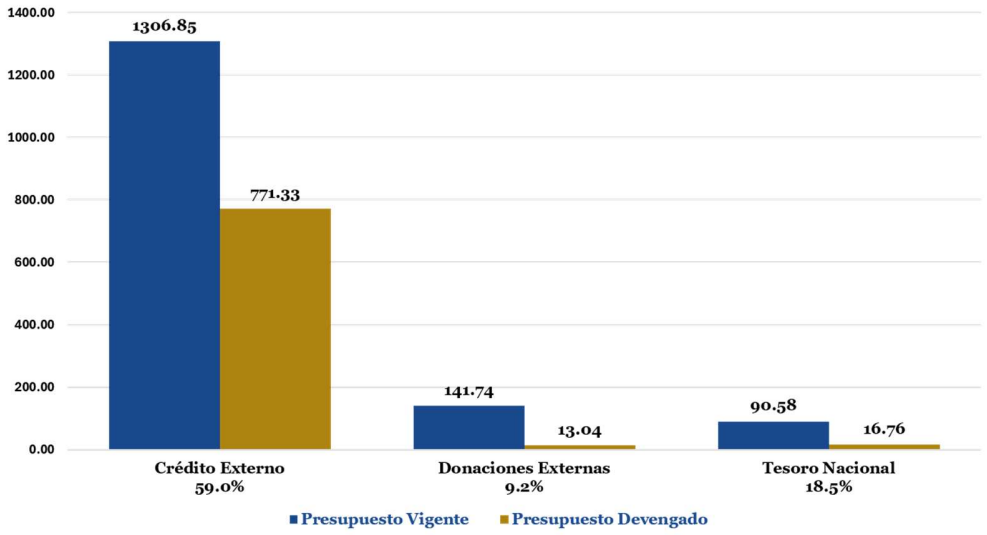


Fuente: SIAFI al 30/09/2026

En función al Gráfico No. 1, el Presupuesto Vigente de la SAG al cierre del III Trimestre 2026 por fuente de financiamiento, los recursos provenientes de Crédito Externo registran el mayor nivel de ejecución, con 59.0% del presupuesto vigente de dicha fuente. Por su parte, los recursos del Tesoro Nacional y las Donaciones Externas presentan ejecuciones de 18.5% y 9.2%, respectivamente. Estos resultados evidencian que el desempeño global de la cartera se encuentra sustentado principalmente en la ejecución de los recursos de Crédito Externo, los cuales muestran una aceleración respecto a los niveles registrados durante el I y II trimestre de 2026.

En cuanto a la composición por fuente de financiamiento, el presupuesto vigente se encuentra distribuido de la siguiente manera: **84.9%**, equivalente a **L1,306,846,537.00**, corresponde a Crédito Externo; **9.2%**, equivalente a **L141,742,264.00**, corresponde a Donaciones Externas; y el **5.9% restante**, equivalente a **L90,575,929.00**, corresponde a Fondos Nacionales, integrados por recursos del Tesoro Nacional y Recursos Propios.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

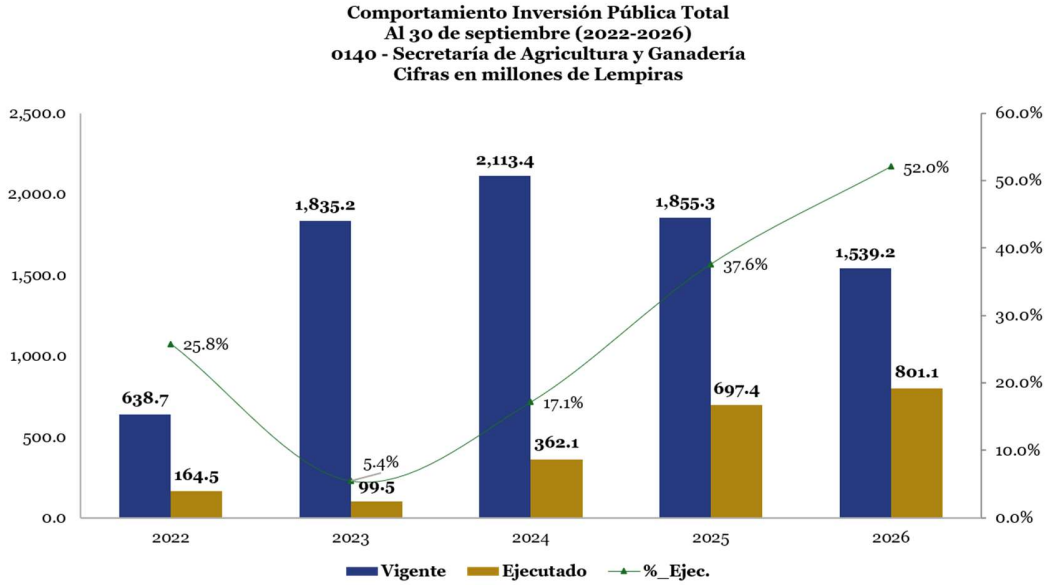

Fuente: SIAFI al 30/09/2026

Durante el período 2022-2026, la inversión productiva de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) experimentó un cambio significativo en su gestión institucional como resultado del traspaso de competencias de inversión de INVEST-H hacia la SAG, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022. A partir de esta transición, la institución ha impulsado diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la operatividad del sector agroalimentario, promoviendo la ejecución de inversiones financiadas con recursos nacionales y externos.

En este contexto, la SAG ha gestionado y ejecutado una cartera de proyectos estratégicos, entre los que destacan: Alianza para el Corredor Seco, Proyecto de Competitividad Rural II (COMRURAL II), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO-LENCA), Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente), Proyecto de Competitividad Rural III (COMRURAL III) e INNOVASAN.

Del análisis comparativo de la ejecución presupuestaria acumulada al tercer trimestre de los años 2022-2026, se observa un comportamiento fluctuante en los niveles de ejecución de la inversión pública de la SAG. Esta variabilidad ha estado asociada principalmente a procesos de contratación prolongados, alta rotación de personal, limitaciones en la planificación operativa y la necesidad de efectuar reprogramaciones de actividades durante etapas críticas de ejecución.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

No obstante, a partir de 2023 se evidencia una recuperación progresiva en los niveles de ejecución. La ejecución pasó de 5.4% en 2023 a 17.1% en 2024, incrementándose posteriormente a 37.6% en 2025 y alcanzando 52.0% en 2026, el nivel más alto del período analizado. Este comportamiento refleja una mejora sustancial en la capacidad de ejecución institucional y sugiere que varios proyectos han transitado de etapas de planificación y estructuración hacia fases de implementación física y financiera más intensivas.

Los resultados observados en 2026 evidencian que una parte importante de los proyectos ha superado las fases iniciales de preparación, estructuración y contratación, avanzando hacia etapas de implementación física y financiera de mayor intensidad. Este comportamiento ha contribuido a incrementar el ritmo de ejecución de los recursos disponibles y a mejorar el cumplimiento de las metas programadas, particularmente en aquellos proyectos que actualmente se encuentran en plena fase de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.

En consecuencia, el desempeño registrado al III Trimestre de 2026 refleja un proceso gradual de fortalecimiento institucional y consolidación de la gestión de la inversión pública de la SAG. De mantenerse esta tendencia, se esperaría una mayor dinamización de la ejecución presupuestaria durante el resto del ejercicio fiscal, así como avances físicos más significativos en los proyectos estratégicos que conforman la cartera de inversión del sector agroalimentario.

D. PRINCIPALES PROYECTOS

Durante el III trimestre de 2026, la Unidad Administradora de Proyectos/SAG administró ocho iniciativas financiadas con recursos externos y contraparte nacional. El desempeño fue heterogéneo en donde algunos proyectos entraron en una fase de mayor ejecución, mientras otros permanecieron concentrados en preparación de adquisiciones, revisión legal, formalización contractual, reestructuración o cierre administrativo.

Desde la perspectiva de gestión de proyectos, y respecto a la información proporcionada por SAG en su Informe al Tercer Trimestre 2026, se identifican cuatro situaciones dentro de la cartera de proyectos:

1. **Proyectos con ejecución acelerada:** COMRURAL III, COMRURAL II, Agua Urbana, SAG-ProOccidente y PROINORTE.
2. **Proyectos con preparación técnica y contractual avanzada, pero limitada materialización física:** Seguridad Hídrica.
3. **Proyectos con retrasos críticos de obra y contratación:** PDABR.
4. **Proyecto en fase de arranque sin ejecución física ni financiera:** INNOVASAN.

El trimestre evidencia una mejor movilización de recursos, pero todavía existe una brecha entre la ejecución financiera, los procesos administrativos realizados y la terminación efectiva de obras, sistemas, planes de negocio y servicios programados.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los proyectos:

D.1. Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

Tiene como objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos, ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del COVID-19.

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Durante el trimestre, el proyecto continuó ejecutando obras, equipamiento, supervisión y asistencia técnica en los sistemas urbanos de agua potable de Puerto Cortés, Choloma, Danlí, La Paz y Siguatepeque. Se procesaron estimaciones correspondientes a los subproyectos en ejecución y se mantuvo el acompañamiento técnico a los prestadores de servicios urbanos priorizados.

En el componente de fortalecimiento institucional, el ERSAPS continuó actualizando la matriz de resultados y las herramientas de medición de los indicadores del proyecto. También avanzó en el fortalecimiento de los sistemas SIME y SIRAPS, así como en el uso de herramientas digitales para recopilar y analizar información de los prestadores. Se actualizaron matrices, tablas y gráficos para comparar los resultados de 2026 con los registros históricos de años anteriores.

En materia de calidad del agua, se revisaron y validaron los resultados reportados en la plataforma SIRAPS, contrastándolos con los análisis emitidos por laboratorios privados. Durante septiembre se examinaron los resultados de Choloma, Danlí, Siguatepeque, La Paz y Puerto Cortés, y se elaboraron informes con observaciones y recomendaciones. También se realizaron jornadas de monitoreo y toma de muestras en Puerto Cortés, Choloma, Siguatepeque y La Paz. Aguas de Danlí reactivó el muestreo de su red de distribución, recolectando 12 muestras que fueron analizadas por el laboratorio central del SANAA.

El proyecto también avanzó en la implementación de mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos, en la revisión de sistemas de facturación y en el análisis del indicador de eficiencia energética. En Aguas de La Paz se coordinó la puesta en marcha del nuevo sistema de facturación y se preparó una prueba piloto. Para Choloma se continuaron las gestiones destinadas a incorporar sistemas fotovoltaicos y se recomendó evaluar la inclusión de Siguatepeque por su potencial de generación solar.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	35%	70.0%	25%	25%	100%
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	5.00	42%	3.00	3.00	100%
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	12	3.00	25%	3.00	3.00	100%
	Oficinas de los nuevos prestadores de servicios de agua potable equipadas (personal, mobiliario y equipo instalado)	Oficina	6	-	-	-	-	-

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto/Informe al III Trimestre 2026

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US$	46,500,000	07/06/2021 30/07/2027
		Lempiras	1,250,557,050	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	119,639,594	189,639,594	49,146,080	25.9
Acumulado 2026	119,639,594	189,639,594	99,499,599	52.5
Acumulado Vida del Proyecto */	1,250,557,050	1,250,557,050	256,178,977	20.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Durante el trimestre se formalizaron los contratos correspondientes a los lotes I y II del subproyecto de rehabilitación de equipos de las plantas de tratamiento y control de calidad del sistema de agua potable de Siguatepeque. Este resultado representa un avance contractual

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

concreto, aunque su materialización física depende de la presentación de garantías, pago de anticipos y entrega de los equipos incluidos en los contratos.

También continuaron los procesos para adquirir equipos destinados a los sistemas de agua potable de La Paz y Danlí. Ambos procesos habían alcanzado aproximadamente un 90% de avance y se encontraban en revisión legal, incluyendo la notificación de adjudicación y los borradores de contrato. De igual forma, el proceso para adquirir sistemas solares fotovoltaicos y servicios conexos para Choloma registraba un avance aproximado del 85%, después de recibirse seis ofertas y obtenerse la no objeción del organismo financiador al informe de evaluación.

Adicionalmente, se mantuvo en ejecución el contrato de asistencia técnica para el fortalecimiento de los prestadores urbanos. Se realizaron gestiones con proveedores tecnológicos para la implementación de módulos de peticiones, quejas y reclamos y para mejorar los sistemas de facturación y gestión operativa de los prestadores.

D.2. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR´s) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

Durante el III trimestre, COMRURAL II concentró sus actividades en completar el cierre técnico, administrativo y operativo del proyecto. En la Ventana 1 se continuó, junto con Swisscontact, la revisión y consolidación de los expedientes de 167 planes de negocio, verificando inversiones, productos de asistencia técnica y medios de respaldo.

En la Ventana 2 se revisaron los informes de cierre de 66 planes de negocio. Al cierre de septiembre, 50 expedientes estaban completos y 16 continuaban en validación. También se avanzó en la consolidación de la documentación relacionada con los convenios interinstitucionales suscritos con SERNA, SENASA, ARSA, SAG y SENPRENDE.

El 24 de septiembre comenzó el levantamiento de información para la Evaluación Final y el Informe de Cierre, a cargo de CONFIE. Las actividades incluyeron encuestas a beneficiarios y grupos de control, entrevistas institucionales, talleres participativos y visitas de verificación. La metodología incorporó un componente de evaluación de impacto solicitado por el Banco Mundial.

D 2.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de SAG no presentaron detalles de avances físico-referentes al COMRURAL II.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D 2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US$	42,499,734	04/05/2020 30/08/2026
		Lempiras	1,142,975,084	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	86,690,133	273,730,133	168,944,576	61.7
Acumulado 2026	86,690,133	273,730,133	219,971,144	80.4
Acumulado Vida del Proyecto */	1,142,975,084	1,142,975,084	965,605,311	84.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D 2.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Durante el trimestre continuó la ejecución de la consultoría contratada con CONFIE para elaborar la Evaluación Final y el Informe de Cierre. La firma completó la planificación metodológica, diseñó los instrumentos de recolección de datos, programó las encuestas mediante KoBoToolbox y organizó el trabajo de campo.

También se mantuvieron las obligaciones derivadas del contrato de asistencia técnica suscrito con Swisscontact, especialmente las relacionadas con la consolidación y cierre documental de los planes de negocio. Adicionalmente, continuó la consultoría destinada a determinar la permanencia en el uso de tecnologías agrícolas mejoradas por parte de los productores beneficiarios.

D.3. Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente)

Tiene como objetivo Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH) y el Objetivo Específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

D 3.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Durante el III trimestre, SAG-ProOccidente avanzó en el fortalecimiento productivo, la gestión de microcuencas, la inclusión financiera y la atención de MIPYMES lideradas por mujeres. El ICF aprobó cuatro planes de manejo de microcuencas, mientras que el Comité de Evaluación del Proyecto declaró elegibles 80 MIPYMES integradas por 357 participantes. De estas personas, 316 correspondían a mujeres y 79 a jóvenes, de acuerdo con los registros incluidos en el informe.

La Unidad Ejecutora aprobó 25 planes de inversión dirigidos a MIPYMES lideradas por mujeres y elaboró nueve planes de asistencia técnica en actividades productivas, pecuarias, turismo rural, artesanías, procesamiento y agregación de valor. En términos acumulados, el proyecto reportó 75 planes de inversión implementados y 150 asistencias técnicas prestadas, equivalentes al 50% de las metas anuales correspondientes.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Entre los resultados más visibles se encuentra la inauguración de 80 tecnologías climáticamente inteligentes en la comunidad de San Antonio Valle, municipio de Erandique, Lempira. También se desarrollaron actividades de verificación de campo, asistencia técnica integral, acompañamiento a MIPYMES, supervisión de inversiones en microcuencas y coordinación con organizaciones e instituciones presentes en el territorio.

En el componente de financiamiento rural, se continuó la coordinación con BANHPROVI y con las instituciones financieras intermediarias para agilizar la colocación de préstamos. Además, se realizaron ajustes al Reglamento Operativo del Proyecto, conforme a la estrategia actualizada de implementación del componente.

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	75.00	50%	-	-	-
	(PI)Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	75	50.00	67%	-	25.00	-
	(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	150.00	49%	-	-	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	10	4.00	40%	-	4.00	-
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	92.00	46%	-	-	-
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Tercer Trimestre 2026.

D 3.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.	BID 4936/BL-HO BID 4940/BL-HO FONPRODE GRT/WE-20251-HO	US$	91,400,000	21/05/2020 21/07/2027
		Lempiras	2,458,084,180	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	149,967,933	258,542,133	70,130,351	27.1
Acumulado 2026	149,967,933	258,542,133	118,729,572	45.9
Acumulado Vida del Proyecto */	2,458,084,180	2,458,084,180	859,920,594	35.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D 3.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

El principal avance contractual fue la formalización del contrato de la Etapa II del componente de fortalecimiento del desarrollo productivo con ACDI/VOCA. El contrato permitirá ampliar la atención a 4,000 nuevos productores mediante tecnologías climáticamente inteligentes y asistencia técnica. Durante el trimestre se recibió y revisó el informe inicial, el plan de trabajo y nueve documentos de gobernabilidad; también se realizó el taller de arranque de esta etapa.

El proyecto recibió mobiliario y equipo para las oficinas de Tegucigalpa y La Esperanza, aunque el pago al proveedor continuaba en seguimiento. El proceso de adquisición de equipo informático tuvo que replantearse mediante una nueva convocatoria. También continuó la remodelación de la oficina regional de La Esperanza, incluyendo la revisión de precios unitarios, cantidades de obra, planos de avance, estimaciones y órdenes de cambio.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

En materia de contratación de personal, se avanzó en la selección o formalización de los puestos de oficial financiero, oficial de bienes, especialista en monitoreo y evaluación, enlace público-privado y especialista en asistencia técnica e innovación tecnológica. Asimismo, se prepararon términos de referencia para contratar un especialista y un técnico en informática, sujetos a la no objeción del BID.

En el componente de seguimiento y evaluación, se obtuvo la no objeción a los términos de referencia para contratar al consultor encargado del diagnóstico institucional del sistema de monitoreo y evaluación de la SAG. También se recibieron 11 expresiones de interés para el estudio de economía del comportamiento y se nombró la comisión evaluadora correspondiente.

D.4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

El proyecto consiste en Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

D 4.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

En el III trimestre, PROINORTE incorporó 20 nuevas organizaciones usuarias a procesos de innovación tecnológica y continuó implementando nuevas herramientas contables, agrícolas y pecuarias mediante el contrato de INNOVATECH. También avanzó en los programas de investigación desarrollados con DICTA, a través de parcelas demostrativas y seis casas malla en las cadenas productivas priorizadas.

El proyecto reportó la participación de 825 mujeres en servicios vinculados con planes de negocio, fortalecimiento organizacional y otros mecanismos de apoyo. Asimismo, se desarrollaron dos actividades de capacitación en género, ambiente y seguridad alimentaria y nutricional, aunque la meta trimestral era de diez actividades. También se realizó un intercambio de experiencias entre organizaciones usuarias.

En el componente de desarrollo productivo, se implementaron diez planes de negocio y se brindaron 125 asistencias técnicas a organizaciones beneficiarias. Además, el Comité de Aprobación de Inversiones aprobó nuevos planes de negocio y cinco planes de inversión ecosistémicos. Estas aprobaciones ampliaron la cartera de intervenciones que deberán convertirse en convenios, desembolsos e inversiones físicas durante los siguientes meses.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresarialidad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad alimentaria.	Beneficiarios	6750	2,150.00	32%	-	-	-
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores.	Planes	40	32.00	80%	18.00	10.00	56%
	Organizaciones de productores de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	40.00	67%	20.00	20.00	100%
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-
	Productores promovidos en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	1,000.00	40%	1,000.00	1,000.00	100%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de León o Caribe Hondureño.	Plan	40	32.00	80%	18.00	10.00	56%
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	83.00	138%	20.00	27.00	135%
	Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios.	Cpacitaciones	445	295.00	66%	125.00	125.00	100%
	Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto	Plan	5	-	-	1.00	-	-
	Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores rurales en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño.	Capacitación	6	-	-	3.00	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Tercer Trimestre 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D 4.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	FIDA 2000002595 LOAN No. 13754P	US$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	1,051,209,489	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	124,843,732	185,961,841	36,459,195	19.6
Acumulado 2026	124,843,732	185,961,841	87,161,119	46.9
Acumulado Vida del Proyecto */	1,051,209,489	1,051,209,489	284,037,677	27.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D 4.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Durante el trimestre se efectuaron desembolsos para la implementación de diez planes de negocio. Asimismo, continuó vigente el contrato correspondiente al fondo concursable de innovación estratégica, mediante el cual INNOVATECH implementa innovaciones en el territorio del proyecto.

Se gestionó la contratación de servicios para desarrollar talleres y campañas de nutrición, higiene y cambio climático. Sin embargo, debido a las demoras administrativas y a los procesos de aprobación del organismo financiador, el proyecto decidió reorientar la implementación de estas actividades a través de la UTSAN.

También se inició el proceso de formalización de convenios para los cinco planes ecosistémicos aprobados. Estos convenios constituyen el instrumento necesario para habilitar los desembolsos y comenzar la ejecución de las inversiones en campo.

D.5. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras

El Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del recurso hídrico en áreas priorizadas, beneficiando a una población estimada de 167,100 habitantes.

D 5.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Durante el III trimestre de 2026, el proyecto avanzó principalmente en la preparación técnica, ambiental, social y contractual de las inversiones priorizadas. Se concluyeron y validaron los diseños de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Curarén y Manazapa-Las Mercedes, y se progresó en la actualización de los correspondientes instrumentos ambientales y sociales. Asimismo, continuó el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de Cane, La Paz.

En relación con el SIAS de Curarén, se remitieron los términos de referencia para contratar la supervisión de las obras y se identificaron 52 predios potencialmente sujetos a servidumbres.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

También se avanzó en la gestión del convenio de cooperación entre la SAG y el ICF para apoyar la protección de las microcuencas relacionadas con las inversiones priorizadas.
En el componente de gobernanza hídrica, continuaron las revisiones de la Política Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y del Reglamento de Aguas Subterráneas. También se desarrolló la Primera edición del curso Oficial FIDIC, con 26 participantes, y se inició una Segunda edición con 13 participantes, fortaleciendo las capacidades relacionadas con la administración contractual de obras.

En cuanto al Radar Meteorológico Banda S, se completaron los documentos correspondientes a nueve de los catorce procesos previstos para su rehabilitación. Esto representa un avance preparatorio del 64.3%, aunque todavía no constituye rehabilitación física del equipo. También se prepararon documentos relacionados con la construcción de viveros agroforestales municipales.

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	10%	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	10%	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca	Porcentaje	1	-	-	50%	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Nacaome rehabilitado.							
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	4.00	-	-
	Diseños finales de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	2.00	100%	-	-	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Informe	2	-	-	1.00	-	-
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidro climática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curaren actualizados.	Estudio	4	-	-	-	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Informes de supervisión de la construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	1.00	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Tercer Trimestre 2026.

D 5.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	IDA-6680-HN	US$	65,500,000	1/4/2021 31/3/2028
		Lempiras	1,761,537,350	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	103,919,661	76,919,661	7,771,833	10.1
Acumulado 2026	103,919,661	76,919,661	24,178,462	31.4
Acumulado Vida del Proyecto */	1,761,537,350	1,761,537,350	100,461,640	5.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D 5.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Durante el trimestre avanzó el proceso para contratar el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de agua potable de Nacaome bajo la modalidad FIDIC Libro Amarillo. Se efectuó la visita técnica al sitio y se atendieron consultas y solicitudes de aclaración de los potenciales oferentes. La recepción de propuestas quedó programada para el 27 de octubre de 2026.

Simultáneamente, avanzó la contratación de la consultoría para supervisar la planta de Nacaome. El 24 de septiembre se recibieron cuatro propuestas técnicas para la selección del Ingeniero FIDIC y se inició su evaluación. También se avanzó en la contratación de la consultoría para evaluar la seguridad de la presa José Cecilio del Valle.

Para el Radar Meteorológico Banda S se prepararon documentos de adquisición correspondientes a mantenimiento, reparaciones, sistemas auxiliares, comunicaciones, equipos especializados, puesta en marcha y capacitación técnica. En el caso de los viveros agroforestales, se evaluaron candidatos para la supervisión y se conformó una lista corta, aunque las entrevistas quedaron condicionadas a la publicación del proceso de contratación de las obras.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.6. Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR)

Contribuye a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales en el área de influencia del programa. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales, así como la reducción de la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa.

D 6.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Durante el III trimestre de 2026, el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego continuó la ejecución de las obras correspondientes a los sistemas de riego San Sebastián y Joya de Ramos, en el departamento de Comayagua. Los trabajos se concentraron en la instalación de la línea de conducción con tubería de 20 pulgadas PVC SDR 41 en San Sebastián y de tubería de 8 pulgadas PVC SDR 41 en Joya de Ramos. Asimismo, se avanzó en la instalación de válvulas de aire y control, construcción de cajas de registro de concreto, colocación de anclajes y reposición de cercos en las parcelas afectadas por las excavaciones.

También se realizaron actividades de replanteo, excavación y colocación de cama de arena en el desarenador, así como trabajos para la construcción del muro de protección en la margen izquierda del río Jupuara. En términos de producción física, se instalaron 3.47 kilómetros de tubería de los 5.60 kilómetros programados para el período, equivalente a un cumplimiento aproximado del 62% de la meta trimestral. No obstante, permanecieron pendientes 2.13 kilómetros y no se concretó la incorporación de las 272 hectáreas agrícolas previstas con acceso a agua para riego.

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	272	-	0%	272.00	-	0%
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilómetros	38	11.36	30%	19.70	5.22	26%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Tercer Trimestre 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D 6.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto De Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR)	BCIE 2101	US$	40,878,965	13/12/2014
		Lempiras	1,092,216,448	30/11/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	72,101,212	72,101,212	10,999,025	15.3
Acumulado 2026	72,101,212	72,101,212	29,835,801	41.4
Acumulado Vida del Proyecto */	1,092,216,448	1,092,216,448	948,378,325	86.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D 6.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

En cuanto al proyecto de riego de Lamaní, durante el trimestre se avanzó en la resolución del ajuste contractual solicitado por el contratista. Aunque el contrato de construcción había sido suscrito en diciembre de 2025, el inicio de las obras permaneció condicionado por la solicitud de incremento del monto contractual presentada por el Consorcio RLH-HONESCON. La aceptación del valor final del incremento se concretó hasta el 23 de septiembre de 2026, constituyendo un paso previo indispensable para formalizar la documentación pendiente y habilitar el inicio de las obras.

En el sistema de riego San Sebastián se tramitó la Adenda n.º 6 al contrato, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución por tres meses y se estableció noviembre de 2026 como nueva fecha estimada de finalización. Esta modificación contractual respondió a la imposibilidad de concluir las obras dentro del plazo ampliado previamente mediante la Adenda n.º 5.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el trimestre del 2026 se realizaron misiones por parte del Banco Mundial y revisión de Cartera de Proyectos BID, se realizaron dictámenes técnicos de ampliación de tiempo para el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad; por otra parte, también se realizaron modificaciones presupuestarias de acuerdo con las solicitudes realizadas por SAG.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

De manera general y de acuerdo con lo indicado en el informe correspondiente presentado por la SAG, los diferentes proyectos ejecutados por SAG, presentan la siguiente problemática:

Proyecto	Problemática	Acciones
PDABR	Retrasos en las obras por ajustes de diseño, condiciones imprevistas del terreno, obras adicionales y demora en materiales importados. En Lamaní, el inicio se postergó por ajustes contractuales.	Se tramitó la **Adenda n.º 6** para ampliar por tres meses el plazo de ejecución de San Sebastián, estableciendo noviembre de 2026 como nueva fecha prevista de finalización. En Lamaní, se alcanzó

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Proyecto	Problemática	Acciones
		un acuerdo con el contratista sobre el ajuste contractual solicitado, como paso previo para formalizar la modificación y emitir la orden de inicio.
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Demoras en garantías, anticipos y revisiones contractuales; bajo desempeño de algunos contratistas y reducción del alcance debido a ajustes en el financiamiento.	La SAG propuso exigir a las empresas constructoras y supervisoras un mayor ritmo de ejecución para incrementar el avance de las obras. Asimismo, se dio seguimiento a garantías y anticipos, se evaluó el desempeño de contratos con retrasos y se consideraron ajustes de alcance o posibles cancelaciones contractuales.
Seguridad Hídrica	Las principales obras no han iniciado por procesos de contratación pendientes, falta de regularización de terrenos y servidumbres, y ajustes derivados de la reestructuración del proyecto.	Se continuaron las gestiones para regularizar los terrenos requeridos. También avanzaron los procesos de contratación para el diseño y construcción de la planta de tratamiento de Nacaome y su supervisión, procurando que esta última estuviera contratada antes del inicio de las obras. Asimismo, se prepararon procesos de adquisición y servicios relacionados con la rehabilitación del Radar Meteorológico Banda S.
PROOCCIDENTE	Riesgo de incumplimiento por la proximidad del cierre, contrataciones de personal pendientes, adquisiciones reiniciadas y necesidad de ajustar metas y cronogramas.	La SAG reportó cumplimiento de las metas trimestrales y continuó gestionando la ampliación del plazo. Se avanzó en la contratación de personal técnico, se reinició el proceso de adquisición de equipo informático y se dio seguimiento a la actualización de metas, cobertura territorial e instrumentos de planificación.
PROINORTE	Retrasos en desembolsos e implementación de planes por documentación legal vencida de las organizaciones, convenios en revisión legal y procesos de contratación declarados desiertos o demorados.	Se brindó acompañamiento a las organizaciones para actualizar sus juntas directivas ante SENPRENDE. Se continuó gestionando la revisión legal y formalización de los convenios de los planes ecosistémicos. Ante el retraso en la contratación de

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Proyecto	Problemática	Acciones
		talleres de nutrición, higiene y cambio climático, se determinó ejecutar estas actividades mediante la UTSAN.
INNOVASAN	Ausencia de ejecución física debido al retraso en la contratación del equipo técnico inicial, lo que ha postergado el comienzo de las actividades territoriales.	seguimiento a la revisión legal del contrato de la empresa consultora responsable de seleccionar y contratar al equipo inicial. Paralelamente, se avanzó en el Manual Operativo, POA, presupuesto, cuentas especiales y proceso de Línea Base; sin embargo, la contratación del equipo técnico continuaba pendiente.
COMRURAL II	Persisten expedientes y convenios pendientes de validación, lo que podría prolongar el cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto.	Se continuó con la revisión y ajuste de expedientes para someter nuevos planes a ratificación, el seguimiento a desembolsos pendientes y el proceso de contratación de la firma implementadora. Además, se efectuaron transferencias para planes aprobados y actividades de capacitación sobre aspectos contractuales, ambientales y sociales.
COMRURAL III	Retrasos en la aprobación, ratificación y desembolso de planes de negocio, así como dependencia de la contratación de la firma implementadora para activar algunas ventanas. Respecto a la Donación Baja ejecución por retrasos en la evaluación y aprobación de planes de negocio, ausencia de planes comunitarios aprobados y debilidades en el registro de resultados.	Se continuó revisando y consolidando los expedientes de 167 planes de negocio. De los 66 informes de cierre de la Ventana 2, se completaron 50 y se mantuvieron 16 en validación. También se revisó la documentación de los convenios interinstitucionales y se inició el levantamiento de información para la Evaluación Final y el Informe de Cierre.

G. CONCLUSIONES

- La cartera de inversión de la SAG presenta avances relevantes, pero con resultados desiguales entre proyectos. Agua Urbana, SAG-ProOccidente, PROINORTE y COMRURAL III muestran mayor dinamismo en la ejecución de actividades, mientras que PDABR, Seguridad Hídrica, INNOVASAN y la parte de Donación de COMRURAL III de

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Fondo Adicional de La Moskitia registran retrasos que afectan el cumplimiento oportuno de sus metas.

- Los procesos legales, administrativos y contractuales constituyen la principal limitante transversal de la cartera. Las revisiones prolongadas de contratos y convenios, la presentación tardía de garantías, los procesos de adquisición pendientes o declarados desiertos, la documentación incompleta y la insuficiencia de personal han retrasado órdenes de inicio, desembolsos y ejecución de actividades.

- Persiste una brecha entre los avances preparatorios y la entrega efectiva de resultados físicos. Aunque se han elaborado diseños, aprobado planes de negocio, preparado adquisiciones y formalizados contratos, una parte de estas gestiones todavía no se traduce en obras terminadas, sistemas operativos o inversiones productivas en funcionamiento.

- Los proyectos con retrasos críticos presentan riesgos de trasladar metas y compromisos hacia períodos posteriores. Las modificaciones de alcance, los ajustes contractuales, la falta de disponibilidad de terrenos y servidumbres, la contratación tardía de equipos técnicos y la proximidad de fechas de cierre podrían comprometer los resultados previstos si no se adoptan medidas correctivas oportunas.

H. RECOMENDACIONES

- Implementar planes de recuperación diferenciados para los proyectos con mayores retrasos, especialmente PDABR, Seguridad Hídrica, INNOVASAN y el Fondo Adicional de COMRURAL III para La Moskitia, estableciendo actividades críticas, responsables, fechas límite y metas físicas verificables para el IV trimestre.

- Establecer una ruta prioritaria para agilizar los procesos legales, administrativos y contractuales, mediante mesas de trabajo semanales que permitan resolver oportunamente contratos, convenios, garantías, adendas, adquisiciones y expedientes que condicionan el inicio de obras y los desembolsos.

- Orientar el seguimiento hacia la entrega efectiva de productos y beneficios, diferenciando claramente entre procesos iniciados, contratos formalizados, adquisiciones realizadas, obras terminadas e inversiones en funcionamiento. La aprobación de planes o la firma de contratos deberá considerarse un resultado intermedio y no el producto final de la inversión.

- Actualizar los cronogramas físicos, contractuales y de adquisiciones con criterios realistas, considerando la disponibilidad efectiva de terrenos, servidumbres, personal, garantías, diseños y documentación. Asimismo, deberá darse seguimiento semanal a las rutas críticas para anticipar desviaciones y evitar el traslado automático de metas y compromisos hacia el siguiente ejercicio fiscal.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
9	**1. Inversión Productiva**		**77,726,290**	**888,409,492**	**966,135,782**	**77,726,290**	**1,448,588,801**	**1,526,315,091**	**10,154,237**	**457,304,779**	**467,459,016**	**30.6%**	**13,226,887**	**784,372,268**	**797,599,155**	**52.3%**	**15,385,887**	**844,783,944**	**860,169,832**	**56.4%**
9	**0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería**		**77,726,290**	**888,409,492**	**966,135,782**	**77,726,290**	**1,448,588,801**	**1,526,315,091**	**10,154,237**	**457,304,779**	**467,459,016**	**30.6%**	**13,226,887**	**784,372,268**	**797,599,155**	**52.3%**	**15,385,887**	**844,783,944**	**860,169,832**	**56.4%**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	N/D	-	-	-	-	47,000,000	47,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**-**	**-**	**-**	**-**	**47,000,000**	**47,000,000**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
2	COMPETITTIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN	-	168,217,503	168,217,503	-	334,764,503	334,764,503	-	121,971,372	121,971,372	36.4%	-	213,759,714	213,759,714	63.9%	-	225,006,469	225,006,469	67.2%
		TF0C1874	-	60,456,014	60,456,014	-	50,956,014	50,956,014	-	1,338,584	1,338,584	2.6%	-	3,765,743	3,765,743	7.4%	-	4,788,277	4,788,277	9.4%
	TOTAL - COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)		**-**	**228,673,517**	**228,673,517**	**-**	**385,720,517**	**385,720,517**	**-**	**123,309,956**	**123,309,956**	**32.0%**	**-**	**217,525,457**	**217,525,457**	**56.4%**	**-**	**229,794,745**	**229,794,745**	**59.6%**
3	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	-	119,639,594	119,639,594	-	189,639,594	189,639,594	-	49,146,080	49,146,080	25.9%	-	99,499,599	99,499,599	52.5%	-	129,879,549	129,879,549	68.5%
	TOTAL - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		**-**	**119,639,594**	**119,639,594**	**-**	**189,639,594**	**189,639,594**	**-**	**49,146,080**	**49,146,080**	**25.9%**	**-**	**99,499,599**	**99,499,599**	**52.5%**	**-**	**129,879,549**	**129,879,549**	**68.5%**
4	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	IDA-6448-HN	-	86,690,133	86,690,133	-	273,730,133	273,730,133	-	168,944,576	168,944,576	61.7%	-	219,971,144	219,971,144	80.4%	-	223,186,281	223,186,281	81.5%
	TOTAL - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)Tipo de proyecto:		**-**	**86,690,133**	**86,690,133**	**-**	**273,730,133**	**273,730,133**	**-**	**168,944,576**	**168,944,576**	**61.7%**	**-**	**219,971,144**	**219,971,144**	**80.4%**	**-**	**223,186,281**	**223,186,281**	**81.5%**
5	PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	38,459,090	33,642,122	72,101,212	38,459,090	33,642,122	72,101,212	4,459,501	6,539,524	10,999,025	15.3%	5,589,804	24,245,997	29,835,801	41.4%	5,889,804	24,245,997	30,135,801	41.8%
	TOTAL - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)		**38,459,090**	**33,642,122**	**72,101,212**	**38,459,090**	**33,642,122**	**72,101,212**	**4,459,501**	**6,539,524**	**10,999,025**	**15.3%**	**5,589,804**	**24,245,997**	**29,835,801**	**41.4%**	**5,889,804**	**24,245,997**	**30,135,801**	**41.8%**
6	Proyecto de fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios (INNOVASAN) en 21 municipios de la región norte central de Honduras	BRAM No.2000005029	-	26,800,000	26,800,000	-	1,650,000	1,650,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
		GAFSP INNOVASAN	-	16,200,000	16,200,000	-	10,700,000	10,700,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
		PBAS No.2000005030	13,800,000	23,500,000	37,300,000	13,800,000	10,550,000	24,350,000	698,000	-	698,000	2.9%	698,000	-	698,000	2.9%	1,895,000	-	1,895,000	7.8%
	TOTAL - Proyecto de fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas a		**13,800,000**	**66,500,000**	**80,300,000**	**13,800,000**	**22,900,000**	**36,700,000**	**698,000**	**-**	**698,000**	**1.9%**	**698,000**	**-**	**698,000**	**1.9%**	**1,895,000**	**-**	**1,895,000**	**5.2%**
7	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	2000002595	19,705,500	70,861,814	90,567,314	19,705,500	66,861,814	86,567,314	4,996,736	9,770,272	14,767,008	17.1%	6,939,083	28,462,280	35,401,363	40.9%	7,601,083	33,472,465	41,073,548	47.4%
		LOAN No. 13754P	-	34,276,418	34,276,418	-	99,394,527	99,394,527	-	21,692,188	21,692,188	21.8%	-	51,759,756	51,759,756	52.1%	-	52,717,938	52,717,938	53.0%
	TOTAL - PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURAL		**19,705,500**	**105,138,232**	**124,843,732**	**19,705,500**	**166,256,341**	**185,961,841**	**4,996,736**	**31,462,460**	**36,459,195**	**19.6%**	**6,939,083**	**80,222,036**	**87,161,119**	**46.9%**	**7,601,083**	**86,190,403**	**93,791,486**	**50.4%**
8	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	5,761,700	98,157,961	103,919,661	5,761,700	71,157,961	76,919,661	-	7,771,833	7,771,833	10.1%	-	24,178,462	24,178,462	31.4%	-	28,241,194	28,241,194	36.7%
	TOTAL - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDORSECO DE HONDURAS		**5,761,700**	**98,157,961**	**103,919,661**	**5,761,700**	**71,157,961**	**76,919,661**	**-**	**7,771,833**	**7,771,833**	**10.1%**	**-**	**24,178,462**	**24,178,462**	**31.4%**	**-**	**28,241,194**	**28,241,194**	**36.7%**
9	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO	-	3,275,000	3,275,000	-	3,275,000	3,275,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
		4940/BL-HO	-	40,010,236	40,010,236	-	133,584,436	133,584,436	-	60,199,499	60,199,499	45.1%	-	84,694,824	84,694,824	63.4%	-	89,067,845	89,067,845	66.7%
		GRT/WE-20251-HO	-	18,086,250	18,086,250	-	33,086,250	33,086,250	-	9,274,187	9,274,187	28.0%	-	9,274,187	9,274,187	28.0%	-	9,282,251	9,282,251	28.1%
		ICO-FONPRODE	-	88,596,447	88,596,447	-	88,596,447	88,596,447	-	656,665	656,665	0.7%	-	24,760,562	24,760,562	27.9%	-	24,895,678	24,895,678	28.1%
	TOTAL - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		**-**	**149,967,933**	**149,967,933**	**-**	**258,542,133**	**258,542,133**	**-**	**70,130,351**	**70,130,351**	**27.1%**	**-**	**118,729,572**	**118,729,572**	**45.9%**	**-**	**123,245,774**	**123,245,774**	**47.7%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		**7,388,037**	**-**	**7,388,037**	**12,849,639**	**-**	**12,849,639**	**1,117,871**	**-**	**1,117,871**	**8.7%**	**3,533,803**	**-**	**3,533,803**	**27.5%**	**8,035,117**	**-**	**8,035,117**	**62.5%**
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		**7,388,037**	**-**	**7,388,037**	**12,849,639**	**-**	**12,849,639**	**1,117,871**	**-**	**1,117,871**	**8.7%**	**3,533,803**	**-**	**3,533,803**	**27.5%**	**8,035,117**	**-**	**8,035,117**	**62.5%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		850,000	-	850,000	2,970,000	-	2,970,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**850,000**	**-**	**850,000**	**2,970,000**	**-**	**2,970,000**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (SISAGRO)		3,292,044	-	3,292,044	6,453,646	-	6,453,646	727,423	-	727,423	11.3%	3,143,355	-	3,143,355	48.7%	6,419,240	-	6,419,240	99.5%
	TOTAL - PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (SISAGRO)		**3,292,044**	**-**	**3,292,044**	**6,453,646**	**-**	**6,453,646**	**727,423**	**-**	**727,423**	**11.3%**	**3,143,355**	**-**	**3,143,355**	**48.7%**	**6,419,240**	**-**	**6,419,240**	**99.5%**
	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)		500,000	-	500,000	680,000	-	680,000	240,994	-	240,994	35.4%	240,994	-	240,994	35.4%	240,994	-	240,994	35.4%
	TOTAL - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)		**500,000**	**-**	**500,000**	**680,000**	**-**	**680,000**	**240,994**	**-**	**240,994**	**35.4%**	**240,994**	**-**	**240,994**	**35.4%**	**240,994**	**-**	**240,994**	**35.4%**
	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)		939,993	-	939,993	939,993	-	939,993	149,454	-	149,454	15.9%	149,454	-	149,454	15.9%	149,454	-	149,454	15.9%
	TOTAL - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)		**939,993**	**-**	**939,993**	**939,993**	**-**	**939,993**	**149,454**	**-**	**149,454**	**15.9%**	**149,454**	**-**	**149,454**	**15.9%**	**149,454**	**-**	**149,454**	**15.9%**
	PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)		1,806,000	-	1,806,000	1,806,000	-	1,806,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,225,429	-	1,225,429	67.9%
	TOTAL - PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)		**1,806,000**	**-**	**1,806,000**	**1,806,000**	**-**	**1,806,000**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**1,225,429**	**-**	**1,225,429**	**67.9%**
	Total general		**85,114,327**	**888,409,492**	**973,523,819**	**90,575,929**	**1,448,588,801**	**1,539,164,730**	**11,272,108**	**457,304,779**	**468,576,887**	**30.4%**	**16,760,690**	**784,372,268**	**801,132,958**	**52.0%**	**23,421,005**	**844,783,944**	**868,204,949**	**56.4%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	35%	70.0%	25%	25%	100%
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	5.00	42%	3.00	3.00	100%
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	12	3.00	25%	3.00	3.00	100%
	Oficinas de los nuevos prestadores de servicios de agua potable equipadas (personal, mobiliario y equipo instalado)	Oficina	6	-	-	-	-	-
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado. *	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	75.00	50%	-	-	-
	(PI)Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	75	50.00	67%	-	25.00	-
	(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	150.00	49%	-	-	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	10	4.00	40%	-	4.00	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	92.00	46%	-	-	-
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresarialidad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad alimentaria.	Beneficiarios	6750	2,150.00	32%	-	-	-
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores.	Planes	40	32.00	80%	18.00	10.00	56%
	Organizaciones de productores de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	40.00	67%	20.00	20.00	100%
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Productores promovidas en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	1,000.00	40%	1,000.00	1,000.00	100%
	Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de León o Caribe Hondureño.	Plan	40	32.00	80%	18.00	10.00	56%
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	83.00	138%	20.00	27.00	135%
	Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios.	Capacitaciones	445	295.00	66%	125.00	125.00	100%
	Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto	Plan	5	-	-	1.00	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores rurales en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño.	Capacitación	6	-	-	3.00	-	-
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	10%	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	10%	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado.	Porcentaje	1	-	-	50%	-	-
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	4.00	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Diseños finales de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	2.00	100%	-	-	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Informe	2	-	-	1.00	-	-
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidro climática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curaren actualizados.	Estudio	4	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	1.00	-	-

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	272	-	0%	272.00	-	0%
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilómetros	38	11.36	30%	19.70	5.22	26%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III)	Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	-	-	0%	-	-	0%
	Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	-	4	0%	-	-	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	-	-	0%	-	-	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	-	4	0%	-	-	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	-	-	0%	-	-	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	-	-	0%	-	-	0%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	-	-	0%	-	-	0%
	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	-	-	0%	-	-	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Tercer Trimestre 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
