SECRETARÍA DE FINANZAS

SNIPH
Sistema Nacional de Inversión Pública
DE HONDURAS



Proyecto de Construcción del Puente en la Carretera Nacional No.6

AGOSTO 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

INFORME DE EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA

www.sefin.gob.hn

Barrio El Jazmin, Ave. Miguel Cervantes

INFORME DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Agosto 2026

Secretaría de Finanzas (SEFIN) · Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

RESUMEN EJECUTIVO

Al 31 de agosto de 2026, la inversión pública nacional alcanzó un presupuesto vigente de **L48,065.7 millones**, con una ejecución acumulada de **L23,196.3 millones,** equivalente al **48.3%.** La Inversión Productiva registró una ejecución del **34.7%** de su presupuesto vigente (L15,785.0 millones), mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo alcanzó el 54.9% de su presupuesto vigente (L32,280.7 millones).

L 48,065.7 Millones Presupuesto Vigente	L 23,196.3 Millones Presupuesto Devengado	48.3 % Ejecución Global	75 Proyectos en Ejecución

EJECUCIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecutado
Inversión Productiva	**15,785.0**	**5,479.8**	**34.7%**
Bienes Capitalizables	*20,895.1*	*9,789.4*	*46.8%*
Transferencias de Capital	*11,385.6*	*7,927.1*	*69.6%*
Total Formación Bruta de Capital	**32,280.7**	**17,716.5**	**54.9%**
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**48,065.7**	**23,196.3**	**48.3%**

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), agosto 2026.

INVERSIÓN PRODUCTIVA INSTITUCIONAL

De las 23 instituciones que ejecutan fondos de Inversión Productiva, se listan a continuación todas las instituciones ordenadas de mayor a menor asignación presupuestaria. Secretaría de Infraestructura y Transporte registra la mayor asignación (L5,370.4 millones) y el mayor monto devengado (L2,852.1 millones), con una ejecución del 53.1%, seguida por Empresa Nacional de Energía Eléctrica, segunda mayor asignación, con devengado de L452.5 millones (22.6%). En conjunto, la Inversión Productiva concentra L15,785.0 millones del presupuesto vigente y L5,479.8 millones ejecutados (35%).

Inversión Productiva

Cifras en Millones de Lempiras


Institución	Vigente	Devengado	% Ejec.
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	5,370.4	2,852.1	53.1%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,004.4	452.5	22.6%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,526.3	593.0	38.9%
0060 - Secretaría de Salud	1,484.5	589.8	39.7%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	1,095.0	80.4	7.3%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	818.6	179.9	22.0%
0415 - Programa de la Red Solidaria	725.4	108.5	15.0%

Institución	Vigente	Devengado	% Ejec.
0050 - Secretaría de Educación	483.7	27.6	5.7%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	364.1	115.0	31.6%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	323.3	19.6	6.1%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	261.3	65.2	25.0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	191.8	122.3	63.8%
0180 - Registro Nacional de las Personas	185.9	5.5	3.0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	183.8	12.9	7.0%
1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central	160.3	45.8	28.6%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	149.2	51.8	34.7%
0070 - Secretaría de Seguridad	137.4	34.7	25.3%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	109.2	98.6	90.3%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	82.9	6.9	8.3%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	73.1	0.5	0.7%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	31.3	16.6	52.9%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	12.2	0.5	3.7%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	11.0	0.0	0.1%
TOTAL, INVERSIÓN PRODUCTIVA	**15,785.0**	**5,479.8**	**34.7%**

Fuente: SIAFI, agosto 2026.

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL POR SECTOR

La Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L48,065.7 millones**, donde los sectores de Carreteras (L13,573.0 millones), Descentralización (L10,898.8 millones), Modernización del Estado (L4,377.2 millones), Energía (L4,259.5 millones) concentran el 68.8% del presupuesto vigente. Los sectores con mayor ejecución respecto a su presupuesto vigente son Descentralización (72.5%), Carreteras (71.8%), Recursos Forestal y Ambiente (57.2%), Riego (43.6%) y Modernización del Estado (36.5%), Salud (30.5%), Agua y Saneamiento (27.1%). Estos resultados evidencian una ejecución diferenciada entre sectores y resaltan la importancia de focalizar el seguimiento en los sectores con mayor peso presupuestario.

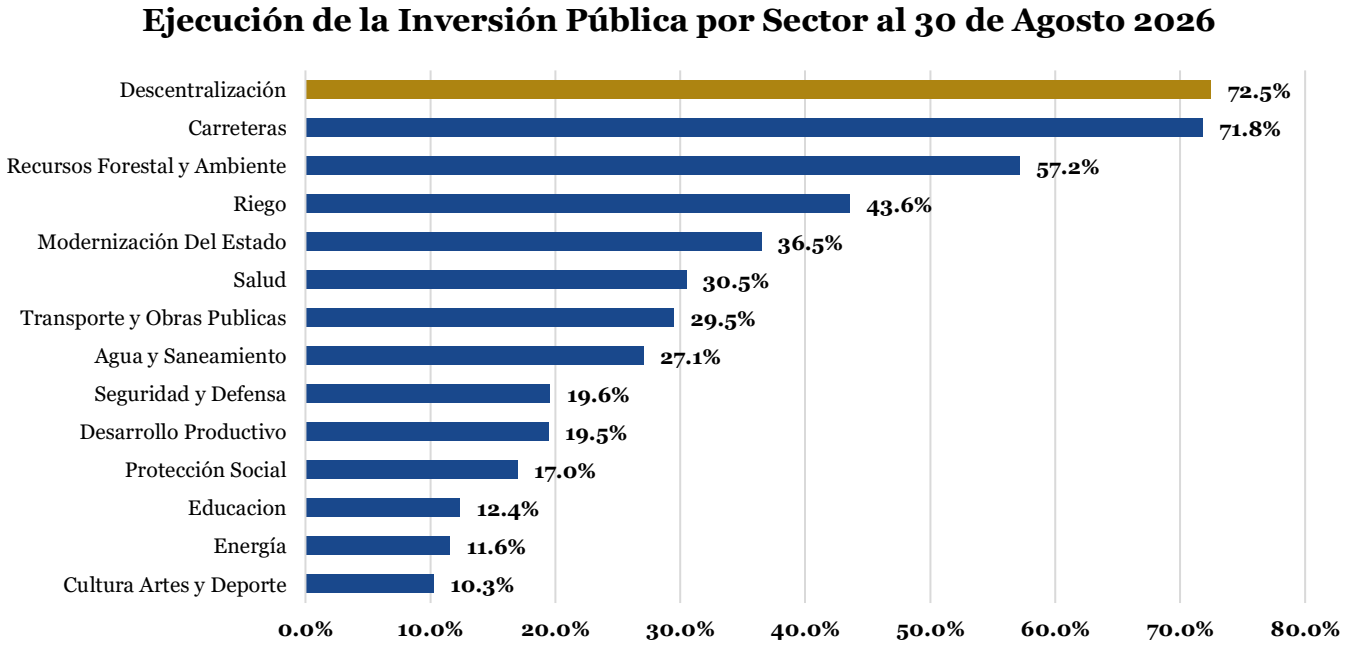

Fuente: SIAFI, agosto 2026.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PRODUCTIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Vigente (L M)	Devengado (L M)	% Ejecutado	%Participación
Tesoro Nacional	3,356.6	2,286.3	68.1%	21.3%
Recursos Propios	1,594.7	109.3	6.9%	10.1%
Crédito Externo	10,158.8	2,952.0	29.1%	64.4%
Donaciones Externas	674.9	132.1	19.6%	4.3%
TOTAL	**15,785.0**	**5,479.8**	**34.7%**	**100.00%**

Fuente: SIAFI, agosto 2026.

SECTORES/PROYECTOS DESTACADOS POR EJECUCIÓN FÍSICA DURANTE EL MES DE AGOSTO

Sector Carreteras: 77.4 km construidos y rehabilitados a nivel nacional (58% de la meta de 120.43 Km), a nivel nacional por medio de proyectos de inversión pública (Programa 11 – Construcción de Carreteras y Programa 12 – Rehabilitación de Carreteras). De igual forma, durante el trimestre, se realizó el mantenimiento de 174.6 kilómetros de carretera en la red vial pavimentada, 7,640 metros cúbicos de obras para el control de inundaciones en el Valle de Sula y 43.4 kilómetros de obras urbanas a nivel nacional.

Sector Salud: Resaltan 3 Hospitales ejecutados por la Secretaría de Salud con Crédito Externo (BCIE)-(BID)

- Hospital de Choluteca: 97.45% de avance en Preinversión, 55.80% en Construcción y 13.76% en Equipamiento (BCIE).
- Hospital San Isidro, Tocoa: 100% de avance en Preinversión, 22.77% en Construcción (BCIE) y 0% en equipamiento.
- Hospital de Roatán: 44.03% de avance de obra; etapa de equipamiento aún sin iniciar (BID).

Sector Energía:

- Avances en la ampliación y modernización de infraestructura de líneas de transmisión, rehabilitación de centrales hidroeléctricas y fortalecimiento de capacidades operativas.

GESTIÓN DE PREINVERSIÓN

La Dirección General de Inversiones Públicas en el marco de lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes en sus artículos 147 y 148 informa que al mes de agosto del 2026 se emitieron dos Notas de Prioridad, 22 Enmiendas a proyectos de inversión pública. Asimismo, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Presupuesto en su artículo 58 numeral 6, se han capacitado de forma presencial 4 personas y de forma virtual 16 personas, totalizando en personas capacitadas en el mes de agosto de 2026, 20 personas.

BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS

Durante agosto de 2026, la Unidad del Banco Integrado de Proyectos garantizó la disponibilidad y óptima operatividad del SNIPH para el registro continuo de información. En este período, se brindaron 3 asistencias técnicas enfocadas en el registro, formulación y actualización de proyectos tanto nuevos como en ejecución. Asimismo, se atendieron con un 100% de efectividad 5 solicitudes para la gestión y modificación de usuarios, y se resolvieron 8 casos de incidentes y soporte técnico en la plataforma mediante oficios, revisión de interfaces y sesiones de coordinación técnica, asegurando la continuidad operativa del Sistema.

FACTORES QUE LIMITAN LA EJECUCION DE LA INVERSIÓN PUBLICA

- La Inversión Productiva registra una ejecución acumulada de 34.7% (L5,479.8 millones de un presupuesto vigente de L15,785.0 millones), reflejando un ritmo de ejecución inferior al requerido para alcanzar las metas anuales de inversión.
- Persisten brechas significativas de desempeño entre instituciones ejecutoras, observándose niveles de ejecución inferiores al 25% en entidades con asignaciones presupuestarias relevantes, lo que limita la materialización oportuna de los resultados programados.

- La limitada ejecución de los recursos financiados con Crédito Externo (29.1%), que representan el 64.4% del presupuesto vigente de la Inversión Productiva, continúa incidiendo en el desempeño general de la cartera de proyectos.
- La baja ejecución de Recursos Propios (6.9%) y Donaciones Externas (19.6%) evidencia retrasos en la implementación de actividades y proyectos financiados bajo estas modalidades.
- Persisten retrasos en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, asociados a procesos de contratación, adquisiciones, gestión de permisos, liberación de derechos de vía y coordinación interinstitucional.
- La concentración del presupuesto en sectores estratégicos como carreteras, energía, descentralización y modernización del Estado requiere fortalecer los mecanismos de seguimiento y gestión para acelerar la ejecución durante el último cuatrimestre del ejercicio fiscal.

CONCLUSIONES

Al 31 de agosto de 2026, el Plan de Inversión Pública registra una ejecución global de 48.3%, equivalente a L23,196.3 millones de un presupuesto vigente de L48,065.7 millones. La Inversión Productiva alcanzó una ejecución de 34.7% (L5,479.8 millones), mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo registró una ejecución de 54.8% (L17,716.5 millones), impulsando el desempeño global de la inversión pública.

A nivel sectorial, los sectores de Carreteras, Descentralización, Modernización del Estado y Energía concentran aproximadamente el 69% del presupuesto vigente, por lo que su desempeño continuará siendo determinante para el cumplimiento de las metas de inversión pública al cierre del ejercicio fiscal.

En relación con las fuentes de financiamiento de la Inversión Productiva, el Crédito Externo concentra el 64.4% del presupuesto vigente (L10,158.8 millones), pero registra una ejecución de apenas 29.1%, constituyéndose en la principal área de atención para acelerar la ejecución. Por su parte, los recursos provenientes del Tesoro Nacional presentan una ejecución de 68.1%, mientras que Recursos Propios (6.9%) y Donaciones Externas (19.6%) muestran los menores niveles de avance financiero.

Recomendación

1. Intensificar el seguimiento a los proyectos financiados con crédito externo, priorizando la identificación y resolución oportuna de cuellos de botella asociados a los procesos de adquisiciones, contratación y gestión de no objeciones ante los organismos financiadores. Asimismo, promover el desarrollo de sesiones técnicas de coordinación entre las Unidades Ejecutoras, los organismos financiadores y la SEFIN, orientadas a identificar las principales restricciones que afectan la ejecución, definir acciones correctivas, establecer compromisos y dar seguimiento a su cumplimiento. De igual manera, fortalecer la coordinación con las instituciones ejecutoras para mejorar el desempeño de los recursos provenientes de crédito externo, recursos propios y donaciones externas, con el propósito de incrementar la ejecución física y financiera de la cartera durante el último cuatrimestre de 2026 y asegurar el cumplimiento de las metas programadas.
2. Se reitera que las Unidades Ejecutoras (UE), en su calidad de responsables directas de la gestión, contratación y ejecución de los proyectos de inversión pública, deben garantizar el cumplimiento de la programación presupuestaria y de las metas físicas y financieras establecidas en sus respectivos Planes Operativos Anuales (POA) para el ejercicio fiscal 2026. En este sentido, deberán fortalecer sus mecanismos de seguimiento y control, identificar oportunamente las desviaciones respecto a lo programado e implementar las acciones correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de inversión pública.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Inversión Pública Total, Año 2026

(Cifras en Lempiras)

Descrip. Sub-Sector IP	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Pago Aprobado	Compromiso Aprobado	% Comp. (Comp./ Vig.)
AGROFORESTAL Y TURISMO	**27,961,010**	**518,835**	**1.9%**	**518,835**	**5,970,345**	**21.4%**
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	27,961,010	518,835	1.9%	518,835	5,970,345	21.4%
AGUA Y SANEAMIENTO	**628,732,981**	**170,202,617**	**27.1%**	**169,772,756**	**309,492,030**	**49.2%**
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	10,829,246	2,154,479	19.9%	2,154,479	2,171,016	20.0%
0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	549,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	266,559,255	107,569,397	40.4%	107,408,197	149,147,479	56.0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	179,117,786	13,313,845	7.4%	13,313,845	13,725,860	7.7%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	11,364,216	1,320,222	11.6%	1,320,222	1,320,222	11.6%
1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central	160,313,478	45,844,675	28.6%	45,576,014	143,127,453	89.3%
CARRETERAS	**13,537,039,505**	**9,725,491,680**	**71.8%**	**9,540,102,971**	**10,001,257,381**	**73.9%**
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	13,537,039,505	9,725,491,680	71.8%	9,540,102,971	10,001,257,381	73.9%
COMUNICACIONES	**59,730,722**	**7,185,074**	**12.0%**	**7,161,010**	**7,185,074**	**12.0%**
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	36,460,722	6,738,138	18.5%	6,714,074	6,738,138	18.5%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	22,270,000	392,164	1.8%	392,164	392,164	1.8%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	1,000,000	54,772	5.5%	54,772	54,772	5.5%
CULTURA, ARTES Y DEPORTES	**1,121,129,629**	**115,352,993**	**10.3%**	**114,855,095**	**130,391,518**	**11.6%**
0404 - Dirección General de Cinematografía	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	68,167,679	16,571,028	24.3%	16,571,028	29,864,577	43.8%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	965,829,837	89,812,543	9.3%	89,314,644	91,557,518	9.5%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	76,132,113	5,910,986	7.8%	5,910,986	5,910,986	7.8%
0510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	11,000,000	3,058,437	27.8%	3,058,437	3,058,437	27.8%
DESARROLLO PRODUCTIVO	**1,761,459,615**	**343,094,158**	**19.5%**	**336,653,882**	**358,505,986**	**20.4%**
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	84,273,247	23,842,212	28.3%	23,551,262	24,058,138	28.5%
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	2,132,746	0	0.0%	0	0	0.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	628,192,825	208,054,927	33.1%	201,920,481	221,906,431	35.3%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	721,920,000	2,010,607	0.3%	2,010,607	2,102,607	0.3%
0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	10,310,000	3,911,150	37.9%	3,911,150	5,111,359	49.6%
0290 - Secretaría de Desarrollo Economico	10,105,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0500 - Instituto Nacional Agrario	300,525,797	104,873,739	34.9%	104,858,858	104,873,739	34.9%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	4,000,000	401,523	10.0%	401,523	453,712	11.3%
DESCENTRALIZACION	**10,898,840,886**	**7,906,664,348**	**72.5%**	**6,427,461,210**	**7,906,664,348**	**72.5%**
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	10,898,840,886	7,906,664,348	72.5%	6,427,461,210	7,906,664,348	72.5%
EDUCACION	**1,699,754,912**	**210,710,297**	**12.4%**	**129,144,619**	**225,025,548**	**13.2%**
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	55,095,857	12,347,561	22.4%	12,339,719	12,687,561	23.0%
0050 - Secretaría de Educación	630,454,243	47,020,435	7.5%	39,246,576	60,432,719	9.6%
0415 - Programa de la Red Solidaria	30,037,698	21,831,722	72.7%	21,831,722	22,394,688	74.6%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	111,271,328	16,070,420	14.4%	16,070,420	16,070,420	14.4%
0504 - Instituto de Crédito Educativo	240,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	55,284,026	4,270,534	7.7%	3,630,637	4,270,534	7.7%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras	194,415,083	3,214,971	1.7%	3,214,971	3,214,971	1.7%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	4,976,725	970,790	19.5%	970,790	970,790	19.5%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	617,979,952	104,983,866	17.0%	31,839,785	104,983,866	17.0%
ENERGIA	**4,259,527,609**	**493,119,744**	**11.6%**	**487,650,001**	**742,352,519**	**17.4%**
0153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica	12,803,758	230,495	1.8%	230,495	230,495	1.8%
0310 - Secretaría de Energía	175,956,671	4,896,055	2.8%	4,576,880	5,046,694	2.9%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	4,070,767,180	487,993,194	12.0%	482,842,626	737,075,331	18.1%
MODERNIZACION DEL ESTADO	**4,377,187,542**	**1,596,236,069**	**36.5%**	**1,162,285,445**	**2,543,612,509**	**58.1%**
0002 - Tribunal Superior de Cuentas	10,066,000	5,330,300	53.0%	3,395,300	5,330,300	53.0%
0004 - Consejo Nacional Electoral	33,964,609	21,219,402	62.5%	11,208,451	21,219,402	62.5%
0005 - Tribunal de Justicia Electoral	427,700	35,600	8.3%	35,600	35,600	8.3%
0010 - Poder Judicial	920,617,000	900,000,000	97.8%	497,859,877	900,000,000	97.8%
0024 - Instituto de la Propiedad	124,650,244	4,379,279	3.5%	4,364,196	4,792,200	3.8%
0030 - Secretaría de la Presidencia	860,000	361,968	42.1%	361,968	361,968	42.1%
0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública	11,000,000	1,491,120	13.6%	454,515	1,504,718	13.7%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	212,755,515	64,164,635	30.2%	64,145,453	72,234,901	34.0%
0041 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0043 - Empresa Nacional de Artes Gráficas	840,000	34,850	4.1%	34,850	34,850	4.1%
0045 - Instituto Nacional de Migración	104,783,000	13,349,666	12.7%	12,725,623	15,378,614	14.7%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	10,600,000	3,000,000	28.3%	3,000,000	4,922,475	46.4%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	7,650,000	1,713,800	22.4%	1,713,800	2,276,564	29.8%
0100 - Secretaría de Finanzas	101,791,161	2,738,701	2.7%	2,738,701	15,618,345	15.3%
0121 - Dirección General de la Marina Mercante	14,492,480	786,295	5.4%	786,295	786,295	5.4%
0180 - Registro Nacional de las Personas	282,249,682	50,113,216	17.8%	41,535,524	53,841,539	19.1%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Inversión Pública Total, Año 2026

(Cifras en Lempiras)

Descrip. Sub-Sector IP	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Pago Aprobado	Compromiso Aprobado	% Comp. (Comp./ Vig.)
0190 - Ministerio Público	294,721,239	187,410,146	63.6%	187,410,146	187,410,146	63.6%
0200 - Procuraduría General de la República	13,400,000	10,548,832	78.7%	10,548,832	10,548,832	78.7%
0290 - Secretaría de Desarrollo Economico	4,657,300	2,138,284	45.9%	2,092,976	2,155,014	46.3%
0300 - Secretaria de Derechos Humanos	1,924,500	344,947	17.9%	344,947	794,600	41.3%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	344,560,898	65,247,113	18.9%	56,311,445	108,531,641	31.5%
0405 - Unidad Especial de Protección	5,000,000	5,000,000	100.0%	5,000,000	5,000,000	100.0%
0407 - Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0408 - Secretaría de Planificación Estratégica	1,267,093	1,130,471	89.2%	822,167	1,130,471	89.2%
0409 - Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	391,098,674	116,089,011	29.7%	116,044,902	180,319,416	46.1%
0418 - Administración Nacional de Servicio Civil	1,432,744	139,032	9.7%	139,032	139,032	9.7%
0422 - Oficina Presidencial de Comercio Exterior	5,590,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	9,150,000	841,487	9.2%	841,487	841,487	9.2%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	1,100,129,840	81,376,361	7.4%	81,376,361	890,868,782	81.0%
0514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia	3,436,000	77,967	2.3%	77,967	77,967	2.3%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	73,606,231	551,104	0.7%	292,548	834,869	1.1%
0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	45,890,000	2,884,001	6.3%	2,884,001	2,884,001	6.3%
0902 - Banco Central de Honduras	147,939,267	46,130,026	31.2%	46,130,026	46,130,026	31.2%
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	75,500,000	6,925,395	9.2%	6,925,395	6,925,395	9.2%
0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros	21,136,365	683,058	3.2%	683,058	683,058	3.2%
PROTECCION SOCIAL	**1,805,495,024**	**306,617,668**	**17.0%**	**302,539,331**	**323,133,309**	**17.9%**
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	902,424	0	0.0%	0	0	0.0%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	98,494,585	16,728,668	17.0%	16,728,668	16,728,668	17.0%
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc	30,000	30,000	100.0%	30,000	30,000	100.0%
0026 - Instituto Nacional de la Juventud	150,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0030 - Secretaría de la Presidencia	34,000,000	2,314,184	6.8%	302,205	2,439,107	7.2%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	107,158,799	215,200	0.2%	215,200	215,200	0.2%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	5,000,000	1,181,731	23.6%	860,191	2,086,551	41.7%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	95,161,840	7,406,444	7.8%	7,020,056	11,469,320	12.1%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	1,700,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	300,000	80,860	27.0%	42,105	80,860	27.0%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	26,799,099	6,521	0.0%	6,521	51,049	0.2%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	26,616,616	741,239	2.8%	738,180	744,884	2.8%
0415 - Programa de la Red Solidaria	341,660,411	46,099,921	13.5%	44,783,305	56,965,375	16.7%
0417 - Programa de Acción Solidaria	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia	9,328,000	806,874	8.7%	806,874	1,316,269	14.1%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.	2,500,000	59,998	2.4%	59,998	59,998	2.4%
0508 - Patronato Nacional de la Infancia	4,753,050	618,626	13.0%	618,626	618,626	13.0%
0516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	2,000,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	306,818,613	9,258,802	3.0%	9,258,802	9,258,802	3.0%
0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	100,000,000	5,500,792	5.5%	5,500,792	5,500,792	5.5%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	122,000,000	6,231,653	5.1%	6,231,653	6,231,653	5.1%
0604 - Instituto de Previsión Militar	500,000,000	208,810,690	41.8%	208,810,690	208,810,690	41.8%
0605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras	9,533,851	509,476	5.3%	509,476	509,476	5.3%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	10,587,736	15,990	0.2%	15,990	15,990	0.2%
RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	**220,447,286**	**126,199,147**	**57.2%**	**64,768,169**	**126,343,981**	**57.3%**
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	198,080,620	125,215,072	63.2%	63,784,094	125,215,072	63.2%
0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas	21,216,666	653,172	3.1%	653,172	798,005	3.8%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	1,150,000	330,903	28.8%	330,903	330,903	28.8%
RIEGO	**644,262,650**	**280,927,057**	**43.6%**	**255,913,684**	**303,781,933**	**47.2%**
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	644,262,650	280,927,057	43.6%	255,913,684	303,781,933	47.2%
SALUD	**2,228,473,147**	**678,966,263**	**30.5%**	**658,304,362**	**965,749,849**	**43.3%**
0060 - Secretaría de Salud	1,833,414,376	634,579,691	34.6%	613,917,790	859,132,865	46.9%
0062 - Agencia de Regulación Sanitaria	41,397,450	3,833,571	9.3%	3,833,571	3,833,571	9.3%
0415 - Programa de la Red Solidaria	353,661,321	40,553,002	11.5%	40,553,002	102,783,413	29.1%
SEGURIDAD Y DEFENSA	**1,425,246,369**	**278,870,622**	**19.6%**	**163,937,237**	**319,341,679**	**22.4%**
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	142,666,062	10,124,095	7.1%	10,124,095	10,688,095	7.5%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	261,468,370	6,305,572	2.4%	6,012,406	6,307,785	2.4%
0046 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	16,605,408	954,807	5.7%	501,908	1,012,706	6.1%
0070 - Secretaría de Seguridad	504,377,516	61,144,347	12.1%	59,028,479	100,991,291	20.0%
0072 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	6,694,875	45,978	0.7%	45,978	45,978	0.7%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Inversión Pública Total, Año 2026

(Cifras en Lempiras)

Descrip. Sub-Sector IP	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Pago Aprobado	Compromiso Aprobado	% Comp. (Comp./ Vig.)
0090 - Secretaría de Defensa Nacional	493,434,138	200,295,823	40.6%	88,224,370	200,295,823	40.6%
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	**3,231,979,281**	**952,007,792**	**29.5%**	**868,249,490**	**970,154,240**	**30.0%**
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	547,939,216	174,924,775	31.9%	164,826,313	187,773,865	34.3%
0102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	105,202,094	19,462,691	18.5%	14,623,245	19,462,691	18.5%
0123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	8,707,655	3,425,027	39.3%	3,425,027	7,545,861	86.7%
0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	1,989,978,787	727,604,755	36.6%	658,858,761	728,328,665	36.6%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	11,476,838	0	0.0%	0	0	0.0%
0420 - Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico	3,740,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	564,184,691	26,416,404	4.7%	26,342,004	26,869,017	4.8%
0808 - Ferrocarril Nacional de Honduras	750,000	174,140	23.2%	174,140	174,140	23.2%
VIVIENDA	**138,432,014**	**4,115,093**	**3.0%**	**2,579,280**	**4,150,743**	**3.0%**
0033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos	1,500,000	0	0.0%	0	0	0.0%
0421 - Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos	136,932,014	4,115,093	3.0%	2,579,280	4,150,743	3.0%
TOTAL GENERAL INVERSIÓN PÚBLICA	**48,065,700,182**	**23,196,279,458**	**48.3%**	**20,691,897,375**	**25,243,112,992**	**52.5%**

Nota: Fuente de información del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) al 31/08/26
