



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Finanzas***  
***(SEFIN)***

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 50% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:


Dicho presupuesto, está conformado por 12 proyectos financiados en 93% (L.410,112,042) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6 y el restante 7% (L. 29,984,351) con Fondos Nacionales como contraparte nacional y municipal asignada a los diferentes programas y proyectos.

Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016  
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	310,457,995
Presupuesto Vigente	440,096,393
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	440,096,393
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	200,721,512
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>46%</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	304,396,609
<b>% Ejecución (Comprometido/ Vigente Ajustado)</b>	<b>69%</b>

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

Gráfico No. 6  
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo  
Cifras en Lempiras

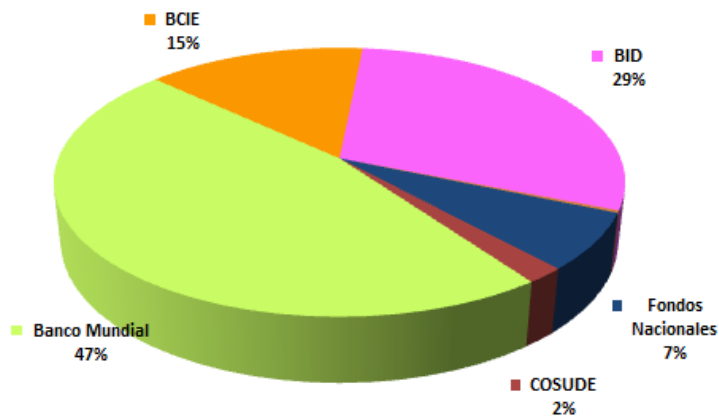

Durante el segundo trimestre del año 2016, se ha logrado comprometer el 69% (L.304,396,609) de los recursos asignados; así mismo, se reporta una ejecución a nivel de devengado de 46% (L.200,721,512) como producto de compromisos contractuales suscritos y pagos realizados a la fecha.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre-2016

#### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para la SEFIN, contempla la ejecución de 12 programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos para la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero.

En ese sentido y considerando que el 93% del presupuesto vigente de la institución para el año 2016, se concentra en 5 programas y proyectos, los mismos se han definido como principales proyectos en los cuales, un atraso en su ejecución repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la institución. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	IDA- 5270-HN	US\$	10,000,000	12/07/2013 31/12/2016
		Lempiras	231,384,000	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	129,411,522	116,884,023	30,393,635	26.0
Acumulado al II Trimestre 2016	129,411,522	116,884,023	43,420,855	37.1
Acumulado Vida del Proyecto */	231,384,000	231,384,000	107,937,505	46.6
<b>Observaciones:</b>				
<p>Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP deberá gestionar movimientos internos a fin de lograr priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias; así mismo, se esperaba la gestión por parte de la UCP para lograr comprometer los recursos antes del cierre fiscal del BM para cumplir con la meta del Proyecto.</p> <p>Se requiere la incorporación por L.43,500,000 para atender compromisos suscritos en ambas operaciones y lograr el cierre al finalizar el año 2016</p> <p>Al II trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI:  15 contratos suscritos para apoyo con las herramientas de las empresas prestadoras de servicios (EPS).  14 contratos de apoyo al sector agua potable y saneamiento (SANAA, CONASA, ERSAPS)  10 Apoyo en la Inversión para rehabilitación y expansión de los servicios de agua y saneamiento en las Municipalidades  1 contrato para la mejora en la coordinación de la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/09/2017
		Lempiras	6,478,752,000	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	92,532,021	64,471,977	52,342,784	81.2
Acumulado al II Trimestre 2016	92,532,021	64,471,977	54,699,541	84.8
Acumulado Vida del Proyecto */	6,478,752,000	6,478,752,000	730,976,356	11.3
<b>Observaciones:</b>				
<p>Se requiere la incorporación por L.59,188,569 para atender parcialmente compromisos suscritos; adicionalmente se cuenta con pagos pendientes de regularizar de pagos se realizó un pago directo por parte del BCIE al Proyecto Trasvase Laureles - Concepción ejecutado por el SANAA por un monto de \$1,748,603.03 debido a la falta de espacio presupuestario.</p> <p>Al II trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI:  1 contrato para la construcción de pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo.</p> <p>Las cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	27/09/2010 29/04/2016
		Lempiras	691,667,283	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	48,661,997	70,663,859	7,194,263	10.2
Acumulado al II Trimestre 2016	48,661,997	70,663,859	28,523,980	40.4
Acumulado Vida del Proyecto */	661,758,240	691,667,283	500,455,419	72.4
<b>Observaciones:</b>				
Se encuentra en proceso la extensión al plazo de ejecución del Programa al 29/04/2017, considerando los plazos de ejecución para el Componente I - Administración tributaria y aduanera, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente.				
Se requiere la incorporación por L.19,600,035 para atender parcialmente compromisos suscritos.				
Al II trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI:				
2 contratos de apoyo para la implementación en Municipios con SAMI.				
2 contratos suscritos para mejorar la infraestructura de las aduanas.				
5 contratos para la mejora en los ingresos tributarios.				
8 contratos para la sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI e incremento de la capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS	BID 2467/BL-HO	US\$	10,000,000	15/12/2010 30/06/2016
		Lempiras	231,384,000	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	33,794,414	61,040,226	27,902,942	45.7
Acumulado al II Trimestre 2016	33,794,414	61,040,226	42,179,214	69.1
Acumulado Vida del Proyecto */	231,384,000	231,384,000	150,127,500	64.9
<b>Observaciones:</b>				
Se encuentra en proceso la extensión al plazo de ejecución del Programa al 31/03/2017 para último desembolso, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente.				
Se requiere la incorporación por L.47,487,175 para atender parcialmente compromisos suscritos.				
Al II trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI:				
1 contrato para la realización de auditoría al proyecto.				
3 contratos para la instalación del Data Center de respaldo.				
8 contratos para la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$	19,583,815,940	17/09/2008
		Lempiras	453,138,166,746	31/12/2016
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	-	97,846,117	15,255,446	15.6
Acumulado al II Trimestre 2016	-	97,846,117	21,148,001	21.6
Acumulado Vida del Proyecto */	453,138,166,746	453,138,166,746	446,595,738	0.1
<b>Observaciones:</b>				
Proyecto Activo, en la actualidad se encuentra en proceso auditoría de Cumplimiento legal de las OPR's (Proceso de Adquisiciones) del periodo de 2012 al 2016 y auditoría financiera para los periodos de 2015 y 2016.				
Se aprobaron Nuevos Planes de Negocios (5) a través del Consejo evaluador del Proyecto por un Monto de L. 10.8 millones en fecha 10 de mayo de 2016.				
En preparación el Proceso para el levantamiento de información de productos a nivel de productores miembros de las OPR's.				
Al II trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI: 2 contratos otorgados para ejecutar planes de negocios. 40 contratos suscritos para realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de negocio.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Ajustes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) relacionados a la formulación presupuestaria.
- Revisión y ajustes relacionados a la evaluación mensual de los programas y proyectos.
- Revisión de Cartera Técnica Proyectos Banco Mundial (Proyecto de Inversión del Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS)/ Financiamiento Adicional (IDA 4335/ IDA 5270) y Competitividad Rural (COMRURAL) (IDA 4465).
- Se emitió Dictamen Técnico para la Modificación del Plan Global de Inversiones (PGI) al Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social – BCIE 2045
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación de plazo de ejecución y último desembolso al Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID 2032/BL-HO).
- Ratificación a la fecha de cierre al Programa de Desarrollo Agroempresarial para Pequeños y Medianos Productores de Palma Africana- PROPALMA (BCIE- 1711-HO), manteniendo la vigencia del Dictamen Técnico No. 0139-2015.
- Se emitió Dictamen Técnico para la extensión al Plazo de último desembolso al Proyecto Mejoramiento de la gestión pública: Presupuesto y Crédito Público (ATN/OC-13582-HO).
- Se llevó a cabo reunión con la unidad ejecutora de PROMOSAS para tratar el tema relacionado a la disponibilidad presupuestaria y requerimientos de incremento al techo de proyectos en cierre.

Ejecución al II Trimestre 2016; Secretaría de Finanzas

- Análisis y elaboración de Nota Técnica No. 3 para la incorporación de Fuentes Externas (22, 23 y Otras Fuentes), donde se incluyó a los proyectos Proyecto Mejoramiento de la gestión pública: Presupuesto y Crédito Público (ATN/OC-13582-HO) por L.1,079,111, Proyecto de Competitividad Rural en Honduras – COMRURAL (Donación COSUDE) por L.5,656,500 y Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID 2032) por L.1,260,000. Autorizada y procesada en el SIAFI.
- Emisión de Dictamen a Modificaciones en SIAFI.
- Asistencia y participación en la videoconferencia para la socialización del Manual de Contingencias Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CCRE) y Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI), en el Banco Mundial coordinada por COPECO.

### Conclusiones

- Al segundo trimestre, la SEFIN presenta una ejecución financiera aceptable de 46% (L.200,721,512), considerando el avance de las operaciones, proyectos que finalizaron y los proyectos que se encuentran realizando sus actividades para efectuar su cierre al finalizar el año 2016.
- 
- Falta de identificación de mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.

### Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- 
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
12	0100 - Secretaría de Finanzas			-	310,457,995	310,457,995	29,984,351	410,112,042	440,096,393	-	-	-	29,984,351	410,112,042	440,096,393	6,854,684	132,576,947	139,431,630	10,352,719	190,368,793	200,721,512	46	11,880,592	292,516,017	304,396,609	69
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	ATN/OC-12691-HO	25/03/2011 29/01/2016	-	1,155,000	1,155,000	-	6,516,725	6,516,725	-	-	-	-	6,516,725	6,516,725	-	3,412,721	3,412,721	-	5,154,272	5,154,272	79	-	5,163,026	5,163,026	79
2	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013 18/07/2016	-	-	-	-	2,805,000	2,805,000	-	-	-	-	2,805,000	2,805,000	-	626,546	626,546	-	626,546	626,546	22	-	626,546	626,546	22
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270- HN	12/07/2013 31/12/2016	-	129,411,522	129,411,522	6,000,000	110,884,023	116,884,023	-	-	-	6,000,000	110,884,023	116,884,023	1,735,295	28,658,340	30,393,635	2,100,170	41,320,685	43,420,855	37	3,339,563	90,959,181	94,298,744	81
4	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	IDA-5020-HN	07/12/2011 30/06/2016	-	-	-	-	1,077,600	1,077,600	-	-	-	-	1,077,600	1,077,600	-	3,711	3,711	-	3,711	3,711	0	-	3,711	3,711	0
5	MODERNIZACION DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/ BL-HO	15/12/2010 31/03/2017	-	33,794,414	33,794,414	-	61,040,226	61,040,226	-	-	-	-	61,040,226	61,040,226	-	27,902,942	27,902,942	-	42,179,214	42,179,214	69	-	48,972,673	48,972,673	80
6	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010 31/12/2017	-	92,532,021	92,532,021	-	64,471,977	64,471,977	-	-	-	-	64,471,977	64,471,977	-	52,342,784	52,342,784	-	54,699,541	54,699,541	85	-	57,280,727	57,280,727	89
7	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	15/10/2008 29/04/2017	-	48,661,997	48,661,997	19,927,630	50,736,229	70,663,859	-	-	-	19,927,630	50,736,229	70,663,859	2,519,625	4,674,638	7,194,263	5,336,621	23,187,359	28,523,980	40	5,336,621	44,412,534	49,749,155	70
8	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008 31/12/2016	-	-	-	3,229,571	94,616,546	97,846,117	-	-	-	3,229,571	94,616,546	97,846,117	1,933,265	13,322,180	15,255,446	2,166,583	18,981,418	21,148,001	22	2,455,063	40,881,572	43,336,635	44
9	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	22/02/2008 31/12/2016	-	-	-	827,150	5,500,000	6,327,150	-	-	-	827,150	5,500,000	6,327,150	666,498	-	666,498	749,345	110,990	860,335	14	749,345	110,990	860,335	14
10	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA: PRESUPUESTO Y CREDITO PUBLICO	ATN/OC-13582-HO	06/03/2013 31/12/2016	-	2,328,041	2,328,041	-	7,849,367	7,849,367	-	-	-	-	7,849,367	7,849,367	-	956,230	956,230	-	1,192,480	1,192,480	15	-	1,192,480	1,192,480	15
11	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION DEL CONGRESO NACIONAL	IDF Grant No. TF011581	01/02/2012 31/12/2016	-	2,575,000	2,575,000	-	2,250,987	2,250,987	-	-	-	-	2,250,987	2,250,987	-	550,606	550,606	-	1,580,360	1,580,360	70	-	1,580,360	1,580,360	70
12	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATN/OC-13585-HO	06/03/2013 06/03/2016	-	-	-	-	2,363,362	2,363,362	-	-	-	-	2,363,362	2,363,362	-	126,248	126,248	-	1,332,217	1,332,217	56	-	1,332,217	1,332,217	56

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 5

**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016**

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec.	Cantidad	Cantidad	% Ejec.
100-Secretaría de Finanzas	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	Auditoria y evaluación realizadas	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		Planes de desarrollo institucional diseñados e implementados	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA IMPLEMENTADA	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		FORTALECIMIENTO REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	Apoyadas con las Herramientas las EPS (Empresas Prestadoras de Servicio) mejorando su eficiencia y	CONTRATO	15	15	100	0	0	0
		Apoyadas las instituciones del sector (Sanaa, Conasa y Ersaps)	CONTRATO	14	14	100	0	0	0
		Apoyo en la Inversión para Rehabilitación y Expansión de las (SAS) en las Municipalidades	CONTRATO	10	10	100	0	0	0
		Coordinación Mejorada la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	AUDITORÍA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	Auditoria realizada	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Data center de respaldo instalado	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
		Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	CONTRATO	8	8	100	0	0	0
	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	Arboles en la subcuenca del Rio Guacerique producidos y plantados	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		Pozos de agua construidos	CONTRATO	1	2	200	0	1	0
		SISTEMA DE AGUA AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		Sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa ampliado y mejorado	CONTRATO	2	0	0	0	0	0
		Subsistemas los laureles fortalecidos	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	Controles en la fiscalización de tributos internos aplicados	CONTRATO	9	0	0	0	0	0
		Infraestructura de las aduanas mejorada	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
Ingresos tributarios mejorados		CONTRATO	5	5	100	0	0	0	
Municipios con SAMI implementado		CONTRATO	37	39	105	0	2	0	



**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016**

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec.	Cantidad	Cantidad	% Ejec.
100-Secretaría de Finanzas	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI incrementada	CONTRATO	8	8	100	0	0	0
	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	20	2	10	20	2	10
	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	APOYO MUNICIPAL IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	1	100	1	1	100
		APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	3	0	0	3	0	0
	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	Auditoria realizada-2	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Diseño de un programa de fortalecimiento del area de programación y monitoreo de ingresos presupuestarios elaborado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Estructuras programaticas del presupuesto revisadas y actualizadas	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		Manuales y clasificadores del sistema presupuestario revisados y actualizados	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Modulo para las unidades ejecutoras de préstamos con financiamiento externo UEPEX/SIAFI mejorado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Programa de capacitacion en temas presupuestarios y de planificacion realizado	CONTRATO	2	1	50	1	0	0
		Programa para el fortalecimiento de la DGCP implementado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	Auditoria realizada-3	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
		Calidad del suministro de información para los miembros del Congreso y de las comisiones aumentada	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		Congreso más eficiente, oportuno y transparente	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	Transparencia y rendición de cuentas del Congreso incrementada	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		Auditoria realizada	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		GERENCIA TÉCNICA FORTALECIDA	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		PLAN DE CARRERA REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	1	0	0	
