



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 58% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el Año 2016 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Dicho presupuesto, está conformado por 13 proyectos financiados en un 92% (L.547,391,444) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6 y el restante 8% (L.46,953,597) con Fondos Nacionales como contraparte nacional y municipal asignada a los diferentes programas y proyectos.

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	310,457,995
Presupuesto Vigente	596,774,921
Congelamiento	2,429,880
Presupuesto Vigente Ajustado	594,345,041
Ejecutado IV Trimestre	248,220,268
% Ejecución IV Trimestre	42%
Total Ejecución Acumulada Anual	560,539,374
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	94%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	94%

Fuente: SIAFI

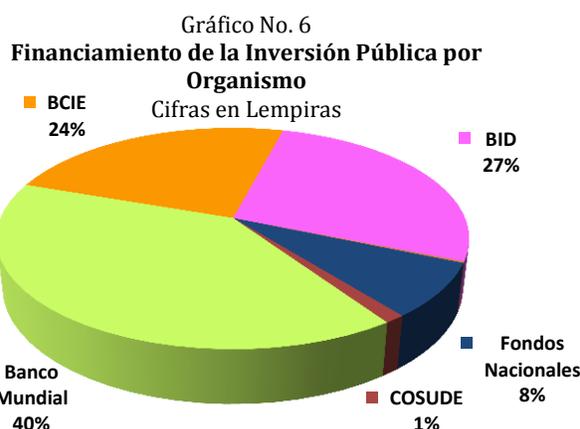

Durante el año 2016, se alcanzó un nivel de ejecución del 94% (L.560,539,374) en relación al presupuesto Vigente Ajustado que totalizó los L. 594,345,041; dicha ejecución como resultado de los compromisos contractuales suscritos, pagos realizados así como las acciones realizadas por la unidades ejecutoras.

Dicho comportamiento mejoró en relación a la ejecución reflejada durante el año 2015; donde se logró alcanzar una ejecución financiera de 80% (L.544,619,983); misma

que consideró las gestiones por parte de las unidades ejecutoras y el apoyo a lo interno de la SEFIN.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2016

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión de la SEFIN, contempla la ejecución de 13 programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos para la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero nacional.

En ese sentido y considerando que el 94% del presupuesto vigente de la institución para el año 2016, se concentra en 5 programas y proyectos, los mismos se han definido como prioritarios, por lo que un atraso en la ejecución de cualquiera de ellos, repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la institución.

Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	IDA- 5270-HN	US\$	10,000,000	12/07/2013 31/12/2016
		Lempiras	231,384,000	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	129,411,522	179,731,539	85,996,025	48%
Acumulado 2016	129,411,522	179,731,539	170,120,410	95%
Acumulado Vida del Proyecto */	231,384,000	231,384,000	234,637,060	101%
Observaciones:				
<p>Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP gestionó movimientos internos a fin para priorizar las actividades de los proyectos en dicha etapa dentro de las disponibilidades presupuestarias.</p> <p>Para el año 2016, se lograron los siguientes avances:</p> <p>Obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorado el Sistema de Agua Potable de los Municipios de Pimienta, San Manuel, Villanueva, Siguatepeque, Comayagua y Danlí • En funcionamiento las Oficinas para los Prestadores de Aguas Potable y Saneamiento en los Municipios de San Pedro de Tutule y Teupasenti • Perforados y Equipados de (6) Seis Pozos Productivos en los municipios de Choloma y Siguatepeque • Mejorado el Sistema de Agua Potable de La Lima • En funcionamiento las Oficinas para los Prestadores de Aguas Potable y Saneamiento en el Municipio de Siguatepeque • Mejoras al Sistema de Agua Potable; Rehabilitada, Ampliada y Equipada la Planta Potabilizadora, Mejoras al Sistema de Agua Potable del municipio de Teupasenti • Instalación de Planta Potabilizadora y Mejoras en la Red de Distribución en el Acueducto de San Pedro de Tutule, Departamento de La Paz <p>Adquisición de Bienes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipados los Prestadores de San Pedro de San Pedro de Tutule y Teupasenti con vehículos pick-up cabina sencilla y camiones cabina sencilla para el prestador de Aguas del Valle (Villanueva Pimienta y San Manuel) • Equipados los Prestadores de Comayagua con camión cabina sencilla • Equipados los Prestadores de Danlí con (1) Vehículo Tipo Camión Cisterna para transporte y distribución de agua potable • Equipamiento (Suministro e Instalación de Pozos en Apoyo a los Municipios Beneficiarios del PROMOSAS: Danlí, La Lima, Pimienta, San Manuel, Choloma y Siguatepeque) • Equipamiento (Suministro de Micro medidores, Macro medidores y Dataloggers para los Municipios Beneficiarios del PROMOSAS) • Equipados con un sistema Informático e Instalados con un Software Comercial en los nueve Prestadores (Pimienta, San Manuel, Villanueva, Siguatepeque, Comayagua y Danlí) <p>Servicios: Fortalecidos los siete (7) Prestadores en el tema de Asistencia Técnica y consolidados los dos nuevos Prestadores (Teupasenti y San Pedro de Tutule) con el fin de que aplicaron las buenas prácticas de gestión para que logren la auto-sostenibilidad, la continuidad y sostenibilidad ambiental del servicio.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/09/2017
		Lempiras	6,478,752,000	

Ejecución al IV Trimestre 2016; Secretaría de Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/09/2017
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	92,532,021	141,307,607	67,849,472	48%
Acumulado 2016	92,532,021	141,307,607	140,150,224	99%
Acumulado Vida del Proyecto */	6,478,752,000	6,478,752,000	816,427,039	13%
Observaciones:				
<p><i>Las cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</i> Al cierre del año 2016 se encuentra pendiente la regularización del pago directo al SANAA por el Proyecto de Traspase por un monto de US\$574,000; así mismo, se encuentra pendiente de realizar la transferencia al PMA por US\$2.0 millones.</p> <p>Los principales logros reportados por el Programa durante el año 2016, se concentran en el pago directo al Programa Mundial de Alimentos (PMA) por un monto de US\$ 6,998,000,00; así mismo el pago directo a proveedores del SANAA por un monto de US\$ 574,000.</p> <p>Al IV trimestre, se reportan los siguientes avances: 2 contratos para la construcción de pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo. 1 contrato para la ampliación y rehabilitación del Sistema de Agua de San Marcos de Colón. 4 contratos suscritos para realizar apoyo presupuestario en programas sociales prioritarios.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	27/09/2010 30/11/2016
		Lempiras	691,667,283	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	48,661,997	70,454,621	25,451,892	36%
Acumulado 2016	48,661,997	70,454,621	64,231,214	91%
Acumulado Vida del Proyecto */	661,758,240	691,667,283	536,162,653	78%
Observaciones:				
<p>Proyecto en etapa de cierre, solamente cuenta con seis meses para ejecución de las actividades comprometidas al 30 de noviembre de 2016. Monto comprometido por 30.0 Millones de Lempiras.</p> <p>Al IV trimestre, se reportan los siguientes avances en SIAFI: 39 contratos de apoyo para la implementación en Municipios con SAMI. 2 contratos suscritos para mejorar la infraestructura de las aduanas. 9 contratos para la mejora en los ingresos tributarios. 47 contratos para la sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI e incremento de la capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI.</p> <p>Así mismo, durante el año 2016 el Proyecto presenta los siguientes logros: 100 Municipalidades y 5 Mancomunidades utilizando el SAMI. Entrega aduana Agua Caliente. Reforzamiento y equipamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) en Palmira.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS	BID 2467/BL-HO	US\$	10,000,000	15/12/2010 30/12/2016
		Lempiras	231,384,000	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	33,794,414	88,375,936	21,914,923	25%
Acumulado 2016	33,794,414	88,375,936	85,248,965	96%
Acumulado Vida del Proyecto */	231,384,000	231,384,000	193,197,251	83%
Observaciones:				
<p>Proyecto en etapa de cierre, solamente cuenta con seis meses para ejecución de actividades comprometidas al 30 de diciembre de 2016. Monto comprometido por 31.0 Millones de Lempiras</p> <p>Al IV trimestre, se reportan los siguientes avances: 21 contratos suscritos para el fortalecimiento de la Aduana de Puerto Cortés. 1 contrato para la realización de auditoría al proyecto. 7 contratos para la instalación del Data Center de respaldo. 8 contratos para la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.</p> <p>Así mismo, durante el año 2016 el Proyecto presenta los siguientes logros: Finalización de la Obra de mejoras en la Aduana de Puerto Cortes. Primer Etapa Aduana Amatillo terminada. Adquisición de equipo aduanero para los laboratorios de Puerto Cortes y Tegucigalpa.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$	19,583,815,940	17/09/2008 30/09/2017
		Lempiras	453,138,166,746	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	-	81,878,528	34,630,026	42%
Acumulado 2016	-	81,878,528	72,720,807	89%
Acumulado Vida del Proyecto */	453,138,166,746	453,138,166,746	517,201,744	0.1%
Observaciones:				
<p>El BM aprobó Ampliación de plazo para desembolso por un periodo de 9 meses (hasta el 30 de Septiembre de 2017).</p> <p>Principales Metas Ejecutadas 2016: 129 Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) con perfiles aprobados por el Consejo de Evaluación cumpliendo en un 73% de la meta programada. 52 Proveedores de asistencia técnica aprobados para dar apoyo a las OPR, cumpliendo más del 100% de lo programado 7,219 productores rurales beneficiados con los fondos de inversiones productivas por Planes de Negocio ratificados y en proceso de implementación, cumpliendo con más del 100% de lo programado. 83% de los Planes de Negocio (PNs) participantes en el proyecto implementan buenas prácticas ambientales como se propone en su Plan de Negocio, cumpliendo con más del 100% de lo programado. 78% Planes de Negocio (PNs) participantes en el proyecto implementan con éxito las medidas de género de juventud y pueblos indígenas, cumpliendo con más del 100% de lo programado.</p> <p>Al IV trimestre, se reportan los siguientes avances: 55 contratos suscritos para mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores. 3 contratos otorgados para ejecutar planes de negocios. 52 contratos suscritos para realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de negocio.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2016; Secretaría de Finanzas

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Participación en la revisión y ajustes propuestos a los mejora a los procesos internos de la Secretaría de Finanzas, en lo que corresponde a la programación y seguimiento de programas y proyectos.
- Realización de visitas de campo a los programas y proyectos de Inversión Pública en ejecución para verificar los avances en los mismos en la zona Sur del país.
- Revisión de Cartera Técnica Proyectos de Cooperación Técnica No Reembolsable financiadas por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (ATN- 13579, ATN- 12691 y ATN- 13858).
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación de plazo de ejecución y último desembolso al Proyecto de Competitividad Rural – ComRural (IDA- 4465).
- Se llevó a cabo reunión con la UAP/SEFIN, en relación a la proyección de ejecución de recursos de Crédito Externo y las acciones a tomar por parte de la misma, para elevar los niveles de ejecución al cierre del 2016.
- Análisis y elaboración de Nota Técnica No. 19 dónde se trasladó presupuesto del Proyecto de Competitividad Rural (IDA 4465) por L.3,047,992 y Proyecto Modernización de la Aduana en Puerto Cortés (BID-2467/BL-HO) por L.1,412,741 para otras instituciones del Sector Público.
- Análisis y elaboración de Nota Técnica No. 20 dónde se trasladó presupuesto del Proyecto Modernización de la Aduana en Puerto Cortés (BID-2467/BL-HO) para otras instituciones por un monto de L. 9,065,133.
- Se emitió Dictamen Técnico para la Transferencia entre Categorías de Inversión al Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID-2032/BL-HO).
- Se emitió Dictamen Técnico para la Transferencia entre Categorías de Inversión al Proyecto Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público (ATN/OC-13582-HO).
- Se emitió Dictamen Técnico para la ampliación de plazo de ejecución y último desembolso al Proyecto Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público (ATN/OC-13582-HO).
- En el marco de las actividades de cierre contable y financiero; se realizó comunicación con las diferentes unidades ejecutoras de proyectos con el fin de notificar y hacer efectivos los ajustes según correspondían las inconsistencias encontradas.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre, la SEFIN presenta una ejecución financiera satisfactoria del 94% (L.560,539,374), considerando el avance de las operaciones, proyectos que finalizaron y los proyectos que se encuentran realizando sus actividades para efectuar su cierre al finalizar el año 2016.
- Falta de identificación de mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Devengado Anual				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
13	0100 - Secretaria de Finanzas			-	310,457,995	310,457,995	46,953,597	549,821,324	596,774,921	-	2,429,880	2,429,880	46,953,597	547,391,444	594,345,041	21,740,226	226,480,043	248,220,268	43,627,246	516,912,128	560,539,374	94	94
1	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	ATN/OC-12691-HO	25/03/2011 29/01/2016	-	1,155,000	1,155,000	-	5,897,447	5,897,447	-	3,519	3,519	-	5,893,928	5,893,928	-	166,525	166,525	-	5,883,348	5,883,348	100	100
2	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013 18/07/2016	-	-	-	-	3,647,122	3,647,122	-	488,453	488,453	-	3,158,669	3,158,669	-	1,039,087	1,039,087	-	1,665,633	1,665,633	46	53
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA-5270-HN	12/07/2013 31/12/2016	-	129,411,522	129,411,522	17,880,000	161,851,539	179,731,539	-	-	-	17,880,000	161,851,539	179,731,539	9,870,012	76,126,014	85,996,025	17,831,519	152,288,890	170,120,410	95	95
4	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	IDA-5020-HN	07/12/2011 30/06/2016	-	-	-	-	3,712	3,712	-	-	-	-	3,712	3,712	-	-	-	-	3,711	3,711	100	100
5	MODERNIZACION DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/BL-HO	15/12/2010 31/03/2017	-	33,794,414	33,794,414	-	88,375,936	88,375,936	-	-	-	-	88,375,936	88,375,936	-	21,914,923	21,914,923	-	85,248,965	85,248,965	96	96
6	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010 31/12/2017	-	92,532,021	92,532,021	-	141,307,607	141,307,607	-	-	-	-	141,307,607	141,307,607	-	67,849,472	67,849,472	-	140,150,224	140,150,224	99	99
7	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	15/10/2008 29/04/2017	-	48,661,997	48,661,997	15,426,750	55,027,871	70,454,621	-	-	-	15,426,750	55,027,871	70,454,621	3,910,723	21,541,169	25,451,892	14,534,262	49,696,952	64,231,214	91	91
8	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS	DI-164/2011	14/02/2012 31/12/2016	-	-	-	2,101,764	-	2,101,764	-	-	-	2,101,764	-	2,101,764	2,091,009	-	2,091,009	2,091,009	-	2,091,009	99	99
9	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008 31/12/2016	-	-	-	6,404,879	75,473,649	81,878,528	-	1,013,283	1,013,283	6,404,879	74,460,366	80,865,245	3,155,034	31,474,993	34,630,026	5,690,092	67,030,715	72,720,807	89	90
10	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	22/02/2008 31/12/2016	-	-	-	5,140,204	5,995,569	11,135,773	-	-	-	5,140,204	5,995,569	11,135,773	2,713,449	4,012,809	6,726,258	3,480,364	4,925,729	8,406,093	75	75
11	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	06/03/2013 31/12/2016	-	2,328,041	2,328,041	-	8,676,139	8,676,139	-	877,492	877,492	-	7,798,647	7,798,647	-	2,256,500	2,256,500	-	6,503,076	6,503,076	75	83
12	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	IDF Grant No. TF011581	01/02/2012 31/12/2016	-	2,575,000	2,575,000	-	1,611,727	1,611,727	-	31,367	31,367	-	1,580,360	1,580,360	-	-	-	-	1,580,360	1,580,360	98	100
13	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	ATN/OC-13585-HO	06/03/2013 06/03/2016	-	-	-	-	1,953,006	1,953,006	-	15,766	15,766	-	1,937,240	1,937,240	-	98,551	98,551	-	1,934,524	1,934,524	99	100

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

INSTITUCION	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
100-Secretaría de Finanzas	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Auditoría y evaluación realizadas	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		Planes de desarrollo institucional diseñados e implementados	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA IMPLEMENTADA	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		FORTALECIMIENTO REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	Coordinación Mejorada la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias	CONTRATO	1	6	600	0	0	0
		Apoyadas con las Herramientas las EPS (Empresas Prestadoras de Servicio) mejorando su eficiencia y	CONTRATO	15	15	100	0	0	0
		Apoyadas las instituciones del sector (Sanaa, Conasa y Ersaps)	CONTRATO	14	14	100	0	0	0
		Apoyo en la Inversión para Rehabilitación y Expansión de las (SAS) en las Municipalidades	CONTRATO	10	10	100	0	0	0
	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO	AUDITORÍA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	Auditoría realizada	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	CONTRATO	8	8	100	0	0	0
		Data center de respaldo instalado	CONTRATO	3	7	233	0	0	0
	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	Sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa ampliado y mejorado	CONTRATO	2	0	0	2	0	0
		SISTEMA DE AGUA AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Pozos de agua construidos	CONTRATO	1	2	200	0	0	0
		Arboles en la subcuenca del Rio Guacerique producidos y plantados	CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

INSTITUCION	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
100-Secretaría de Finanzas	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	Subsistemas los laureles fortalecidos	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	Ingresos tributarios mejorados	CONTRATO	5	9	180	0	0	0
		Controles en la fiscalización de tributos internos aplicados	CONTRATO	9	0	0	0	0	0
		Infraestructura de las aduanas mejorada	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI incrementada	CONTRATO	8	47	588	0	0	0
		Municipios con SAMI implementado	CONTRATO	37	39	105	0	0	0
		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	40	52	130	0	7
	PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS		CONTRATO	10	3	30	0	0	0
	PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS		CONTRATO	10	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
		APOYO MUNICIPAL IMPLEMENTADO	CONTRATO	1	4	400	0	0	0
		APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	CONTRATO	1	2	200	0	0	0
	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	Auditoria realizada-2	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Programa de capacitacion en temas presupuestarios y de planificacion realizado	CONTRATO	2	5	250	0	4	0
		Manuales y clasificadores del sistema presupuestario revisados y actualizados	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Estructuras programaticas del presupuesto revisadas y actualizadas	CONTRATO	2	2	100	0	0	0
		Evaluación realizada	CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

INSTITUCION	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
100-Secretaría de Finanzas	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	Programa para el fortalecimiento de la DGCP implementado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Diseño de un programa de fortalecimiento del área de programación y monitoreo de ingresos presupuestarios elaborado	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		Modulo para las unidades ejecutoras de préstamos con financiamiento externo UEPEX/SIAFI mejorado	CONTRATO	1	3	300	0	0	0
	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE HONDURAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL	Auditoria realizada-3	CONTRATO	3	3	100	0	0	0
		Calidad del suministro de información para los miembros del Congreso y de las comisiones aumentada	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		Transparencia y rendición de cuentas del Congreso incrementada	CONTRATO	0	0	0	0	0	0
		Congreso más eficiente, oportuno y transparente	CONTRATO	1	0	0	1	0	0
	PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO	1	1	100	0	0	0
		GERENCIA TÉCNICA FORTALECIDA	CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		PLAN DE CARRERA REALIZADO	CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI
