



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe General de la Inversión Pública Al II Trimestre, Año 2020

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.

Julio, 2020

Contenido

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020..... | 3 |
| PRESENTACION | 3 |
| I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2020..... | 4 |
| 1.1 Inversión Pública Global 2020 | 4 |
| 1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público | 6 |
| 1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel de Sector..... | 7 |
| 1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's) ... | 8 |
| 1.5 La Inversión Pública a Nivel de Gabinete Sectorial..... | 9 |
| 1.6 Financiamiento de la Inversión | 9 |
| GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS | 10 |
| GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL: | 16 |
| GABINETE ECONÓMICO..... | 26 |
| GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA:..... | 30 |
| 1.7 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el segundo trimestre del año 2020..... | 33 |

INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

PRESENTACION

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2020. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal 2020 asciende a **L25,211,380,425**, que incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), Programa de Infraestructura Vial, por un monto de **L4,576,900,000 y L2,500,000,000** respectivamente, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que asciende a **L4,500,000,000** y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por un monto de **L1,013,000,000**. Del monto total de la Inversión Pública aprobado para la gestión 2020 los Proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) suman un monto de **L12,621,480,425** y que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

Al Segundo Trimestre la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L26,270,696,454** para la ejecución de 81 proyectos (incluidos cinco proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP) y tres Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) y 81 proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP).

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al segundo trimestre refleja un aumento global de **L1,059,316,051** respecto al presupuesto aprobado, esto debido a incrementos en los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de **L329,200,000**, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por la cantidad de **L631,700,000 y L950,000,022** en el Fideicomiso de Infraestructura Vial, de igual forma el PIP muestra del presupuesto vigente de **L11,724,030,258** una disminución de **L851,583,971** respecto al aprobado por el Congreso Nacional.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2020

1.1 Inversión Pública Global 2020

El presupuesto global de la Inversión Pública al Segundo Trimestre del 2020 reporta un presupuesto vigente de **L26,270,696,454** que representa el **3.9% del PIB¹** para el 2020, el cual muestra un aumento global de **L1,059,316,051** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

En el cuadro No.1 se ve reflejado el aumento debido a las adiciones en la proyección de los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de L329,200,000, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por la cantidad de L631,700,000 y L950,000,022 en el Fideicomiso de Infraestructura Vial; y a la reducción de L851,583,971 en el PIP.

En relación al PIP, que muestra un presupuesto vigente e **L11,769,896,454**, lo que refleja una disminución de respecto al Presupuesto aprobado, de los cuales **L692,757,615** corresponden a Crédito Externo; **L85,583,084** a Donaciones Externas y finalmente **L73,243,272** Fondos Nacionales.

Esta situación obedece a la facilitación de espacio presupuestario durante el primer semestre, para el traslado de espacio presupuestario de fondos a instituciones con estructura presupuestaria sin proyecto, específicamente para casos de fuentes externas (crédito externo y donaciones); tales como: la incorporación de L738,600,000 para continuar con el proceso de cancelación del pago del Pasivo Laboral a los empleados del SANAA, traslado de L27,940,000 para la Secretaría de Seguridad para el Programa de Promoción de Paz y Convivencia, traslado de L42,255,737 al Instituto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal ICF, para el Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal de Honduras (EuroFor)/ (PAPSFOR) y L 7,695,540 Fondos de aporte de Honduras al Plan Trifinio, en el Marco del Programa de Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas en la Región del Trifinio. Entre otros.

Por su parte en la fuente 11 Tesoro Nacional, se debe a la aplicación de la **Circular No. 003-DGP-2020 en aplicación al PCM 20-2020** de fecha 16 de marzo de 2020, el cual establece que con el propósito de mantener una disciplina presupuestaria acorde con la Ley Orgánica del Presupuesto y con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a aplicar en todas las Instituciones del Sector Público No Financiero una reducción en sus presupuestos que le permita obtener al menos el 2% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de

Cuadro No. 1
Clasificación de la Inversión Pública por Sector Público al 30 de Junio 2020
Cifras en Millones de Lempiras

| Estructura del Sector Público | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución (Ejec./Vig.) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Administración Central | 12,240.3 | 11,280.0 | 1,663.1 | 15 |
| Resto del Sector Público | 381.2 | 489.9 | 69.8 | 14 |
| Total General PIP | 12,621.5 | 11,769.9 | 1,732.9 | 15 |
| Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) | 4,500.0 | 4,500.0 | 711.5 | 16 |
| Proyectos APP's */ | 4,576.9 | 4,906.1 | 475.9 | 10 |
| Programa de Infraestructura Vial | 2,500.0 | 3,450.0 | 3,120.7 | 90 |
| Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) | 1,013.0 | 1,644.7 | - | - |
| TOTAL PLAN DE INVERSIÓN | 25,211.4 | 26,270.7 | 6,041.0 | 23 |

Fuente: SIAFI, Circular No. CCG-523-2020 y Circular No. CCG-524-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.


*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

¹ El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2020 asciende a L.657,737,000,000, según cifra proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

la República para el ejercicio fiscal vigente. Asimismo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) queda facultada a realizar todas las operaciones presupuestarias necesarias para la aplicación del presente decreto lo anterior debido a la declaratoria de emergencia por el COVID 19 en el presente año a partir del 16 de Marzo

Dado lo anterior, se procedió a la reducción del presupuesto de gasto operativo contenido en los Grupos de Gasto Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Bienes Capitalizables, aplicando reducción en las estructuras de las Instituciones Descentralizadas como ser la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Gráfico No 1
Comparativo Inversión Pública 2019 - 2020
Cifras en Millones de Lempiras

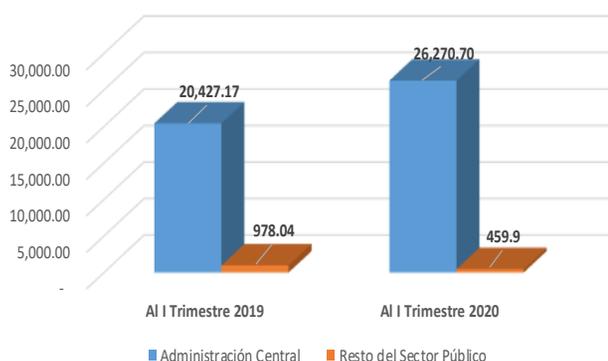

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-523-2020 y Circular No. CGG-524-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.
* Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 30 de junio del 2020 por la cantidad de **L6,041,029,776.98** millones reflejando un **23%** de ejecución a nivel de devengado. El mismo incluye ejecución del Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) por la cantidad de **L711,500,000** y el Programa de Infraestructura Vial, su ejecución asciende a **L3,120,700,000** según el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), para la ejecución de 81 proyectos detallados así: 60 para la Administración Central, 13 para el Resto del Sector Público, 5 de Asociaciones Público Privadas, 1 para el Fondo Social para la

Reducción de la Pobreza Vida Mejor y 1 del Fondo Vial, y 1 para el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).

El mayor porcentaje del PIP se concentra en los proyectos ejecutados por la Administración Central en los Gabinetes: Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas (**52%**); el Económico con **23%** y el Social con **22%**, alcanzando en su conjunto, el **97%** de la inversión Pública para la gestión; en menor proporción se observa el resto de los Gabinetes.

En el transcurso del Segundo Trimestre se han incorporado proyectos al PIP; tales como: Inclusión Social a La Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS), Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortes (ENP), Proyecto de Transporte Publico para el Distrito Central (Tegucigalpa - Comayagüela) los anteriores son proyectos de arrastre que no fueron formulados dentro del PIP para el año 2020 y el Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa (AMDC) proyecto nuevo que alcanzo el cumplimiento del marco legal en el presente año

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar,

reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Segundo Trimestre del 2020 a nivel de devengado incluye (Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor); muestra una reducción de 5 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre del año 2019 (28%), lo anterior se debe a retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales, por otra parte, a partir del 16 de marzo del presente año la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno por el COVID 19 y las medidas de contención del gasto establecidas mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-020-2020, obligó a las instituciones a limitar la ejecución en varios rubros, como los indicados en la circular DGP-003-2020. En el segundo trimestre los principales centros económicos del país a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID 19 se encuentran en la fase cero de la reapertura inteligente de la economía nacional debido al gran número de contagios que sigue en ascenso día a día; al estar en la etapa cero de la reapertura económica mucho de los proyectos que conforman el PIP se encuentran suspendidos, lo cual impacta directamente a la ejecución del PIP en su mayoría los proyectos orientados a generar un beneficio económico en el país.

Adicionalmente, las restricciones en la aprobación de cuotas de compromiso, hasta cierto punto afectan la ejecución de los proyectos en cuanto a honrar compromisos que no se encuentran en la proyección original de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del presente año. Dichas medidas han sido consideradas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal. Sin embargo, se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2020 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Cabe señalar que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 188-2020) de fecha 17 de abril 2020, el cual literalmente dice:

"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."


1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Segundo Trimestre del 2020, ascendió a **L26,270,696,454** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **99%** específicamente en los proyectos ejecutados por INVEST-H, ENEE, INSEP, SAG, SESAL y SEDIS, proyectos APP, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fondo Infraestructura Vial, y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), El resto del Sector Público alcanza apenas el **1%** de la Inversión.

La distribución del PIP de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. Asimismo, refleja una ejecución de **L6,041,029,776.98** representando un **23%** respecto al presupuesto vigente global.

En términos financieros del Programa de Inversión Pública, se registran mayores niveles de ejecución en INVEST-H **L545,618,815.85**; La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) **L309,914,255.49**; La Secretaría de Salud (SESAL) **L218,987,290.32**; La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social **L129,895,057.80**; La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) **L127,385,691.41** y La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) **L106,815,478.26** quienes en su conjunto suman **L1,438,616,589.13**; es decir que concentran el **83%** del total del presupuesto ejecutado correspondiente al PIP registrados en el SNIPH, (**L1,732,929,776.98**); por otra parte, el Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), y el Programa Vial suman **L4,308,100,000** de presupuesto ejecutado, haciendo un total de **L6,041,029,776.98**.

Gráfico No.2
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
Cifras en Millones de Lempiras

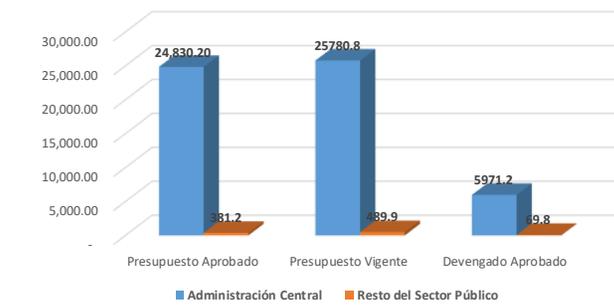

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-523-2020 y Circular No. CGG-524-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

Para el ejercicio fiscal 2020 en las Normas de Ejecución Presupuestarias, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel de Sector

En cuanto a la inversión Sectorial, el Sector Carretero cuenta con el mayor porcentaje de inversión L8,596 millones (32.7%), quien es el que concentra el mayor monto de ejecución presupuestaria (L1,577 Millones), incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso; seguido por Sector Protección Social con L4,682.1 Millones (17.8%) incluye el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza; seguido por el Sector Salud L3,970.1 millones, (**15.1%**); seguido del Sector de Transporte y Obras Públicas con L2,258.7 millones (**8.6%**) de participación en relación al total del presupuesto de inversión; seguido el Sector de Desarrollo Productivo L1,377.9 millones (**5.2%**); y en menor proporción el resto de los sectores abarcan el 20.6% de la inversión. Ver gráfico No.3.


1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)

Al segundo trimestre de 2020, la Ejecución a nivel de fideicomisos y APP's, asciende a **L4,308,100,000**, representando un **30%** respecto al presupuesto vigente de **L 14,500,800,000** asignados a estos. Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L711,500,000** representando un **16%**, respecto al presupuesto vigente (**L4,500,000,000**) según el SIAFI y el Fideicomiso de Infraestructura Vial con una ejecución de **L3,120,700,000.00** representativo de 90% de ejecución, respecto al presupuesto vigente (**L3,450,000,022**) esta situación se explica en que gran

parte de este fideicomiso ha sido destinado para atender la Emergencia sanitaria nacional producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19; mientras que la superintendencia de Alianzas Público Privadas reporta una ejecución de **L475,900,000** en proyectos APP's, los cuales cuentan con presupuesto vigente de **L4,906,100,000.00** (10%) de ejecución. Asimismo, el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de **L1,644,700,000**, 0% de ejecución, el Fiduciario **BANHPROVI** informó que no hay ejecución en el segundo trimestre 2020, respecto a los fondos asignados.

Cabe señalar que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 188-2020) de fecha 17 de abril 2020, el cual literalmente dice:


"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."

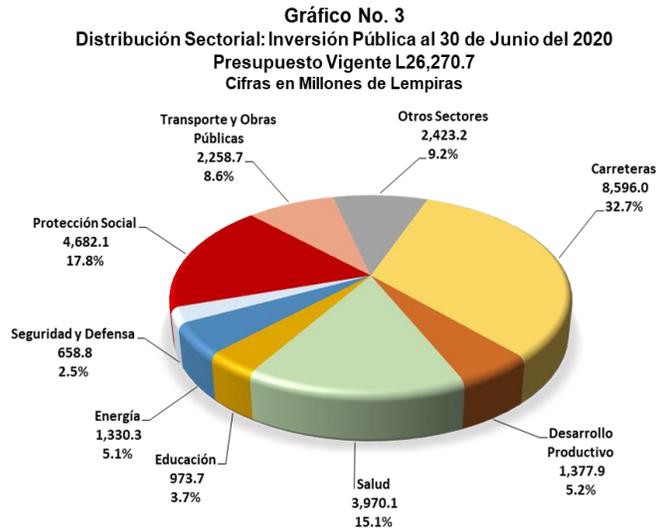

1.5 La Inversión Pública a Nivel de Gabinete Sectorial

En el marco de la reforma a la Ley General de la Administración Pública, Según Decreto Ejecutivo número PCM-009-2018 se conformaron Gabinetes Sectoriales que agrupan las instituciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones. En el gráfico No.4 se muestra la Inversión Pública distribuida en diferentes Gabinetes.

A nivel de presupuesto vigente el Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas cuenta con el mayor porcentaje de participación 55%, Incluye (el Plan de Infraestructura Vial), el Gabinete Social con el 33% de participación, contempla (el Fondo Social Reducción de la Pobreza Vida Mejor y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), seguido el Gabinete Económico con un 8% y en menor porcentaje el resto de los gabinetes.

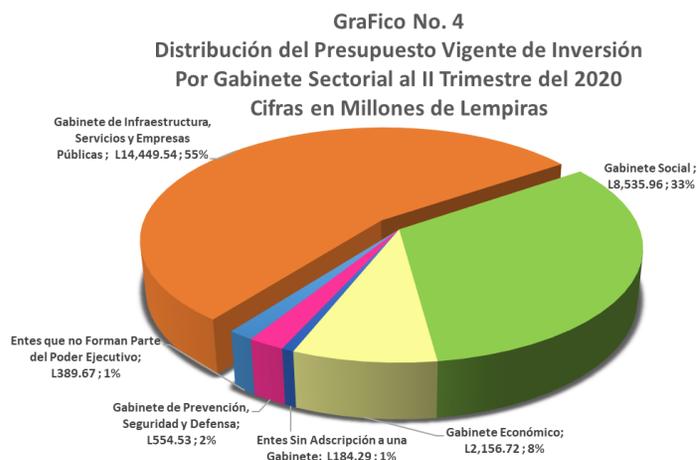

1.6 Financiamiento de la Inversión

El 60% de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's, Plan de Infraestructura Vial y Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), y el 40% por fondos externos; de estos el 85% es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el 15% por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2

Cuadro No. 2
Clasificación de la Inversión Pública por Fuente de Financiamiento
Cifras en Millones de Lempiras

| Fuente de Financiamiento | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución (Ejec/Vig) |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Fondos Nacionales | 13742.9 | 15759.2 | 4,455.92 | 28% |
| Crédito Externo | 9775.7 | 8887 | 1,243.07 | 14% |
| Donaciones Externas | 1692.8 | 1624.4 | 342.03 | 21% |
| Total Plan de Inversión | 25,211.40 | 26,270.60 | 6,041.03 | 23% |

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-523-2020 y Circular No. CGG-524-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destacan la INVEST-H, INSEP, ENEE, SAG, SEDIS orientado a la construcción de carreteras, proyectos de energía, construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, Microempresas).

En seguimiento a las Normas de Ejecución Presupuestaria del Año 2020, en su Artículo 28, que literalmente expresa que; "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado "Documento de

Modificación Presupuestaria” generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.....

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Gabinete se muestran a continuación:

GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

El Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas

Está conformado por 6 Instituciones Públicas y son: Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS**), Inversión Estratégica de Honduras (**INVEST-H**), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP**), Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE**) y La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (**HONDUTEL**).

Al Segundo Trimestre el Gabinete de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas cuenta con un presupuesto vigente de **L 14,449.54 millones**, su ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2020, asciende a **L 9,641.3 millones (66.7%)** según SIAFI. La Distribución de la Inversión del Gabinete está concentrada en: Inversión Estratégica de Honduras (**INVEST-H**) (**70%**); Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE**) (**13%**) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP**) (**9%**); Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS**) (**5%**); Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**) (**2%**) y en menor porcentaje La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con un (**1%**) de inversión.

Al Segundo Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H:

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2):**

La Programación del trimestre incluía pagos de obra y supervisión de tramos (Choluteca Guasaule), por un monto de US\$502,067.31, pero debido al retraso en la aprobación de la reforma de algunos artículos por parte del Congreso Nacional, impidió la realización de modificaciones presupuestarias del grupo 40000 por lo que, no se logró incluir las estructuras requeridas en el presupuesto vigente de INVESTH. Adicionalmente, la programación incluía de US\$763,360.04 por devolución de la retención del tramo Júcaro Galán-El Amatillo. Sin embargo, se determinó realizar el pago hasta que la supervisión de su Visto Bueno a la reparación de las obras.

Para el segundo trimestre no se reporta avance físico, ya que las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) suspendieron labores, debido a la emergencia sanitaria generada por la Pandemia el COVID-19.

- **Programa de Integración Vial Regional II, (BID-3815/BL-HO):**

Este proyecto cerró su obra física contractualmente en el mes de abril, finalizando 23 km del tramo La Barca-Pimienta. Actualmente, las obras se encuentran en etapa de subsanaciones, pero debido a la paralización de obras, el contratista no ha podido ejecutarlas y el supervisor tampoco ha presentado informe reportando el 100% de ejecución.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, (BCIE 2116 y BCIE-2205):**

La obra física del Tramo “El Quebrachal-Goascorán” se encuentra finalizada, mismas que consistieron en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 km. Es importante hacer notar que debido a que, al cierre del 2018, ya se contaba con 29 km con carpeta asfáltica terminada.

- **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

En el Segundo Trimestre, el proyecto se encuentra en implementación de la estrategia de salida para consolidar capacidades productivas de los productores beneficiados con sistemas de riego en los 6 departamentos de la zona de influencia. Se alcanzó un total de 2,675 visitas/eventos en el trimestre, a pesar de las restricciones producto de la emergencia por COVID-19. Por la necesidad de acelerar producción en los meses críticos de verano, el equipo técnico intensificó la actividad. Cabe mencionar que, por la estrategia de salida del proyecto, la Asistencia Técnica incluye los 6 departamentos donde se instalaron sistemas de riego. La temática principal de la asistencia técnica fue en producción agrícola/pecuaria y manejo postcosecha. A través de los gestores descentralizados de servicios de salud (GDSS) se alcanzaron un total de 14,166 niños atendidos en la vida del proyecto. Esta actividad vinculada a nutrición fue finalizada en el trimestre anterior.

- **Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danli, tramo Neteapa – Danlí. (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2 BID-3815/BL-HO):**

Durante el segundo trimestre, INVEST-H ha sostenido reuniones remotas y presenciales tanto con el supervisor como con el contratista, para analizar escenarios post crisis y la estrategia de reactivación del proyecto, teniendo en cuenta un protocolo de medidas de bioseguridad para salvaguardar la vida de los obreros, el equipo del contratista y el equipo de supervisión. En ese sentido, se reiniciaron labores en fecha 26 de junio de 2020, en el lote A (Estación 54+240 – Estación 74+240) y el 25 de junio en el lote B (Estación 74+240 a la 89+160). Es importante mencionar que previo al reinicio de las obras, se realizaron pruebas rápidas Covid-dúo a todo el personal.

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO**

Durante el mes de junio se inició revisión de sobrecostos del contratista por aplicación de protocolos de bioseguridad en las obras.

- **Programa de Infraestructura Vial (Fideicomiso)**

Actualmente en lo que respecta a los proyectos que se ejecutan bajo la estructura del Fideicomiso Vial no se encuentra registrado en el SNIPH debido a que en su mayoría

corresponde a obras de mantenimiento de la Red vial Pavimentada y No Pavimentada. La INVESTH es la responsable de la ejecución física y financiera de dicho Fideicomiso, en la cual ha remitido el Informe correspondiente al mes de Junio del 2020.

Sobre los proyectos del Programa de Conservación del Patrimonio Vial, de manera general y de acuerdo lo indicado por INVEST-H en sus informes, éstos se han visto severamente afectados por las restricciones de movilidad y la suspensión de las labores; no obstante, al cierre del mes junio en el Programa de Balastados en los Accesos a las Cabeceras Municipales (PACM) en la Red Vial No Pavimentada, se reactivaron los lotes 1 del departamento de Copán y Ocotepeque Zona 1, Lote 26 departamento de Francisco Morazán Zona 5, reportando 44.65 km intervenidos. Se espera que el programa de acceso a cabeceras municipales se reactive completamente para el mes de agosto. Asimismo, se prevé que se aprueben en el corto plazo los estudios y diseños de proyectos para el acceso a cabeceras que se encuentran en etapa de revisión por parte de UNOPS, en vista que los mismos han sido entregados a dicha entidad durante los meses de mayo y junio, en su mayoría. En relación al trabajo de mantenimiento rutinario y el trabajo con las microempresas, el avance fue nulo, debido a la suspensión de labores para evitar el riesgo de contagio del personal; sin embargo, se espera reanudar esta actividad alrededor del mes de agosto, si las medidas de la cuarentena comienzan su reducción.

Es importante mencionar que, de acuerdo al reporte presentado por la INVESTH, el monto presupuestado de L3,450,000,022.00 se ha desembolsado a junio L3,120,710,054.43, de los cuales L1,151,408,349.68 han sido para el sector de mantenimiento de carreteras y el banco fiduciario ha ejecutado a junio 2020, el monto L830,516,859.95.

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):

- **Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Valladolid-la virtud-Mapulaca con una longitud aproximada de 30 km localizado en el departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

Al 30 de junio del 2020 se han pavimentado 22.69 km con concreto hidráulico. Debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19 el proyecto ha suspendido su ejecución física y está a la espera de reiniciar sus actividades en consecuente a la reactivación económica de país para el sector de Infraestructura.

Durante el segundo trimestre, se gestionó mediante oficio DM-0466-2020 una ampliación de plazo de cierre del proyecto hasta el 17 de junio de 2021, periodo que le permitirá continuar con la ejecución física. En el mismo oficio, INSEP solicitó la primera Enmienda a la Nota de Prioridad sobre el costo y alcance del proyecto, la cual incluye un incremento de L87.37 millones consecuencia de la revisión al diseño del proyecto y la excavación de roca en el tramo carretero.

La enmienda al costo y alcance, así como el plazo del proyecto fueron otorgados en el mes de junio de 2020. El proyecto reanudara su ejecución física y financiera en el mes de julio del presente año.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

Al Segundo Trimestre de 2020 el proyecto presenta un avance físico de 98.75% este porcentaje ya solo corresponde al Lote No.3, el cual corresponde a la pavimentación con concreto asfáltico entre la estación 55+820 hasta la estación 56+960 y las obras de mitigación de la falla geológica entre dichas estaciones 55+820.

Durante el segundo trimestre de 2020, se gestionó ante los organismos financieros ampliación de plazo para los convenios de préstamo. El Convenio BCIE-2156 se requiere una ampliación de plazo de cierre al mes de diciembre de 2020, esto con el propósito de efectuar los pagos finales de los contratos suscritos. En el caso del Convenio BEI-FI No. 84859 se gestionó una ampliación de plazo hasta el mes de junio de 2021, con el objetivo de realizar obras de mitigación en la falla geológica del kilómetro 55 del tramo carretero del lote No.3 (Los Ranchos – El Florido), señalización, informes técnicos y finales del proyecto. Es importante mencionar que estas ampliaciones aún no han recibido aprobación por parte de los organismos financieros.

El proyecto continuo con el proceso de pago de estimaciones finales de los tramos 2 y 3 del proyecto.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros, (Fondos Nacionales 0000003-13):**

El proyecto inició su ejecución en el año 2013, de manera intermitente hasta el 2016 donde fue suspendido debido a la falta de recursos presupuestarios. Durante dicho tiempo de ejecución se logró ejecutar 6.5 kilómetros.

El Proyecto logró completar la pavimentación de los 9 km de carretera que estaban contemplados en el objetivo del proyecto. El avance físico representa un 74% según el alcance contemplado en la nota de prioridad.

Durante el segundo trimestre de 2020, se analizó la solicitud de ampliación al proyecto Cuevas de Talgua que solicito INSEP a través de Oficio DM No. 0277-2020. La cual no fue procedente ya que el mismo no cumplía con los requisitos establecidos en el Artículo 108 de las Normas de Ejecución Presupuestarias Vigentes (NEPv).

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante el Segundo Trimestre 2020 el proyecto se encuentra en ejecución obteniendo avances en las actividades por convenio de financiamiento siguientes:

BID 3103/BL-HO: Evaluación final del contrato de préstamo, Auditoria Final del Proyecto con "Opinión Limpia", Equipo de cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND), Contenedor para archivo de la documentación del contrato de préstamo adquirido, Auditoria Externa del Proyecto realizada, Cierre del Convenio el 19 Marzo del 2020 y con la donación GRT/SX-16864-HO avance de obra de 77% en la Construcción y Ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín (230-138 kV).

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

se ha tenido avances en el II Trimestre en Cierre técnico-financiero de la Obra “Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo”, La Obra para la Construcción, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 38 Estaciones Hidroclimatológicas automáticas para la Optimización de la Red de Monitoreo de las Cuencas Hidrológicas de las Centrales, Orden de inicio emitida el 27 de abril del año 2020 para el Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y en proceso de elaboración los Contratos para las firmas Japonesas Hitachi y Toshiba.

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica**

Durante el II Trimestre se logró realizar la publicación del Documento de Licitación Pública Internacional (Paquete 1/32) del “Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito” y la Ejecución y publicación de visita guiada de manera virtual para el proceso de Licitación Pública Internacional del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito” como estrategia para avanzar en el proceso de adquisición en vista al estado de restricciones de movilización y viajes internaciones por la emergencia sanitaria COVID-19.

Proyecto Ejecutado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS):

- **Proyecto De Energía Renovable Para El Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, (EDCF No. HND-5) Fondos de Korea Eximbank:**

Los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural) se continuó con el desarrollo de diversos planes de ejecución como: Creación de cronogramas de supervisión de Juntas de Energía la cuales son las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto y velar por el excelente funcionamiento de los sistemas solares.

Creación de cronogramas de supervisión de Sistemas Fotovoltaicos instalados en Vivienda, Escuelas y Centros de Salud, requisito principal para realizar la recepción de obra.

Recibimiento de repuestos de equipos en Aduanas y Bodegas y capacitación de técnicos para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.

Además de varios procesos administrativos fundamentales del Proyecto.

Proyecto Ejecutado por Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL):

- **El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, (FP-HONDUTEL-22102) Fondos Propios:**

La reducción del presupuesto en un 38.9%, a la Institución más las limitantes existentes de flujo de efectivo de la empresa conllevaran a la no disponibilidad de fondos que acortaron significativamente aún más la disponibilidad de presupuesto de inversión, afectando los

alcances proyectados de la ejecución física y financiera, al término del segundo trimestre se reporta 0% de ejecución según SIAFI.

Los alcances que no se han logrado y considerando que el proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación ha sido diseñado como un plan integral de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, se trasladó su ejecución para el presupuesto 2020, siempre limitado y priorizado con lo que permita el monto de inversión disponible en el año.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS):

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inició la ejecución de obras el día 20 de diciembre de 2019. La duración prevista de finalización del contrato para dichas obras es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de junio de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 16% y tiene un avance financiero de 45.8% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.09.

Debido a la pandemia del COVID-19 en este proyecto se han implementado las medidas de bio-seguridad en base a la apertura económica inteligente, sin embargo, dado el incremento de personas afectadas por el corona virus se ha realizado el paro de labores a pesar de haber implementado los protocolos de bio-seguridad establecido por: la Secretaría del Trabajo, SEDECOAS FHIS y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras; en este sentido se ha tenido muy poco avance en comparación al trimestre anterior.

El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, inició el día 23 de noviembre de 2019. Al mes de junio de 2020 se tiene un avance físico promedio del 48.24% y un avance financiero del 42.15% en relación al monto contratado que es de L. 10,967,584.51. En comparación al avance físico del trimestre anterior el proyecto no ha tenido un avance notorio, debido al paro de labores establecidas por la emergencia nacional ante la pandemia por el COVID-19.

El Programa de Deportes y Valores. En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube, para el aprovechamiento de clases.

- **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):**

El monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00), al 30 de junio cuenta con un presupuesto vigente

de L 145,322,291 y una ejecución del L 41,362,856 que representa el 29%, para la rehabilitación de centros escolares y la Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional.

Por el estado de emergencia emitido mediante decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, a la fecha se han priorizado proyectos de Infraestructura y Equipamiento de establecimientos de salud con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia que atraviesa el país, según PCM-077-2020.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/ KFW SE-FHIS FASE III y IV, (2014 67 414 (KFW) / FHIS – SE y SE/FHIS VIII No.2008-66-178):**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 41 proyectos de los cuales, 21 ya cuentan con la factibilidad institucional y con sus respectivas no objeciones, de estos 21, 11 proyectos están en ejecución con un avance de ejecución física del 50% en promedio, debido a la emergencia COVID-19 (Coronavirus) se encuentran suspendidos temporalmente, sin embargo, ya se han autorizado el reinicio de actividades para finales del mes de julio.

GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL:

Este Gabinete Sectorial Social lo conforman 17 instituciones de las cuales cinco (5) instituciones: Secretaría de Salud (**SESAL**), Secretaría de Educación (**SEDU**), Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (**SEDIS**), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**UPNFM**), Universidad Nacional de Agricultura (**UNA**) y la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, ejecutan 16 programas y proyectos de inversión pública y el fideicomiso Vida Mejor.

El Gabinete tiene un presupuesto vigente de **L8,535,959,556** en el segundo trimestre logró una ejecución de **L1,089,368,415.21**. Equivalente el **13%** respecto al presupuesto vigente. La Distribución de la Inversión del Gabinete, está concentrada mayormente en el **Fideicomiso Vida Mejor** con un **53%** de participación seguido por la Secretaría de Salud (**SESAL**) (**12%**), Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (**SEDIS**) (**8%**); Secretaría de Educación con un (**5%**) en menor proporción el resto de las instituciones.

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación y salud.

Al Segundo Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las Familias de Extrema pobreza. Entre estos se encuentran.

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 3371/BL-HO):**

Durante este segundo trimestre en el Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones, En el segundo trimestre de 2020, se efectuó el pago de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes. También de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

De igual manera, el pago por concepto de supervisión de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica que corresponde al pago No.5, de la cancelación de la Estimación No.4 : incluye medidas ambientales, porcentaje de avance obra del 28.28% del 70% del monto del contrato. Pago de honorarios de los ingenieros supervisores del Diseño y Supervisión de Obras SEDUC.

Supervisión de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica. Cabe mencionar, que al segundo trimestre se han recepcionado 23 CEB en los departamentos de Copán (5 CEB) en los municipios de Cucuyagua (1 CEB), La Unión (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB), San Antonio (1 CEB), Intibucá 1 CEB: municipio de Colomoncagua, La Paz 5 CEB: Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 4 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB), Santa Cruz (1 CEB), Ocotepeque (3 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara (5 CEB) en los municipios de Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB), San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1 CEB).

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):**

En el segundo trimestre en el Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas: Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), en el período se realizó el pago por L2,878,173.48 de la comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de TMC a los participantes del Programa Bono Vida Mejor, de acuerdo a liquidación de fecha 30 de diciembre del 2019.

El Componente Fortalecimiento Institucional: Entre las actividades realizadas bajo el componente de Fortalecimiento Institucional en el segundo trimestre de 2020, se continuó apoyando la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva Local para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor, a través de: dos (2) consultores para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del PBVM, tres (3) consultores a nivel local para la identificación de la oferta institucional

para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva, uno (1) consultor para apoyar los procesos de Gestión Administrativa para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva.

Con el objetivo de garantizar la operatividad del PBVM tanto a nivel central como a nivel comunitario, se continuó con los servicios de dieciséis (16) Coordinadores Departamentales, ciento setenta y uno (171) Gestores Sociales, quince (15) Oficiales de Atención al Participante, cuatro (4) Técnicos en Seguimiento de Auditoría, cuarenta y uno (41) Digitadores SSIS/PRAF y dos (2) supervisores de Digitadores, un Asistente Operativo de la Dirección de TMC. Adicionalmente, se efectuó el reembolso de gastos por inscripción al curso de Gestión por Resultados y Presupuesto realizado en la Ciudad de Santiago de Chile, en el periodo comprendido del 15 al 28 de marzo del año en curso realizado al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica Americana y Social (ILPES/CEPAL).

El Componente Piloto de Superación de Pobreza: En el segundo trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera para el periodo reportado.

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Dentro del Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada, se efectuó el pago de la comisión bancaria por el servicio de entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) Dominio Urbano del año 2019 a los participantes del Programa, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta, monto y forma de pago en el Contrato de prestación de servicios bancarios interinstitucional suscrito entre la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF) y el Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A. (BANRURAL) y de acuerdo a la liquidación presentada por BANADESA en fecha 25 de febrero de 2020.

- **Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor**

La información que se refleja en el presente Informe del Fideicomiso de Protección Social es indicativa ya que no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH). Cuenta con presupuesto para el 2020 de **L4,500** millones está fundamentado en 13 Proyectos de inversión, de los cuales, en base a la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) al segundo trimestre solamente presentan ejecución cuatro proyectos que se detallan a continuación:

Guías de Familia: (Monto Presupuestado L708.0 millones), ejecución financiera de L486.4 millones, beneficiando a 90,508 familias.

Mejores Familias: (Monto Presupuestado L207.7 millones) ejecución financiera de L116.8 millones, beneficiando a 377,041 familias.

Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L130.6 millones) ejecución financiera de L54.6 millones, beneficiando a 206,949 personas adultas mayores.

Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L24.2 millones) ejecución financiera de L13.8 millones, beneficiando a 3,606 personas con discapacidad.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para el tercer y cuarto trimestre del año, esto debido a la emergencia mundial de la Pandemia COVID-19.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO**

1) Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Desde el inicio del Programa al 31 de marzo del presente año, se han atendido 182,226 mujeres, de las cuales 43,744 fueron nuevos ingresos (24.0%) del total y 138,752 (76.0%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2020 un promedio diario de 268 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 350,544 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 764 mujeres de las cuales 13 fueron nuevos ingresos (1.7%) del total y 751 (89.3%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 27,384.

2) Centro Ciudad Mujer Choloma

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de Junio del presente año, se han atendido 82,531 mujeres, de las cuales 22,981 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 59,550 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 209,439, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 1,725 mujeres de las cuales 482 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 1,243 (72%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 5,743.

La baja que se registra en este trimestre con respecto al anterior es de alrededor de un 74.4%, debido a la Pandemia Covid-19, el único módulo que operó al 100% en atenciones y servicios fue el MSSR, y a finales de junio el Módulo de Autonomía Económica (MAE), el MAPRODEM y el MAA han podido brindar algunos servicios.

3) Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 61,134 mujeres, de las cuales 17,199 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 43,935 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la

atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 143,891 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 2,117 mujeres de las cuales 692 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 1,425 (67%) visitas brindándoseles 4,803 atenciones de servicio en los diferentes módulos.

La baja que se registra en este trimestre con respecto al trimestre anterior de alrededor de un 77% se debe a la pandemia suscitada en nuestro país sobre Covid-19, el único módulo que operó para atenciones y servicios fue el MSSR, posteriormente se fue integrando el MAPRODEN y a finales de junio se han podido brindar servicios en el MAA y alguno de MAE.

4) Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 38,565 mujeres, de las cuales 23,704 fueron nuevos ingresos (61.4%) del total y 14,861 (38.6%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 151 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 94,664 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 3,863 mujeres de las cuales 6,632 fueron nuevos ingresos (38.5%) del total y 2,374 (61.5%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 10,531 atenciones.

La baja que se registra en este trimestre con respecto al trimestre anterior de alrededor de un 77% se debe a la pandemia suscitada en nuestro país sobre Covid-19, el único módulo que opero para atenciones y servicios fue el MSSR, posteriormente se fue integrando el MAPRODEN y a finales de junio se han podido brindar servicios en el MAA y alguno de MAE

5) Centro Ciudad Mujer Juticalpa

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 12,244 mujeres, de las cuales 5,691 fueron nuevos ingresos (46.5%) del total y 6,553 (53.5%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 80 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 37,513 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En el segundo trimestre del presente año se han atendido 2,117 mujeres, de las cuales 692 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 1,425 (53%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 10,531 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

6) Ciudad Mujer Móvil

Durante el trimestre se han atendido a 120 mujeres de las cuales 14 fueron nuevos ingresos y 106 subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 120, es de señalar que debido a la pandemia COVID 19, hasta el mes de junio se pudieron reanudar los servicios y las atenciones. Las actividades que se realizaron son las siguientes:

- Se reabrieron las atenciones y servicios a partir de la primera quincena del mes de junio en los módulos de MSSR y en el área de asesoría psicológica de MAPRODEM.
- Se realizaron las gestiones con la empresa privada para conseguir kits de material de bioseguridad a lo cual hubo respuesta satisfactoria.
- Se realizó la contratación del siguiente personal: dos médicos; la especialista gineco-obstetra, la médico general y una licenciada de enfermería refiriéndose al MSSR y una psicóloga en el módulo de MAPRODEM.
- Se recibieron diversos cursos en la plataforma del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP; tales como el de Normas de bioseguridad, oratoria, Actitud positiva con inteligencia emocional, entre otros.
- Se ha tenido la aceptación de las usuarias al momento de ofrecer las atenciones a través de llamadas telefónicas o video llamadas, a lo cual se indican seguimientos en dichas atenciones.

Proyecto Ejecutado por Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):

- **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, (FN 000057-11 UPNFM):**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, no se registra avances en la ejecución física en este II Trimestre 2020 debido a las dificultades con la aprobación de permiso ambiental y el permiso de construcción, los cuales no se entregaron por motivo de la Declaración de la Emergencia Sanitaria (COVID19) por lo que la Alcaldía San Pedro Sula suspendió sus actividades por mandato de SINAGER.

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), El monto a pagar a la constructora DICONSET según contrato es de L 38,473,420.10. La vigencia del contrato es del 16 de octubre de 2019 al 15 de diciembre de 2020, se le pagó el anticipo por L.7.7 millones; la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los dos permisos antes mencionados. Para este Contrato se solicitará ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN; por el desfase causado primero por la problemática de la Licencia Ambiental y el Permiso de Construcción, así como la situación de la Pandemia Covid-19.

Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario. El monto a pagar a la empresa supervisora INDES según contrato es de L 1,958,825.00. La vigencia del contrato es del 20 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021. Para este Contrato de Supervisión se solicitará ampliación al proyecto con nuevo cronograma de ejecución, en base a la solicitud de

ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN. El inicio de la obra civil de construcción depende de la aprobación de los 2 permisos: la Licencia Ambiental (la cual ya se cuenta) y del Permiso de construcción por parte de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, (el cual se encuentra todavía pendiente); se están realizando las gestiones para su obtención de manera electrónica, pero en estas circunstancias de la Pandemia Covid-19 y por lo complicado del proceso no se cuenta con una fecha probable para la resolución final.

Proyectos Ejecutados por La Secretaría de Educación (SEDUC):

- **Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

Al segundo trimestre el proyecto no presenta ejecución física según SIAFI. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), para el segundo trimestre se han realizado las siguientes acciones conforme a la planificación de productos esperados:

A la presentación del presente informe se están realizando las siguientes acciones para el logro de los productos planificados para el año 2020:

Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos. El proceso para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento a la fecha está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la Propuesta Técnica y Económica para una posterior negociación de contrato.

Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas. A la fecha se cuenta con No Objeción del BID al primer grupo de 12 de Carpetas Pre factibilidad otorgada por medio de CID/CHO/524/2020 de fecha 28 de abril de 2020.

Están en proceso de digitalización del segundo grupo de 12 nuevas carpetas de prefactibilidad para posterior de solicitud oficial al BID de No Objeción a dichas carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura.

Firma de Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara de las primeras 24 está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la lista corta para proceder a invitar a firmas que conforman lista corta.

El proceso para la contratación de la Empresa Constructora para la Ampliación de Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica zonas rurales de baja cobertura en el occidente del país está por presentarse la Solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones para proceder a publicar llamado a licitación.

Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía.

Esta por nombrar como Órgano Ejecutor y futuro Contratante del Proyecto la Comisión de Evaluación que estaría integrada por miembros de SEDUC, UPNFM y AEPASH (UEP), mediante memorándum de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e

Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras.

Producto 2.4: Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.

En el proceso para la Contratación de Servicios para la Reproducción y Entrega de Textos Áreas Educativas Curriculares está en proceso de solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones.

Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.

En ejecución la consultoría para la Implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.

Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados. Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Al trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, el Programa no contó desde el inicio del año 2020 con personal técnico contratado, debido a que la Dirección de Adquisiciones de SEDUC, estuvo resolviendo temas con la ONCAE, en relación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones Consolidado (PACC).

Para el segundo trimestre 2020, a raíz de la Pandemia COVID-19 por lo que no se logró realizar las actividades planificadas en el PACC y POA 2020, que conllevan al logro y ejecución física y financiera del Programa PROMINE, debido a las restricciones por contención del gasto mediante las Circulares DGP-003-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, y DGIP-003-2020 con fecha 31 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que el Programa realiza su ejecución mediante las visitas a centros educativos y realizar la Formulación, Supervisión y Recepción de Proyectos de Infraestructura Educativa ejecutados por SEDECOAS, así mismo confirmar la implementación de la normativa de Planificación de la Infraestructura de Centros Educativos.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).

- **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) de la SESAL, cuentan con un 78% de avance físico al II Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel:
 - Se alcanzó el 100% de la meta física.
 - Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM.
 - Adquisición de equipo de cómputo y kit para los colaboradores voluntarios.
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales:
 - Hospitales priorizados cuentan con los lineamientos para la organización de los servicios hospitalarios
 - Otros logros: Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría:
 - Informe de auditoría realizado, Se alcanzó el 100% de la meta física.
- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal” BID 4619/BL-HO:**

Al término del segundo trimestre, el Proyecto todavía se encuentra realizando su ejecución dentro de la SESAL, procurando evitar el desfase en la ejecución de recursos para la atención en la Emergencia Sanitaria COVID-19. Mediante Oficio No. CGG-113-2020, de fecha 21 de abril de 2020, AEPAS-H notifica que el plazo máximo para transferencias entre cuentas (TEC), priorización y pagos de F01/F07; y regulación de dichas transacciones hasta el 25 de mayo de 2020, plazo que se amplió al 30 de junio 2020 mediante Oficio No. CGG-GS-133-2020 en fecha 26 de mayo de 2020 y posteriormente al 31 de julio de 2020 con el Oficio No. Oficio AEPAS-H -0025-2020.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), se alcanzó el 100% del avance físico programado al II Trimestre, que corresponde a población garantizada con la prestación de servicios de salud a través del Modelo de Gestión Descentralizada.

- ✓ Se logró una ejecución del 85% para el II trimestre debido a la incorporación de 8 convenios con gestores de segundo Nivel en el marco de la pandemia COVID 2019:
 - Región Norte (Valle de Sula): Leonardo Martínez (Cortés), Hospital Puerto Cortés (Cortés)
 - Región Occidente: Regional de Occidente (Copán), San Marcos de Ocotepeque, Enrique Aguilar Cerrato (Intibucá)
 - Región Sur: Hospital del SUR (Choluteca)
 - Hospital San Francisco (Olancho)
 - Hospital San Lorenzo (Valle)
- ✓ Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales: Continuidad en la prestación de servicios brindando a través de gestores

descentralizados. Así como la prestación de servicios de salud en el marco de la Pandemia COVID-19.

- ✓ Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información: Se cuenta con las Asistencias Técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

- **Hospital María de Especialidades Pediátricas, (ITALIA-HOS/MARIA):**

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora tenemos las siguientes:

- Se reporta avance en las metas físicas en un 65%, en relación a equipo entregado en el Hospital, en referencia a los lotes 3 y 9.
 - A la fecha no se reporta ejecución financiera, debido a que se encuentra en gestión el proceso de solicitud de desembolso conforme al "Anexo A" del Convenio de financiamiento, para remitir al Organismo Financiero (Cassa Depositi e Prestiti - CDP).
 - En gestión con SEFIN (Crédito Público), el trámite de Delegación de Firma por parte de la UAFCE.
 - Confirmación de ampliación de plazo por parte de CDP.
- **Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, (EDCF No. HND-4) Fondos de Eximbak Korea:**

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos, dando respuesta que requieren informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al segundo trimestre 2020.

Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Al II Trimestre la ejecución Financiera según SIAFI es de 0.9%. En cuanto al avance físico, fue aprobado por la Dirección de Franquicias, exoneración de impuestos sobre ventas en abril de 2020, pero por las restricciones por la pandemia de COVID-19 lo cual ha provocado que las empresas proveedoras de equipos no puedan embarcar los bienes que vienen del extranjero y las nacionales por restricciones de movilización del personal para la entrega del bien y la instalación se han limitado, pues para acceso al municipio debería estar en cuarentena durante 14 días y no cuentan con los salvo conductos requeridos. En relación a las obras hay retrasos debido a que los nuevos contratos se firmaron en febrero, pero no se tenía aprobación de la incorporación presupuestaria del proyecto debido a que el mismo no fue formulado para la presente gestión.

GABINETE DESARROLLO ECONÓMICO

Este Gabinete lo conforman veintinueve (29) instituciones:

De las cuales siete (6) Instituciones están ejecutando proyectos de Inversión Pública: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) con **34%** de participación, Secretaría de Finanzas (**SEFIN**) **14%**, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (**STSS**) con **7%**; Instituto Nacional de Conservación Forestal (**ICF**) con **2%** y en menor porcentaje el Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (**IHCIETI**) y Centro Nacional de Educación para el Trabajo (**CENET**).

Al segundo Trimestre del 2020 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente de **L2,156,717,442** y un presupuesto devengado que asciende a **L397,756,289 (18.4%)**. Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales. Al segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):

- **El Proyecto Adaptación Al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR), (DCI-AL-4/2012/023-5 I0) KFW/UE:**

Durante el II Trimestre se reporta una ejecución física según SIAFI de un 0% y financiera de un 31% en relación al trimestre.

Según Unidad Ejecutora Durante el II Trimestre se presenta una ejecución física de 100% y financiera de un 117% en relación al trimestre.

Según la Unidad Ejecutora reporta actividades relevantes ejecutadas tales como:

Se ha dado seguimiento al funcionamiento de instancias de desarrollo territorial de comunidades indígenas y garífunas; en el periodo se realizó evaluación del Plan de Vida del sitio PECH de Jocomico. Destacándose las siguientes situaciones:

a) Actualmente la comunidad de Jocomico está en estado crítico el tema de gobernanza territorial, debido a que han vendido parte de su territorio de una forma ilegal a terceros, logrando incrementar la pérdida de su cosmovisión como pueblo indígena.

b) Debido a la falta de asistencia técnica y financiera para la implementación de una agricultura sostenible, el pueblo Pech de Jocomico hoy en día está en riesgo su seguridad alimentaria.

c) El tema de educación es limitado, ya que nada más se cuenta con el nivel primario, cortando las esperanzas de un desarrollo educativo superior a los niños y jóvenes de la comunidad.

d) Por cultura misma, los Pech radican en viviendas hechas de materiales ligeros como el barro y maderas livianas, tradiciones que aún mantienen. Actualmente impulsan el mantenimiento del puente peatonal que cruza el río Wampu.

e) La comunidad de Jocomico a través de su C.T poseen un plan de manejo forestal orientado a la extracción de madera de pino, pero actualmente por la llegada de terceros existen zonas forestales que han sido eliminadas con el objetivo de siembra de zacates o granos básicos.

f) Es necesario la creación de un centro de salud en la comunidad, ya que el centro de salud más próximo está a 3 horas a pie de camino, por lo que niños y ancianos requieren de atención inmediata.

g) En la comunidad existe una gran intervención por parte de las iglesias, por lo que son mínimos los problemas sociales, como ser; abusos sexuales o drogadicción.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

Al segundo trimestre, el Proyecto presenta una ejecución financiera de 19%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

El subproyecto sistema de Riego Sulaco: durante este período se ha trabajado en la línea de conducción del sub proyecto Tascalapa, como también en la fundición de las presas, específicamente en los canales de limpieza y desarenador, pruebas hidrostática y colocación de válvulas parcelarias.

Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas: Durante el II trimestre, se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 4,510.38 metros lo que representa un avance de 3.45% del total contratado, por lo cual a la fecha informada del mes de junio, se cuenta con 26,739.31 metros lineales de tubería aprobada con éxito, que representa un 20.46% del valor total contratado.

El Sub proyecto Sistema de Riego de Olomán: Durante este II Trimestre no se ejecutó ninguna actividad en el Sistema de Riego de Olomán.

El Sub proyecto Sistemas de Riego de Proyectos de Pequeño: La SAG, realizó reunión para presentar los proyectos de pequeño riego (PPR-PDABR) que serán abastecidos con cosecha de agua, beneficiando a 215 productores y aplicando riego a 112.96 hectáreas, está pendiente la licitación del proceso.

Se revisó Contrato de Supervisión de Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego (PPR-PDABR) correspondiente a Lamaní (Lote No. 2) para Manifestarle a la empresa ganadora del concurso (VIELCA Ingenieros S.A.) los cambios suscitados al mismo.

El Sub proyecto Sistema de Riego de San Sebastián: En relación a la ejecución física, se encuentra en un 16.26%, en este tipo de proyectos donde el suministro de tubería representa más del 50% del costo total del mismo.

En estos momentos la ejecución se ve afectada por la falta de autorización de la ejecución de la línea de conducción principal del proyecto por los problemas de servidumbre suscitados en el mismo y la pandemia del Covid 19.

El Sub proyecto Sistema de Riego de Selguapa: presenta un avance de 1.536.65 ml (1.5 KM) que representa el 3% de avance, el acumulado es de 2,972.65 ml (3.0 KM) representando un avance acumulado del 5%.

El proyecto al segundo trimestre presenta una ejecución financiera de L.47.5 millones que representa el 18.99% del presupuesto vigente.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN-(DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

El proyecto no presenta ejecución financiera y física debido a que el EXIM Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

COMPONENTE 1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES:

Durante el segundo trimestre se culminó con la elaboración de 130 planes de fortalecimiento organizativo (PFO), estos ya han sido aprobados por las Organizaciones beneficiarias (OB) la implementación de los mismos se ha retrasado por las situaciones que se han presentado a causa de la pandemia del Covid19.

Se continuó con la documentación de organizaciones beneficiarias para las actualizaciones de membresías, juntas directivas, tramites de personerías jurídicas, obtención de RTN, PIN SIAFI y aperturas de cuentas.

COMPONENTE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIOS

Se realizaron reuniones de seguimiento con los 13 técnicos que están brindando los servicios de asistencia técnica a 47 organizaciones que ya tienen sus desembolsos FIDA y GEF. Cumpliendo con las recomendaciones de SINAGER.

La SAG, realizó giras de monitoreo y seguimiento a las inversiones que se están realizando en los municipios de Colomocagua, Camasca, Concepción del departamento de Intibucá y los municipios de Yarula, Santa Elena y San José del departamento de La Paz, proyectos de infraestructura, cultivo de café y tiendas de consumo, además se revisaron procesos de compras y recopilación de contrapartidas.

Acompañamiento en los procesos de liquidación de las 59 Organizaciones Beneficiarias, 21 ya finalizaron las inversiones y liquidaron los fondos FIDA y GEF, 30 que están en proceso de liquidación, 4 OB que están ejecutando fondos y 3 OB que todavía les hace falta un desembolso.

COMPONENTE 3. INFRAESTRUCTURA RURAL

Durante el segundo trimestre no se avanzó con la ejecución de los tres proyectos de caminos mismos que se encuentran paralizado producto de la Emergencia Covid-19. Durante el mes de junio se recibió el dictamen legal favorable al convenio con el Fondo Cafetero Nacional, así mismo se envió el trámite para pago del primer desembolso y reanudar los trabajos en campo durante el mes de julio los proyectos se encuentran con porcentajes de avance del 26, 12 y 12% respectivamente.

El Proyecto Durante el año 2020 ha generado un total de 524 empleos.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- **Manejo Sostenible De Bosques, (BID3878/BL-HO):**

Para el segundo trimestre del 2020 cuenta con un presupuesto vigente de L 194,218,327 y una ejecución de L9,781,124, representando el 5% del presupuesto asignado.

Las Principales metas físicas acumuladas son:

Componente 1. Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo

- Al 30 de junio 2020, se elaboraron 36 planes de restauración, equivalentes a 31,603.03 hectáreas (93%); de los cuales, se aprobaron 33 planes, equivalentes a 30,218.84 hectáreas (89%); con convenios suscritos 31 planes, equivalentes a 29,754.97 hectáreas (88%) y en ejecución 26 planes, equivalentes a 28,267.23 hectáreas (83%).
- Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución.
- En afinamiento el Módulo de Monitoreo del Proyecto en la plataforma SIGMOF de ICF.
- En ejecución proceso de contratación firma para diseño del programa piloto de incentivos en bosque privado.

- En ejecución proceso de contratación firma para el diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático

- En ajustes finales el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones y seleccionados los temas de investigación en plagas y enfermedades forestales por parte de ICF.
- Provistas las cajas entomológicas a ICF y las universidades beneficiadas.
- En ejecución la carta acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del Programa de Capacitación en salud y sanidad forestal.
- En ejecución Contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT).
- En ejecución 2 contratos de apoyo a la clasificación de Línea Base de incendios forestales, en el área de influencia del proyecto.

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

- Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las cuales finalizaron en el mes de junio 2020.
- En Ejecución el Certificado de Fundamentos de Cambio Climático para 25 funcionarios públicos, el cual finaliza en el mes de julio 2020.

Cabe destacar que con la Publicación del Decreto Ejecutivo PCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, para la ejecución del **Programa Manejo Sostenible de Bosques (PSB) BID 3878/BL-HO**.

GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA:

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente por la cantidad de **L554,531,464** para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un **6.1%** de ejecución (**L33,837,534**) para el segundo trimestre de 2020. Las principales metas ejecutadas son:

Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

El avance físico obtenido al II Trimestre del 2020 fue poco satisfactorio, debido a la Pandemia por COVID19, en la cual el Gobierno de la República de Honduras estableció toque de queda absoluto en todo el territorio Nacional, el proyecto solicitó a todos los contratistas y consultores acatar las disposiciones del Gobierno y reanudar actividades de ejecución una vez el mismo establezca las fechas para continuar con las labores. Las actividades trasladadas son:

Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) San Antonio de Cortés, Cortés, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida. Los Contratos ya fueron firmados por un monto de L.54,980,113 y cuya ejecución física está en un 15%, la ejecución financiera es un 10% debido a que muchas de ellas tramitaron su anticipo de obra, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 30 de octubre de 2020. Estas medidas retomaron sus actividades a partir del 15 de junio de 2020 y su ejecución es lenta.

Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física quedó al 80%. Este Contrato tiene fecha de finalización 30 de agosto de 2020. Esta actividad retomó actividades a partir del mes de mayo de 2020.

Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.12,876,065 y su avance físico es de 20%, este Contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020. Esta medida retomó sus actividades a partir de mayo de 2020.

Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra publicado y está en espera de recepción de ofertas con un monto base de L.12,500,000. Las solicitudes de ofertas se han ampliado conforme se amplía el toque de queda.

Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías para el Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoría social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, por un monto de L.3,200,000 y su ejecución física está en un 60%.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Las limitaciones generadas por la Pandemia del Covid-19 el Gobierno de la República de Honduras mediante el Decreto Ejecutivo No. 005-2020 declaró Emergencia Nacional por lo que las actividades realizadas al II trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- En ejecución el contrato para la elaboración del Diseño para la Construcción de dos (2) Unidades Metropolitanas Policiales una en San Pedro Sula, Cortés y otra en Las Vegas, Santa Bárbara.
- En proceso la Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara; Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito, Yoro. Con No Objeción Conformación de lista corta.
- En ejecución, contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de Recepción de Denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. Avance físico: 55%; Avance Financiero: 49.0%.
- En ejecución contrato de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Investigación y Estudios para el fortalecimiento del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEASCI).
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.
- Componente: Efectividad policial
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Producto final entregado, Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).
- Obra e instalación culminada, adquisición de Suministro e instalación de generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO-TAMARA.
- Informe Final presentado, Capacitación Especializada para funcionarios de laboratorio de Balística y Documentología de la DPI.
- Capacitación de IBIS TRAX HD3D dirigido a personal del DPI (12) en la adquisición y análisis de resultados de balas y casquillos.
- En ejecución, contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI.
- En ejecución, Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.

- o Desarrollo los servicios de capacitación y primera visita documental, formando efectivos de la Dirección Policial de Investigación DPI, en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 - o Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración ISO 17025:2017 y un Sistema de Gestión para los diferentes organismos que realizan la inspección ISO 17020:2012.
- Bienes entregados, contrato adquisición de Insumos y Equipo para la DPI
 - o Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias inflamables.
 - o Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias corrosivas
 - o Dos (2) Muflas Eléctricas

Componente: Gestión del Programa

- En ejecución contrato de un Especialista Social para apoyo a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Segundo Trimestre del Año 2020

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

| Área | Problemas | Acciones |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica | Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno. | Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP. |
| | La declaratoria de emergencia nacional por COVID19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, de febrero del presente año, en el cual se ha determinado establecer toque de queda absoluto en el territorio nacional a partir de marzo de 2020. ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales. | Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos. |

| Área | Problemas | Acciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución</p> | <p>Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.</p> |
| | <p>Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.</p> | <p>Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Administrativa-Financiera</p> | <p>Retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales.</p> | <p>Revisar los artículos de las Normas de ejecución Presupuestaria, específicamente aquellos que afectan la ejecución de los proyectos.</p> |
| | <p>Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.</p> | <p>Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.</p> |
| | <p>El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.</p> | <p>La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.</p> |
| | <p>Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión</p> | <p>Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.</p> |

| Área | Problemas | Acciones |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legal | Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión. | Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos. |

MATRIZ FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Anual | | | | Devengado II Trimestre | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|-------|------|
| | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | 11 - Tesoro Nacional | 21 - Crédito Externo | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | 21 - Crédito Externo | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | 21 - Crédito Externo | Total | % Ejecución (Comp./Vig.) | | | | |
| 2 | Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo | - | 563,596,829 | 563,596,829 | - | 389,667,869 | 389,667,869 | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 7.6% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 7.6% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 7.6% | |
| 1 | 0010 - Poder Judicial | - | 75,712,929 | 75,712,929 | - | 75,712,929 | 75,712,929 | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | |
| 1 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | - | 487,883,900 | 487,883,900 | - | 313,954,940 | 313,954,940 | - | - | - | - | 0.0% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 9.5% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 29,765,153 | 9.5% | |
| 1 | Entes Sin Adscripción a una Gabinete | - | 606,159,737 | 606,159,737 | - | 184,285,057 | 184,285,057 | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 0.0% | |
| 1 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | - | 606,159,737 | 606,159,737 | - | 184,285,057 | 184,285,057 | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 0.0% | |
| 39 | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | 811,482,975 | 5,680,283,357 | 6,491,766,332 | 916,940,664 | 5,127,802,026 | 6,044,742,690 | 112,330,220 | 781,372,167 | 893,702,386 | 14.8% | 74,156,252 | 622,643,790 | 696,800,042 | 11.5% | 165,803,965 | 1,291,304,241 | 1,457,108,205 | 24.1% | - | - | - | 0.0% |
| 3 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | - | 756,979,805 | 756,979,805 | - | 48,695,922 | 48,695,922 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 0.0% | |
| 5 | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | 35,042,089 | 469,117,482 | 504,159,571 | 35,042,089 | 469,117,482 | 504,159,571 | 5,919,406 | 90,067,882 | 95,987,287 | 19.0% | 1,481,954 | 81,805,735 | 83,287,690 | 16.5% | 5,919,406 | 124,163,427 | 130,082,833 | 25.8% | - | - | - | 0.0% |
| 13 | 0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | 4,721,718 | 2,897,532,984 | 2,902,254,702 | 4,721,718 | 3,070,282,765 | 3,075,004,483 | 2,360,860 | 543,257,956 | 545,618,816 | 17.7% | 2,360,860 | 407,196,833 | 409,557,693 | 13.3% | 2,360,860 | 976,521,424 | 978,882,284 | 31.8% | - | - | - | 0.0% |
| 7 | 0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 579,827,394 | - | 579,827,394 | 579,827,394 | 199,361,846 | 779,189,240 | 84,778,588 | 22,036,890 | 106,815,478 | 13.7% | 53,065,885 | 22,036,890 | 75,102,775 | 9.6% | 138,241,529 | 22,036,890 | 160,278,419 | 20.6% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% | 3,924,854 | - | 3,924,854 | 2.6% | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% | - | - | - | 0.0% |
| 6 | 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica | 90,728,943 | 1,139,346,328 | 1,230,075,271 | 90,728,943 | 1,090,319,474 | 1,181,048,417 | 1,376,252 | 127,385,891 | 128,762,143 | 10.8% | 692,451 | 111,604,332 | 112,296,783 | 9.5% | 1,387,857 | 168,582,500 | 169,970,357 | 14.4% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0803 - Empresa Nacional Portuaria | - | - | - | - | 105,457,689 | 105,457,689 | 12,630,247 | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% | 12,630,247 | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | 87,136,431 | - | 87,136,431 | 87,136,431 | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | 1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central | - | 141,035,699 | 141,035,699 | - | 163,485,699 | 163,485,699 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa | - | 521,108,339 | 521,108,339 | - | 554,531,464 | 554,531,464 | - | 33,837,534 | 33,837,534 | 6.1% | - | 26,404,824 | 26,404,824 | 4.8% | - | 125,392,737 | 125,392,737 | 22.6% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0041 - Comisión Permanente de Contingencias | - | 108,300,000 | 108,300,000 | - | 141,723,125 | 141,723,125 | - | 21,877,735 | 21,877,735 | 15.4% | - | 15,456,308 | 15,456,308 | 10.9% | - | 85,106,002 | 85,106,002 | 60.1% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0070 - Secretaría de Seguridad | - | 412,808,339 | 412,808,339 | - | 412,808,339 | 412,808,339 | - | 11,959,799 | 11,959,799 | 2.9% | - | 10,948,516 | 10,948,516 | 2.7% | - | 40,286,735 | 40,286,735 | 9.8% | - | - | - | 0.0% |
| 18 | Gabinete Económico | 145,780,932 | 2,092,827,699 | 2,238,608,631 | 145,780,932 | 2,010,936,510 | 2,156,717,442 | 2,003,607 | 395,752,682 | 397,756,289 | 18.4% | 1,977,018 | 325,138,832 | 327,115,850 | 15.2% | 2,451,726 | 406,535,389 | 408,987,115 | 19.0% | - | - | - | 0.0% |
| 3 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | - | 922,520,954 | 922,520,954 | - | 819,635,677 | 819,635,677 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0037 - Servicio de Administración de Rentas | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 6,234,307 | 6,234,307 | 6.6% | - | 4,015,877 | 4,015,877 | 4.3% | - | 10,564,132 | 10,564,132 | 11.2% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 4 | 0100 - Secretaría de Finanzas | 100,000,000 | 195,913,977 | 295,913,977 | 100,000,000 | 205,217,418 | 305,217,418 | - | 30,041,571 | 30,041,571 | 9.8% | - | 23,736,112 | 23,736,112 | 7.8% | - | 35,258,379 | 35,258,379 | 11.6% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,641,640 | 33,712,150 | 35,353,790 | 24.9% | - | - | - | 0.0% |
| 6 | 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería | 37,542,285 | 692,906,897 | 730,449,182 | 37,542,285 | 700,826,897 | 738,369,182 | 211,435 | 309,702,820 | 309,914,255 | 42.0% | 184,846 | 247,612,860 | 247,797,707 | 33.6% | 211,435 | 309,702,820 | 309,914,255 | 42.0% | - | - | - | 0.0% |
| 19 | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | 3,770,647 | 3,770,647 | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 2,170,802 | 2,170,802 | 57.6% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Gabinete Social | 195,719,861 | 2,145,566,395 | 2,341,276,256 | 195,719,861 | 2,195,539,695 | 2,391,259,556 | 33,489,163 | 344,379,252 | 377,868,415 | 15.8% | 30,530,867 | 291,121,054 | 321,651,921 | 13.5% | 33,578,065 | 416,241,963 | 451,820,028 | 18.9% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | - | 196,639,426 | 196,639,426 | - | 196,639,426 | 196,639,426 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | 0050 - Secretaría de Educación | 2,497,156 | 450,407,904 | 452,905,060 | 2,497,156 | 450,407,904 | 452,905,060 | 10,979 | 26,541,243 | 26,552,222 | 5.9% | 10,979 | 24,243,184 | 24,254,163 | 5.4% | 10,979 | 26,541,243 | 26,552,222 | 5.9% | - | - | - | 0.0% |
| 6 | 0060 - Secretaría de Salud | 1,633,532 | 995,551,302 | 997,184,834 | 1,633,532 | 1,019,425,602 | 1,021,059,134 | - | 218,987,290 | 218,987,290 | 21.4% | - | 199,710,056 | 199,710,056 | 19.6% | - | 229,708,456 | 229,708,456 | 22.5% | - | - | - | 0.0% |
| 7 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 165,181,186 | 494,456,677 | 659,637,863 | 165,181,186 | 494,456,677 | 659,637,863 | 33,478,185 | 96,416,873 | 129,895,058 | 19.7% | 30,519,889 | 65,419,462 | 95,939,350 | 14.5% | 33,567,086 | 159,354,042 | 192,921,128 | 29.2% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 2,186,358 | 2,186,358 | 25.7% | - | 1,500,864 | 1,500,864 | 17.7% | - | 2,390,734 | 2,390,734 | 28.1% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | 26,407,987 | - | 26,407,987 | 26,407,987 | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0703 - Universidad Nacional de Agricultura | - | - | - | - | 26,109,000 | 26,109,000 | - | 247,488 | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 247,488 | 0.9% | - | - | - | 0.0% |
| 73 | Total general | 1,152,983,768 | 11,468,512,835 | 12,621,496,603 | 1,258,441,457 | 10,511,458,543 | 11,769,900,000 | 147,822,990 | 1,585,106,787 | 1,732,929,777 | 14.7% | 106,664,137 | 1,295,073,653 | 1,401,737,790 | 11.9% | 201,833,755 | 2,271,239,483 | 2,473,073,238 | 21.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Fondos Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) | 4,500,000,000 | - | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | - | - | 711,500,000,000 | - | 711,500,000,000 | 15.8% | - | - | - | 15.8% | 711,500,000,000 | - | 711,500,000,000 | 15.8% | - | - | - | 0.0% |
| 5 | Proyectos APP'S | 4,576,900,000 | - | 4,576,900,000 | 4,576,900,000 | - | - | 4,906,100,000,000 | - | 4,906,100,000,000 | 9.7% | - | - | - | 9.7% | 4,906,100,000,000 | - | 4,906,100,000,000 | 9.7% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Programa de Infraestructura Vial | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | 3,450,000,000,000 | - | 3,450,000,000,000 | 90.5% | - | - | - | 90.5% | 3,450,000,000,000 | - | 3,450,000,000,000 | 90.5% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) | 1,013,000,000 | - | 1,013,000,000 | 1,013,000,000 | - | - | 1,844,700,000,000 | - | 1,844,700,000,000 | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 81 | Total Inversión Pública | 13,742,883,768.00 | 25,211,380,425.00 | 38,954,264,193.00 | 15,759,241,457.00 | 26,270,700,000.00 | 28,029,929,975.00 | 4,455,922,989.75 | 15,759,241,457.00 | 16,015,852,964.75 | 23.0% | 6,041,029,776.98 | 15,759,241,457.00 | 16,015,852,964.75 | 23.0% | 4,509,933,754.89 | 6,781,173,237.68 | 7,281,107,012.57 | 25.8% | - | - | - | 0.0% |

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-175-2020 y Circular No. CGG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.
/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

MATRIZ FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Anual | | | | Devengado II Trimestre | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp. / Vig.) |
| 2 | Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo | | | - | 563,596,829 | 563,596,829 | - | 389,667,869 | 389,667,869 | - | 59,530,306 | 29,765,153 | 8% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 7.6% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 7.6% |
| 1 | 0010 - Poder Judicial | | | - | 75,712,929 | 75,712,929 | - | 75,712,929 | 75,712,929 | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% |
| 1 | 005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RÁPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | DCI-ALA/2013/023-720 | 26/11/2013 - 26/11/2020 | - | 75,712,929 | 75,712,929 | - | 75,712,929 | 75,712,929 | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 39.3% |
| 1 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | | | - | 487,883,900 | 487,883,900 | - | 313,954,940 | 313,954,940 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 9.5% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 9.5% |
| 1 | PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA | P170469 | | - | 487,883,900 | 487,883,900 | - | 313,954,940 | 313,954,940 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Total - PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA | | | - | 487,883,900 | 487,883,900 | - | 313,954,940 | 313,954,940 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Entes Sin Adscripción a una Gabinete | | | - | 606,159,737 | 606,159,737 | - | 184,285,057 | 184,285,057 | - | 268,483,745 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | | | - | 606,159,737 | 606,159,737 | - | 184,285,057 | 184,285,057 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate" | 2235-TRAMO A | | - | 606,159,737 | 606,159,737 | - | 184,285,057 | 184,285,057 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Total 005 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate" | | | - | 606,159,737 | 606,159,737 | - | 184,285,057 | 184,285,057 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 39 | Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas | | | 811,482,975 | 5,690,283,357 | 6,491,766,332 | 916,940,664 | 5,127,802,026 | 6,044,742,690 | 112,330,220 | 238,718,592 | 893,702,386 | 14.8% | 74,156,252 | 227,080,069 | 696,800,042 | 11.5% | 165,803,965 | 288,695,421 | 1,457,108,205 | 24.1% |
| 3 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | | | - | 756,979,805 | 756,979,805 | - | 48,695,922 | 48,695,922 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 0.0% | - | 29,765,153 | 29,765,153 | 0.0% |
| 1 | INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II) | P158086 | | - | 48,695,922 | 48,695,922 | - | 48,695,922 | 48,695,922 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Total INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II) | | | - | 48,695,922 | 48,695,922 | - | 48,695,922 | 48,695,922 | - | 29,765,153 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICAS PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS DE LA ENEE | P158086 | | - | 200,335,793 | 200,335,793 | - | - | - | - | 29,765,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Total PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICAS PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS DE LA ENEE | | | - | 200,335,793 | 200,335,793 | - | - | - | - | 29,765,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | P158086 | | - | 507,948,090 | 507,948,090 | - | - | - | - | 29,765,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | | | - | 507,948,090 | 507,948,090 | - | - | - | - | 29,765,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | | | 35,042,089 | 469,117,482 | 504,159,571 | 35,042,089 | 469,117,482 | 504,159,571 | 5,919,406 | 65,735,877 | 95,987,287 | 19.0% | 1,481,954 | 61,592,714 | 83,287,690 | 16.5% | 5,919,406 | 65,983,020 | 130,082,833 | 25.8% |
| 1 | 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUGESTION LOCAL | 2014 67 414 (KFV) / FHS - SE | | 2,824,000 | 9,995,100 | 12,819,100 | 2,824,000 | 9,995,100 | 12,819,100 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUGESTION LOCAL | SE/FHS VIII No.2008-66-178 | | 1,298,432 | 121,790,245 | 123,088,677 | 1,298,432 | 121,790,245 | 123,088,677 | 457,785 | 22,773,847 | 23,231,632 | 18.9% | 200,027 | 18,630,684 | 18,830,711 | 15.3% | 457,785 | 22,773,847 | 23,231,632 | 18.9% |
| 2 | 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 522-0501-4 | 19/10/2017 - 19/10/2021 | 28,651,501 | 116,670,790 | 145,322,291 | 28,651,501 | 116,670,790 | 145,322,291 | 5,461,620 | 35,901,236 | 41,362,856 | 28.5% | 1,281,928 | 35,901,236 | 37,183,163 | 25.6% | 5,461,620 | 35,901,236 | 41,362,856 | 28.5% |
| 3 | 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS | ATN/OC-17135-HO | 01/10/2018 - 01/10/2023 | - | 4,889,760 | 4,889,760 | - | 4,889,760 | 4,889,760 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | 247,143 | 247,143 | 5.1% |
| 1 | Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS | BID/4518/BL-HO | | - | 129,981,491 | 129,981,491 | - | 129,981,491 | 129,981,491 | - | - | 19,224,802 | 15.4% | - | - | 15,105,819 | 12.1% | - | - | 53,073,205 | 42.5% |
| 4 | 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS | | | - | 134,871,251 | 134,871,251 | - | 129,871,251 | 129,871,251 | - | - | 19,224,802 | 14.8% | - | - | 15,105,819 | 11.6% | - | 247,143 | 53,320,348 | 41.1% |
| 1 | Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS | BCIE-1736 | | 2,288,156 | 20,207,000 | 22,475,156 | 2,288,156 | 20,207,000 | 22,475,156 | - | 3,581,310 | - | 15.9% | - | - | 3,581,310 | 15.9% | - | - | 3,581,310 | 15.9% |
| 1 | 047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE) | | | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | 1,525,893 | 30.5% | - | - | 1,525,893 | 30.5% | - | - | 1,525,893 | 30.5% |
| 1 | Total 047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE) | | | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | 1,525,893 | 30.5% | - | - | 1,525,893 | 30.5% | - | - | 1,525,893 | 30.5% |
| 5 | 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 522-0502 C d E No.9 | 31/10/2018 - 30/04/2021 | - | 65,583,096 | 65,583,096 | - | 65,583,096 | 65,583,096 | - | 7,060,794 | 7,060,794 | 10.8% | - | 7,060,794 | 7,060,794 | 10.8% | - | 7,060,794 | 7,060,794 | 10.8% |
| 1 | Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | | | - | 65,583,096 | 65,583,096 | - | 65,583,096 | 65,583,096 | - | 7,060,794 | 7,060,794 | 10.8% | - | 7,060,794 | 7,060,794 | 10.8% | - | 7,060,794 | 7,060,794 | 10.8% |
| 13 | 0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | | 4,721,718 | 2,897,532,984 | 2,902,254,702 | 4,721,718 | 3,070,282,765 | 3,075,004,483 | 2,360,860 | 117,412,989 | 545,618,816 | 17.7% | 2,360,860 | 110,065,405 | 409,557,693 | 13.3% | 2,360,860 | 154,681,366 | 978,882,284 | 31.8% |
| 1 | 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | Carta de Ejecución No. 7 USAID/TF017904 | 29/01/2014 - 30/10/2021 | - | 111,649,170 | 111,649,170 | - | 111,649,170 | 111,649,170 | - | 61,227,048 | 61,227,048 | 54.9% | - | 56,354,258 | 56,354,258 | 50.5% | - | 74,015,884 | 74,015,884 | 66.3% |
| 1 | Total 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) | | | - | 213,218,663 | 213,218,663 | - | 213,218,663 | 213,218,663 | - | 49,409,761 | 49,409,761 | 23.2% | - | 47,124,987 | 47,124,987 | 22.1% | - | 73,885,387 | 73,885,387 | 34.7% |
| 2 | 010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II | BID-3815/BL-HO | 30/06/2017 - 04/06/2021 | - | 255,969,868 | 255,969,868 | - | 229,602,667 | 229,602,667 | - | 121,698,130 | 121,698,130 | 53.0% | - | 121,698,130 | 121,698,130 | 47.4% | - | 147,901,271 | 147,901,271 | 45.5% |
| 1 | Total 010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II | | | - | 255,969,868 | 255,969,868 | - | 229,602,667 | 229,602,667 | - | 121,698,130 | 121,698,130 | 53.0% | - | 121,698,130 | 121,698,130 | 47.4% | - | 147,901,271 | 147,901,271 | 45.5% |
| 3 | 011 - CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL | BID_2470/BL-HO-1 | | - | 7,967,525 | 7,967,525 | - | 4,558,952 | 4,558,952 | - | 9,351,128 | 9,351,128 | 20.6% | - | 4,753,268 | 4,753,268 | 10.5% | - | 9,353,496 | 9,353,496 | 20.6% |
| 1 | Total 011 - CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL | BID 2470BL-HO-2 | | - | 129,333,159 | 129,333,159 | - | 165,987,698 | 165,987,698 | - | 16,316,022 | 16,316,022 | 9.8% | - | 12,252,397 | 12,252,397 | 7.4% | - | 28,835,303 | 28,835,303 | 17.4% |
| 4 | 012 - CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDURENAS (CIUDAD MUJER) | BID-3771/BL-HO | 26/12/2016 - 26/04/2022 | - | 87,106,119 | 87,106,119 | - | 95,009,319 | 95,009,319 | - | 15,199,847 | 15,199,847 | 16.0% | - | 7,033,421 | 7,033,421 | 7.4% | - | - | 82,122,845 | 86.4% |
| 1 | Total 012 - CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDURENAS (CIUDAD MUJER) | | | - | 87,106,119 | 87,106,119 | - | 95,009,319 | 95,009,319 | - | 15,199,847 | 15,199,847 | 16.0% | - | 7,033,421 | 7,033,421 | 7.4% | - | - | 82,122,845 | 86.4% |
| 5 | 013 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLI | BID_2470/BL-HO-1 | 01/07/2019 - 01/09/2021 | - | 34,957,831 | 34,957,831 | - | 149,957,831 | 149,957,831 | - | 70,381,150 | 70,381,150 | 46.9% | - | 53,480,477 | 53,480,477 | 35.7% | - | - | 70,909,712 | 47.3% |
| 1 | Total 013 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLI | BID_2470BL-HO-2 | | - | 319,720,700 | 319,720,700 | - | 319,720,700 | 319,720,700 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | 79,778,750 | 25.0% |
| 1 | Total 013 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLI | BID-3815/BL-HO | | - | 328,868,653 | 328,868,653 | - | 151,186,688 | 151,186,688 | - | 8,810,403 | 8,810,403 | 5.8% | - | 8,326,025 | 8,326,025 | 5.5% | - | - | 140,803,637 | 93.1% |
| 6 | 014 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMATICA (PPCR) | PPCR-TF044893 | 30/06/2017 - 30/04/2020 | - | 8,504,085 | 8,504,085 | - | 8,556,085 | 8,556,085 | - | 6,776,160 | 6,776,160 | 79.2% | - | 6,586,160 | 6,586,160 | 77.0% | - | 6,780,089 | 6,780,089 | 79.2% |
| 1 | Total 014 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMATICA (PPCR) | | | - | 8,504,085 | 8,504,085 | - | 8,556,085 | 8,556,085 | - | 6,776,160 | 6,776,160 | 79.2% | - | 6,586,160 | 6,586,160 | 77.0% | - | 6,780,089 | 6,780,089 | 79.2% |
| 7 | 015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur | BCIE 2221 | 30/09/2019 - 30/09/2022 | - | 159,822,927 | 159,822,927 | - | 156,262,927 | 156,262,927 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | | |

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Anual | | | | Devengado II Trimestre | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./ Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./ Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp./ Vig.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION I | BCIE 2177 | 02/01/2008 - 31/12/2021 | - | 626,587,480 | 626,587,480 | - | 626,587,480 | 626,587,480 | - | - | 20,006,376 | 3.2% | - | - | 20,006,376 | 3.2% | - | - | 20,006,376 | 3.2% |
| | Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION I | | | - | 626,587,480 | 626,587,480 | - | 626,587,480 | 626,587,480 | - | - | 20,006,376 | 3.2% | - | - | 20,006,376 | 3.2% | - | - | 20,006,376 | 3.2% |
| 7 | 0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | | | 579,827,394 | - | 579,827,394 | 579,827,394 | 199,361,846 | 779,189,240 | 84,778,588 | 707,234 | 106,815,478 | 13.7% | 53,065,885 | 707,234 | 75,102,775 | 9.6% | 138,241,529 | 707,234 | 160,278,419 | 20.6% |
| 1 | 015 - Obra de Mitigación de Riesgos Estructurales en las Riberas de los Ríos en los Departamentos de Copan, Ocotepeque, Intibucá, Colón, Cortes, Francisco Morazán, Lempira, Valle y Olancho. | FN-INSEP-23423-1 | 01/04/2020 - 30/09/2020 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total 015 - Obra de Mitigación de Riesgos Estructurales en las Riberas de los Ríos en los Departamentos de Copan, Ocotepeque, Intibucá, Colón, Cortes, Francisco Morazán, Lempira, Valle y Olancho. | | | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | 025 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DEPORTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN COLÓN, INTIBUCÁ, YORO, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA Y COMAYAGUA | FN-INSEP-23370 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total 025 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DEPORTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN COLÓN, INTIBUCÁ, YORO, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA Y COMAYAGUA | | | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 3 | 026 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE 11,040 METROS LINEALES DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS FRANCISCO MORAZÁN, EL PARAISO, CHOLUTECA, VALLE, CORTES, COMAYAGUA, COPÁN, ATLÁNTIDA, COLÓN, INTIBUCÁ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, YORO, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA Y COMAYAGUA | FN-INSEP-23717-1 | 01/04/2020 - 30/11/2020 | 101,199,951 | - | 101,199,951 | 101,199,951 | - | 101,199,951 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total 026 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE 11,040 METROS LINEALES DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS FRANCISCO MORAZÁN, EL PARAISO, CHOLUTECA, VALLE, CORTES, COMAYAGUA, COPÁN, ATLÁNTIDA, COLÓN, INTIBUCÁ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, YORO, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA Y COMAYAGUA | | | 101,199,951 | - | 101,199,951 | 101,199,951 | - | 101,199,951 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 4 | 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA | INDOS NACIONALES 00000003 | 18/11/2013 - 31/03/2020 | 28,183,065 | - | 28,183,065 | 28,183,065 | - | 28,183,065 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | 7,045,767 | - | 7,045,767 | 25.0% |
| | Total 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA | | | 28,183,065 | - | 28,183,065 | 28,183,065 | - | 28,183,065 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | 7,045,767 | - | 7,045,767 | 25.0% |
| 5 | 121 - REHABILITACION VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN | BCIE-2156 | 01/01/2016 - 30/06/2021 | - | - | - | - | 91,290,908 | 91,290,908 | - | 707,234 | 22,036,890 | 24.1% | - | 707,234 | 22,036,890 | 24.1% | - | 707,234 | 22,036,890 | 24.1% |
| | | BEI-FI No. 84859 | | - | - | - | - | 108,070,938 | 108,070,938 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | | DCI-ALA/2015/369-566 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total 121 - REHABILITACION VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN | | | - | - | - | - | 199,361,846 | 199,361,846 | - | 707,234 | 22,036,890 | 11.1% | - | 707,234 | 22,036,890 | 11.1% | - | 707,234 | 22,036,890 | 11.1% |
| 6 | 144 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD 2 MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA | FN-INSEP-23245 | 17/07/2018 - 17/07/2020 | 253,229,220 | - | 253,229,220 | 253,229,220 | - | 253,229,220 | 80,197,439 | - | 80,197,439 | 31.7% | 53,065,885 | - | 53,065,885 | 21.0% | 126,614,612 | - | 126,614,612 | 50.0% |
| | Total 144 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD 2 MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA | | | 253,229,220 | - | 253,229,220 | 253,229,220 | - | 253,229,220 | 80,197,439 | - | 80,197,439 | 31.7% | 53,065,885 | - | 53,065,885 | 21.0% | 126,614,612 | - | 126,614,612 | 50.0% |
| 7 | 147 - CORREDOR TURISTICO DISTRITO DE LOS LAGOS ETAPA 1: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS: 1- CAÑAVERAL-RIO LINDO-CARACOL SECCION 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 7.00 KM. 2- CAÑAVERAL-RIO LINDO- | FN-INSEP-23450-1 | | 152,215,158 | - | 152,215,158 | 152,215,158 | - | 152,215,158 | 4,581,150 | - | 4,581,150 | 3.0% | - | - | - | 0.0% | 4,581,150 | - | 4,581,150 | 3.0% |
| | Total 147 - CORREDOR TURISTICO DISTRITO DE LOS LAGOS ETAPA 1: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS: 1- CAÑAVERAL-RIO LINDO-CARACOL SECCION 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 7.00 KM. 2- CAÑAVERAL-RIO LINDO- | | | 152,215,158 | - | 152,215,158 | 152,215,158 | - | 152,215,158 | 4,581,150 | - | 4,581,150 | 3.0% | - | - | - | 0.0% | 4,581,150 | - | 4,581,150 | 3.0% |
| 1 | 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | | | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% | 3,924,854 | - | 3,924,854 | 2.6% | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% |
| 1 | 010 - PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGIA RURAL | EDCF No. HND-5 | 28/03/2014 - 30/06/2020 | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% | 3,924,854 | - | 3,924,854 | 2.6% | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% |
| | Total 010 - PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGIA RURAL | | | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 14,026,400 | 135,234,760 | 149,261,160 | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% | 3,924,854 | - | 3,924,854 | 2.6% | 5,264,866 | - | 5,264,866 | 3.5% |
| 6 | 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica | | | 90,728,943 | 1,139,346,928 | 1,230,075,871 | 90,728,943 | 1,090,319,474 | 1,181,048,417 | 1,376,252 | 54,862,512 | 127,385,691 | 10.8% | 692,451 | 54,714,716 | 112,296,783 | 9.5% | 1,387,057 | 67,323,807 | 169,969,557 | 14.4% |
| 1 | 012 - APOYO AL PLAN ESTRATEGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD | ATNOC-16427-HO-BID | 16/03/2018 - 16/03/2021 | - | 4,605,573 | 4,605,573 | - | 4,180,563 | 4,180,563 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | 87,279 | 87,279 | 2.1% |
| | Total 012 - APOYO AL PLAN ESTRATEGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD | | | - | 4,605,573 | 4,605,573 | - | 4,180,563 | 4,180,563 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | 87,279 | 87,279 | 2.1% |
| 2 | 018 - PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO | BID 3435/BL-HO | 28/05/2015 - 21/07/2024 | 78,000,000 | 226,543,009 | 304,543,009 | 78,000,000 | 217,561,886 | 295,561,886 | 1,376,252 | - | 65,565,089 | 22.2% | 692,451 | - | 50,623,977 | 17.1% | 1,387,057 | - | 95,687,660 | 32.4% |
| | Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO | JICA HD-P6 | | - | 540,100,000 | 540,100,000 | - | 491,541,000 | 491,541,000 | - | 5,904,824 | 1.2% | - | - | 5,904,824 | 1.2% | - | - | 5,904,824 | 1.2% | |
| | Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO | | | 78,000,000 | 766,643,009 | 844,643,009 | 78,000,000 | 709,102,886 | 787,102,886 | 1,376,252 | 71,469,913 | 9.1% | 692,451 | 56,528,800 | 7.2% | 1,387,057 | 101,592,483 | 12.9% | - | 101,592,483 | 12.9% |
| 3 | 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) | BID 3103/BL-HO | 14/05/2014 - 14/03/2023 | - | 4,158,884 | 4,158,884 | - | 1,383,757 | 1,383,757 | - | 664,698 | 48.0% | - | - | 664,698 | 48.0% | - | - | 664,698 | 48.0% | |
| | Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) | GRT/SX-16864-HO | | - | 131,364,749 | 131,364,749 | - | 130,896,295 | 130,896,295 | - | 53,986,479 | 41.2% | - | 53,838,683 | 53,838,683 | 41.1% | - | 65,284,978 | 65,284,978 | 49.9% | |
| | Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) | | | - | 135,523,633 | 135,523,633 | - | 132,280,052 | 132,280,052 | - | 53,986,479 | 41.3% | - | 53,838,683 | 54,503,381 | 41.2% | - | 65,284,978 | 65,949,677 | 49.9% | |
| 4 | 021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGIAS RENOVABLES | ATNSX-16689-HO | 20/09/2018 - 20/09/2021 | - | 4,288,332 | 4,288,332 | - | 5,463,342 | 5,463,342 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | 163,098 | 163,098 | 3.0% |
| | Total 021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGIAS RENOVABLES | | | - | 4,288,332 | 4,288,332 | - | 5,463,342 | 5,463,342 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | 163,098 | 163,098 | 3.0% |
| 5 | 022 - ELECTRIFICACION RURAL EN LUGARES AISLADOS | BID-GRT/SX-17123-HO | 29/12/2018 - 28/12/2021 | - | 36,627,790 | 36,627,790 | - | 35,877,790 | 35,877,790 | - | 876,033 | 876,033 | 2.4% | - | 876,033 | 876,033 | 2.4% | - | 1,788,451 | 1,788,451 | 5.0% |
| | Total 022 - ELECTRIFICACION RURAL EN LUGARES AISLADOS | | | - | 36,627,790 | 36,627,790 | - | 35,877,790 | 35,877,790 | - | 876,033 | 876,033 | 2.4% | - | 876,033 | 876,033 | 2.4% | - | 1,788,451 | 1,788,451 | 5.0% |
| 6 | 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA | BID-4598/BL-HO | 29/13/2018 - 29/12/2023 | 12,728,943 | 167,064,691 | 179,793,634 | 12,728,943 | 178,820,941 | 191,549,884 | - | - | 388,568 | 0.2% | - | - | 388,568 | 0.2% | - | - | 388,568 | 0.2% |
| | Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA | BID-4599/SX-HO | | - | 24,593,900 | 24,593,900 | - | 24,593,900 | 24,593,900 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA | | | 12,728,943 | 191,658,591 | 204,387,534 | 12,728,943 | 203,414,841 | 216,143,784 | - | - | 388,568 | 0.2% | - | - | 388,568 | 0.2% | - | - | 388,568 | 0.2% |
| 1 | 0805 - Empresa Nacional Portuaria | | | - | - | - | - | 105,457,689 | - | 12,630,247 | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% |
| 1 | 390 - CONSTRUCCION OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES | FP-23771 | | - | - | - | - | 105,457,689 | - | 12,630,247 | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% |
| | Total 390 - CONSTRUCCION OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES | | | - | - | - | - | 105,457,689 | - | 12,630,247 | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% | - | - | 12,630,247 | 12.0% |
| 1 | 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | | | 87,136,431 | - | 87,136,431 | 87,136,431 | - | 87,136,431 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 1 | 001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación | FP-HONDUTEL-22102 | 30/12/2016 - 30/12/2020 | 87,136,431 | - | 87,136,431 | 87,136,431 | - | 87,136,431 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | | |

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Anual | | | | Devengado II Trimestre | | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp. / Vig.) |
| 3 | 0449 - Servicios Financieros de la Administración Central | | | - | 922,520,954 | 922,520,954 | - | 819,635,677 | 819,635,677 | - | 29,765,153 | - | - | 0.0% | - | 29,765,153 | - | - | 29,765,153 | 0.0% | |
| 1 | PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA | HO-L1200; HO-G1252 | | - | 274,755,670 | 274,755,670 | - | 274,755,670 | 274,755,670 | - | 29,765,153 | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| | Total PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA | | | - | 274,755,670 | 274,755,670 | - | 274,755,670 | 274,755,670 | - | 29,765,153 | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| 2 | PROGRAMAS Y PROYECTOS VARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | - | 616,951,564 | 616,951,564 | - | 544,880,007 | 544,880,007 | - | 29,765,153 | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| | Total PROGRAMAS Y PROYECTOS VARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | - | 616,951,564 | 616,951,564 | - | 544,880,007 | 544,880,007 | - | 29,765,153 | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| 3 | PROYECTO MANEJO AGROFORESTAL SOSTENIBLE Y AGROFORESTERIA EN CUENTAS CRÍTICAS PAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE HONDURAS (AGROLAC) | ATNAG-17919-HO | | - | 30,813,720 | 30,813,720 | - | - | - | - | 29,765,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Total PROYECTO MANEJO AGROFORESTAL SOSTENIBLE Y AGROFORESTERIA EN CUENTAS CRÍTICAS PAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE HONDURAS (AGROLAC) | | | - | 30,813,720 | 30,813,720 | - | - | - | - | 29,765,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | | | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% |
| 1 | 001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP) | PN 2016 70 124 | 08/01/2018 - 08/01/2021 | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% |
| | Total 001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP) | | | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 3,270,927 | 48,275,143 | 51,546,070 | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% | 598,650 | 15,127,106 | 15,725,756 | 30.5% |
| 1 | 0037 - Servicio de Administración de Rentas | | | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 6,234,307 | 6.6% | - | - | 4,015,877 | 4.3% | - | - | 10,564,132 | 11.2% | |
| 1 | 001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria | BID-3541/BL-HO | 24/05/2016 - 27/04/2021 | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 6,234,307 | 6.6% | - | - | 4,015,877 | 4.3% | - | - | 10,564,132 | 11.2% | |
| | Total 001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria | | | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 94,165,765 | 94,165,765 | - | 6,234,307 | 6.6% | - | - | 4,015,877 | 4.3% | - | - | 10,564,132 | 11.2% | |
| 1 | 0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo | | | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| 1 | 001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL | TDR-CENET-23352-1 | 01/09/2018 - 01/09/2020 | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL | | | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | 2,047,624 | 2,047,624 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | 0.0% | |
| 4 | 0100 - Secretaría de Finanzas | | | 100,000,000 | 195,913,977 | 295,913,977 | 100,000,000 | 205,217,418 | 305,217,418 | - | 5,569,278 | 30,041,571 | 9.8% | - | 5,569,278 | 23,736,112 | 7.8% | - | 10,153,004 | 35,258,379 | 11.6% |
| 1 | 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas | FN 23753-1 | 03/01/2020 - 31/12/2023 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| | Total 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas | | | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 2 | 052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | BID3878/BL-HO | 25/04/2017 - 25/06/2022 | - | 194,218,327 | 194,218,327 | - | 194,218,327 | 194,218,327 | - | 24,472,293 | 12.6% | - | - | 18,166,833 | 9.4% | - | - | 25,105,375 | 12.9% | |
| | Total 052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | | | - | 194,218,327 | 194,218,327 | - | 194,218,327 | 194,218,327 | - | 24,472,293 | 12.6% | - | - | 18,166,833 | 9.4% | - | - | 25,105,375 | 12.9% | |
| 3 | 053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO | BID ATNOC-15878-HO | | - | 1,695,650 | 1,695,650 | - | 2,119,490 | 2,119,490 | 1,837,820 | 1,837,820 | 86.7% | - | 1,837,820 | 1,837,820 | 86.7% | - | 1,837,820 | 1,837,820 | 86.7% | |
| | Total 053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO | | | - | 1,695,650 | 1,695,650 | - | 2,119,490 | 2,119,490 | 1,837,820 | 1,837,820 | 86.7% | - | 1,837,820 | 1,837,820 | 86.7% | - | 1,837,820 | 1,837,820 | 86.7% | |
| 4 | 054 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE | ATNOC-15961-HO | 24/05/2017 - 11/02/2021 | - | - | - | - | 8,879,601 | 8,879,601 | - | 3,731,458 | 42.0% | - | 3,731,458 | 3,731,458 | 42.0% | - | 8,315,184 | 8,315,184 | 93.6% | |
| | Total 054 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE | | | - | - | - | - | 8,879,601 | 8,879,601 | - | 3,731,458 | 42.0% | - | 3,731,458 | 3,731,458 | 42.0% | - | 8,315,184 | 8,315,184 | 93.6% | |
| 1 | 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | | | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,641,640 | 33,712,150 | 35,353,790 | 24.9% |
| 1 | 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO-LABOR) | DCI-ALA/2014/026-851 | 03/07/2015 - 03/07/2021 | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,641,640 | 33,712,150 | 35,353,790 | 24.9% |
| | Total 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO-LABOR) | | | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 4,967,720 | 136,997,339 | 141,965,059 | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,193,521 | 33,712,150 | 34,905,671 | 24.6% | 1,641,640 | 33,712,150 | 35,353,790 | 24.9% |
| 6 | 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería | | | 37,542,285 | 692,906,897 | 730,449,182 | 37,542,285 | 700,826,897 | 738,369,182 | 211,435 | 15,857,007 | 309,914,255 | 42.0% | 184,846 | 8,904,849 | 247,797,707 | 33.6% | 211,435 | 15,857,007 | 309,914,255 | 42.0% |
| 1 | 003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR) | FIDA 816-HN | | - | - | - | - | 20,573,579 | 20,573,579 | - | 19,170,921 | 93.2% | - | - | 19,170,921 | 93.2% | - | - | 19,170,921 | 93.2% | |
| | Total 003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR) | | | - | - | - | - | 20,573,579 | 20,573,579 | - | 19,170,921 | 93.2% | - | - | 19,170,921 | 93.2% | - | - | 19,170,921 | 93.2% | |
| 2 | 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA | FIDA-I-899-HN | 03/03/2014 - 31/03/2022 | - | 119,090,162 | 119,090,162 | - | 97,357,829 | 97,357,829 | - | 32,372,313 | 33.3% | - | - | 15,664,718 | 16.1% | - | - | 32,372,313 | 33.3% | |
| | Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA | FIDA-II-200000125200 GEF-FSS-05-HN | | - | 56,000,000 18,228,068 | 56,000,000 18,228,068 | - | 47,660,596 26,148,068 | 47,660,596 26,148,068 | - | 6,791,325 15,857,007 | 14.2% 60.6% | - | - | 299,957 8,904,849 | 0.6% 34.1% | - | - | 6,791,325 15,857,007 | 14.2% 60.6% | |
| | Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA | | | - | 193,318,230 | 193,318,230 | - | 171,166,493 | 171,166,493 | - | 15,857,007 | 55,020,645 | 32.1% | - | 8,904,849 | 24,869,525 | 14.5% | - | 15,857,007 | 55,020,645 | 32.1% |
| 3 | 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) | BCIE-2101 | 13/12/2014 - 13/12/2020 | 37,542,285 | 399,129,059 | 436,671,344 | 37,542,285 | 436,671,344 | 436,671,344 | 211,435 | 47,530,319 | 19.0% | 184,846 | 15,564,891 | 6.2% | 211,435 | 15,564,891 | 6.2% | 47,530,319 | 19.0% | |
| | Total 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) | | | 37,542,285 | 399,129,059 | 436,671,344 | 37,542,285 | 436,671,344 | 436,671,344 | 211,435 | 47,530,319 | 19.0% | 184,846 | 15,564,891 | 6.2% | 211,435 | 15,564,891 | 6.2% | 47,530,319 | 19.0% | |
| 4 | 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1 | IN-DL98134500295569L | 16/06/2016 - 30/06/2022 | - | 97,363,072 | 97,363,072 | - | 97,363,072 | 97,363,072 | - | 97,363,072 | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1 | | | - | 97,363,072 | 97,363,072 | - | 97,363,072 | 97,363,072 | - | 97,363,072 | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 5 | 011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS | DN-No.2000001838-FIDA-SAG | 01/06/2018 - 01/04/2020 | - | 3,096,536 | 3,096,536 | - | 3,096,536 | 3,096,536 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS | | | - | 3,096,536 | 3,096,536 | - | 3,096,536 | 3,096,536 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 6 | 012 - PROYECTO DE TRANSFORMACION EN REGADIO EN LA RIBERA DEL AGUAN | ING-BANK-CREDITO-S/N | | - | - | - | - | 195,820,998 | 195,820,998 | - | 188,192,370 | 96.1% | - | - | 188,192,370 | 96.1% | - | - | 188,192,370 | 96.1% | |
| | Total 012 - PROYECTO DE TRANSFORMACION EN REGADIO EN LA RIBERA DEL AGUAN | | | - | - | - | - | 195,820,998 | 195,820,998 | - | 188,192,370 | 96.1% | - | - | 188,192,370 | 96.1% | - | - | 188,192,370 | 96.1% | |
| 1 | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | - | - | - | 3,770,647 | 3,770,647 | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 2,170,802 | 2,170,802 | 57.6% |
| 1 | 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | ATNOC-16177-HO | 09/12/2017 - 09/12/2020 | - | - | - | - | 3,770,647 | 3,770,647 | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 2,170,802 | 2,170,802 | 57.6% |
| | Total 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | | | - | - | - | - | 3,770,647 | 3,770,647 | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 934,728 | 934,728 | 24.8% | - | 2,170,802 | 2,170,802 | 57.6% |
| 19 | Gabinete Social | | | 195,719,861 | 2,145,556,395 | 2,341,276,256 | 195,719,861 | 2,195,539,695 | 2,391,259,556 | 33,489,163 | 2,350,732 | 377,868,415 | 15.8% | 30,530,867</ | | | | | | | |

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Anual | | | Devengado II Trimestre | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------|----------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev. / Vig.) | 11 - Tesoro Nacional | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp. / Vig.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total 015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA | | | 1,633,532 | 258,940,398 | 260,573,930 | 1,633,532 | 258,940,398 | 260,573,930 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 2 | 019 - REQUILIBRAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP) | ITALIA-HOS/MARIA | 31/01/2011 - 31/12/2020 | - | 13,972,976 | 13,972,976 | - | 13,972,976 | 13,972,976 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 019 - REQUILIBRAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP) | | | - | 13,972,976 | 13,972,976 | - | 13,972,976 | 13,972,976 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 3 | 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | BID 4619/BL-HO | 19/06/2019 - 31/05/2024 | - | 652,420,977 | 652,420,977 | - | 652,420,977 | 652,420,977 | - | 204,207,502 | 31.3% | - | - | 185,616,196 | 28.5% | - | - | 204,685,198 | 31.4% | |
| | Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL | | | - | 652,420,977 | 652,420,977 | - | 652,420,977 | 652,420,977 | - | 204,207,502 | 31.3% | - | - | 185,616,196 | 28.5% | - | - | 204,685,198 | 31.4% | |
| 4 | 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | BID 3723/BL-HO | 30/06/2017 - 30/06/2021 | - | 68,306,340 | 68,306,340 | - | 68,306,340 | 68,306,340 | - | 12,429,057 | 18.2% | - | - | 11,743,128 | 17.2% | - | - | 22,670,962 | 33.2% | |
| | Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | | | - | 68,306,340 | 68,306,340 | - | 68,306,340 | 68,306,340 | - | 12,429,057 | 18.2% | - | - | 11,743,128 | 17.2% | - | - | 22,670,962 | 33.2% | |
| 5 | 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II | GRT/HE-14661-HO | 29/05/2015 - 29/11/2020 | - | 1,910,611 | 1,910,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II | GRT/HE-16838-HO | | - | 1,910,611 | 1,910,611 | - | 5,440,911 | 5,440,911 | - | 2,350,732 | 43.2% | - | - | 2,350,732 | 43.2% | - | - | 2,352,296 | 43.2% | |
| | Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACION DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA) | GRT/MM-17339-40-HO | 01/12/2019 - 30/11/2021 | - | - | - | - | - | 20,344,000 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACION DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA) | | | - | - | - | - | - | 20,344,000 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 7 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | | | 165,181,186 | 494,456,677 | 659,637,863 | 165,181,186 | 494,456,677 | 659,637,863 | 33,478,185 | 129,895,058 | 19.7% | 30,519,889 | 95,939,350 | 14.5% | 33,567,086 | 192,921,128 | 29.2% | | | |
| 1 | 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES | FN-BOLSON ESCOLAR-14-08 | | 7,000,000 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES | | | 7,000,000 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 2 | 015 - ATENCION A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | FN-0000015-14 | 01/01/2015 - 31/12/2021 | 29,856,800 | - | 29,856,800 | 29,856,800 | - | 29,856,800 | 10,947,801 | 10,947,801 | 36.7% | 7,992,124 | 7,992,124 | 26.8% | 11,036,702 | 11,036,702 | 37.0% | | | |
| | Total 015 - ATENCION A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | | | 29,856,800 | - | 29,856,800 | 29,856,800 | - | 29,856,800 | 10,947,801 | 10,947,801 | 36.7% | 7,992,124 | 7,992,124 | 26.8% | 11,036,702 | 11,036,702 | 37.0% | | | |
| 3 | 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | FN-0000016-14 | 03/01/2014 - 31/12/2021 | 34,924,902 | - | 34,924,902 | 34,924,902 | - | 34,924,902 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| | Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | | | 34,924,902 | - | 34,924,902 | 34,924,902 | - | 34,924,902 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 4 | 017 - CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | FN-0000017-14 | 01/01/2015 - 31/12/2021 | 72,858,500 | - | 72,858,500 | 72,858,500 | - | 72,858,500 | 12,530,384 | 12,530,384 | 17.2% | 12,527,765 | 12,527,765 | 17.2% | 12,530,384 | 12,530,384 | 17.2% | | | |
| | Total 017 - CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | | | 72,858,500 | - | 72,858,500 | 72,858,500 | - | 72,858,500 | 12,530,384 | 12,530,384 | 17.2% | 12,527,765 | 12,527,765 | 17.2% | 12,530,384 | 12,530,384 | 17.2% | | | |
| 5 | 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO | BID 3371/BL-HO | 01/10/2015 - 01/10/2020 | 20,540,984 | 143,184,778 | 163,725,762 | 20,540,984 | 167,055,905 | 187,596,889 | 10,000,000 | 64,318,710 | 34.3% | 10,000,000 | 42,448,167 | 22.6% | 10,000,000 | 126,593,947 | 67.5% | | | |
| | Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO | | | 20,540,984 | 143,184,778 | 163,725,762 | 20,540,984 | 167,055,905 | 187,596,889 | 10,000,000 | 64,318,710 | 34.3% | 10,000,000 | 42,448,167 | 22.6% | 10,000,000 | 126,593,947 | 67.5% | | | |
| 6 | 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | BID 3723/BL-HO | 30/06/2017 - 30/06/2021 | - | 70,210,470 | 70,210,470 | - | 137,153,826 | 137,153,826 | - | 38,586,807 | 28.1% | - | 29,459,938 | 21.5% | - | 39,124,441 | 28.5% | | | |
| | Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | | | - | 70,210,470 | 70,210,470 | - | 137,153,826 | 137,153,826 | - | 38,586,807 | 28.1% | - | 29,459,938 | 21.5% | - | 39,124,441 | 28.5% | | | |
| 7 | 021 - PROYECTO DE INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL / 6401-HN | 6401-HN | 17/09/2019 - 17/10/2024 | - | 281,061,429 | 281,061,429 | - | 190,246,946 | 190,246,946 | - | 3,511,356 | 1.8% | - | 3,511,356 | 1.8% | - | 3,635,654 | 1.9% | | | |
| | Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACION DE LA PROTECCION SOCIAL / 6401-HN | | | - | 281,061,429 | 281,061,429 | - | 190,246,946 | 190,246,946 | - | 3,511,356 | 1.8% | - | 3,511,356 | 1.8% | - | 3,635,654 | 1.9% | | | |
| 1 | 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | | | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 2,186,358 | 25.7% | - | 1,500,864 | 17.7% | - | 2,390,734 | 28.1% | | | |
| 1 | 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | BID-3771/BL-HO | 25/12/2016 - 26/04/2022 | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 2,186,358 | 25.7% | - | 1,500,864 | 17.7% | - | 2,390,734 | 28.1% | | | |
| | Total 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | | | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 8,501,086 | 8,501,086 | - | 2,186,358 | 25.7% | - | 1,500,864 | 17.7% | - | 2,390,734 | 28.1% | | | |
| 1 | 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | | | - | - | 26,407,987 | - | 26,407,987 | 26,407,987 | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% | | | |
| | 003 - Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM | FN 0000057-11 UPNFM | 02/01/2012 - 02/12/2020 | - | - | 26,407,987 | - | 26,407,987 | 26,407,987 | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% | | | |
| | Total 003 - Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM | | | - | - | 26,407,987 | - | 26,407,987 | 26,407,987 | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% | | | |
| 1 | 0703 - Universidad Nacional de Agricultura | | | - | - | - | - | 26,109,000 | 26,109,000 | - | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 0.9% | | | |
| | 005 - INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNAPINPROS) | BCIE 2069 | 30/06/2015 - 30/07/2020 | - | - | - | - | 26,109,000 | 26,109,000 | - | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 0.9% | | | |
| | Total 005 - INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNAPINPROS) | | | - | - | - | - | 26,109,000 | 26,109,000 | - | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 0.9% | - | 247,488 | 0.9% | | | |
| 73 | Total general PIP | | | 1,152,983,768 | 11,468,512,835 | 12,621,480,425 | 1,258,441,457 | 10,511,458,543 | 11,769,900,000 | 147,822,990 | 1,585,106,787 | 14.7% | 106,664,137 | 323,444,065 | 11.9% | 201,833,755 | 397,832,939 | 24.7% | | | |
| 1 | Fondos Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) | | | 4,500,000,000.00 | - | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | - | 4,500,000,000.00 | 711,500,000.00 | 711,500,000.00 | 15.8% | - | - | 711,500,000.00 | 15.8% | - | - | 711,500,000.00 | 15.8% | |
| 5 | Proyectos APP S | | | 4,576,900,000.00 | - | 4,576,900,000.00 | 4,906,100,000.00 | - | 4,906,100,000.00 | 475,900,000.00 | 475,900,000.00 | 9.7% | - | - | 475,900,000.00 | 9.7% | - | - | 475,900,000.00 | 9.7% | |
| 1 | Programa de Infraestructura Vial | | | 2,500,000,000.00 | - | 2,500,000,000.00 | 3,450,000,000.00 | - | 3,450,000,000.00 | 3,120,700,000.00 | 3,120,700,000.00 | 90.5% | - | - | 3,120,700,000.00 | 90.5% | - | - | 3,120,700,000.00 | 90.5% | |
| 1 | Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) | | | 1,013,000,000.00 | - | 1,013,000,000.00 | 1,644,700,000.00 | - | 1,644,700,000.00 | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 81 | Total Inversión Pública | | | 9,165,983,768.00 | - | 9,165,983,768.00 | 25,211,380,428.00 | - | 25,211,380,428.00 | 4,455,922,989.75 | 1,585,106,787.23 | 14.7% | 106,664,137 | 323,444,065 | 11.9% | 201,833,755 | 397,832,939 | 24.7% | | | |

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-175-2020 y Circular No. CGG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

* Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).
