
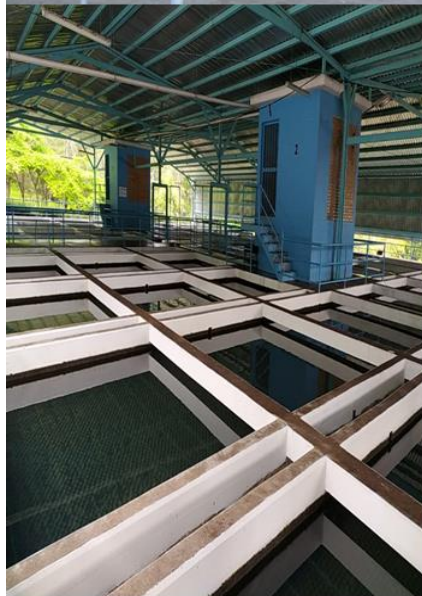


INFORME GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

AL IV TRIMESTRE 2022

www.sefin.gov.hn

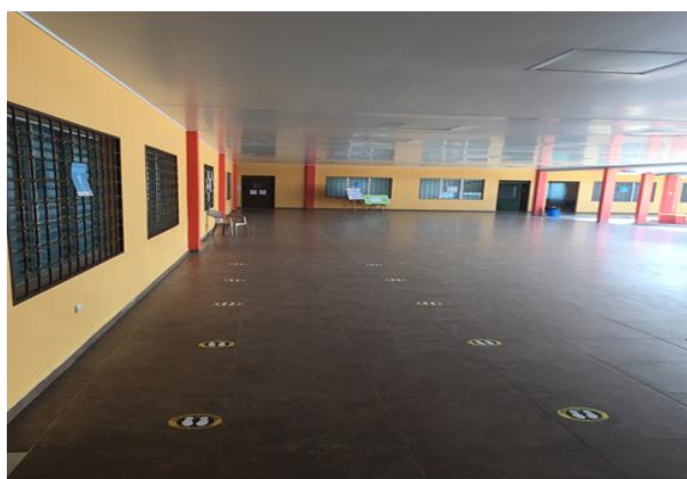

ÍNDICE

INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022	1
PRESENTACIÓN	1
1. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE 2022 .	2
1.1. Programa de Inversión Pública 2022.....	4
1.2. Inversión Pública por Institución 2022	4
1.3. Inversión Pública por Estructura del Sector Público	9
1.4. La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión	10
1.5. Financiamiento del Programa de Inversión Pública.....	12
1.6. Ejecución histórica período 2018 - 2022	13
1.7. Ejecución Física a Nivel de Sectores	14
1.7.1. Sector Carreteras.....	14
1.7.2. Sector de Protección Social	15
1.7.3. Sector Energía	15
1.7.4. Sector Educación	17
1.7.5. Sector Salud	19
1.7.6. Sector Desarrollo Productivo y Riego.....	23
1.7.7. Sector Seguridad y Defensa	25
1.7.8. Sector Recursos Forestales y Ambiente	26
1.7.9. Sector Modernización del Estado.....	27
1.7.10. Sector de Transporte y Obras Públicas	28
1.8. Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, durante el cuarto trimestre del Año 2022	29

INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

PRESENTACIÓN

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 (enero a diciembre). El documento ha sido elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

Durante el año 2022, se puso en marcha el Plan de la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, el cual define que el Programa de Inversión Pública tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico, a través de inversiones estratégicas en infraestructura, en beneficio de los sectores productivos, su principal énfasis está en la provisión de servicios, rehabilitación de carreteras, caminos en zonas postergadas y de energía, telecomunicaciones, viviendas y plantas productivas.

Asimismo, se propuso garantizar el financiamiento de un Sistema Educativo renovado de clase mundial, en todos sus niveles y modalidades. Mediante la asignación necesaria para ofrecer educación pública de la mejor calidad, y pertinente con las realidades de la población, garantizando el acceso universal. Entre las metas propuestas del Plan de Refundación se resalta la rehabilitación y repotenciación de al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, invertir en la construcción de nuevas aulas y escuelas en las zonas priorizadas; reorientar los programas asistenciales a fin de que verdaderamente lleguen a las familias de menores ingresos, en forma transparente, garantizando un acceso integral a los servicios de salud, dado que no hay una cobertura aceptable de la seguridad y previsión social.

El Programa de Inversión Pública (PIP) aprobado en inversión productiva para el año 2022 asciende a **L11,204.6 millones**; al cierre del 2022 se contó con un presupuesto vigente de **L10,859.1 millones** para la ejecución de 91 proyectos en los diferentes sectores prioritarios, incluyendo proyectos coejecutados por las diferentes instituciones del sector público, reflejando una ejecución acumulada de **L4,574.12 millones** que representan el 42.1% de ejecución. El Programa de inversiones representa el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB)¹ y el 2.9% del Presupuesto General de República².

¹ Proyección Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2022 es de L771,074.8 millones, según cifras proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

² Presupuesto General Vigente L369,484.75 millones al 31 de diciembre de 2022.

Asimismo, se cuenta con un presupuesto aprobado de L14,394.5 millones para la Inversión Social la cual está enfocada en el Desarrollo Humano y están formuladas en programas institucionales que no forman parte del Programa de Inversiones Públicas, por lo que no nacen dentro de la Metodología SNIPH. Durante el año 2022 se contó con una inversión Productiva y Social con Presupuesto Aprobado total de **L24,109.7 millones**.

Como parte de las acciones de ordenamiento del nuevo gobierno, se revisó el Presupuesto General de la República, incluyendo el Programa de Inversión Pública, a fin de alinearlos conforme a las prioridades del nuevo Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria, por lo que se publicó una reforma a dicho presupuesto por medio del Decreto 30-2022 en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 8 de abril de 2022. Cabe resaltar que en dicha reforma fueron derogados los artículos que instruían registrar en el SNIPH los proyectos financiados bajo la modalidad Asociación Público-Privada (APP) y fideicomisos.

En base al Decreto legislativo 30-2022, publicado en la Gaceta en fecha 8 de abril del 2022 que constituyó modificación General del Presupuesto de la República, como consecuencia de la obtención de financiamiento con crédito externo con el Banco Central de Honduras (BCH) por un monto de **US\$1,000 millones**, equivalentes a L24,691.2 millones con el objetivo de financiar proyectos de inversión pública; de los cuales se incorporó al presupuesto del programa de inversiones públicas 2022 un monto de L987,921,796.0, estos recursos seguirán ingresando al PIP del 2023 en la medida que las unidades ejecutoras de los proyectos cumplan la normativa legal vigente.

1. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE 2022

La Inversión Pública total para el año 2022 según lo reportado en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) muestra una Inversión Productiva³ vigente de L10,859.2 millones, asimismo, se cuenta con un presupuesto vigente de L13,428.2 millones, para la Inversión Social⁴,. Haciendo un monto total de Inversión Pública Vigente de L24,287.3 millones, y una ejecución total de L15,991.9 millones (65.8%) tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.

³ La inversión Productiva es la inversión pública que ha cumplido con la Guía Metodológica General para la Formulación de proyectos, por ende, ha sido ingresada en el SNIPH y cuenta con Código BIP.

⁴ Inversión Social es la inversión pública que no nace desde la Guía Metodológica General para la Formulación de proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL *, AÑO 2022
Cifras en Millones de Lempiras

INSTITUCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
Administración Central	9,508.2	10,312.6	4,268.4	41.4%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,743.8	1,473.2	599.6	40.7%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	76.6	59.2	18.6	31.4%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	1,464.9	1,603.9	406.2	25.3%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	146.3	153.8	127.2	82.7%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	0.0	57.2	57.2	100.0%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	0.0	5.0	5.0	100.0%
0050 - Secretaría de Educación	401.4	194.7	53.5	27.5%
0060 - Secretaría de Salud	113.9	904.3	407.4	45.1%
0070 - Secretaría de Seguridad	178.5	253.0	160.3	63.4%
0100 - Secretaría de Finanzas	162.0	19.3	5.5	28.5%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	776.3	155.1	0.0	0.0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	1.7	8.4	8.4	99.9%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	639.1	603.9	231.4	38.3%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	0.0	61.4	0.0	0.0%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.0	198.6	198.6	100.0%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	433.4	131.3	48.9	37.3%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	25.7	26.1	22.0	84.1%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	1,339.9	1,224.0	322.9	26.4%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	0.0	507.6	507.6	100.0%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	0.0	6.4	6.4	100.0%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	0.0	57.7	57.7	100.0%
0415 - Programa de la Red Solidaria	0.0	302.2	268.1	88.7%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	0.0	22.2	0.0	0.0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	1.1	1.1	1.0	88.2%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.0	10.0	0.0	0.0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	0.0	10.0	0.0	0.0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	0.0	17.0	17.0	100.0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,003.6	2,009.3	684.7	34.1%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	0.0	236.4	53.2	22.5%
Resto del Sector Público	207.0	546.6	305.7	55.9%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	207.0	207.0	7.9	3.8%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	0.0	36.4	36.4	100.0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	0.0	98.8	89.9	91.0%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	0.0	197.6	167.9	85.0%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	0.0	6.8	3.7	53.9%
Total general	9,715.2	10,859.2	4,574.1	42.1%
Inversión Productiva	9,715.2	10,859.2	4,574.1	42.1%
Administración Central	13,023.0	11,656.6	10,005.2	86%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,147.4	1,044.6	1,044.6	100.0%
0033 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	353.4	275.7	267.2	96.9%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	0.0	153.4	53.3	34.7%
0040 - Secretaría de Justicia, Gubernación y Descentralización	1.0	1.0	1.0	100.0%
0050 - Secretaría de Educación	1,733.2	791.1	653.4	82.6%
0060 - Secretaría de Salud	1,941.2	1,892.3	1,018.7	53.8%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	0.0	1,000.0	1,000.0	100.0%
0242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	246.1	265.5	227.8	85.8%
0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	18.5	18.5	18.1	97.8%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	91.9	91.6	64.4	70.3%
0310 - Secretaría de Energía	5,994.5	4,434.9	4,396.7	99.1%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	154.2	154.2	107.9	70.0%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	181.5	190.5	184.9	97.1%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	370.2	370.2	196.5	53.1%
0417 - Programa de Acción Solidaria	790.0	973.2	770.8	79.2%
Resto del Sector Público	1,371.5	1,771.5	1,412.6	79.7%
0504 - Instituto de Crédito Educativo	87.0	22.1	9.7	43.9%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	286.0	292.3	124.3	42.5%
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	998.5	1,457.1	1,278.6	87.7%
Programas Sociales	14,394.5	13,428.2	11,417.8	85.0%
Total General	24,109.7	24,287.3	15,991.9	65.8%

Fuente: SIAFI, al 31/12/22

*/Incluye inversión en infraestructura e inversión social

1.1. Programa de Inversión Pública 2022

El Programa de Inversión Pública (PIP) es el instrumento a través del cual se concretan las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, haciendo compatible la planeación con el presupuesto, orientando la inversión hacia la generación de beneficios sociales y propiciando la gestión por resultados.

Como ya se ha dicho, al cuarto trimestre del 2022 el Programa de Inversión Pública contó con un presupuesto vigente de **L10,859.1 millones** lo que representa **1.4%** del PIB para el año 2022 y el **2.9%** del Presupuesto General de República, el cual muestra una disminución global de **L13,164.2 millones**, respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la gestión anterior, lo que representa una reducción del 54.7% al presupuesto de Inversión Pública. Esto se debe a la derogación de fideicomisos (vida mejor, infraestructura vial, FINA II, etc.) y liquidación de instituciones con duplicidad de funciones.

Al cierre del 2022, el Programa de Inversión Pública (considerando únicamente los proyectos incorporados en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH)) muestra una ejecución de **L4,574.12 millones** a nivel de devengado, lo que representa el **42.1%** del total vigente.

1.2. Inversión Pública por Institución 2022

A nivel institucional, para el año 2022 en relación al presupuesto vigente la inversión representa **L8,006.47 millones** para la Administración Centralizada y **L2,852.68 millones** para el Resto del Sector Público (RSP).

En la Administración Central las instituciones que concentraron el mayor monto de inversión fueron INVEST-HONDURAS⁵ con L1,603.9 millones, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con L1,473.20 millones, la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPASH)⁶ con L1,224.0 millones, la Secretaría de Agricultura y Ganadería con L603.8 millones, la Secretaría de Salud con L904.3 millones y la Secretaría de Infraestructura y Transporte L507,5 millones, las seis instituciones en conjunto representan el 78.9% del presupuesto vigente de la Administración Centralizada. En cuanto al Resto del Sector Público (RSP), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con L2,216.35 millones, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) con un presupuesto vigente de L197.6 millones y la Alcaldía Municipal del Distrito Central con L236.4 millones representan el 92.9% del presupuesto vigente del Resto del Sector Público (RSP).

⁵ Institución en proceso de liquidación según artículo No. 21 del PCM 005-2022.

⁶ Los proyectos bajo la responsabilidad de AEPAS-H serán ejecutados a través de la Red Solidaria según Artículo 12 del PCM 005-2022.

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

Por otro lado, a consecuencia de acuerdo con el Decreto 30-2022 de fecha 8 de abril de 2022 a través de préstamo del Banco Central de Honduras (BCH) hasta un monto de US\$1,000 millones al Programa de Inversión Pública, se incorporaron 15 proyectos de inversión los cuales lograron una ejecución con financiamiento BCH del 93% tal como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 02
Inversión Pública Financiamiento BCH al mes de diciembre de 2022
 Cifras en Millones de Lempiras

No.	Institución	Nombre del Proyecto por Institución	Costo Total de Proyecto	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	001 - Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	499.70	270.58	270.58	100%
2	0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	001 - Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.	191.61	57.25	57.25	100%
3	0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	480 - EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	45.70	5.00	5.00	100%
4	0044 - Instituto Nacional Penitenciario	001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE HONDURAS	778.60	-	-	-
5	0050 - Secretaría de Educación	011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I	441.60	41.68	38.72	93%
6	0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	001 - Desarrollo del Sistema de Saneamiento de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).	1.71	-	-	0%
7	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	001 - PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO	725.00	198.60	198.60	100%
8	0412 - Secretaría de Desarrollo Social	001 - Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en	27.21	6.40	6.40	100%
9	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	320.00	57.69	57.69	100%

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

Cuadro No. 02
Inversión Pública Financiamiento BCH al mes de diciembre de 2022
 Cifras en Millones de Lempiras

No.	Institución	Nombre del Proyecto por Institución	Costo Total de Proyecto	Vigente	Devengado	% de Ejecución
10	0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	001 - EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES	99.70	22.21	-	0%
11	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	002 - ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UBICADOS EN IRIONA (COLÓN), LA ESPERANZA (INTIBUCÁ) Y TEGUCIGALPA (FRANCISCO MORAZÁN)	4.77	4.77	-	0%
12		003 - INSTALACIÓN DE PARQUE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A JÓVENES ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS, UBICADO ALDEA FLORES, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	5.23	5.23	-	0%
13	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	006 - Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	75.00	17.00	17.00	100%
14	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	001 - AMPLIACIÓN EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD Y EN ACCESOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES (HONDUTEL)	36.40	36.40	36.40	100%
15	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	98.80	98.80	89.87	91%
16	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	197.60	197.60	167.89	85%
17	0809 - Empresa de Correos de Honduras	001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro - Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bá	6.80	6.80	3.66	54%
Total, General (Fuente 11-BCH)			3,555.44	1,026.01	949.06	93%

De forma global la mayor asignación del presupuesto vigente se concentra en siete (7) instituciones del sector público, con un monto asignado de L8,533.33 millones que en términos porcentuales representa cerca del 78.6% del presupuesto vigente del Programa de Inversión Pública para el año 2022, véase el resumen institucional del Programa de Inversión Pública a continuación:

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)


Cuadro No. 3
Inversión Pública (Inversión Productiva) por Institución al mes de diciembre de 2022
 Cifras en Millones de Lempiras

INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejec. (Dev./Vig.)
Administración Central	8,508.21	8,006.47	3,512.51	44%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,743.85	1,473.20	599.60	41%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	76.56	59.24	18.61	31%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	1,464.93	1,603.94	406.20	25%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	146.32	153.82	127.23	83%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	-	57.25	57.25	100%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	-	5.00	5.00	100%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	-	-	-	0%
0050 - Secretaría de Educación	401.38	194.71	53.48	27%
0060 - Secretaría de Salud	113.94	904.35	407.45	45%
0070 - Secretaría de Seguridad	178.49	253.00	160.30	63%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	-	-	-	-
0100 - Secretaría de Finanzas	162.00	19.32	5.50	28%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	776.26	155.11	-	0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	1.66	8.43	8.42	100%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	639.07	603.88	231.36	38%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	-	61.39	-	0%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	-	198.60	198.60	100%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	433.43	131.27	48.91	37%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	25.75	26.10	21.95	84%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	1,339.87	1,224.03	322.90	26%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	-	507.58	507.58	100%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	-	6.40	6.40	100%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	-	57.69	57.69	100%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	302.16	268.06	89%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	1,004.70	-	-	-
Resto del Sector Público	2,696.40	2,852.68	1,061.61	37%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	481.00	236.41	53.23	23%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,210.59	2,216.35	692.58	31%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	-	36.40	36.40	100%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	-	98.80	89.87	91%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	-	197.60	167.89	85%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	-	6.80	3.66	54%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	-	22.21	-	0%

Cuadro No. 3
Inversión Pública (Inversión Productiva) por Institución al mes de diciembre de 2022
 Cifras en Millones de Lempiras

INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejec. (Dev./Vig.)
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	1.11	1.11	0.98	88%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	10.00	-	
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	-	10.00	-	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	-	17.00	17.00	100%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	3.70			-
Total, general	11,204.61	10,859.15	4,574.12	42.1%

Nota. SIAFI, al 31 de diciembre de 2022

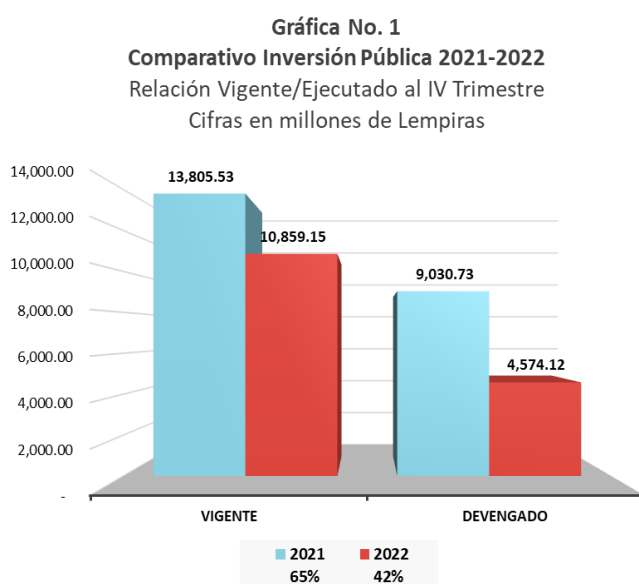

Al cuarto trimestre de 2022, el desempeño de ejecución a nivel ejecutado devengado (42%) muestra una reducción de 23 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre del año 2021 (65%), lo anterior se debe a los cambios estructurales derivados de los Acuerdos Ejecutivos (PCM) 005-2022, 009-2022 y 011-2022 en los cuales se han eliminado instituciones y se han creado otras, rotación de personal, así como la rescisión y liquidación de los contratos y/o convenios de fideicomisos suscritos.


Los retrasos en las ejecuciones por parte de las unidades ejecutoras se han generado en su mayoría por el proceso de ordenamiento y transición en el Marco del Plan de Gobierno para Refundar Honduras, situación que ha ocasionado lentos procesos de adquisición, pagos a proveedores, falta de ratificación de contratos (obras, bienes y servicios) que trascendieron el periodo de Gobierno, retrasos en la ejecución de obras por la temporada ciclónica, así como el resto de actividades programadas en sus planes operativos anuales (POA) y planes de adquisiciones y contrataciones (PAC).

En el Plan de Inversión Pública se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar,

modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Cabe señalar, que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 349-2022), Artículo 2, numeral 34 el cual literalmente dice: "UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, subprogramas y proyectos."

1.3. Inversión Pública por Estructura del Sector Público

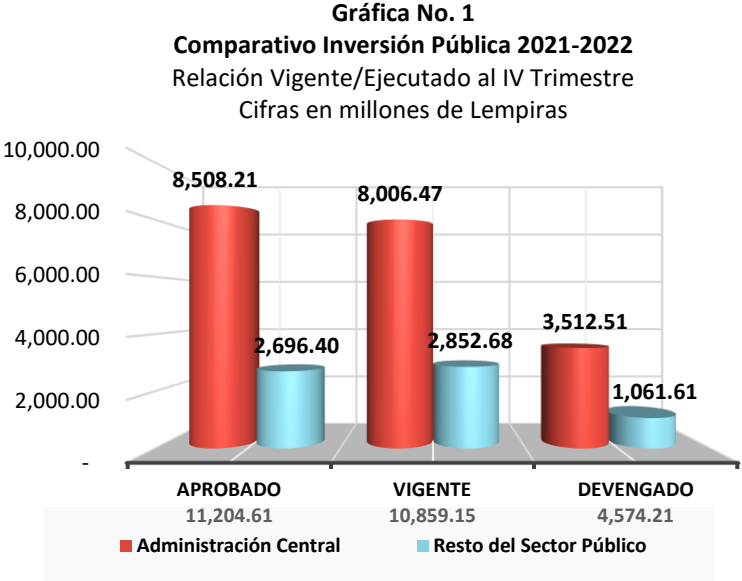


De acuerdo con lo anterior, la mayor parte del presupuesto vigente se concentra en proyectos ejecutados por instituciones de la Administración Central, con 73.7%. Tal como se mencionó anteriormente las instituciones que concentran mayor presupuesto son: INVEST-H, FHIS, AEPAS-H, Secretaría de Salud y la ENEE por Resto del Sector Público (RSP), que alcanza 26.3%, cabe señalar que en este nivel

se incorporaron proyectos del IHMA y BANASUPRO financiados con fondos de préstamo del Banco Central de Honduras (BCH).

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

La distribución del PIP para el año 2022 de acuerdo con la Clasificación del Sector Público, de acuerdo con el Presupuesto Aprobado fue de L11,204.61 millones; detallado para la Administración Central (AC) L8,508.21 millones y el Resto del Sector Público (RSP) L2,696.40 millones; sin embargo, el presupuesto vigente es de L10,859.15 millones; de los cuales L8,006.47 millones corresponden a la Administración Centralizada y L2,852.68 millones del Resto del Sector Público (RSP), mientras que a nivel de ejecución se reportan L4,574.1 millones de los cuales L3,512.5 millones corresponden a la AC y L1,061.6 millones al RSP, tal como se muestra en la Gráfica 3.

Gráfico No. 3
Presupuesto Ejecutado Clasificación de la Inversión por Estructura del Sector Público
Cifras en millones de Lempiras

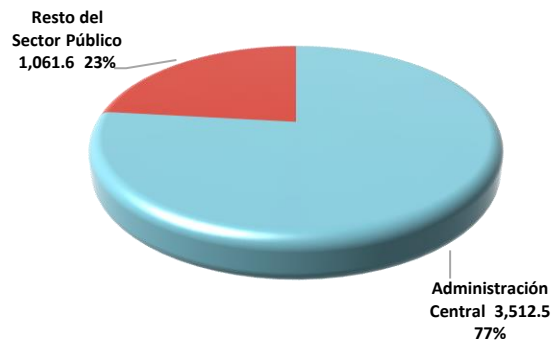


A continuación, véase la Inversión Pública por estructura del Sector Público al 31 de diciembre de 2022.

Cuadro No. 4
Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de diciembre de 2022
Cifras en millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Ejecutado			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
Administración Central	944.8	9,911.2	10,856.0	1,345.7	6,660.8	8,006.5	1,319.3	2,193.2	3,512.5	43.9%
Resto del Sector Público	211.9	136.0	347.9	606.9	2,245.8	2,852.7	323.7	737.9	1,061.6	37.2%
Total General Inversión Pública	1,156.7	10,047.2	11,203.9	1,952.6	8,906.5	10,859.2	1,643.0	2,931.1	4,574.1	42.1%

Fuente: SIAFI al 31 de diciembre de 2022

1.4. La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión (Inversión Productiva)

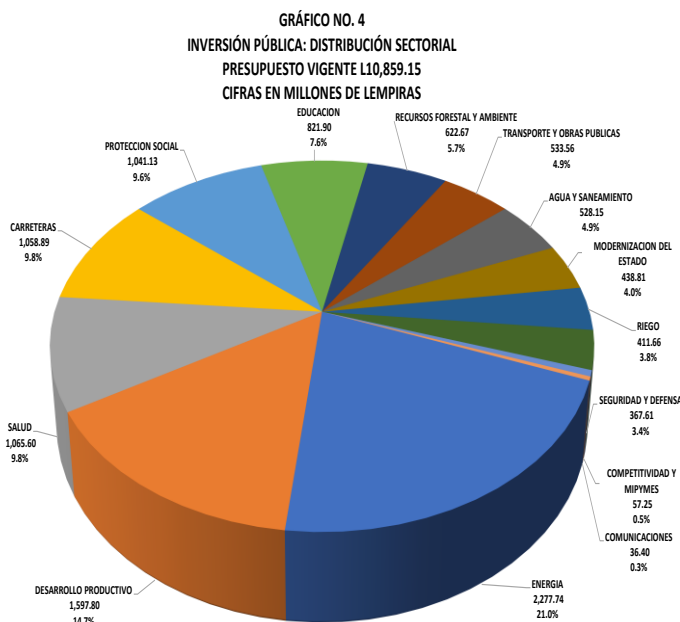

En cuanto a la inversión Sectorial, el Sector Energía cuenta con el mayor porcentaje de inversión con L2,277.74 Millones (21%), el cual incluye proyectos en ejecución por la ENEE para la ejecución de los proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares

Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

Seguido del **Sector de Desarrollo Productivo** con L1,597.80 millones (14.7%) en apoyo a la población más vulnerable de la zona del corredor seco, con el proyecto Alianza para El Corredor Seco (USAID-GAFSP), proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca.

El **Sector Salud** con una inversión L1,065.60 millones (9.8%), incluye Proyectos orientados al Plan de Vacunación contra el COVID-19 y mejora al sistema de los servicios de Salud a través de proyectos de Inversión como ser el Proyecto para Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de Salud Materno-Neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata e Salud RISP para contener y controlar el coronavirus COVID-19 y Mitigar su efecto en la prestación de servicio en Honduras.

El **Sector Protección Social** con una inversión de L1,041.13 millones (9.6%), contempla la ejecución de once (11) proyectos que serán ejecutados por la Red Solidaria (Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus), FHIS (Programa de Seguridad Ciudadana), Salud (Apoyo al sistema integral de protección Social), Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (Centros de atención integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas), entre otros proyectos.

Seguido el **Sector Educación** con una inversión de L821.9 millones (7.6%); ejecutando el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo (Proyecto Joven), Equipamiento de talleres del INFOP, Mejoramiento de la calidad en la educación prebásica en Honduras, entre otros proyectos.

Finalmente, el **Sector Carretero** con una inversión de L1,058.89 millones (9.8%); constituye uno de los sectores de inversión pública más relevante, siendo un motor fundamental del desarrollo económico y social del país ya que genera oportunidades para los pobres y mejora la competitividad de la economía, en este sector se está ejecutando proyectos como el Corredor Pacífico, Corredor Occidente, Libramiento Anillo Periférico, Villa de San Antonio Goascorán y los tramos carreteros “Naco – La Entrada, en corredor de Occidente” “Las Lomas – Terrero Blanco”, “Portillo del Lobo – Reitoca – Curaren”, “Tegucigalpa – El Guanabano, Salida a Olancho”, entre otros.

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

El resto de los sectores: Recursos Forestal y Ambiente (5.7%), Transporte y Obras Públicas (4.9%), Agua y Saneamiento (4.9%), Modernización del Estado (4.0%), Riego (3.8%), Seguridad y Defensa con (3.4%), Competitividad y MIPYMES (0.5%) y Comunicaciones (0.3%).

1.5. Financiamiento del Programa de Inversión Pública

El **18%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuente nacional (Fuentes 11 y 12); el **75%** es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el **7%** por donaciones externas (Fuente 22).

Principalmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM), Unión Europea (UE) y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), Véase Cuadro 4.

Cuadro No. 6
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al mes de diciembre 2022
Cifras en Millones de Lempiras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
Nacionales	1,152.97	1,952.60	1,643.00	84.1%
Crédito Externo	8,832.65	8,195.49	2,613.19	31.9%
Donaciones Externas	1,218.97	711.05	317.91	44.7%
Total, Plan de Inversión	11,204.59	10,859.15	4,574.11	42.1%


Fuente: SIAFI, al 31 de diciembre de 2022

1.6. Inversión Social

Son aquellas inversiones, en su mayoría de Desarrollo Humano que están formuladas en programas institucionales que no forman parte del Programa de Inversiones Públicas, por lo que no nacen dentro de la Metodología SNIPH y por ende no cuentan con un código BIP. Al IV trimestre dichas inversiones han ejecutado L11,417.8 millones correspondiente al 90% de los recursos asignados. En donde instituciones como la SESAL, SEDUC, SAG, SEN, IHMA, BANADESA, FHIS y El Programa de Acción Solidaria contaron con una asignación de L11,885.55 millones (88.5%) respecto al presupuesto vigente de L13,428.2 para desarrollar actividades para la compra de vacunas covid-19 y otras patologías, bono tecnológico, cafetalero y ganadero, becas, bonos y matrícula gratis, subsidio energía, diésel, lpg, energía menos de 150 kw, construcción, mejoramiento de instalaciones deportivas, fomento al deporte y recreación así como el otorgamiento de créditos agrícolas.

Por lo anterior, la inversión realizada por los Programas sociales y la Inversión Productiva (inversiones del Plan de Inversión Pública que fueron formulados bajo la Metodología

Gráfico No. 4
Presupuesto Ejecutado Clasificación de la Inversión Social y Productiva
Cifras en millones de Lempiras

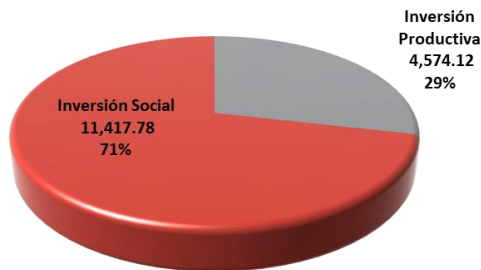


SNIPH y que cuentan con código del Banco Integrado de Proyectos (BIP)) al IV trimestre fue del 65.8% correspondiente a L15,991.9 millones tal y como se aprecia en el gráfico No. 4 con relación al presupuesto vigente de L24,287.31 millones del total de las inversiones.

1.7. Ejecución histórica período 2018 - 2022

La ejecución total acumulada al mes diciembre de 2022 registra una baja ejecución en comparación a los años anteriores, esto se debió principalmente a la reestructuración del nuevo gobierno, la reformulación del Presupuesto en abril y la falta de ratificación de contratos de proyectos que traspasaron período de gobierno.

Gráfico No. 5
Comportamiento de la Inversión Pública Histórica
Ejecución al 31 de diciembre de 2022
Cifras en Millones de Lempiras

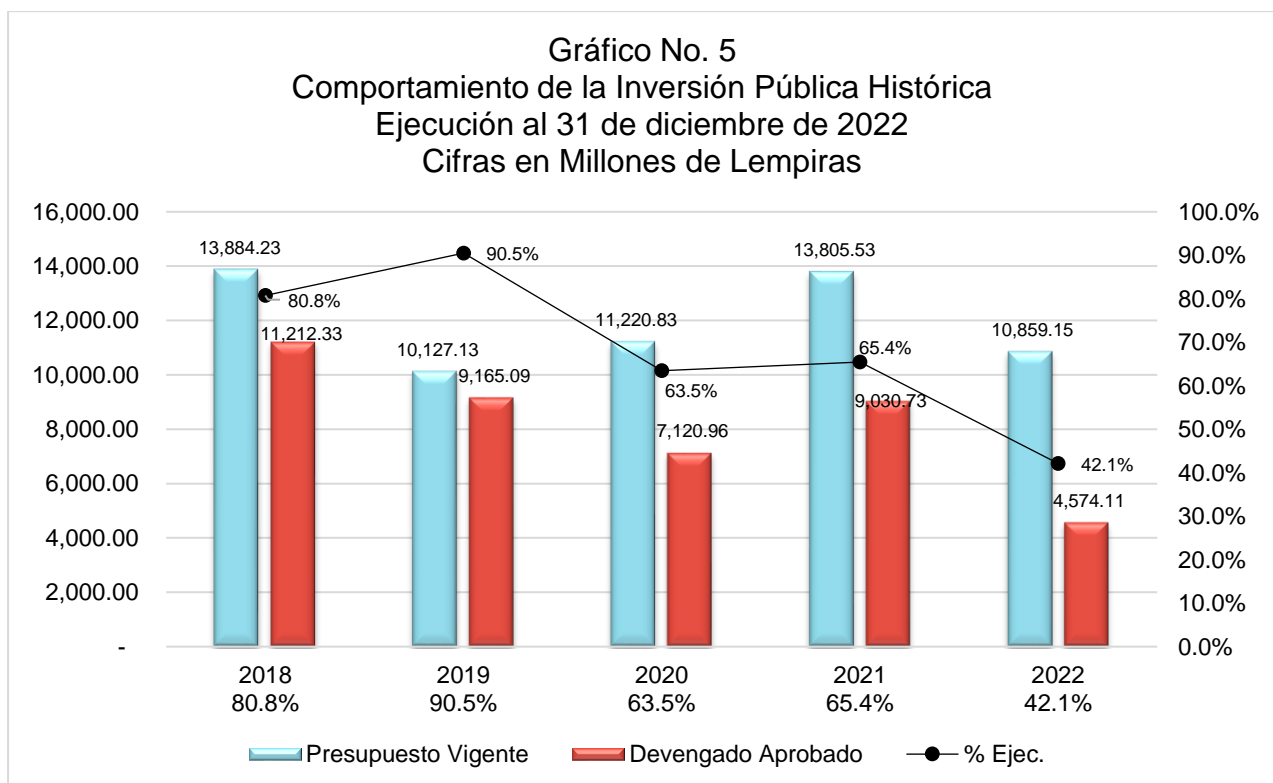

Fuente: SIAFI, al 31 de diciembre de 2022

1.8. Ejecución Física a Nivel de Sectores

Los avances al cuarto trimestre de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

1.8.1. Sector Carreteras

Al cuarto trimestre, las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INSEP entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

Durante el año 2022 se han otorgado 11 Notas de prioridad con un monto de inversión L36,645.1 millones que intervendrán tramos carreteros como ser:

1. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero: la Ena - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, sub tramo: "Puente Río el Pataste - Dulce Nombre de Culmí".
2. Proyecto obras de mitigación para el control de riesgos geotécnicos y geológicos, por deslizamientos y desprendimientos de roca de taludes de corte en la carretera CA5-Sur tramo "Moramulca", fase I.
3. Construcción y rehabilitación vial con concreto hidráulico del Corredor de Occidente, tramo carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 km), localizado en los departamentos de Santa Bárbara y Copán.
4. Rehabilitación con concreto hidráulico sobre la carpeta asfáltica existente del tramo carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), longitud 7.22 km (salida a Olancho).
5. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del Corredor de Oriente, tramo carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, ruta 53" y elaboración del estudio y diseño del tramo carretero: ruta 119,".
6. Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero: "Portillo del Lobo - Reitoca - Curarén" (39.54 km), localizado en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)

INVEST-H, tras la publicación de los PCM 05-2022 y 11-2022 quedó suprimida y se nombró un liquidador para efectuar el cierre de proyectos que finalizaron su ejecución física y financiera, y el traspaso de los proyectos a la SAG y SIT para mantener la ejecución operativa de estos.

Por lo anterior, los proyectos que fueron traspasados a la SAG están:

- Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II).
- Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.
- Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

Y los proyectos que fueron traspasados a la SIT está:

- Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

1.8.2. Sector de Protección Social

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al cuarto trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos ejecutados por Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

1. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID): Se han ejecutado 2 obras complementarias reparadas y/o ampliadas en los servicios de salud ubicados en Atlántida y Cortés, 8 obras de espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos, 9 centro educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa.
2. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): El proyecto realizo dos obras de reparación en dos centros de salud en los departamentos de Francisco Morazán y Santa Barbara; construcción de cuatro centros educativos en Ocotepeque, Intibucá, La Paz y Lempira.

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO) y Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN): Actualmente, el Proyecto se encuentra en proceso de transición a la Red Solidaria, pendiente respuesta por parte del organismo ejecutor a la solicitud de cambio de ejecutor y contrato modificadorio.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer (DNCM)

Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer): Se ejecuto el contrato para el suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma, el cual beneficiaria a los centros Ciudad Mujer a contar con una autonomía en su operatividad, así como el ahorro en gastos de operación.

1.8.3. Sector Energía

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación

del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red.

Los avances al cuarto trimestre se presentan a continuación:

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

1. Proyecto Apoyo a la Integración De Honduras en el Mercado Regional (MER): el remanente del convenio de US\$640,000.00 será utilizado en la subestación del Progreso, esto debido a la necesidad que es la segunda subestación más importante de la zona norte del País y evitar los racionamientos de energía.
2. Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo: Al cuarto trimestre se realizaron los trabajos de despejes en los Sistemas de Excitación para las Unidades Principales de Generación de la Central Hidroeléctrica de Francisco Morazán. Por otra parte, se finalizaron los contratos de Consultorías del Manejo Integral del Lago de Yojoa, a excepción del Contrato 124-2021 correspondiente a la Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua, Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado; el cual fue cancelado por incumplimiento en la presentación de un producto, por lo que se iniciará un nuevo proceso de adquisición para cumplir con el mismo.
3. Proyecto Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad: la operación ATN/OC-16427-HO se encuentra en etapa de cierre. No se logró concluir la ingeniería de detalle en los plazos previstos, retrasando con ello la compra de parte de los bienes y la planificación de los servicios conexos; en vista que las capacitaciones están coligadas a la operación y mantenimiento del Proyecto de las Plantas Solares Fotovoltaicas en Guanaja y Brus Laguna y este último obtuvo la Licencia Ambiental hasta el 8 de agosto de 2022.
4. Proyecto Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables: Al cierre del cuarto trimestre se logró comprometer el 80% de los montos de la Cooperación Técnica No Reembolsable.
5. Proyecto de Electrificación Rural en Lugares Aislados: Finalizada la gestión 2022, se recibió el Informe Final de la Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica. Asimismo, se recibió Acta de Recepción Provisional de los Modelos de Sostenibilidad Financiera para la instalación y operación de los Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios en los Municipios de El Corpus y Concepción de María.

6. Proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica: Al cuarto trimestre presentados y aceptados los Informes Intermedios para iniciar las obras de construcción y pruebas de subestaciones y líneas de transmisión a nivel nacional asimismo para los términos de referencia y presupuestos de las consultorías especializadas.

1.8.4. Sector Educación

Este sector apoya a la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa (proyecto Joven) y el Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. Los avances al cuarto trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación (SEDUC)

1. Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (IDA 6560-HN): Al cuarto trimestre de acuerdo con las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta lo siguiente:
 - Publicado en el mes de noviembre la solicitud de expresión de interés para el proceso de contratación de una firma consultora que se encargará de la Construcción de un Modelo de Calidad para la Educación Prebásica en Honduras.
 - Se obtuvo la no objeción por parte del Banco Mundial (BM) a la propuesta de ajustes del presupuesto de este subcomponente, la cual contempla el desarrollo de diversas acciones a ejecutarse en el marco de la implementación del Programa de Fortalecimiento de los COMDE en dos (2) fases
 - Revisión y consolidación de la información, producto de las jornadas desarrolladas del nivel de Educación Prebásica en los 18 departamentos.
 - En ejecución la consultoría para la evaluación y formulación de los proyectos de obras en 253 Centros de Educación Prebásica seleccionados, en 40 municipios en los 6 departamentos focalizados por el proyecto (Copán, El Paraíso, Gracias a Dios, Lempira, Olancho y Yoro). Se ha avanzado en la elaboración de las evaluaciones de las primeras 140 carpetas de los proyectos de obras en los 253 CEPB.
2. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE Fase IV): Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del programa en relación con las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, seguridad alimentaria y temas administrativos se detallan las siguientes:
 - Desarrollo de 7 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV)
 - Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, Porcentajes de avance, verificación de Normativa, protocolos de bioseguridad en la ejecución del proyecto, verificación de actividades de proyectos,

- construcción de huertos educativos y productivos, generación de recomendaciones.
- Capacitaciones Levantamiento Plan Maestro de Infraestructura educativa Departamento de Santa Bárbara.
- Realización de Solicitudes y seguimiento a procesos de Legalización de centros educativos a intervenir con el PROMINE.
- Realización de taller de mantenimiento de Centros educativos en el departamento de Intibucá.

Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

1. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven: A la fecha, la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) ha suscrito dos (02) Convenios interinstitucionales con la Secretaría de Educación (SEDUC) y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), modalidad flexible presencial y a distancia, bajo dicho convenio se beneficiará un máximo de 11,343 educandos.

En cuanto a la ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país, se avanzó en los procesos de contratación para la construcción de 3 aulas y facilidades para la atención de tercer ciclo de Educación Básica en 15 de 50 Centros Educativos Básica, para lo cual, se contrató una firma consultora de supervisión y cuatro empresas contratistas de obra civil. Por otra parte, se ha realizado la publicación del proceso para la contratación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) para su adjudicación en el último trimestre del año y para la Rehabilitación de 09 (CEB's) productos de las afectaciones de las tormentas ETA & IOTA.

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docente para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el Tercer Ciclo de la Educación Básica del área de influencia del Proyecto. Actualmente están en proceso de formación 625 docentes en los siguientes Departamentos.

Se llevó a cabo la instalación del servicio de conectividad fija a Internet para 28 de esos 72 centros educativos, y para 63 de los 72 centros educativos se llevó a cabo la instalación y configuración de equipo de conectividad inalámbrica (Access points y switches). Para el 2023 queda pendiente llevar a cabo la inspección de dicho equipo de conectividad inalámbrica con la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) y gestionar una compra adicional de equipos de conectividad inalámbrica para los cuatro centros de formación regional de SEDUC y el Edificio DGDP.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE Fase IV): Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:
 - De 5 centros educativos programados se finalizaron 2 centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en el Departamento de Intibucá, generando 85 empleos directos y beneficiando a 807 personas directamente.
 - L56.8 millones son anticipos a proyectos en los departamentos de Copán, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

1.8.5. Sector Salud

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. Los avances al cuarto trimestre de la Secretaría de Salud y AEPAS-H son los siguientes:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL)

1. Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras: Al cuarto trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reportó avance físico del 89% y avance financiero del 98%, detallando su ejecución por componentes:
 - Conducción de la respuesta a nivel del país: se realizaron los pagos de honorarios profesionales de las consultorías siguientes: consultoría para tres desarrolladores en apoyo a la estrategia para la conducción de respuesta (pago de honorarios octubre a diciembre) y pago final a la consultoría senior (entrega de tres productos finales).
 - Detección y seguimiento de los casos: Para el cuarto trimestre del año no se reporta ejecución física; debido, a que el proceso de adquisición de reactivos en apoyo al Laboratorio Nacional se realizó, sin embargo, los oferentes no lograron acreditar su representación exclusiva en el país, por lo cual no pudo concluir el proceso.
 - Interrupción de la cadena de transmisión: Para el cuarto trimestre del año no se reporta ejecución física; debido a que el proceso para la consultoría para la Violencia Contra la Mujer (VCM) fue fracasado; al cierre del 2022 se inició un nuevo proceso del cual se encuentra en evaluación de hojas de vida de los ofertantes.
 - Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud: Se realizó el segundo y tercer pago a la empresa COVADI por la construcción de 12 casetas para el manejo de desechos en hospitales priorizados.
2. Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271): Al cuarto trimestre, la Unidad Ejecutora, reportó los siguientes avances:

- Adquisición de 130,368 dosis de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el Plan de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19.
- Elaborar 4 informes de administración y ejecución del Proyecto.
- Contratar la Auditoría y supervisión externa del Proyecto.

Por disposiciones de las Autoridades de la SESAL se determinó cancelar los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo BCIE 2271, por un monto estimado de US\$4.3 millones; en vista que los recursos ya no serían requeridos para la adquisición de vacunas y que el uso de estos de acuerdo con el contrato suscrito únicamente puede ser utilizados para dicho fin. Por otra parte, la Autoridad ha gestionado la obtención de vacunas mediante otras cooperaciones en calidad de donación.

Al cuarto trimestre, se registró el pago a Horwath Central América, S.deR.L. de C.V. correspondiente al del Contrato de Auditoría externa de los estados financieros, revisión operativa del Programa y cumplimiento contractual del mismo.

3. Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN): Durante el cuarto trimestre del 2022; se realizaron acciones conjuntas SESAL-PROSALH y SEFIN, para la identificación de espacio presupuestario para la ejecución; mismo que fue identificado mediante Notas Técnicas No.001-2022 y 004-2022 para el traslado de espacio presupuestario parcial por un monto de L293.2 millones para honrar pagos que no pudieron ser efectuados durante el año 2021, debido al desfase relacionado al proceso de traslado de INVESTH a SESAL, en cumplimiento al PCM-030-2021; actividad que también impactó en no poder formular dicho proyecto para el año 2022.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH), las principales actividades realizadas se resumen a continuación: Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de contratación de recurso humano (783 personas) para el despliegue y aplicación de la vacuna en 230 municipios a través de 79 equipos que considera 711 personas en brigadas y 72 coordinadores.

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

Convenio IDA-6626-HN:

1. Adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso; los bienes ya se encuentran embarcados y se espera la llegada al País para el 04 de febrero 2023.
2. Adquisición de 71 monitores de signos vitales; los bienes se encuentran en proceso de fabricación se espera que los mismos ingresen al País en marzo 2023.
3. Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19 (continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023)

4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%)

Convenio IDA-6868-HN:

1. Personal de Despliegue y aplicación del Despliegue (contratación de 430 personas); continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023.
2. Adquisición de 650 mil jeringas; 120 mil de cajas de seguridad y 300 set de destructores de agujas; En proceso de embarque de china al Honduras.
3. Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19; (Shifo Foundation).
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$46,287.78)
5. Adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19; En proceso de fabricación y entrega.
6. Adquisición de camisetas, carnet, gorras, chalecos para el proceso de despliegue; En proceso de fabricación y entrega.
7. Contratación de consultor para el diseño e implementación de la página web del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19).
8. Insumos y materiales para el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI); En proceso de impresión y entrega.

Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2): Al cuarto Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 22% y financiero del 51% (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- Componente 1: Pago de 3 consultoras en apoyo a las intervenciones del Programa, para apoyo financiero y monitoreo (octubre a diciembre).

Se reporta no ejecución del 50% de la meta programada debido a que no se dio al proceso de contratación de Técnicos en monitoreo para Departamento de Primer y Segundo Nivel de Atención de la SESAL (las autoridades no aprobaron el proceso)

- Componente 2: Se realizó la adquisición de equipo para mejoramiento de la red interna de la SESAL.

Se presentó desfases considerando:

Proceso para la adquisición de reactivos para la detección de Covid-19 fue cancelado, a petición del Banco se envió solicitud a los proveedores para cada

uno de los tipos de reactivos que acreditaran su representación exclusiva en el país, la cual no lograron acreditar en tiempo.

No se inició el proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo para sistema de información y mejorar conectividad de hospitales y regiones, esto debido a que no se recibió solicitud de este por parte de la Unidad de Gestión de la Información (UGI).

No se inició el proceso para la adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL, debido a que no se recibió solicitud, por parte de la UGI, para dar inicio al proceso

- Componente 3: Pendiente un último desembolso a la enmienda para la adquisición de Vacunas de Pfizer, ya que no se realizó requerimiento.

Se inició el proceso de la adquisición de 2 Generadores Eléctricos y un banco de transformadores para almacenes de biológicos, pero se detectó que las especificaciones técnicas no estaban claras, por lo que la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) se encargó de revisarlas y ajustarlas.

- Componente 4: Se realizó el pago (octubre a diciembre) a la consultoría en apoyo a los procesos de Control Interno con los Gestores, así mismo el pago de recurso humano en apoyo a los hospitales.

Se presentó desfases considerando: Que el proceso de construcción de las Dos (2) salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19. La UTGP realizó ajustes a las especificaciones técnicas ya que estaban para la construcción de un hospital y no para salas. Este proceso de Contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata en el marco de la Pandemia COVID-19 está en elaboración de informes de evaluaciones para ser enviados a No Objeción del Banco.

Se inició el para la contratación de Ingenieros Biomédicos, Sistemas, Civiles y Consultor en Infraestructura Hospitalaria (se envió a No Objeción del Banco el PEP con esta actividad nueva).

Pendiente la Contratación de personal de apoyo.

Equipamiento de Hospitales /Equipo Médico para Hospital Escuela. A la espera que se definan los TDR para esta consultoría (actividad nueva de fondos remanentes).

Contratación de firma para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria.

Pendiente la Contratación de consultoría para proceso de telemedicina, esto debido a que se está a la espera que se defina la consultoría pagada con el proyecto RISP-HO, y definir si se continúa con este modelo.

Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

1. Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal: De acuerdo con la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al cuarto trimestre se describen a continuación:

- Priorización de los municipios con incidencia de muertes materno-neonatales, en primer nivel de atención mediante la incorporación de equipos de salud familiar, en regiones priorizadas (Copan; Florida-Trinidad, Olancho; Juticalpa-Patuca, Choluteca; Namasigüe) brindando atención prenatal a 1,599 embarazadas de las cuales 233 fueron captadas antes de las 12SG obteniendo un 77% de la captación de embarazadas antes de 12 SG. Así como atención médica a 1,242 recién nacidos de los cuales 587 fueron captados en los primeros 3 días de nacidos. representando un 47% de la captación de los recién nacidos en los primeros 3 días.
- Se intervinieron 11 hospitales, 91 municipios, en el mejoramiento de Infraestructura de los servicios de salud. En proceso infraestructura, a la firma consultora TASH (Firma Española- Nacionalizada Honduras), para el "Diseño y Supervisión de las Obras en: H. Regional de Occidente, H. Roberto Suazo Córdova, H. San Francisco, H. Santa Teresa de Comayagua, H. Escuela, H. de Roatán.

1.8.6. Sector Desarrollo Productivo y Riego

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, incremento los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria.

Al cuarto trimestre del año 2022 las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

1. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA: Durante el cuarto trimestre para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto se encuentran en la implementación en campo 51 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, mypimes.

Este producto tendrá avance, una vez que los planes de fortalecimiento sean elaborados, implementados y revisados para someter a la aprobación de las organizaciones beneficiarias.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la señora ministra de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se han generado procesos de 50 desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las

organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico.

Por otra parte, se ha realizado el Establecimiento de sistemas agroforestales iniciando el proceso de adquisiciones el cual se encuentra en proceso de evaluación de ofertas, asimismo, se realizaron acercamientos con ICF con el que actualmente se trabaja un borrador de acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar reforestaciones con árboles maderables en la zona de La Paz.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR): se continua con el proceso de las pruebas de las tuberías en los subproyectos de Tascalapa y Sigüapa, no así en Maralito donde aún no se concluye con la represa. Para el proyecto de “Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua”. El avance ha sido mínimo considerando la demora que tomó la firma de la Adenda No. 3 del contratista, pues sin esta no podía adquirir los compromisos para la adquisición del equipo de riego del proyecto de Joya de Ramos, sin el cual no se puede obtener el permiso para continuar con la instalación de la tubería de la línea de conducción del proyecto de San Sebastián. Actualmente se cuenta con un avance del 55% en donde Durante este período se ha trabajado principalmente, en: Bocatoma (resanes, muro de mampostería; muro de gaviones; concreto ciclópeo); y se suministró e instaló tubería de 500 mm en la línea de conducción.
3. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de JAMASTRAN FASE 1: Se programaron 20 nuevas estaciones de bombeo y equipamiento instalado en los módulos de riego, que beneficiarían a 68 familias. Esto representaría un avance de 50% de la obra para el año 2022. Sin embargo, el proyecto se encuentra en proceso de evaluación técnica asimismo existen temas legales en proceso, a espera de resolución del TSC.
4. Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE): En el mes de diciembre, se programó una ejecución que correspondía a la priorización de una cadena de valor, una campaña de concientización diseñada, inversión productiva y capacitaciones brindadas a administradores de las estaciones agroclimáticas.

Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

1. Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN: Se presentó el informe de auditoría al 30 de octubre 2022; se realizaron transferencias no reembolsables al plan Organización de Productores Rurales (OPR) así como la ratificación de planes de negocios, y a su vez se firmaron los acuerdos de subvención para hacer efectivos los desembolsos.

Se realizaron gestiones para la firma de los convenios interinstitucionales que conforman parte del componente II de ComRural II que lo conforman la SAG, SENASA, MIAMBIENTE, SENPRENDE y ARSA, posterior a la firma se aprobaron

los Programas de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), proceso que debe ser continuado por la SAG quien es la institución receptora del proyecto.

2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201): Se realizó la presentación del informe de auditoría, la contratación del Sub implementador del Componente 1 Fortalecimiento Productivo del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad para implementar las acciones en campo y logras los objetivos de implementación. Por su parte, se realizaron adquisiciones para los especialistas ambientales, sociales, monitoreo y Evaluación, así como la adquisición de mobiliario y equipo.

1.8.7. Sector Seguridad y Defensa

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Las principales metas ejecutadas al cuarto trimestre son:

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad (SDS)

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB): Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

Infraestructura en Jefaturas Policiales:

- Construcción de 3 Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida Dos licitaciones internacionales para la adquisición de mobiliario y equipo informático.
- Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS, Cortés y en el municipio de La Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
- Remodelación de las 2 Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Choluteca y Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios.
- Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.

Efectividad Policial:

- Adquisición de Mobiliario y de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.
- Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas)
- Compra de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de operaciones de la PNH
- Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de 1,000 pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.

1.8.8. Sector Recursos Forestales y Ambiente

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB).

Los avances al cuarto trimestre se muestran a continuación:

Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

1. Proyecto Manejo Sostenible de Bosques: Los principales avances físicos alcanzados al cuarto trimestre se describen a continuación:
 - 38 planes de restauración (PR) en bosque público aprobados, equivalentes a 32,475.25 hectáreas, lo que representa un 95.5% en relación con la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se tiene 37 PR con convenios suscritos vigentes, equivalentes a 32,128.71 hectáreas (94.5% de la meta) y en ejecución 36 planes, equivalentes a 32,041.41 hectáreas (94.2%), se ha ejecutado un monto de L57,221,884.70 por las organizaciones implementadoras de los 36 PR.
 - En las actividades de protección y restauración forestal se han generado 5,502 empleos de los cuales 1,992 empleos corresponden a mujeres. En forma acumulada el proyecto ha generado 19,137 empleos.
 - Las actividades de restauración de los 36 planes en ejecución se llevan a cabo en 24 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro
 - Fortalecidas 85 brigadas comunitarias mediante la compra y dotación de herramientas y equipo para la protección, conservación y el manejo sostenible de bosques.

Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): Durante el cuarto Trimestre la ejecución financiera es de 1% alcanzado una ejecución acumulada en la vida del proyecto de 37%, y con una ejecución técnica del 47%.

Se ha avanzado en la construcción de las herramientas de planificación de las áreas protegidas, principalmente en los planes de manejo, de los cuales 6 ya se encuentran aprobados y 6 ya se encuentran a nivel de expediente y en proceso de revisión de la Dirección de Adquisiciones de Proyectos y las Regionales, los cuales serán aprobados en el primer trimestre del 2023.

Por otra parte, se realizó jornada de evaluación de efectividad de manejo de 4 Áreas Protegidas, por parte de la oficina local de Tela la cual evidencia la necesidad de contar

con instrumentos de planificación adecuados y la documentación en tiempo y forma de cada uno de los procesos.

1.8.9. Sector Modernización del Estado

Se refiere a proyectos integrales que promuevan la eficiencia y la eficacia de las instituciones a través de cambios e innovaciones de simplificación y tecnológicos, los avances al cuarto trimestre se muestran a continuación:

Proyectos Ejecutados por Servicio de Administración de Rentas (SAR)

1. **Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria:** En cuanto a la ejecución física al 31 de Diciembre del año 2022, el Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, presenta un porcentaje de avance físico del 73% a nivel de Estructura Desarrollo de Trabajo (EDT) en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) en donde el Componente I. Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria fue concluido en el año 2019, presentando una ejecución total de US\$2.05 millones y física de un 100%. En cuanto al Componente II. Modernización de Sistemas e Infraestructura Tecnológica y Física SAR se tiene un presupuesto total de US\$ 21.10 millones de los cuales se han comprometido US\$20.48 millones de los cuales se ha ejecutado US\$9.15 en donde para el cuarto Trimestre se realizó el Pago del Hito No. 2 por un monto de US\$1, 062,159.30 correspondiente a las etapas 4, 5 y 6 del Contrato No. SAR-BID-3541-B-002-2021, suscrito con la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A. (GTT) “Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR)”, contra entrega y aprobación productos tales como el Análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales y casos de uso – Fase 1.1, Diseño del Sistema Informático – Arquitectura y Elaboración del prototipo del Sistema informático.

En cuanto a la Infraestructura Tecnológica de Software y Física del SAR reforzada para la adquisición del equipamiento, se cuenta con un monto contratado es de US\$1.37 millones, en donde se realizan las actividades correspondientes al Fortalecimiento de la Plataforma de Contact Center y Solución Unificada de telefonía, Licencias cliente de base de datos y a la Controladora de ancho de banda.

Es importante indicar que el proyecto también cuenta con un tercer componente orientado al Fortalecimiento del Talento Humano del SAR en donde actualmente se encuentra en el desarrollo de las Especificaciones Técnicas para el Lanzamiento de Proceso licitatorio para el 2023.

Proyectos Ejecutados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN)

1. **Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1):** Al cuarto trimestre el proyecto presenta baja ejecución financiera, debido al cambio de autoridades en la Secretaría para la toma de decisiones del Proyecto, el Proyecto no cuenta con el personal técnico capacitado, en vista que el personal no se le renovó contrato a partir de marzo, los procesos de licitación se realizan a

través de la Gerencia Administrativa Central y no se cuenta con personal exclusivo del proyecto

Proyectos Ejecutados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

1. **El Programa “Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras” (EURO+LABOR):** El programa cerró su ejecución física y financiera, para lo cual UCP-SETRASS ha realizado las siguientes actividades:
 - Se atendió los requerimientos de la empresa auditora que realizó la auditoría final del Programa.
 - Se atendió los requerimientos de la empresa auditora prueba y error residual de la UE, que revisa a nivel mundial los proyectos.
 - Se digitalizó los documentos del programa para la entrega a la Secretaría General de la SETRASS en versión impresa y digital, y a la Unión Europea en versión digital.

Proyectos Ejecutados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAAH)

Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales (FN 24388-1): se han intervenido 10 rollos de documentos microfilmados, correspondiente a los rollos 047 al 057 cada rollo oscila en 60 a 90 documentos, es decir más de mil imágenes, digitalizado 950 documentos microfilmados, documentos descripciones 950, actualizaciones de inventario 950, número de documentos microfilmados alojados a la página del cdihh: 388, se alojaron 150 documentos en el mes de octubre, se logró terminar de alojar esta parte del fondo.

1.8.10. Sector de Transporte y Obras Públicas

Este sector tiene como finalidad contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de programas y proyectos promovida y administrados por el gobierno para la construcción de infraestructuras hasta edificaciones públicas. Los avances al cuarto trimestre se muestran a continuación:

Proyectos ejecutados por Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

1. **Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE):** Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:
 - 2 obras complementarias reparadas y/o ampliadas en los servicios de salud ubicados en Atlántida y Cortés.
 - 8 obras de espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos.
 - 9 centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa.

1.9. Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, durante el cuarto trimestre del Año 2022

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de estos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	Debido a la situación de cierre de INVEST-H y el tardío nombramiento del Liquidador de la institución, se atrasó la liquidación y cierre de proyectos de inversión, así como su traslado a las nuevas instituciones ejecutoras de los proyectos que continuaran su ejecución bajo otra institución	Definir una fecha de corte para realizar un análisis de los saldos pendientes de pago de los proyectos a ser trasladados a otras instituciones, así como los que cerraran en la INVEST-H.
	A la falta de una adecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, y la rotación de nuevo personal en la UCP, ha desfasado la ejecución oportuna de los proyectos.	Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa-Financiera	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Reglamentar la presentación de estimaciones, reembolsos y demás cuentas por pagar de los proveedores para evitar desfases en la ejecución presupuestaria de los proyectos.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al segundo desembolso es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN a través de la DGCP y la DGIP deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión.	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

Área	Problemas	Acciones
Legal	Lento proceso por parte de la Secretaría de la Presidencia en remitir al Congreso Nacional para su ratificación, los Contratos de Obras, Bienes y Servicios que trascendieron el periodo de gobierno, ocasionando retraso en la ejecución de los proyectos.	Las unidades ejecutoras deben solicitar apoyo al más alto nivel para la pronta ratificación por parte del Congreso Nacional, para la reactivación de dichos contratos.
	El cambio de Autoridades por el nuevo Gobierno genera lentos procesos como ser: delegación de firmas, solicitudes de desembolsos, pagos a Proveedores, y falta de aprobaciones de Cuotas de Compromiso para efectuar pagos.	Las unidades ejecutoras de proyectos tendrán que revisar su programación de pagos, así como la revisión de sus planes de adquisiciones y presupuestos.
