

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Salud  
(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras

Mayo, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

En lo que respecta a la **Inversión Pública** aprobada para la SESAL en el Año 2023 asciende a **L.4,613.3 millones**, la que a su vez se agrupa en *Inversión Social* la cual se destina principalmente a fortalecer áreas de intervención como adquisición de vacunas y medicamentos, adicionalmente se destina parte de los recursos a la finalización de obras y equipamiento del Hospital de Roatán; totalizando dicha inversión por un monto de *L.2,843.8 millones*.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* (Proyectos de Inversión Pública) cuentan con una asignación aprobada por el Congreso Nacional de *L.1,769.5 millones*, los cuales incluyen espacio presupuestario por L.1,037.9 millones destinados a proyectos en proceso de incorporación presupuestaria para regularización (Reequipamiento Biomédico del Hospital María) y otros en etapa de Preinversión para la construcción de 5 hospitales: Ocotepeque, Salamá, Santa Bárbara, Traumas San Pedro Sula y Traumas Tegucigalpa (actualmente en proceso la gestión de negociación, elaboración de documento de perfil de proyectos, etc.).

Al cierre del I trimestre de 2023, se cuenta con un presupuesto vigente de L.731.5 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para fortalecer las unidades del Segundo Nivel de atención (construcción, equipo, telemedicina y contratación de recurso humano); fortalecer la red de diagnóstico: notificación, seguimiento y respuesta

laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias; fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria; mejora de la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil; instalación del

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del  
2023  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,769,477,260
Presupuesto Vigente	731,518,063
Ejecutado (Devengado Anual)	72,574,050
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>10%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	147,996,805
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>20%</b>


Fuente: SIAFI, 31/03/2023

equipo médico y no médico adquirido, así como insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales; adquisición de 151,000 vacunas bivalentes contra COVID-19 y fortalecimiento de los almacenes de biológicos con equipo para cadena de frío; adquisición de reactivos e insumos para laboratorios públicos; Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa, contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

La SESAL registró ejecución presupuestaria en el primer trimestre del 10% (L.72.5 millones) a nivel de devengado y compromisos por L147.9 millones (20%) del Presupuesto Vigente asignado (la ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1), producto de la ejecución reportada en seis de siete proyectos adscritos en ejecución.

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al primer trimestre del 2023 se financia con recursos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Taiwán de los cuales, el Crédito Externo representa el 96% (L.704.0 millones) y Donaciones externas 4% (L.27.5 millones), distribuidos de acuerdo con el Gráfico No. 01.

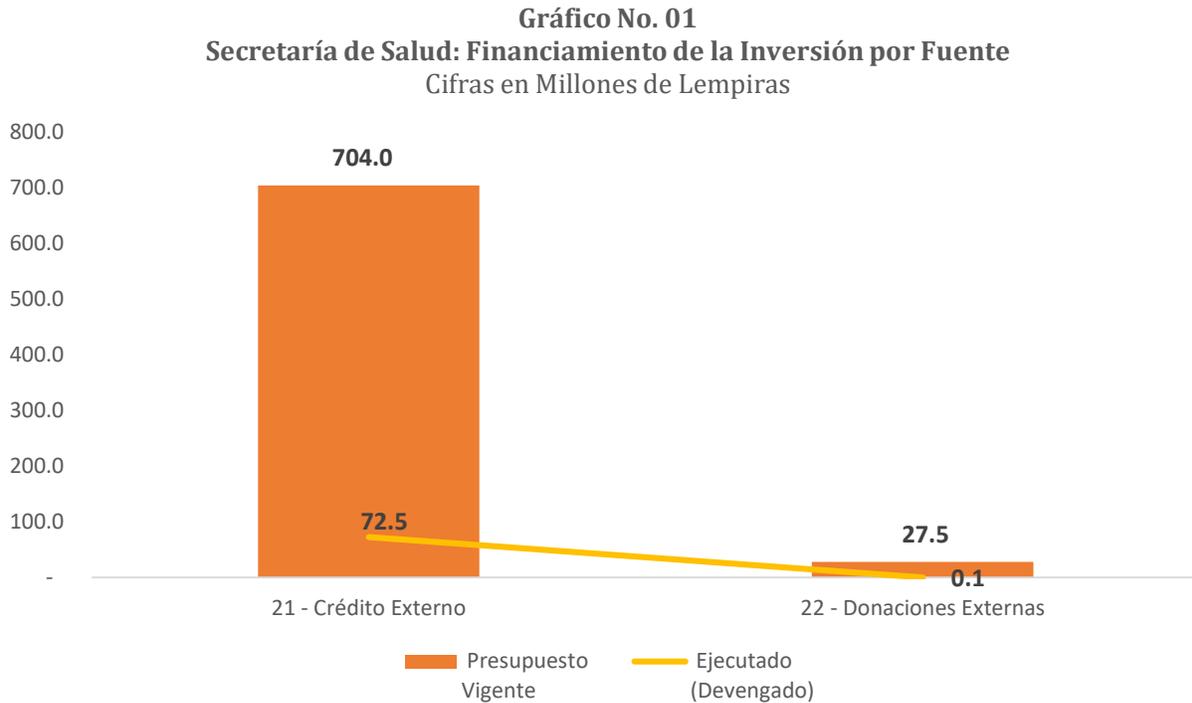

En forma comparativa al I trimestre del año 2022, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L.113.9 millones, reportó ejecución en 3% (L.3.8 millones); la tendencia en ejecución refleja un porcentaje similar tomando en cuenta que la asignación para el año 2023 incremento en L.617.6 millones que representaría un incremento del 542%. Es de considerar que para este trimestre uno de los proyectos es coejecutado con Red Solidaria, ha desfasado su ejecución debido a que se encuentra a la espera de la formalización del Contrato

Modificatorio al Convenio BID 5008/BL-HO por cambio de Organismo Ejecutor (de SEDIS a Red Solidaria), por lo que su presupuesto no logró ser ejecutado por contar con marco legal pendiente para realizar la operatividad a nivel de sistemas de Gobierno.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.


**3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2019 – 2023):**

En el período comprendido de los años 2019 al 2023, el Programa de Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 14 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 98% con recursos de crédito externo, 2% recursos de donación externa.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L.2,910.07 millones; reflejando un promedio de ejecución de 11% (L.325.3 millones) al mes de marzo de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge la Emergencia Sanitaria por COVID-19 permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, considerando que, para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el PNUD y la OPS.

**Comportamiento de la Inversión Pública**  
(Secretaría de Salud)  
Al 31 de marzo 2019-2023  
Millones de Lempiras

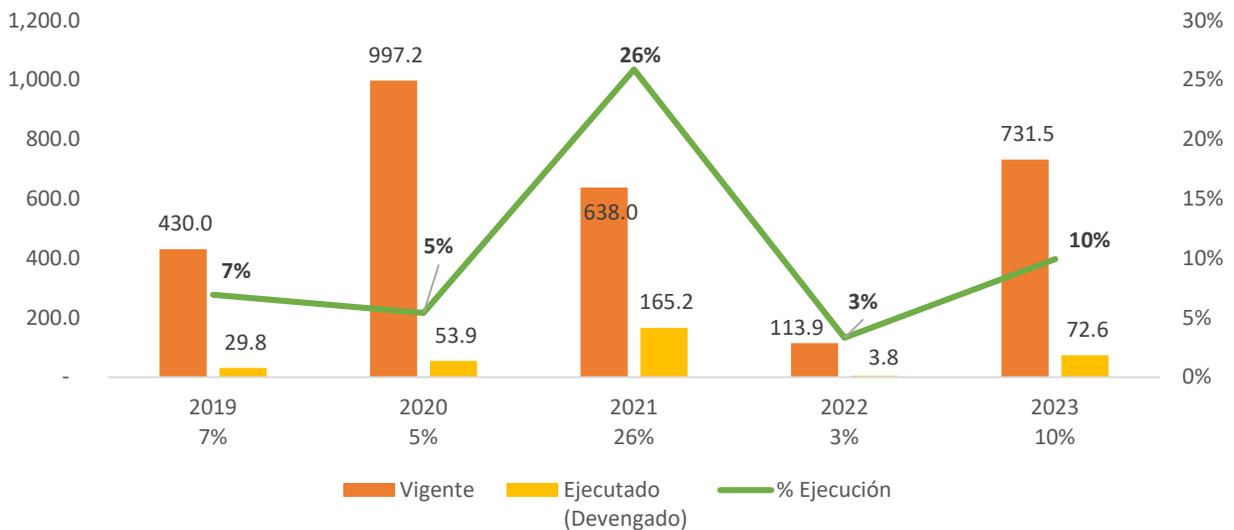

## 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

**Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2* 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	14/08/2020 28/11/2023
		Lempiras	1,234,450,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	-	17,783,562	-	0%
Acumulado 2023	-	17,783,562	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,234,450,000	1,234,450,000	1,184,708,567	96%

\*/ Para el Convenio 3815/BL-HO-2, se efectuó devolución de saldos no comprometidos por US\$385,780.03.

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L24.6890 por US\$1.00

**Objetivo:** contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Realizar 3 capacitaciones en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por COVID-19.
- Fortalecer 26 unidades del segundo nivel de atención (construcción, equipo, telemedicina y recurso humano).
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, con la contratación de recurso humano en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19 (46 informes).
- Fortalecer la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (1 contrato).
- Realizar la Auditoría del Proyecto.

## SECRETARIA DE FINANZAS

Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta que Programa presenta avance físico acumulado del 89% y avance financiero del 98%; no realizó ejecución física en este trimestre.

### **Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 11/12/2024
		Lempiras	123,445,000	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2023	37,822,172	59,040,584	-	0%
Acumulado 2023	37,822,172	59,040,584	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	123,445,000	123,445,000	11,174,230	9.1%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L24.6890 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 169 municipios, en intervenciones de 46 trimestralmente.

Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 26% y financiero del 9.2%, presenta desfase en la ejecución del año 2023 debido a que se encuentra a la espera de la formalización del Contrato Modificatorio al Convenio BID 5008/BL-HO por cambio de Organismo Ejecutor (de SEDIS a Red Solidaria), por lo que su presupuesto no logró ser ejecutado por contar con marco legal pendiente para realizar la operatividad a nivel de sistemas de Gobierno.

### **Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):**

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	US\$	40,000,000	15/04/2020 31/10/2024
		Lempiras	987,560,000	

## SECRETARIA DE FINANZAS

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	205,444,615	205,444,615	61,878,424	30.1%
Acumulado 2023	205,444,615	205,444,615	61,878,424	30.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	987,560,000	987,560,000	534,435,117	54.1%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L24.6890 por US\$1.00

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frio para los establecimientos de salud priorizados.

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Instalación del equipo médico, no médico y adquisición de insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales (4 lotes).
- Adquisición de 151,000 dosis y aplicación de las vacunas COVID-19 a la población de acuerdo con el Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecer los almacenes de biológicos con equipo para cadena de frio.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:

- 90.8% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.
- 59% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,405,645; Población 2da dosis: 5,675,207).
- Laboratorios designados con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
- 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.
- 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.

## SECRETARIA DE FINANZAS

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

### Convenio IDA-6626-HN:

1. Adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso; los bienes ya fueron recepcionados y distribuidos a diferentes hospitales del país.
2. Adquisición de 71 monitores de signos vitales; los bienes fueron embarcados, se recibieron las facturas originales, pendiente realizar pago directo.
3. Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19 (continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023)
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%)

### Convenio IDA-6868-HN:

1. Personal de Despliegue y aplicación del Despliegue (contratación de 430 personas); continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023.
2. Adquisición de 650 mil jeringas; 120 mil de cajas de seguridad y 300 set de destructores de agujas; Bienes embarcados, pendientes del pago Directo del 100% del contrato.
3. Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19; (Shifo Foundation, pago pendiente de 42% del contrato).
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$46,287.78)
5. Adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19; En proceso de Subsancar ciertos productos entregados.
6. Contratación de consultor para el diseño e implementación de la página web del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19); En proceso de elaboración del manual de identidad gráfica del proyecto.
7. Insumos y materiales para el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI); Recepcionados los bienes y distribuidos a diferentes regiones hospitalarias.
8. Actividades para movilización en seguimiento al despliegue de aplicación de vacunas (servicio de transporte, viáticos)

### **Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 01/10/2023
		Lempiras	1,328,761,980	

## SECRETARIA DE FINANZAS

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	460,761,338	421,759,364	10,621,925	2.5%
Acumulado 2023	460,761,338	421,759,364	10,621,925	2.5%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,328,761,980	1,328,761,980	703,971,879	53.0%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L24.6890 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- 18 contratos de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.
- 2 contratos para la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos.
- 3 contratos de firmas consultoras para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
- Contratación de recurso humano para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes de COVID-19.
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **30%** y financiero del **52.3%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

Una (1) en Asistencia Técnica de los Procesos Financieros y Administrativos relacionados con los proveedores descentralizados financiados por RISP-HO-2, dos (2) en Asistencia Técnica Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de la respuesta a la pandemia.

- ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

Pagos del personal médico contratado (175 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria, pago al consultor senior en salud digital para la definición y apoyo a la

implementación de una estrategia para el uso de soluciones tecnológicas en el marco del fortalecimiento institucional de la SESAL.

Pagos de consultorías de GESALUD en apoyo a las actividades del Programa, pago de los servicios básicos (energía eléctrica, teléfono e internet de las oficinas de GESALUD y UGD, pago de viáticos a las intervenciones del RISP-HO-2, pago de la publicación de procesos.

### 3.3.1 INVERSIÓN SOCIAL

De los L.2,843.8 millones asignados para Inversiones Sociales en la SESAL, se registra ejecución por L.196.1 millones, equivalentes a una ejecución financiera del 7% destinados principalmente a la adquisición de medicamentos. Al cierre del primer trimestre, como parte de estas inversiones sociales, la SESAL se encontraba en proceso de realizar transferencia por L.100.0 millones a la Municipalidad de Roatán para la finalización de obras y equipamiento del Hospital de Roatán.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (enero - diciembre) de ejecución para el Año 2023 (con actualización mensual).
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0006-2023 para la ampliación del período de desembolsos, ejecución y cierre al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN e IDA 6868-HN) por 18 meses.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0007-2023 para la Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN e IDA 6868-HN).
- Participación en la Revisión de la Gestión de Cartera (RGC I) correspondiente a los Proyectos financiados por el BID.
- Participación en “Taller de trabajo conjunto para la Revisión y valoración técnica de la cartera de créditos vigentes”.

### Conclusiones

- Al primer trimestre del año 2023, la ejecución reportada por la SESAL registró una ejecución a nivel de devengado del 4% (L.72.6 millones) y compromisos registrados por L.147.9 millones (8%) en relación al Presupuesto Vigente asignado; cabe señalar que la baja ejecución se ha visto afectada por no contar con la disponibilidad para ejecución en una de las operación debido a que se depende de la firma de contrato modificatorio que

permitirá habilitar el proyecto para su ejecución, así mismo, se estaba a la espera de la gestión y autorización de ampliación de plazo que permitiera continuar con la firma de contratos y posterior ejecución de los mismos; los procesos internos de modificación presupuestaria que permitiera la disponibilidad de los recursos en las líneas presupuestarias correspondientes.

- Actualmente las Unidades Ejecutoras continúan en procesos de renovación de personal clave lo cual implica desfase de las actividades programadas para ejecución 2023.

### Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

# ANEXOS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
6	0060 - Secretaría de Salud			-	731,518,063	731,518,063	-	731,518,063	731,518,063	-	72,574,050	72,574,050	10%	-	147,996,805	147,996,805	20%
1	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 4449/BL-HO-2	14/08/2020	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		BID 4518/BL-HO-3	28/11/2023	-	-	-	-	16,583,562	16,583,562	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO</b>			-	-	-	-	17,783,562	17,783,562	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019	-	18,330,786	18,330,786	-	18,330,786	18,330,786	-	73,700	73,700	0%	-	300,000	300,000	2%
		IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA	30/11/2023	-	18,330,786	18,330,786	-	18,330,786	18,330,786	-	73,700	73,700	0%	-	300,000	300,000	2%
3	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020	-	37,822,172	37,822,172	-	59,040,584	59,040,584	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>			-	37,822,172	37,822,172	-	59,040,584	59,040,584	-	-	-	0%	-	-	-	0%
4	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	15/04/2021	-	9,159,152	9,159,152	-	9,159,152	9,159,152	-	-	-	0%	-	-	-	0%
			15/04/2023	-	9,159,152	9,159,152	-	9,159,152	9,159,152	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total 030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS</b>			-	9,159,152	9,159,152	-	9,159,152	9,159,152	-	-	-	0%	-	-	-	0%
5	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	24/04/2020	-	15,000,000	15,000,000	-	23,682,847	23,682,847	-	3,745,441	3,745,441	16%	-	3,931,828	3,931,828	17%
		IDA 6868-HN	30/04/2023	-	190,444,615	190,444,615	-	181,761,768	181,761,768	-	58,132,983	58,132,983	32%	-	73,228,029	73,228,029	40%
	<b>Total 031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19</b>			-	205,444,615	205,444,615	-	205,444,615	205,444,615	-	61,878,424	61,878,424	30%	-	77,159,857	77,159,857	38%
6	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	01/10/2021	-	460,761,338	460,761,338	-	421,759,364	421,759,364	-	10,621,925	10,621,925	3%	-	70,536,948	70,536,948	17%
			01/10/2023	-	460,761,338	460,761,338	-	421,759,364	421,759,364	-	10,621,925	10,621,925	3%	-	70,536,948	70,536,948	17%
	<b>Total 032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)</b>			-	460,761,338	460,761,338	-	421,759,364	421,759,364	-	10,621,925	10,621,925	3%	-	70,536,948	70,536,948	17%
6	<b>SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)</b>			346,031,957	5,109,013,174	5,455,045,131	-	731,518,063	731,518,063	-	72,574,050	72,574,050	10%	-	147,996,805	147,996,805	20%
	0060 - Secretaría de Salud			-	1,111,794,073	1,111,794,073	73,834,876	1,037,959,197	1,111,794,073	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Monto Aprobado Congreso en gestión para incorporación, cambio de fuente y pendiente emisión de Nota de Prioridad)</b>			-	1,111,794,073	1,111,794,073	73,834,876	1,037,959,197	1,111,794,073	-	-	-	0%	-	-	-	0%
6	<b>TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA</b>			346,031,957	6,220,807,247	6,566,839,204	73,834,876	1,769,477,260	1,843,312,136	-	72,574,050	72,574,050	4%	-	147,996,805	147,996,805	8%
	0060 - Secretaría de Salud			1,470,000,000	-	1,470,000,000	1,470,000,000	-	1,470,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>TOTAL INVERSIÓN SOCIAL</b>			1,470,000,000	-	1,470,000,000	1,470,000,000	-	1,470,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
6	<b>TOTAL GENERAL</b>			1,816,031,957	6,220,807,247	8,036,839,204	1,543,834,876	1,769,477,260	3,313,312,136	-	72,574,050	72,574,050	2%	-	147,996,805	147,996,805	4%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	16 - Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.	Informe	3	0	0	0	0	0
		17 - Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención ( construcción , equipo, telemedicina y RRHH )	Informe	26	0	0	0	0	0
		18 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	2	0	0	0	0	0
		19 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)	Informe	46	0	0	0	0	0
		20 - Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0	0	0	0
	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	06 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	Informe	3	0	0	1	0	0
		07 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	Informe	2	0	0	0	0	0
		08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	55	0	0	18	0	0
	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Informe	169	0	0	46	0	0
	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	07 - Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Capacitación	8	0	0	2	0	0
		08 - Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	Informe	21	0	0	1	0	0
		09 - Realizada la adquisición de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	0
		10 - Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Taller de Capacitación	8	0	0	2	0	0
	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	08 - Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales	Lote	4	0	0	1	0	0
		09 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	1	0	0	1	0	0
		10 - Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biológicos con equipo para cadena de frio	Vacuna	151,000	0	0	109,000	0	0
		11 - Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto	Informe de Auditoría	1	0	0	1	0	0

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	09 - Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	Informe	18	0	0	6	0	0
		10 - Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	Contrato	2	0	0	1	0	0
		11 - Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.	Contrato	3	0	0	2	0	0
		12 - Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19	Contrato	1	0	0	1	0	0
		13 - Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023	Informe	163	0	0	42	0	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2023
