

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Salud  
(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

En lo que respecta a la **Inversión Pública** vigente para SESAL al cuarto trimestre del 2023 asciende a **L8,753.0 millones**, la que a su vez se agrupa en *Inversión Social* la cual se destina principalmente a fortalecer áreas de intervención como adquisición de vacunas y medicamentos, adicionalmente se destina parte de los recursos a la finalización de obras y equipamiento del Hospital de Roatán; al cierre del año 2023, dicha inversión asciende a L8,005.4 millones de los cuales se ejecutó un **83%**, es decir L6,643.2 millones.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* (Proyectos de Inversión Pública) cuentan con una asignación vigente al mes de diciembre por *L747.5 millones*, para la ejecución de 8 proyectos, asimismo, un espacio presupuestario por L1,038.0 millones de crédito externo previsto para proyectos en etapa de Preinversión para la construcción de 3 hospitales: Traumas San Pedro Sula, Traumas Tegucigalpa y Hospital de Roatán; al cierre del ejercicio fiscal se presentaron para aprobación al soberano Congreso Nacional el Convenio de financiamiento suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$150.0 millones para el “*Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria*”. Con respecto a los Hospitales básicos en Ocotepeque y en Salamá, así como el Hospital General en Santa Bárbara, se determinó realizar la ejecución

de las obras a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con fondos nacionales, monto total de la inversión por L3,171.3 millones.

Al cierre del año 2023, se cuenta con un presupuesto vigente de L747.5 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para fortalecer las unidades del Segundo Nivel de atención (construcción, equipo, telemedicina y contratación de recurso humano); fortalecer

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado*	7,463,595,659
Presupuesto Vigente	747,511,130
Devengado IV Trimestre, 2023	254,718,941
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/ Vigente)</b>	<b>34%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	516,135,731
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>69%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

\*/ Presupuesto Aprobado incluye Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) e Inversión Social (Programas sin categoría de Proyecto) identificadas al 31/12/2023.


la red de diagnóstico: notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias; fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria; mejora de la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil; instalación del equipo médico y no médico adquirido, así como insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales; adquisición de 151,000 vacunas bivalentes contra COVID-19 y fortalecimiento de los almacenes de biológicos con equipo para cadena de frío; adquisición de reactivos e insumos para laboratorios públicos; Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Hospital de Roatán, así mismo, las acciones en Preinversión para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital de Choluteca y Tocoa, como apoyo a la red hospitalaria.

La SESAL registró ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del **69%** (L516.1 millones) a nivel de devengado y en relación con el Presupuesto Vigente asignado (la ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1), producto de la ejecución reportada de los ocho proyectos adscritos en ejecución.

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al cuarto trimestre del 2023 se financia con recursos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Italia y Taiwán de los cuales, el Crédito Externo representa el 95% (L713.8 millones) y Donaciones externas 5% (L33.7 millones), distribuidos de acuerdo con el Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01  
Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente  
Cifras en Millones de Lempiras

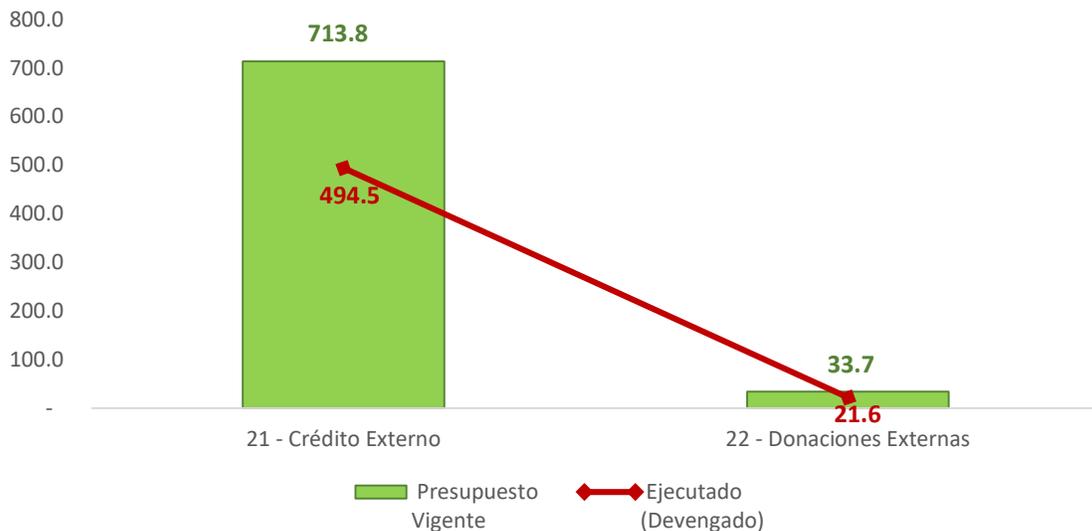

En forma comparativa al IV trimestre del año 2022, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L904.3 millones, reportó ejecución en 45% (L407.4 millones); la tendencia en ejecución se refleja al alza en 24 puntos porcentuales, tomando en cuenta que la asignación para el año 2023 es menor en L156.8 millones.


Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

**3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2019 – 2023):**

En el período comprendido de los años 2019 al 2023, el Programa de Inversión Pública (PIP) de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 14 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 98% con recursos de crédito externo, 2% recursos de donación externa.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L5,457.3 millones; reflejando un promedio de ejecución del 79% (L4,321.4 millones) al mes de diciembre de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; sin embargo, no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, y que, para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

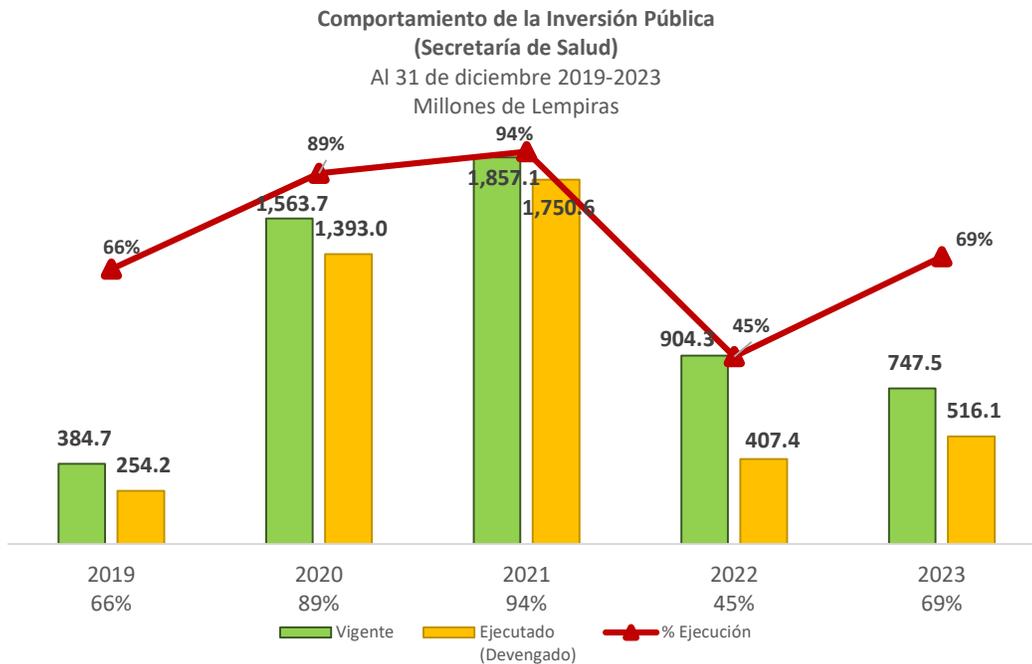

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

#### **Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 11/12/2024
		Lempiras	123,847,192	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2023	37,822,172	34,012,479	10,967,623	32%
Acumulado 2023	37,822,172	34,012,479	11,583,567	34%
Acumulado Vida del Proyecto *	123,847,192	123,847,192	22,757,796	18%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L24.7694 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 169 municipios, programados 40 informes y ejecutados 27 informes al cuarto trimestre.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 36% y financiero del 10%; durante dicho trimestre se realizaron 13 giras de supervisión a municipios a descentralizar en el marco del Programa, 4 talleres de capacitación: dos (2) en el marco de la Estrategia de Atención Integral en la Comunidad (AIN-C); un (1) taller para el Fortalecimiento del Modelo Nacional de Salud (SINAR) y un (1) taller de Fortalecimiento en 20 regiones. Adicionalmente se logró el primer desembolso a 2 Gestores (ADASBA y MANLESIP).

**Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):**

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	US\$
		Lempiras	990,777,536	31/10/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2023	205,444,615	376,237,515	155,613,777	41%
Acumulado 2023	205,444,615	376,237,515	336,109,394	89%
Acumulado Vida del Proyecto *	990,777,536	990,777,536	808,666,087	82%

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L24.7694 por US\$1.00

Consiste en apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frio para los establecimientos de salud priorizados.

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Instalación del equipo médico, no médico y adquisición de insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales (4 lotes).
- Adquisición de 151,000 dosis y aplicación de las vacunas COVID-19 a la población de acuerdo con el Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecer los almacenes biológicos con equipo para cadena de frío.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), al 31 de diciembre de 2023 reporta avances físicos en **93%** de las actividades planificadas, de las cuales las principales se listan a continuación:

- ✓ Implementación y cierre de la Estrategia de Despliegue de la Vacunación contra el COVID-19:
  - Se contrataron 530 recursos técnicos distribuidos a nivel nacional para complementar los equipos de vacunación de 18 regiones sanitarias.
  - Se priorizaron los municipios con menores niveles de cobertura en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, con extensión solicitada por las autoridades de la SESAL para la aplicación de todas las vacunas contenidas en el PAI, aplicándose alrededor de 801,803 dosis.

- ✓ Adquisición de 111 equipos médicos y no médicos para 28 hospitales que incluyen:
  - Máquinas de anestesia
  - Rayos x móviles y fijos
  - Ultrasonidos
  - Tomógrafos
  - Arco en C para hemodinamia y arcos en c para ortopedia
  - Torre de endoscopia y colonoscopia
  - Video broncoscopio
  - Foto coagulador de escaneo láser
  - Oxímetros de pulso para uso hospitalario
  - Camillas de transporte hospitalarias
  - Monitores de signos vitales
  - Lavadoras industriales
  - Secadoras industriales
  - Estufas industriales eléctricas
  - Aires acondicionados
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo para 20 equipos de ultrasonografía y RX móviles marca SIEMENS, ubicados en 13 hospitales.
- ✓ Adquisición de 240 equipos de oficina para unidades de nivel central de la SESAL y de 18 regiones sanitarias.
- ✓ Instalación de la Red LAN, Red NID, red eléctrica y aires acondicionados de la Sala Situacional de la SESAL.
- ✓ Distribución de 513 equipos para fortalecer la cadena de frio para 148 unidades de salud distribuidas en 20 regiones sanitarias.
- ✓ También se han implementado las medidas establecidas en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS) relacionadas a los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial que son de obligatorio cumplimiento para el país.

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

### **Convenio IDA-6626-HN:**

1. Adquiridos 6 rayos X, contrato firmado y recibidos y pagados 4 rayos x, pendiente recibir en el mes de enero 2024 los restantes 2 rayos x y completar la ejecución del 100% del Contrato. (Avance 76.7%).
2. Contratación de personal de los Centros de Atención a Migrantes Retornados en puntos fronterizos, se ha ejecutado el 100% del contrato al 31 de diciembre 2023.
3. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros, se ha ejecutado el 100% del contrato al 31 de diciembre 2023.
4. Adquisición de 23 lavadoras (ejecutado 100%) y 10 secadoras (ejecutado 72%), contrato firmado; el restante se ejecutará contra entrega total secadoras, capacitación e instalación.
5. Adquisición de Video-broncoscopio terapéutico de alta resolución, contrato firmado, Se ha pagado el 40%, pendiente el restante contra entrega de documentos de embarque e instalación.

6. Preinstalaciones de 6 Rayos x fijos HOSPITEC (EQUIPO GE) [avance 33.2%], se pagará el resto finalizada todas las instalaciones de rayos X
7. Contrato para mantenimiento de ultrasonidos y rayos X (DISS) [Avance 27.2%], se pagará el restante una vez finalizado todos los mantenimientos.

### **Convenio IDA-6868-HN:**

1. Adquiridos 2 tomógrafos de 64 cortes y 1 Arco en C Hemodinamia, contrato firmado, se reporta avance de 68%, queda pendiente un tomógrafo y se hará el pago una vez sea embarcado.
2. Adquiridos de 2 rayos x móviles y 4 ultrasonidos, contrato firmado y pagado en su totalidad, el equipo ya llegó a puerto.
3. Consultoría para la Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19 [avance en 31%]. Se realizó una adenda en tiempo al 30 de octubre 2024.
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros, contrato pagado en 100%. Auditoría finalizada, el informe final se entregó en el 31 de julio 2023.
5. Contratación de consultor para el diseño del Sistema de quejas del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19). Ejecutado en 100%.
6. Adquisición adicional de 2 rayos x móviles (Enmienda al Contrato con SIEMENS), contrato firmado, Se pago el 100% del contrato, el equipo ya llegó a puerto.
7. Adquisición de 23 lavadoras (Empresa MACC MEDICAL), Contrato Firmado. Se pago el 45%, se espera recibir los bienes en el mes de enero 2024 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
8. Adquisición adicional de 6 lavadoras (MACC MEDICAL), Contrato Firmado. Ejecutado el 100% del contrato.
9. Adquisición adicional 4 secadoras (SIMEDIC), Contrato Firmado. Se esperaba recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
10. Adquisición de 1 Fotocoagulador de escaneo láser, Se espera recibir los bienes en el mes de marzo 2024 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
11. Adquisición de 1 torre de endoscopia y colonoscopia, [avance 50%] Se esperaba recibir los bienes en el mes de octubre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
12. Adquisición adicional de 5 arco en C portátiles (Enmienda Firmada GE), Firmado el contrato, Se pago el 100%, equipo se encuentra ya en puerto.
13. Adquisición adicional de 1 rayos X (Enmienda Firmada GE), Firmado el contrato, se pagó el 100%, equipo se encuentra ya en puerto.

**Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	53,820,000	01/10/2021
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	Lempiras	1,333,091,175	10/03/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2023	460,761,338	275,994,569	64,725,087	23%
Acumulado 2023	460,761,338	275,994,569	121,885,133	44%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,333,091,175	1,333,091,175	815,235,087	61%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L24.7694 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

**Avance Físico:** Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- 18 contratos de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.
- Contratos para la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos. (Programados 9, ejecutados 8).
- 3 contratos de firmas consultoras para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
- Contratación de recurso humano para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes de COVID-19. Contratados 354 recursos humanos
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **52%** y financiero del **56%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones), los avances por componentes se describen a continuación:

✓ Componente 2: Detección y seguimiento de casos:

Se firmó los contratos para la adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI).

Pago de contratos para la adquisición de reactivos a Promoción Médica Honduras, DIMEX Medical y Distribuidora de Productos para Día.

✓ Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión:

En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos.

✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

Pagos del personal médico contratado (352 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: ayudantes de enfermería, Auxiliares de enfermería, microbiólogos, licenciados en enfermería, médico anestesiólogo, médico cirujano, médicos internistas, médicos pediatras, médicos Gineco obstetra, médicos generales, técnicos de Laboratorio Clínico, técnico en anestesia y técnicos en radiología; especialista en infraestructura hospitalaria.

Se realizó 3 giras de supervisión para la gestión hospitalaria.

✓ Componente 5: Administración del Programa:

Pago a 1 consultor de apoyo GESALUD.

Pago de licencia de internet de GESALUD y UTINH.

Pago de renta de impresoras, Pago de Telefonía y viáticos para 3 giras para realizar supervisión de la Gestión Hospitalaria.

### 3.3.1 INVERSIÓN SOCIAL

Al cuarto trimestre de 2023, la SESAL cuenta con **L8,005.4 millones** asignados para Inversiones Sociales los que a su vez se conforman por *Programas Sociales* (L5,406.9 millones) y *Formación Bruta de Capital* (Bienes Capitalizables) por un monto de L2,598.6 millones.

En dicho conjunto, se registró ejecución financiera por **L6,643.2 millones** equivalentes al **83%**; destinados principalmente a la adquisición de medicamentos, reactivos, material médico quirúrgico menor, instrumentos y material para laboratorio, contratación de servicios médicos, anticonceptivos, reactivos VIH/SIDA, material y suministros odontológico, productos farmacéuticos y medicinas varias, otros instrumentos, accesorios y material médico.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre - diciembre) de ejecución para el Año 2023 (con actualización mensual).

- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0038-2023 para la modificación entre categorías de inversión y componentes al Proyecto Reequipamiento Biomédico del Hospital María de Especialidades Pediátricas (HMEP), por un monto de €887,375.84.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0040-2023 para la ampliación de plazo de ejecución y cierre al Proyecto Honduras – Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana (GRT/MM-17339-HO), por 13 meses.
- Participación en la Segunda Revisión Técnica de Cartera de Proyectos de Inversión Pública financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Participación en el Programa de las audiencias Públicas en el Soberano Congreso Nacional, para la revisión de la Inversión 2024 para la SESAL.
- Participación en reuniones técnicas de la Consultoría de Revisión del Gasto, coordinado por la Dirección General de Presupuesto y el BID.

### Conclusiones

- Al cuarto trimestre del año 2023, la ejecución reportada por la SESAL se registra a nivel de devengado en 69% (L516.1 millones) para la Inversión Productiva y un 83% (L6,643.2 millones) para la Inversión Social (Formación Bruta de Capital + Programas Sociales) ambas en relación con el Presupuesto Vigente asignado; la tendencia en ejecución se refleja al alza considerando las asignaciones en su conjunto para el Plan de Inversión Pública de la SESAL para el año 2023.
- Al término del cuarto trimestre la gestión para la incorporación que permita el pago final de supervisión y auditoría del Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271) se culminó.
- Así mismo, en cuanto a la regularización de pagos por parte del Proyecto Reequipamiento Biomédico Hospital María Especialidades Pediátricas (HMEP), al término del trimestre logró registrar L9.5 millones equivalentes al 98% de ejecución.

### Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

# ANEXOS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proj.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
8	0060 - Secretaría de Salud		-	731,518,063	731,518,063	-	747,511,130	747,511,130	-	254,718,941	254,718,941	34%	-	516,135,731	516,135,731	69%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	37,822,172	37,822,172	-	34,012,479	34,012,479	-	10,967,623	10,967,623	32%	-	11,583,567	11,583,567	34%
	<b>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	<b>37,822,172</b>	<b>37,822,172</b>	-	<b>34,012,479</b>	<b>34,012,479</b>	-	<b>10,967,623</b>	<b>10,967,623</b>	<b>32%</b>	-	<b>11,583,567</b>	<b>11,583,567</b>	<b>34%</b>
2	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	-	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS</b>		-	-	-	-	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>
3	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	-	-	-	-	9,729,848	9,729,848	-	7,143,854	7,143,854	73%	-	9,530,136	9,530,136	98%
	<b>Total HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)</b>		-	-	-	-	<b>9,729,848</b>	<b>9,729,848</b>	-	<b>7,143,854</b>	<b>7,143,854</b>	<b>73%</b>	-	<b>9,530,136</b>	<b>9,530,136</b>	<b>98%</b>
4	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	-	9,159,152	9,159,152	-	5,489,440	5,489,440	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS</b>		-	<b>9,159,152</b>	<b>9,159,152</b>	-	<b>5,489,440</b>	<b>5,489,440</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>
5	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	-	15,000,000	15,000,000	-	88,676,688	88,676,688	-	44,432,525	44,432,525	50%	-	73,432,350	73,432,350	83%
		IDA 6868-HN	-	190,444,615	190,444,615	-	287,560,827	287,560,827	-	111,181,252	111,181,252	39%	-	262,677,044	262,677,044	91%
	<b>Total Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19</b>		-	<b>205,444,615</b>	<b>205,444,615</b>	-	<b>376,237,515</b>	<b>376,237,515</b>	-	<b>155,613,777</b>	<b>155,613,777</b>	<b>41%</b>	-	<b>336,109,394</b>	<b>336,109,394</b>	<b>89%</b>
6	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	-	18,330,786	18,330,786	-	28,215,717	28,215,717	-	7,139,646	7,139,646	25%	-	21,627,227	21,627,227	77%
	<b>Total PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)</b>		-	<b>18,330,786</b>	<b>18,330,786</b>	-	<b>28,215,717</b>	<b>28,215,717</b>	-	<b>7,139,646</b>	<b>7,139,646</b>	<b>25%</b>	-	<b>21,627,227</b>	<b>21,627,227</b>	<b>77%</b>
7	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID -19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 4449/BL-HO-2	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		BID 4518/BL-HO-3	-	-	-	-	17,183,562	17,183,562	-	9,128,955	9,128,955	53%	-	15,400,274	15,400,274	90%
	<b>Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID -19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS</b>		-	-	-	-	<b>17,783,562</b>	<b>17,783,562</b>	-	<b>9,128,955</b>	<b>9,128,955</b>	<b>51%</b>	-	<b>15,400,274</b>	<b>15,400,274</b>	<b>87%</b>
8	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	-	460,761,338	460,761,338	-	275,994,569	275,994,569	-	64,725,087	64,725,087	23%	-	121,885,133	121,885,133	44%
	<b>Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)</b>		-	<b>460,761,338</b>	<b>460,761,338</b>	-	<b>275,994,569</b>	<b>275,994,569</b>	-	<b>64,725,087</b>	<b>64,725,087</b>	<b>23%</b>	-	<b>121,885,133</b>	<b>121,885,133</b>	<b>44%</b>
	<b>SUB-TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)</b>		-	<b>731,518,063</b>	<b>731,518,063</b>	-	<b>747,511,130</b>	<b>747,511,130</b>	-	<b>254,718,941</b>	<b>254,718,941</b>	<b>34%</b>	-	<b>516,135,731</b>	<b>516,135,731</b>	<b>69%</b>
	0060 - Secretaría de Salud		-	1,111,794,073	1,111,794,073	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>SUB-TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Pendiente de incorporar)</b>		-	<b>1,111,794,073</b>	<b>1,111,794,073</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>
	<b>TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA</b>		-	<b>1,843,312,136</b>	<b>1,843,312,136</b>	-	<b>747,511,130</b>	<b>747,511,130</b>	-	<b>254,718,941</b>	<b>254,718,941</b>	<b>34%</b>	-	<b>516,135,731</b>	<b>516,135,731</b>	<b>69%</b>
	0060 - Secretaría de Salud		4,257,094,261	3,299,690	4,260,393,951	1,494,904,840	3,911,980,243	5,406,885,083	554,340,986	1,739,197,807	2,293,538,793	42%	1,493,277,715	3,687,766,219	5,181,043,934	96%
	<b>TOTAL INVERSIÓN SOCIAL</b>		<b>4,257,094,261</b>	<b>3,299,690</b>	<b>4,260,393,951</b>	<b>1,494,904,840</b>	<b>3,911,980,243</b>	<b>5,406,885,083</b>	<b>554,340,986</b>	<b>1,739,197,807</b>	<b>2,293,538,793</b>	<b>42%</b>	<b>1,493,277,715</b>	<b>3,687,766,219</b>	<b>5,181,043,934</b>	<b>96%</b>
	0060 - Secretaría de Salud		171,360,192	1,111,794,073	1,283,154,265	124,335,674	2,474,227,714	2,598,563,388	114,247,075	1,314,668,280	1,428,915,355	55%	123,335,772	1,338,833,964	1,462,169,737	56%
	<b>TOTAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)</b>		<b>171,360,192</b>	<b>1,111,794,073</b>	<b>1,283,154,265</b>	<b>124,335,674</b>	<b>2,474,227,714</b>	<b>2,598,563,388</b>	<b>114,247,075</b>	<b>1,314,668,280</b>	<b>1,428,915,355</b>	<b>55%</b>	<b>123,335,772</b>	<b>1,338,833,964</b>	<b>1,462,169,737</b>	<b>56%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,428,454,453</b>	<b>2,958,405,899</b>	<b>7,386,860,352</b>	<b>1,619,240,514</b>	<b>7,133,719,087</b>	<b>8,752,959,601</b>	<b>668,588,061</b>	<b>3,308,585,028</b>	<b>3,977,173,089</b>	<b>45%</b>	<b>1,616,613,487</b>	<b>5,542,735,915</b>	<b>7,159,349,402</b>	<b>82%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPE) 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	06 - Realizada la regularización de fondo de los lotes 3 y 9 del proveedor ALTHEA	Informe	1	0	0	0	0	0
		16 - Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.	Informe	1	0	0	0	0	0
		17 - Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención ( construcción , equipo, telemedicina y RRHH )	Informe	26	0	0	1	0	0
		18 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	2	0	0	0	0	0
		19 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)	Informe	46	0	0	23	0	0
	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	20 - Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0	1	0	0
		06 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	Informe	4	0	0	0	0	0
		07 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	Informe	2	0	0	0	0	0
	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	55	0	0	0	0	0
		09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Informe	169	0	0	40	0	0
	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	13 - Realizadas los pagos de la auditoria al proyecto APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS BCIE 2271	Informe	1	0	0	1	0	0
		14 - Realizadas la Supervisión Externa y Auditoria de los fondos del proyecto	Informe de Auditoría	1	0	0	1	0	0
	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	07 - Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Capacitación	8	0	0	2	0	0
		08 - Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	Informe	21	0	0	8	0	0
		09 - Realizada la adquisición de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	0
		10 - Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Taller de Capacitación	8	0	0	2	0	0
	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	08 - Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales	Lote	2	0	0	0	0	0
		09 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	1	0	0	0	0	0
		10 - Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biologicos con equipo para cadena de frio	Vacuna	2	0	0	0	0	0
		11 - Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0
032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	09 - Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	Informe	18	0	0	3	0	0	
	10 - Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	Contrato	2	0	0	0	0	0	
	11 - Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.	Contrato	1	0	0	0	0	0	
	12 - Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19	Contrato	1	0	0	0	0	0	
	13 - Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023	Informe	163	0	0	40	0	0	
