

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 100% de la Inversión del Gabinete de Seguridad y Defensa, su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Al segundo trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L 443,601,514, obteniendo una ejecución acumulada de L.126,385,862 representando el 28% de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	374,261,330
Presupuesto Vigente	443601514
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	443,601,514
Devengado II Trimestre -17	110,381,628
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	25%
Devengado Anual	126,385,862
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	28%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	330,713,084
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	75%


Fuente: SIAFI, 30/06/2017

En el periodo logró una ejecución acumulada por la cantidad de L.126,381,628 permitiendo avanzar en realizar pagos de los equipos recibidos y algunos pagos de estimaciones de obras de las construcciones de Comayagua, Santa Bárbara y San Pedro Sula.

El presupuesto vigente ajustado es financiado de la forma siguiente: el 89% (L393.816,540) está financiado con fondos externos (préstamos) y el 11% (L49.784,974) con fondos nacionales como contraparte, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Gráfico No. 1

Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras

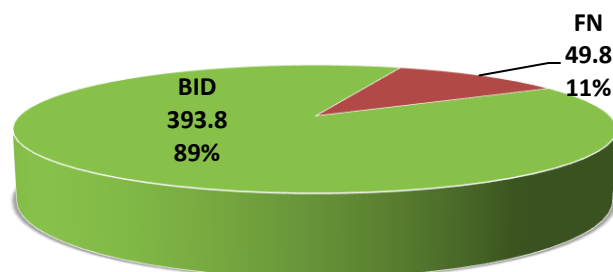

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo proyecto que contribuye al fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	1,628,943,360	2012-2017
	FINANCIERA		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
II Trimestre 2017	374,261,330	443,601,514	110,381,628
Acumulado 2017	374,261,330	443,601,514	126,385,862
Acumulado Vida del Proyecto	1,628,943,360	1,628,943,360	1,224,551,321
Observaciones: El programa se encuentra en su fase final, y en este periodo presenta avances en las ejecucion de obras siguientes: Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 48% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 87% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 65%, Asimismo se han recibido varias adquisiciones contempladas en su Plan Operativo Anual.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Los avances al segundo trimestre en cada uno de sus componentes son los siguientes:

Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad: 5,086 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, **se recibieron los equipos y mobiliario siguientes:** equipo de cocina y lavandería ITP. Equipo Informático del ITP y otras dependencias. Mobiliario del ITP. Equipo para la Plataforma Tecnológica del ITP. Equipo médico quirúrgico, equipo de aseo y extintores de seguridad.

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: se recibieron los Reactivos para Kits de inspecciones oculares, Primera y segunda adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS). Capacitación para uso de Software de Dispositivos de Extracción Forense para la DPI, Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 48% de la obra.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Recepción de bienes para 10 centros de alcance (CDA), Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 87% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 65% de la obra, recepción de Literas, Camas y ropa de cama para Estaciones Policiales (Lote 1 al 15).

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No.5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La Dirección General de Inversión Pública en conjunto con el BID y la unidad coordinadora del proyecto, sostuvieron reunión de seguimiento con la empresas constructoras y supervisoras; a fin de agilizar la ejecución financiera de las obras ejecutadas en vista que han tenido atrasos en la presentación de estimaciones financieras de las obras siguientes: Complejo de Laboratorio del DPI, Complejo Jefatura de Comayagua y Santa Bárbara, estas se encuentran en su etapa final.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución del Proyecto al segundo trimestre representa el 28% (L.126,385,862.) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.443,601,514), ejecución muy por debajo de lo programado, debido a la falta de elaboración de estimaciones de pago por parte de las empresas constructoras, a pesar de que las obras cuentan con avances físicos ejecutados de acuerdo a lo planificado en cada una de estas.

Recomendaciones

- ✓ Se recomienda agilizar los procesos de estimaciones de pago por parte de las empresas constructoras para que la ejecución financiera se refleje en el presupuesto vigente.
