

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SDS)

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad le compete lo concerniente a la formulación de la Política Nacional de Seguridad Interior y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana.

Su principal objetivo es mantener y restablecer el orden público para promover una convivencia pacífica y armoniosa. Además, se enfoca en prevenir, investigar y combatir delitos, faltas e infracciones, protegiendo los derechos y bienestar de las personas, así como preservar el medio ambiente, la moralidad pública y los bienes estatales.

También juega un papel relevante en el control migratorio, abordando aspectos de seguridad, prevención y represión de la inmigración criminal.

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades introducir medidas sociales con el fin de establecer una Honduras que fomente la solidaridad, la inclusión y la erradicación de la violencia; donde se priorice el principio del derecho sobre los privilegios y se combata la exclusión. Esto implica dirigir los esfuerzos hacia la provisión de servicios fundamentales como salud, educación, seguridad ciudadana y social, atención a migrantes, alimentación y creación de empleo, concebidos como derechos esenciales.

En materia de Seguridad, las propuestas planteadas en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras están enfocadas en: i) Formar una policía comunitaria eficaz, ii) Despolitizar el sistema de seguridad y de justicia; iii) Combatir frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos; iv) Recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado; v) Optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos; y vi) Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución.

Al primer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L 2,993.9 millones** detallado para la Inversión productiva **L139.0**

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,993,941,486
Inversión Productiva	139,045,251
Inversión Social	2,601,193,644
Formación Bruta de Capital	253,702,591
Presupuesto Vigente	2,993,868,234
Inversión Productiva	139,045,251
Inversión Social	2,601,120,392
Formación Bruta de Capital	253,702,591
Ejecutado I Trimestre	568,990,810
Inversión Productiva	4,586,228
Inversión Social	564,404,582
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)	19.0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	657,986,176
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	22.0%


Nota: SIAFI, 31/03/2024

millones y la Inversión Social L2,601.1 millones y L253.7 millones la formación bruta de capital; y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L569.0 millones** lo que representa el 19.0% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de un (1) proyecto, enfocado a mejorar la calidad de vida y reducir la incidencia de delitos violentos en barrios vulnerables mediante la mejora del hábitat y el acceso a servicios básicos, así como medidas de prevención de delitos como robos y delitos sexuales; reduciendo los niveles de homicidios y violencia intrafamiliar en los municipios intervenidos mediante la mejora de los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; así como el fortalecimiento de la Policía Nacional de Honduras para contribuir a la reducción de las tasas delictivas en el país, mediante la mejora del sistema de gestión estratégica del recurso humano policial y la modernización del sistema educativo policial, especialmente en la formación de oficiales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 1
Presupuesto Vigente y Ejecutado al 31 de Marzo 2024
Secretaría de Seguridad (SDS): por fuente de financiamiento
En Millones de Lempiras

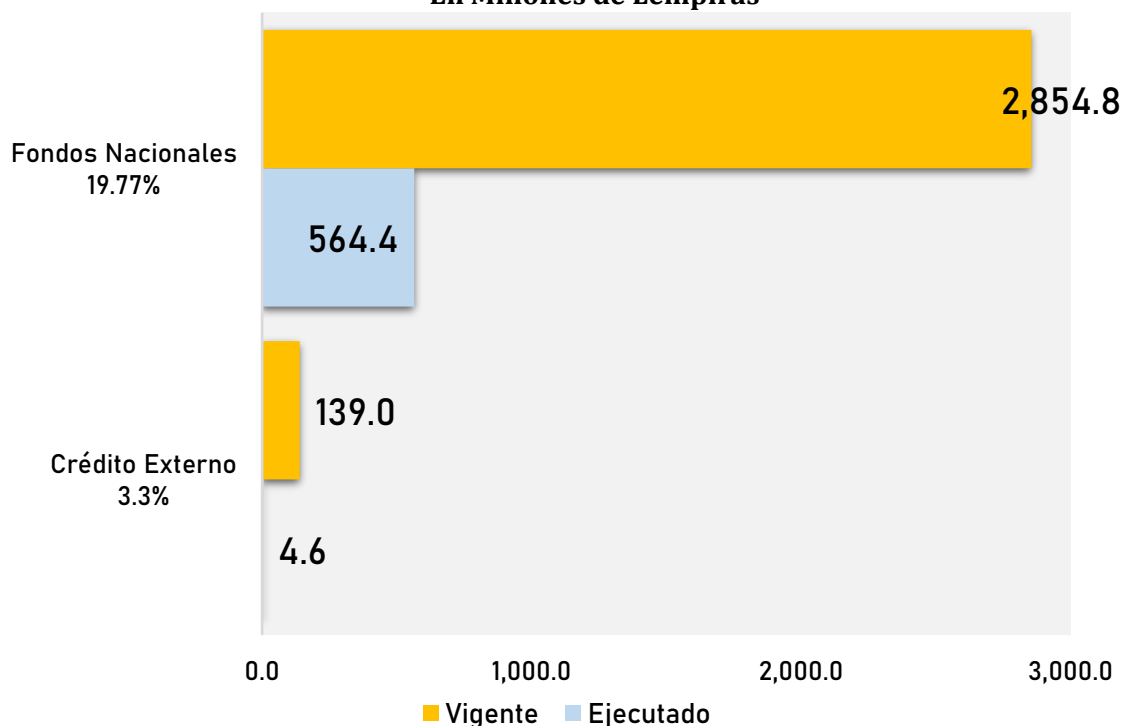


En referencia al financiamiento de Inversión Pública Productiva, el 100% corresponde a

fondos provenientes de crédito externo que expresado en términos monetarios asciende a monto de **L139.0 millones**, sin embargo este monto representa el **4.6%** de toda la Inversión en la Secretaría de Seguridad; el **88.4%** corresponde a financiamiento con fondos nacionales con un monto de **L2,854.8 millones** de los cuales L2,601.1 millones es Inversión Pública Social, equivalente al 91.1% del total de la inversión y L253.7 millones es Formación Bruta de Capital, equivalente al 8.5% de la totalidad de la inversión vigente en la institución.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2024):

En los años 2022 al 2024, la Inversión Pública Productiva de la Secretaría de Seguridad ha considerado la ejecución de al menos 1 Proyecto de Inversión, financiado el 100% con recursos de crédito externo.

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
Secretaría de Seguridad (SDS)
Al 31 de marzo 2022-2024
En Millones de Lempiras

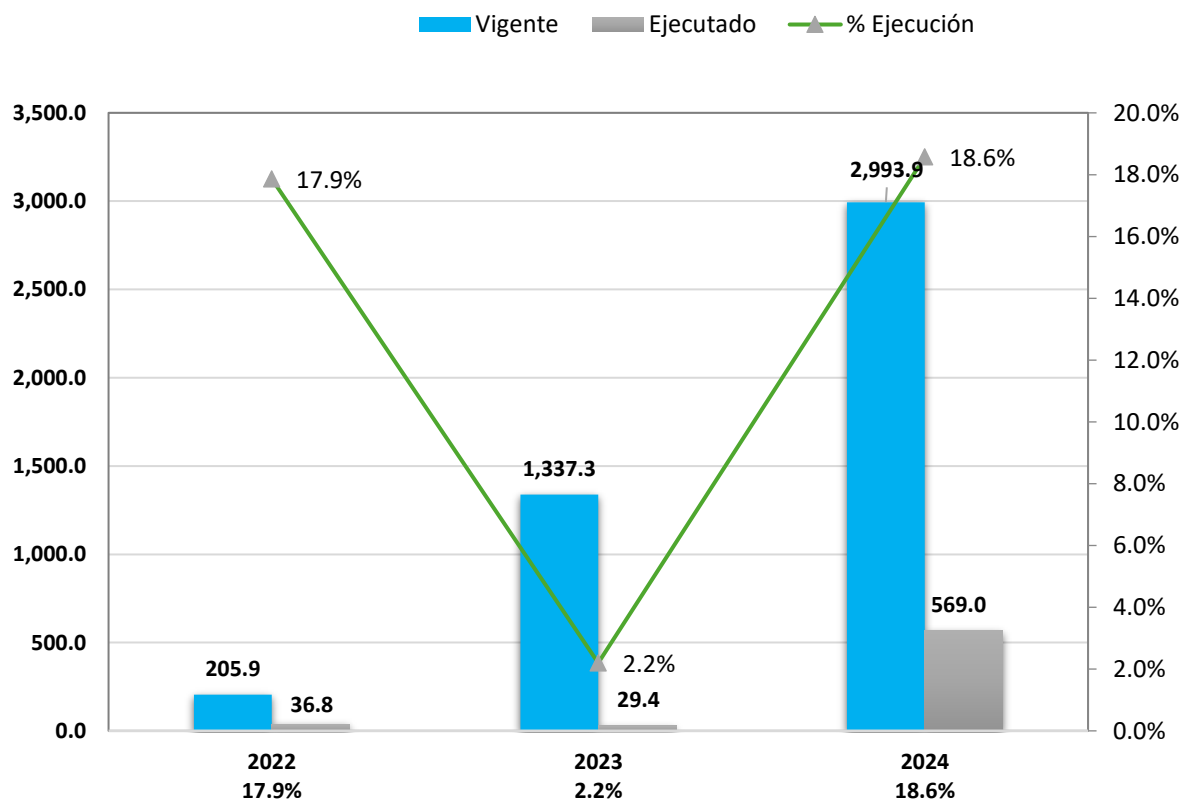

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos tres años al 31 de marzo, el pico más alto se registra este año (2024), pues se incorporaron al presupuesto nuevos programas de inversión social, para dar servicios de atención a la

violencia contra la mujer, servicios preventivos policiales comunitarios, servicios de control fronterizos y formación policial técnica y superior; por otro lado, se ha incluido la inversión relacionada con la formación bruta de capital, donde se encuentra el Programa Estratégico Policial que ha planificado la construcción y mejoras de bienes en dominio privado bajo el grupo de gasto de bienes capitalizables (4000).

Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2023 se debe en parte a procesos fracasados licitatorios, lo cual impidió que se ejecutara física y financieramente uno de los entregables del Proyecto.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva en el primer trimestre del año 2024 se concentró en el proyecto Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, a continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mismo:

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento tiene por objetivo general contribuir a mejorar la convivencia en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos.

Los objetivos concretos son: (i) mejorar el hábitat de los barrios urbanos vulnerables, ampliando el acceso a infraestructura de servicios básicos y medidas preventivas para reducir los delitos de robo y agresiones sexuales; (ii) disminuir los índices de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos, mediante la mejora de los servicios de prevención y atención a las víctimas de la violencia; y (iii) incrementar la efectividad en la investigación criminal por parte de la policía, aumentando la proporción de casos de homicidio con agresor identificado y el informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

El programa actualmente se encuentra en ejecución principalmente en Atlántida e Intibucá con la construcción de las Unidades Departamentales de Policía; también el proyecto ejecuta actividades en diferentes departamentos del país como, Cortés, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Yoro fortaleciendo con entrega de mobiliario y equipo.

Detalle de Principales Metas Físicas Programadas y ejecutadas en el I Trimestre-2024

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
• Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP) en Tela	UDEP	1	1	100%	1	1	100%
• Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP) en Intibucá	UDEP	1	0.36	36%	1	0.36	36%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

- El proceso de contratación para la obra de construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá, departamento de Intibucá, se adjudicó a la empresa HJJ Grupo Vela; además, el 26 de diciembre de 2023 se contrató la supervisión de las obras de construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá, por lo que el contrato con la empresa TECNISA se encuentra en estado de ejecución.
- La construcción de las jefaturas policiales en el municipio de Tela, Atlántida se encuentra en un avance físico de un 100%; mientras que el contrato suscrito con la empresa de supervisión para la construcción de las jefaturas municipales de Tela, Atlántida se encuentra con un 90%
- En cuanto a la adquisición del mobiliario para las cuatro jefaturas de policía. (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida y Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras ha finalizado y existe un avance físico del 100%. Mobiliario instalado, pendiente que contratista subsane ciertos daños que se suscitaron durante el bodegaje para cerrar contrato.
- El contrato suscrito con la empresa, COMPUSER, para la reparación de equipo informático, aún se encuentra en ejecución, pues está a la espera de repuestos de impresoras para proceder a la liquidación.
- Igualmente se encuentra en ejecución el contrato de auditoría externa de los Estados Financieros del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios para el año 2023.

Lo anterior indica que el proyecto de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) está ejecutando conforme a lo planificado; sin embargo, es importante mencionar que el mismo se encuentra en un proceso de contratación de personal para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

Avance Hacia los Resultados (solo resultados, no productos)

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	PROBABILIDAD DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
Mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos	<ul style="list-style-type: none"> Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes en Honduras (Meta 45.00) está en 32 Tasa de Femicidios por cada 100,000 habitantes en Honduras (Meta 6.00) Porcentaje de Victimización personal reportada en Honduras (Meta 15.00) Porcentaje de Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía (Meta 45.00) 	Alta
Reducción de homicidios y Violencia Intrafamiliar en los municipios beneficiados	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de prevalencia de VIF en las áreas intervenidas (Meta 5.00) Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas (Meta 25.00) Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma anual (Meta 850) Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas (Meta 85) variación a nivel de préstamo (Tela Olanchito y las Vegas) 	Alta
Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público	<ul style="list-style-type: none"> Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por competencias (Meta 80) (actualmente hay 83 graduados) Porcentaje de casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de homicidios investigados por la Policía Nacional (Meta 42) ya solicitaron la información que tienen una probabilidad alta Casos de homicidio aceptados por el Ministerio Público, sobre el total de casos remitidos por la Policía Nacional al Ministerio Público (Meta 36) 	Alta

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)	BID 4518/ BL-HO	US\$ Lempiras	30,000,000 743,643,000	01/10/2018 30/06/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
I Trimestre 2024	139,045,251	139,045,251	4,586,227.75	3.3%
Acumulado 2024	139,045,251	139,045,251	4,586,227.75	3.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	743,643,000.00	743,643,000.00	575,847,804.61	77%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

El Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios al primer trimestre 2024 ha reportado los siguientes procesos de adquisiciones que han formalizado el contrato:

Para el Componente II: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios:

1) **Contratación de Obras de construcción de la Unidad Departamental (UDEP)**

Intibucá, departamento de Intibucá.

Estado: Contrato en ejecución, Consorcio HJJ – Grupo Vela, se firmó contrato 05 de enero de 2024 y se emitió orden de inicio el 26 de enero del 2024; terminación contractual 26 de noviembre 2024.

Avance físico: 3% **Avance Financiero:** 20%

Procesos de Adquisiciones Pendientes de Adjudicación y Firma de Contrato

2) Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario de Oficina, (Sillas, Escritorios, Modulares, entre otros), para la Unidad Departamental de Policía (UDEP) de Intibucá, Intibucá.

Estado: Proceso de contratación, se publicó el proceso en fecha 19 de abril del 2024, se reciben ofertas el 04 de junio del 2024.

Procesos / Contratos en ejecución

3) **Contratación de Supervisión de Obras** de construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá, departamento de Intibucá.

Estado: Contrato en ejecución empresa TECNISA, Contrato firmado el 26 de diciembre del 2023 y **orden de inicio emitida** el 17 de enero del 2024.

Para el Componente de Gestión del Programa:

1) **Contratación de la Auditoría Externa** de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios 2023 & COSUDE.

Estado: Contrato en ejecución empresa DELOITTE & TOUCHE, vigente hasta el 30 de abril 2024.

4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

En la Secretaría de Seguridad se implementan diversos programas sociales, como los servicios de atención a la violencia contra la mujer, la Inspectoría General, la Dirección de Comunicación Estratégica y Protocolo, Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios, los Servicios Preventivos Policiales Comunitarios, los Servicios Policiales de Control Fronterizos para Garantizar la Seguridad del Estado, los Servicios Policiales de Disuasión y Control, los Servicios de Protección y Servicios Especiales, los Servicios

Preventivos de Atención a la Violencia contra la Mujer, los Servicios de Investigación, los Servicios Policiales Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado, los Servicios de Investigación de Femicidios y Delitos Conexos, los Servicios de Prevención Vial, y la Formación Policial Técnica Básica (ITP), la Formación Policial Superior (ANAPO) y la Formación Policial Superior (UNPH). Durante el primer trimestre se ha ejecutado con fuente del Tesoro Nacional un total de L564.4 Millones.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el primer trimestre se sostuvo reuniones de seguimiento; cuyo objetivo fue revisar la cartera de proyectos de la Secretaría de Seguridad, incluyendo el proyecto que está por iniciar “Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras” el cual se ejecutará con financiamiento externo (BID) y cuyo convenio (BID 5831/BL-HO) se encuentra firmado, sin embargo, en ese momento se encontraba pendiente la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
- Participación en la revisión de Cartera con el organismo financiador, en la que se plantearon los retos y recomendaciones; de los cuales se puede rescatar como tema clave las contrataciones en proceso de un Coordinador General, un Coordinador Monitoreo, un Coordinador Unidad Técnica de Infraestructura (UTI), el cual es clave para el cierre del proyecto y un Ingeniero Control y Seguimiento de las obras del proyecto de Intibucá.

4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

La principal problemática está relacionada con la necesidad urgente de contratar el personal clave de la Unidad Coordinadora de Proyectos y el inicio del Proyecto Modernización Integral, Profesionalización y Digitalización de los Servicios de la Policía Nacional; Por otro lado, otra problemática identificada estuvo relacionada con las fluctuaciones de la energía eléctrica, hallazgos por parte de la supervisión, donde identificó requerimientos de equipos necesarios en la UDEP de Tela (regulador de voltaje para todo el circuito) para el correcto funcionamiento; lo cual se tomará en cuenta para mitigar este tipo de riesgo en la UDEP de Intibucá.

Conclusiones

La Unidad Coordinadora de Proyectos concluye que para garantizar la ejecución adecuada de los proyectos:

- Es fundamental mantener el respaldo político y gerencial del Despacho Ministerial para garantizar una ejecución adecuada del Programa en ejecución y los venideros.

- La preinversión en procesos futuros de obra y supervisión, basada en lecciones aprendidas, es esencial para mejorar la eficiencia y la calidad de los proyectos.
- Es crucial aplicar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, como Las Vegas en Santa Bárbara, Olanchito en Yoro y Tela en Atlántida, en el proceso constructivo de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá.

Recomendaciones

- Monitorear de forma constante la fecha de cierre del proyecto con el fin de asegurar que se complete dentro del tiempo estipulado, cumpliendo con los requisitos de calidad y alcance establecidos.
- Abordar los desfases en el tiempo del proceso de contratación de obra de la UDEP #10 en Intibucá con prontitud y eficacia. De existir, es crucial identificar las causas subyacentes de estos desfases y tomar medidas correctivas para agilizar el proceso de construcción.
- Mantener el equipo de la Unidad Coordinadora del Programa, garantizando la continuidad y estabilidad en la gestión del proyecto. Además, es fundamental agilizar los tiempos de contratación del personal clave faltante para asegurar la adecuada operatividad y ejecución del programa.
- Se recomienda mantener un seguimiento constante del cronograma de obras de la UDEP en Intibucá para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No 001

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al I Trimestre				Comprometido			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
3	0070 - Secretaría de Seguridad / INVERSIÓN PRODUCTIVA	-	139,045,251	139,045,251	-	139,045,251	139,045,251	-	4,586,228	4,586,228	3.3%	-	93,581,594	93,581,594	67.3%
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-	139,045,251	139,045,251	-	139,045,251	139,045,251	-	4,586,228	4,586,228	3.3%	-	93,581,594	93,581,594	67.3%
	Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-	139,045,251	139,045,251	-	139,045,251	139,045,251	-	4,586,228	4,586,228	3.3%	-	93,581,594	93,581,594	67.3%
2	PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	0070 - Secretaría de Seguridad / INVERSIÓN SOCIAL	2,601,193,644	-	2,601,193,644	2,601,120,392	-	2,601,120,392	564,404,582	-	564,404,582	21.7%	564,404,582	-	564,404,582	21.7%
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	23,330,750	-	23,330,750	23,330,750	-	23,330,750	3,295,863	-	3,295,863	14.1%	3,295,863	-	3,295,863	14.1%
	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	15,566,932	-	15,566,932	15,493,680	-	15,493,680	2,352,000	-	2,352,000	15.2%	2,352,000	-	2,352,000	15.2%
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGP)	10,120,400	-	10,120,400	20,198,185	-	20,198,185	10,351,599	-	10,351,599	51.3%	10,351,599	-	10,351,599	51.3%
	INSPECTORIA GENERAL (SEDS)	2,113,008	-	2,113,008	2,013,008	-	2,013,008	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL	78,067,862	-	78,067,862	84,889,513	-	84,889,513	1,468,291	-	1,468,291	1.7%	1,468,291	-	1,468,291	1.7%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES	131,690,917	-	131,690,917	119,772,323	-	119,772,323	6,010,631	-	6,010,631	5.0%	6,010,631	-	6,010,631	5.0%
	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO	6,135,000	-	6,135,000	6,529,103	-	6,529,103	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	4,580,000	-	4,580,000	4,495,255	-	4,495,255	62,942	-	62,942	1.4%	62,942	-	62,942	1.4%
	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA SESEG	9,320,487	-	9,320,487	26,161,840	-	26,161,840	5,210,290	-	5,210,290	19.9%	5,210,290	-	5,210,290	19.9%
	SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS	1,395,753,101	-	1,395,753,101	1,370,601,494	-	1,370,601,494	463,203,635	-	463,203,635	33.8%	463,203,635	-	463,203,635	33.8%
	SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO	9,578,013	-	9,578,013	9,578,013	-	9,578,013	331,190	-	331,190	3.5%	331,190	-	331,190	3.5%
	SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL	18,477,741	-	18,477,741	18,339,553	-	18,339,553	402,699	-	402,699	2.2%	402,699	-	402,699	2.2%
	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES	7,924,776	-	7,924,776	7,798,470	-	7,798,470	566,392	-	566,392	7.3%	566,392	-	566,392	7.3%
	SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	11,755,039	-	11,755,039	12,005,039	-	12,005,039	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	SERVICIOS DE INVESTIGACION	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO	436,828,178	-	436,828,178	457,035,978	-	457,035,978	50,207,800	-	50,207,800	11.0%	50,207,800	-	50,207,800	11.0%
	SERVICIOS DE INVESTIGACION DE FEMICIDIOS Y DELITOS CONEXOS	5,303,940	-	5,303,940	5,230,688	-	5,230,688	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SESEG	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)	77,616,000	-	77,616,000	77,616,000	-	77,616,000	12,662,796	-	12,662,796	16.3%	12,662,796	-	12,662,796	16.3%
	FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)	40,031,500	-	40,031,500	40,031,500	-	40,031,500	8,278,454	-	8,278,454	20.7%	8,278,454	-	8,278,454	20.7%
	FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0070 - Secretaría de Seguridad / INVERSIÓN BRUTA DE CAPITAL	253,702,591	-	253,702,591	253,702,591	-	253,702,591	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
-	TOTAL GENERAL	2,854,896,235	139,045,251	2,993,941,486	2,854,822,983	-	2,993,868,234	564,404,582	4,586,228	568,990,810	19.0%	564,404,582	93,581,594	657,986,176	22.0%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

Fuente SIAFI al 31 de marzo de 2024

ANEXO No 002

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0070 - Secretaría de Seguridad								
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción y equipamiento de una (1) Unidad Departamental de Policía (UDEP) en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá.	155 - CONTRATO	1	0.36	36%	1	0.36	36%
	Finalización obras Unidad de Tela	155 - CONTRATO	1	1	100%	1	1	100%
PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL, PROFESIONALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL	Lanzamiento del proceso de diseño de la ANAPO	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024
