

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025

Secretaría de Seguridad (SEDS)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2025

www.sefin.gob.hn



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad es responsable de la formulación de la Política Nacional de Seguridad Interior, así como de los programas, planes, proyectos y estrategias relacionados con la seguridad ciudadana.

Su principal objetivo es mantener y restablecer el orden público, promoviendo una convivencia pacífica y armoniosa. Asimismo, se enfoca en la prevención,

investigación y combate de delitos, faltas e infracciones, protegiendo los derechos y el bienestar de las personas, y preservando el medio ambiente, la moralidad pública y los bienes estatales. Además, tiene un papel relevante en el control migratorio, abordando aspectos de seguridad, prevención y represión de la inmigración criminal.

El actual Gobierno ha priorizado la implementación de políticas sociales orientadas a construir una Honduras solidaria, inclusiva y libre de violencia. Su objetivo es promover una sociedad donde prevalezca el respeto por los derechos fundamentales por encima de los privilegios, y se combata activamente la exclusión. Para ello, se enfocan los esfuerzos en garantizar servicios esenciales como salud, educación, seguridad ciudadana y social, atención a personas migrantes, alimentación y generación de empleo, reconociéndolos como derechos básicos para todos los ciudadanos.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,229,733,504
Inversión Productiva	141,019,610
Inversión Social	2,835,011,303
Formación Bruta de Capital	253,702,591
Presupuesto Vigente	3,350,627,538
Inversión Productiva	327,043,236
Inversión Social	2,635,867,274
Formación Bruta de Capital	387,717,028
Ejecutado II Trimestre	765,915,771
Inversión Productiva	61,871,411
Inversión Social	667,000,608
Formación Bruta de Capital	37,043,752
% Ejecución (Devengado II Trim-2025/Vigente)	22.9%
Ejecutado Anual	1,240,821,951
Inversión Productiva	77,510,581
Inversión Social	1,126,267,619
Formación Bruta de Capital	37,043,752
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	37.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2025



En materia de Seguridad, las propuestas plateadas en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras están enfocadas en: i) Formar una policía comunitaria eficaz, ii) Despolitizar el sistema de seguridad y de justicia; iii) Combatir frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos; iv) Recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado; v) Optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos; y vi) Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución.

En el segundo trimestre del 2025, la Secretaría de Seguridad contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de L 3,350.6 millones del cual L327.0 millones corresponde a inversión productiva, L2,635.9 millones a inversión social y L387.7 millones a formación bruta de capital fijo. La ejecución presupuestaria en el primer trimestre asciende a L765.9 millones representando el 22.9% con respecto al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1


La ejecución productiva se llevó a cabo a través de dos proyectos de inversión pública, ambos diseñados para mejorar la calidad de vida y reducir la incidencia de delitos violentos en barrios vulnerables, uno a través del apoyo en la infraestructura policial y el otro a través de la profesionalización de los policías, con el diseño y construcción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO); Sin embargo, es importante señalar que, dentro del presupuesto vigente –aún sin ejecución–, se contempla una partida destinada a inversiones en construcciones y mejoras de bienes de dominio privado, en el marco del Programa Estratégico Policial; asimismo, se evidencian avances en la inversión social de la institución como el pago de insumos para la atención a la violencia contra la mujer, brindar servicios policiales antimaras, pandillas y crimen organizado, entre otros; ver en Anexo No. 1, el detalle de la Ejecución Financiera.



b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, al segundo trimestre de 2025 se constata, según fuente SIAFI, que está compuesta por un 90.7% de financiamiento con Fuente 11, Fondos Nacionales, del presupuesto vigente correspondiente a la Inversión Social y a la Formación Bruta de Capital (L3,038.4 millones); un 5.0% del presupuesto corresponde a Fuente 12 Recursos propios utilizados para financiar la formación bruta de capital; mientras que un 4.2 % del presupuesto vigente corresponde a la Fuente 21, Crédito Externo (L141.0 millones); y un 0.1% (L4.4 millones) corresponde a la Fuente 22, Donaciones Externas; es importante mencionar que los proyectos de inversión pública que integran la inversión Productiva son financiados por las Fuentes 21 y 22 (Crédito y Donaciones Externas).

Gráfico No. 01
Secretaría de Seguridad: Financiamiento de la Inversión por Fuente
II Trimestre 2025
Cifras en Millones de Lempiras

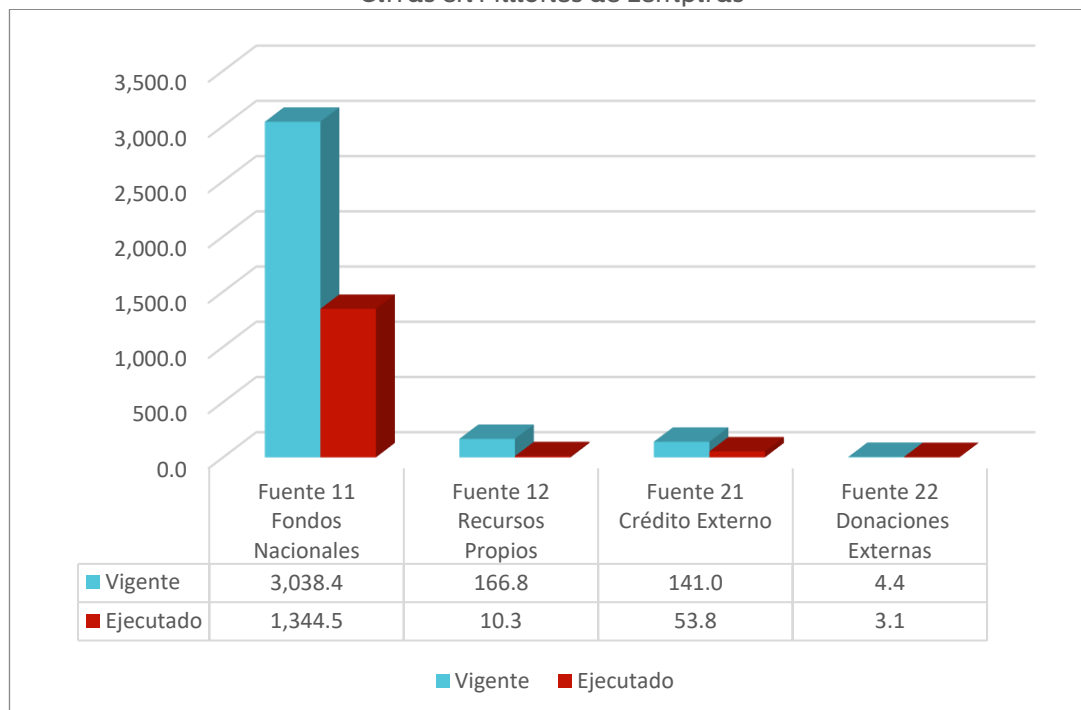

Fuente SIAFI- Power BI



c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2025)

Entre 2021 y 2025, la Inversión Pública Productiva de la Secretaría de Seguridad ha contemplado la ejecución de al menos un proyecto de inversión, financiados con recursos de crédito y donaciones externas.

La Gráfica No. 2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años hasta el 30 de junio de 2025, donde se destaca un aumento significativo en los años 2024 y 2025, tanto en el presupuesto vigente como en el ejecutado.


Este incremento se debe a la incorporación de nuevos programas de inversión social en el presupuesto de inversión pública, destinados a ofrecer servicios de atención a la violencia contra la mujer, servicios preventivos policiales comunitarios, control fronterizo y formación policial técnica y superior.

Además, se ha incluido inversión en la formación bruta de capital, destacando el Programa Estratégico Policial, que ha planificado la construcción y mejora de bienes de dominio privado, bajo el grupo de gasto de bienes capitalizables (40000).

La baja ejecución reflejada en los años 2021, 2022 y 2023 se atribuye, a procesos de licitación fallidos, transición por cambio de gobierno, lo que impidió la ejecución del presupuesto asignado a la institución; sin embargo, en 2024 se ve reflejada la ejecución presupuestaria de los contratos firmados y ejecutados de manera exitosa, en el segundo trimestre de 2025 la ejecución aumentó, ya que la empresa contratista de la obra de la UDEP en Intibucá del Proyecto Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, logró el desaduanaje de equipo fotovoltaico y logró avanzar en la obra en un 98% por lo que se realizaron los pagos .



Gráfico No. 02
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2021-2025)
0070-Secretaría de Seguridad
Cifras en Millones de Lempiras

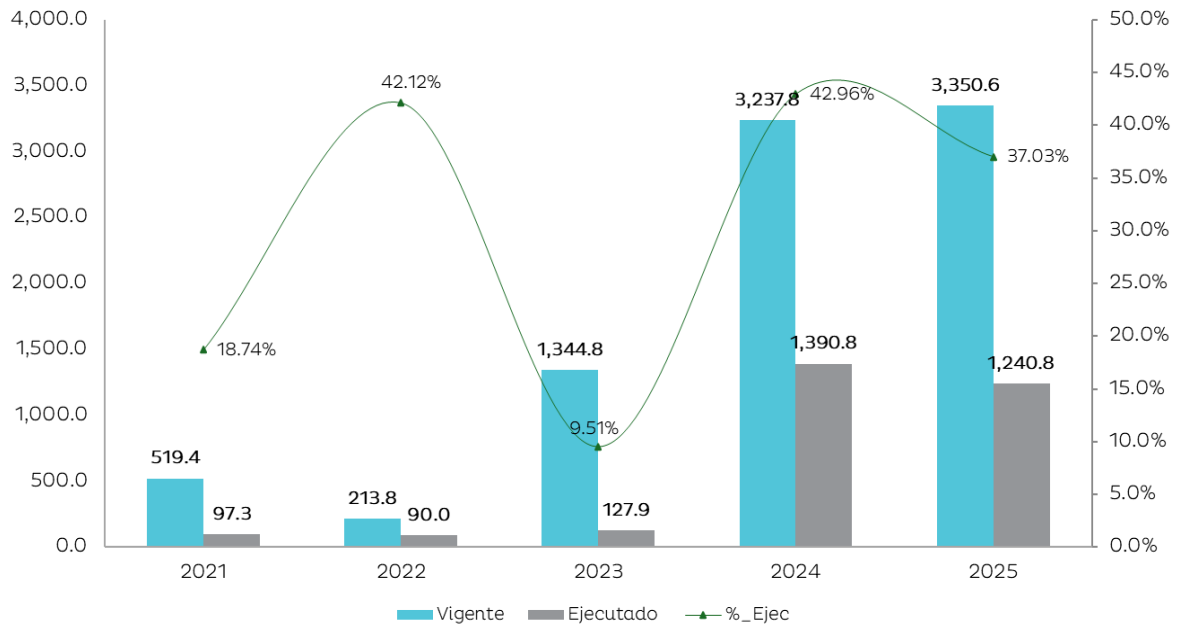

d. Principales Proyectos

La inversión en el segundo trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios.
2. Proyecto Modernización Integral, Profesionalización y Digitalización de los Servicios de la Policía Nacional. Este proyecto se incorporó al presupuesto vigente de la Secretaría de Seguridad durante el tercer trimestre.
3. Programa Estratégico Policial el cual tiene contemplado ejecutar Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:



1. PROYECTO PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

El Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios tiene como objetivo general mejorar la convivencia en Honduras mediante el incremento de la calidad de vida en barrios vulnerables y la disminución de la incidencia de delitos violentos.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- i) Mejorar el hábitat de los barrios urbanos vulnerables, ampliando el acceso a infraestructura de servicios básicos y medidas preventivas para reducir los delitos de robo y agresiones sexuales;
- ii) Disminuir los índices de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos, mediante la mejora de los servicios de prevención y atención a las víctimas de la violencia;
- e,
- iii) Incrementar la efectividad en la investigación criminal por parte de la policía, aumentando la proporción de casos de homicidio con agresor identificado y el informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

En el 2025 el programa se encuentra en su etapa de finalización y cierre del proyecto, logrando alcanzar las siguientes entregables o metas planificadas:

- ✓ Construcción y equipamiento de 4 Unidades Metropolitana de Prevención (UMEP's).
- ✓ Construcción y equipamiento de 1 Unidad Departamental de Prevención (UDEP).
- ✓ Construcción de Complejo Especializado en La Paz (Ciudadela).
- ✓ Remodelación y equipamiento de 2 UDEP (Choluteca y Nacaome)
- ✓ Diseño de 3 Documentos: Protocolo de actuación, cartera de servicios policiales y estrategia de comunicación desarrollo de capacitaciones en implementación de protocolo a jóvenes y sobre violencia a Gobiernos Municipales.

A la fecha el programa, solamente tiene pendiente la finalización de la construcción y equipamiento de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá,

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:



Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP) en Intibucá	UDEP	0.23	0.21	91.3%	0.13	0.21	162%

Fuente: Unidad Ejecutora 30/06/2025

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 reportados por la unidad ejecutora del proyecto son los siguientes:

- El proyecto en Intibucá ha alcanzado un avance físico real del 98% y reporta un avance financiero de 82%, tomando en cuenta la ampliación de monto contractual con la 5ta enmienda contractual.
- Se destaca el cambio en la ejecución, logrando la entrega y culminación de la mayor parte de las áreas, como los dormitorios femeninos, masculinos y de oficiales, el edificio administrativo, bodega de armas, salón de capacitaciones, sala técnica y la garita sur-este. mientras que las siguientes actividades presentan un avance considerable:
 - El Módulo de Detención con un 98%
 - La Lavandería con un 98%



- Obras de urbanización con un 94%
- La Cafetería con un 99%
- Servicios varios con un 99%

En materia de gestión ambiental y social, la Unidad Ejecutora ha mantenido una coordinación efectiva con autoridades locales y la Policía Nacional, evitando incidentes y cumpliendo con los requisitos legales. La UCP y la DMAICE han monitoreado el cumplimiento de las normas ambientales y sociales. El proyecto, basado en energía fotovoltaica, aporta beneficios como ahorro energético, reducción de costos y menor huella de carbono, con pruebas del sistema programadas para julio. Además, en abril se formalizó una orden de cambio y en mayo se emitió una quinta enmienda contractual con ampliación de monto para atender nuevas necesidades.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios al segundo trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)	BID 4518/BL-HO Donación Cosude GRT/CF-17829 y ATN/PS-20802-HO	US\$	31,420,547	01/10/2018 31/10/2025
		Lempiras	820,123,765	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2025	27,409,476	76,513,739	33,230,390	43.4
Acumulado 2025	27,409,476	76,513,739	44,645,561	58.3
Acumulado Vida del Proyecto *	823,026,965	823,026,965	762,212,151	92.6

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio fuente BCH tasa promedio junio 2025, L 26.1939 por US\$1.00

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios se encuentra en la recta final de ejecución física, presupuestaria y financiera, con un cierre de la ejecución física programado para el 31 de julio de 2025 y cierre



financiero tres meses después, al 31 de octubre 2025; fechas que fueron aprobadas a través de Dictamen de Ampliación de Plazo No.004-2025 y recibiendo la No Objeción que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo a la ampliación del Contrato de Financiamiento BID 4518/ BL-HO.

2. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS

El Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras fue incorporado al Presupuesto de la República durante el tercer trimestre del año pasado (2024), a través de una modificación presupuestaria, logrando la elegibilidad para el primer desembolso en el cuarto trimestre del 2024.

La Unidad Ejecutora del proyecto reporta los siguientes avances en las actividades programadas, al primer trimestre:

COMPONENTE 1: Modernización de la carrera policial para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios a la ciudadanía

- Las mesas de trabajo conformadas en el trimestre anterior comenzaron a identificar las principales necesidades y a elaborar propuestas de Términos de Referencia, con el propósito de avanzar en su revisión y socialización, en cumplimiento de los once productos establecidos en el componente.
- Los términos de referencia priorizados se encuentran identificados dentro del cumplimiento de los objetivos 7 (Diseño e implementación del Centro integrado de gestión del conocimiento) y 8 (Diseñado e implementado el Centro integrado de gestión del conocimiento).

COMPONENTE 2: Modernización de la formación y profesionalización policial, basada en competencias y habilidades

- Las mesas de trabajo conformadas en el trimestre anterior iniciaron a identificar las principales necesidades y a elaborar las propuestas de Términos de referencia para el avance de revisión y



socialización de los mismos en aras de cumplir con 4 productos del componente entre ellos.

- Sistema de carrera docente policial, incluyendo un sistema de evaluación de la gestión docente rediseñado
- Estructura física de la ANAPO modernizada, con estándares EDGE.

Cabe resaltar que, 2025 representa un año de preparación en los procesos de adquisiciones a fin de contratar los consultores para alcanzar los siguientes entregables o metas en la primera etapa del proyecto:

Componente	Meta o Entregable	Unidad de Medida
Componente 1: Modernización de la carrera policial para mejorar la cobertura y la calidad	P.1.4 Programas académicos correspondientes a los cursos de ascenso de la escala de oficiales, en coherencia con la carrera y el modelo policiales comunitario rediseñados.	Documentos de programa de ascenso rediseñado
	P.1.7 Centro integrado de gestión del conocimiento que genere insumos para la toma de decisiones estratégicas y operativas de los servicios policiales diseñado e implementado.	Documento que respalde la creación del centro integrado
	P.1.8 Diseñar e implementar un sistema de estándares mínimos de la profesión policial	Documento que respalde la creación del sistema
Componente 2: Modernización de la formación y profesionalización policial, basada en competencias y habilidades	P2.1 Rediseñar los programas académicos de formación inicial, continua y especializada, en modalidad presencial y a distancia, con perspectiva de género, diversidad y pertinencia cultural, en coherencia con las necesidades del modelo policial comunitario.	Informe de educación policial
	P2.2 Estructurar un sistema de carrera docente policial, incluyendo un sistema de evaluación de la gestión docente.	Documento que respalde la creación del sistema docente
	P2.3 Modernizar la infraestructura física de la ANAPO, incluyendo diseño, construcción, supervisión, mobiliario y equipo, de acuerdo con estándares internacionales de educación superior e infraestructura ecoeficiente	Planos del diseño / Acta de recepción de obra
	P2.4 Modernizar las áreas y servicios complementarios de apoyo a la formación continua y especializada de la oficialidad policial	Planos del diseño / Acta de recepción de obra



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras al primer trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras	BID 5831/BL-HO	US\$	50,000,000	Junio 2024
		Lempiras	1,286,870,000	Julio 2029
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2025	113,610,134	68,955,280	6,581,308.18	9.5
Acumulado 2025	113,610,134	68,955,280	10,805,307.47	15.7
Acumulado Vida del Proyecto *	1,309,695,476	1,309,695,476	11,623,406.54	0.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio fuente BCH tasa promedio junio 2025, L 26.1939 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025

- Los contratos firmados para la Adquisición de Puntos de acceso, Smart TV, Data Show e impresoras multifuncionales, suscritos con dos proveedores, CENTROMATIC con las impresoras y COMPUSER el resto, se encuentra en ejecución, para el Proyecto Convivencia Ciudadana.
- Los contratos para la adquisición de Literas y Mobiliario Diverso y Adquisición de Mobiliario de Oficina, (Sillas, Escritorios, Modulares, entre otros), para la Unidad Departamental de Policía (UDEP) de Intibucá, Intibucá, suscrito con IPSA; aun, se encuentran en ejecución, aunque han finalizado el avance físico, el avance financiero se encuentra pendiente, ya que se tiene previsto realizar el pago en el mes de julio.
- El contrato para la adquisición de Equipo Informático, (Computadoras de escritorio y portátiles, impresoras, Smart tu y proyector), para la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá, suscrito con la



empresa CENTROMATIC, se firmó contrato el 09 de septiembre 2024 y su avance físico es del 100%, pero el avance financiero se encuentra en 80%, se tiene previsto realizar el pago en el mes de julio 2025.

- En el Proyecto de Modernización Integral y Profesionalización de los servicios de la PNH, se encuentra en proceso de evaluación la Adquisición del Componente Herramienta para Evaluación del Desempeño de la Policía, (licencia de software Typeform o equivalente para encuestas) y el proceso de solicitud de expresiones de interés para participar en la consultoría de diseño de la ANAPO se encuentra en evaluación de propuestas.
- El Proyecto de Modernización Integral y Profesionalización de los servicios de la PNH cuenta con el Especialista en planificación, monitoreo y evaluación desde el 4 de abril de 2025 y el Coordinador de la UTI a partir del 23 de abril de 2025.

d.2. Programas Sociales

En la Secretaría de Seguridad se llevan a cabo diversos programas sociales, que incluyen servicios de atención a la violencia contra la mujer, la Inspectoría General, la Dirección de Comunicación Estratégica y Protocolo, así como Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios. También se ofrecen Servicios Preventivos Policiales Comunitarios, Servicios Policiales de Control Fronterizo para garantizar la seguridad del Estado, y Servicios de Disuasión y Control. Además, se brindan Servicios de Protección y Servicios Especiales, así como Atención a la Violencia contra la Mujer, Investigación, y servicios específicos contra maras, pandillas y crimen organizado, así como investigación de femicidios y delitos conexos. También se incluyen gastos operativos para brindar los servicios de prevención vial y programas de formación policial, tanto técnica básica (ITP) como superior (ANAPO y UNPH). El presupuesto actual destinado a la inversión social de la institución asciende a L2,635.9 millones, con una ejecución acumulada al 30 de junio de 2025 de L1,126.3 millones representando el 42.7% sobre el presupuesto vigente.

e. Gestión de la Inversión

En el segundo trimestre del presente año la Unidad Ejecutora del Proyecto “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” realizó la solicitud de modificación entre categorías y componentes de inversión en mayo del presente año; por lo cual, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Dirección General de Inversiones Públicas emitió en Junio el Dictamen Favorable No.013-2025 a la modificación entre Categorías de Inversión y Componentes solicitado.

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025

La principal problemática se centra en la revisión y verificación de la calidad de las obras entregadas en Intibucá y el cumplimiento del cierre físico y el financiero en las fechas programadas.

El Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras ya presenta retrasos en el cronograma del proyecto, por lo que se han reunido con el organismo financiero para reprogramar y realizar el esfuerzo por cumplir con las fechas establecidas en el proyecto.

V. CONCLUSIONES

Durante el segundo trimestre de 2025, el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios muestra un avance físico y financiero significativo, acercándose a su cierre con la mayoría de sus metas cumplidas, destacando la construcción de infraestructura policial y el fortalecimiento institucional en prevención de la violencia.

En contraste, el Programa de Modernización y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional se encuentra en su fase inicial, con bajo nivel de ejecución financiera, pero avanzando en la planificación técnica y contrataciones clave. Ambos programas reflejan una gestión activa y

coordinada, aunque el segundo enfrenta retos en el cumplimiento del cronograma, lo que requerirá ajustes oportunos para asegurar su ejecución efectiva.

VI. RECOMENDACIONES

Partiendo de los hallazgos del primer y segundo trimestre del 2025 en los Proyectos de Inversión Pública, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer los mecanismos de planificación y control para garantizar el cumplimiento oportuno de hitos críticos, especialmente en programas que se encuentran en fases iniciales como el de Modernización y Profesionalización Policial. Es clave aplicar herramientas de gestión del cronograma y riesgos (como cronogramas detallados, matrices de riesgo y planes de contingencia),
- Reforzar la coordinación interinstitucional para agilizar procesos de adquisiciones y contrataciones.
- Socializar y compartir el sistema de seguimiento y evaluación con indicadores claros de avance físico y financiero, que permita tomar decisiones informadas en tiempo real.
- Asegurar la sostenibilidad de los resultados mediante estrategias de mantenimiento, operación y apropiación institucional de las obras e intervenciones realizadas.



ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
Inversión Productiva																
3	0070 - Secretaría de Seguridad			141,019,610.0	141,019,610.0	181,574,217.0	145,469,019.0	327,043,236.0	22,059,712.6	39,811,698.6	61,871,411.2	18.9	22,059,712.6	55,450,868.1	77,510,580.7	23.7
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/PS-20802-HO		-	-	-	4,449,409.0	4,449,409.0	-	2,303,363.8	2,303,363.8	51.8	-	2,303,363.8	2,303,363.8	51.8
		BID/4518/BL-HO		27,409,476.0	27,409,476.0	-	72,064,330.0	72,064,330.0	-	30,927,026.6	30,927,026.6	42.9	-	42,342,196.8	42,342,196.8	58.8
	Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS			27,409,476.0	27,409,476.0	-	76,513,739.0	76,513,739.0	-	33,230,390.4	33,230,390.4	43.4	-	44,645,560.6	44,645,560.6	58.3
2	Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras	BID 5831/BL-HO		113,610,134.0	113,610,134.0	-	68,955,280.0	68,955,280.0	-	6,581,308.2	6,581,308.2	9.5	-	10,805,307.5	10,805,307.5	15.7
			Total Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras		113,610,134.0	113,610,134.0	-	68,955,280.0	68,955,280.0	-	6,581,308.2	6,581,308.2	9.5	-	10,805,307.5	10,805,307.5
3	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL				-	181,574,217.0	-	181,574,217.0	22,059,712.6	-	22,059,712.6	12.1	22,059,712.6	-	22,059,712.6	12.1
	Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL				-	181,574,217.0	-	181,574,217.0	22,059,712.6	-	22,059,712.6	12.1	22,059,712.6	-	22,059,712.6	12.1
Inversión Social																
	0070 - Secretaría de Seguridad		2,835,011,303.0	-	2,835,011,303.0	2,635,867,274.0	-	2,635,867,274.0	667,000,607.5	-	667,000,607.5	25.3	1,126,267,618.7	-	1,126,267,618.7	42.7
	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		-	-	-	2,635,867,274.0	-	2,635,867,274.0	667,000,607.5	-	667,000,607.5	25.3	1,126,267,618.7	-	1,126,267,618.7	42.7
	Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		-	-	-	2,635,867,274.0	-	2,635,867,274.0	667,000,607.5	-	667,000,607.5	25.3	1,126,267,618.7	-	1,126,267,618.7	42.7
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		185,656,847.0	-	185,656,847.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES		185,656,847.0	-	185,656,847.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		2,649,354,456.0	-	2,649,354,456.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		2,649,354,456.0	-	2,649,354,456.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación Bruta de Capital																
	0070 - Secretaría de Seguridad		253,702,591.0		253,702,591.0	387,717,028.0	-	387,717,028.0	37,043,751.9	-	37,043,751.9	9.6	37,043,751.9	-	37,043,751.9	9.6
	PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		253,702,591.0		253,702,591.0	387,717,028.0	-	387,717,028.0	37,043,751.9	-	37,043,751.9	9.6	37,043,751.9	-	37,043,751.9	9.6
	Total PROGRAMA ESTRATEGICO POLICIAL		253,702,591.0		253,702,591.0	387,717,028.0	-	387,717,028.0	37,043,751.9	-	37,043,751.9	9.6	37,043,751.9	-	37,043,751.9	9.6
0	Total general		3,088,713,894.0	141,019,610.0	3,229,733,504.0	3,205,158,519.0	145,469,019.0	3,350,627,538.0	726,104,072.1	39,811,698.6	765,915,770.7	53.8	1,185,371,083.2	55,450,868.1	1,240,821,951.3	0.4

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

Fuente: SIAFI/BI

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Seguridad	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios tiene como objetivo general mejorar la convivencia en Honduras	Construcción Unidad Departamental de la Policía (UDEP en Intibucá)	75 - PORCENTAJE	0.23	0.21	91%	0.13	0.21	162%

Fuente: Unidad Ejecutora-SDS
