

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

***Secretaría de Salud  
(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025



## IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la institución responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector Salud; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, prioriza en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, ofrendar servicios de salud, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

Respecto a la Inversión Pública del año 2025, la Secretaría de Salud

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del  
2025

Cifras en Lempiras

| Descripción                                                | Monto                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Presupuesto Aprobado</b>                                | <b>10,823,792,284.0</b> |
| Inversión Productiva                                       | 3,276,101,856.0         |
| Inversión Social                                           | 7,376,614,268.0         |
| Formación Bruta de Capital                                 | 171,076,160.0           |
| <b>Presupuesto Vigente</b>                                 | <b>8,177,320,412.0</b>  |
| Inversión Productiva                                       | 2,066,814,406.0         |
| Inversión Social                                           | 5,037,157,276.0         |
| Formación Bruta de Capital                                 | 1,073,348,730.0         |
| <b>Ejecutado III Trimestre</b>                             | <b>2,426,793,367.1</b>  |
| Inversión Productiva                                       | 311,695,273.6           |
| Inversión Social                                           | 2,037,179,991.2         |
| Formación Bruta de Capital                                 | 77,918,102.3            |
| <b>% Ejecución<br/>(Devengado III Trim-2025/Vigente)</b>   | <b>29.7%</b>            |
| <b>Ejecutado Anual</b>                                     | <b>4,855,404,828.9</b>  |
| Inversión Productiva                                       | 659,036,738.1           |
| Inversión Social                                           | 3,811,305,156.8         |
| Formación Bruta de Capital                                 | 385,062,934.0           |
| <b>% Ejecución<br/>(Devengado anual/Vigente)</b>           | <b>59.4%</b>            |
| Comprometido<br>(Devengado + Compromiso)                   | 5,219,104,896.4         |
| <b>% Ejecución Comprometido<br/>(Comprometido/Vigente)</b> | <b>63.8%</b>            |

Nota: SIAFI, 30/09/2025

cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L10,823.8 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Proyectos de Inversión Pública (Inversión Productiva), Programas sociales orientados al desarrollo de las capacidades humanas y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable (Inversión Social) y Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.



Al tercer trimestre, el presupuesto vigente total asignado asciende a L8,177.3 millones, de los cuales la *Inversión Social* se destina principalmente a atención a enfermedades transmisibles, atención a grupos priorizados, atención a grupos y enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervención de prevención y promoción de la salud, prevención, atención y control de emergencias epidemiológicas, entre otras intervenciones sociales. Dicha inversión asciende a L5,037.2 millones de la cual se ejecutó un 76%, equivalente a L3,811.3 millones a nivel de devengado y se registran compromisos por el orden de L3,958.5 millones (78.6%) al término de dicho trimestre.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* cuenta con una asignación vigente de L2,066.8 millones, para la ejecución de 7 proyectos vigentes; asimismo, la SESAL cuenta con espacio presupuestario adicional de L680.5 millones de fuentes externas (crédito y donaciones) previsto para proyectos de inversión productiva; con prioridad en la infraestructura hospitalaria. Al tercer trimestre se reportó una ejecución de L659.0 millones (32%) a nivel de devengado y L800.9 millones (38.8%) a nivel de compromisos, ambos con relación al presupuesto vigente asignado.

Por su parte, las asignaciones correspondientes a la *Formación Bruta de Capital* (L1,073.3 millones de presupuesto vigente), se orientan principalmente a la adquisición de ambulancias para el sistema de salud pública, atención a enfermedades transmisibles priorizadas, atención de grupos priorizados, desarrollo del recurso humano, dirección y coordinación de riesgo poblacional, intervenciones de prevención de salud, entre otros. Al término del tercer trimestre reflejó una ejecución del 36% (L386.5 millones) a nivel de devengado y L459.6 millones (43%) registrados como compromisos; ambos con relación al presupuesto vigente asignado.

En conjunto la SESAL registró una ejecución presupuestaria al tercer trimestre del año 2025 por L4,855.4 millones (59.4%) a nivel de devengado y L5,219.1 millones (63.8%) a nivel de compromisos con relación al Presupuesto Vigente asignado, principalmente con orientación al Sector Salud e intervenciones para la corresponsabilidad en el Sector Protección Social. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

## **b. Financiamiento de la Inversión Pública**


El 48% de la Inversión Pública de la SESAL, se financia con recursos provenientes del Tesoro Nacional (Fondos nacionales y propios), el 27% con Crédito Externo (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)) y los restantes 25% con



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

donaciones externas, alivio de la deuda y apoyos presupuestarios (BID, BM, BCIE, CAF, China, Japón y Alemania) mismos que se representan en el Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01  
**Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente**  
Cifras en Millones de Lempiras

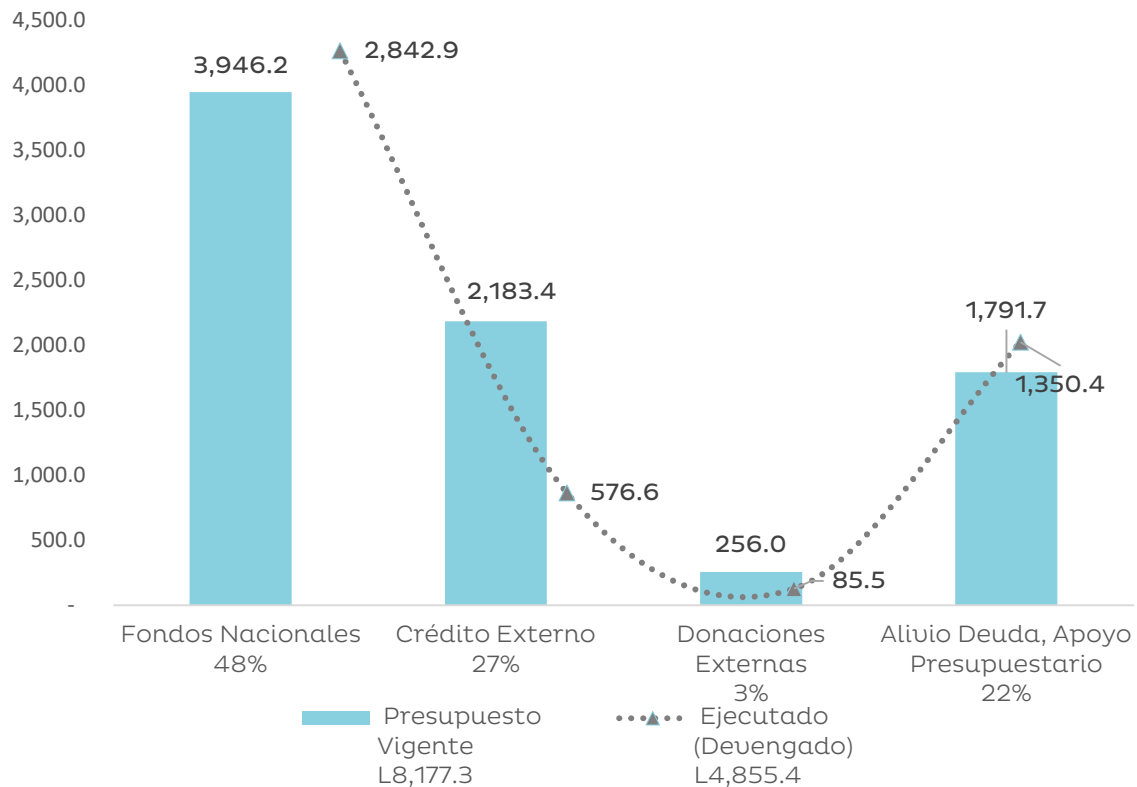

**c. Comportamiento de la Ejecución al III trimestre (2023-2025):**


En el período comprendido del 2023 al 2025, la Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión y diferentes intervenciones para inversión social y formación bruta de capital; las cuales se han financiado en 51% con recursos nacionales, 40% con recursos de crédito externo y el restante 9% de donaciones externas, alivio de deuda y apoyos presupuestarios.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un total de L29,654.8 millones; reflejando un promedio de ejecución del 47.9% (L14,210.2 millones) al mes de septiembre de cada año.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Gráfico No. 2  
Comportamiento de la Inversión Pública  
(Secretaría de Salud)  
Al 30 de Septiembre (2023-2025)  
Millones de Lempiras

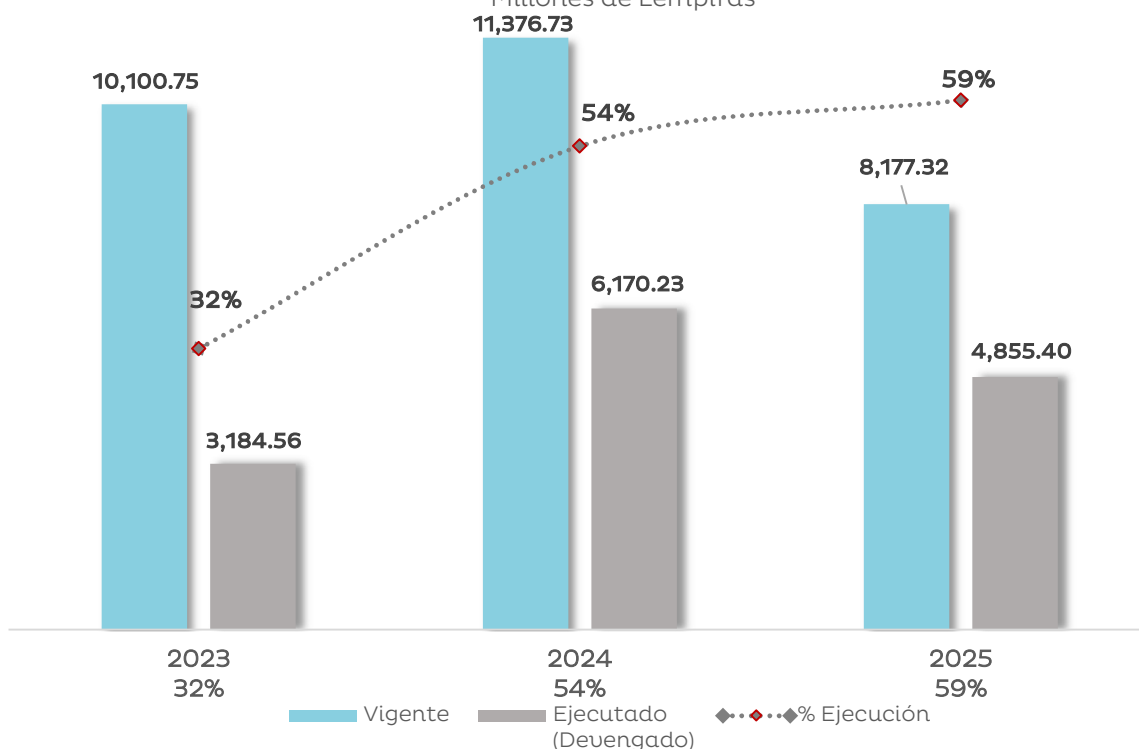

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa con corte al 30 de septiembre de los últimos tres años; el pico más alto se registra en el año 2024 considerando principalmente la incorporación de programas sociales orientados primordialmente en la atención a enfermedades transmisibles, atención a grupos priorizados, atención a grupos y enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervención de prevención y promoción de la salud, prevención, atención y control de emergencias epidemiológicas, entre otras intervenciones sociales.

#### d. Principales Proyectos

La inversión productiva para el año 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

- |   |                                                                                                                                                                      |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras | BCIE-2329      |
| 2 | Programa de Construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras            | BID 5790/BL-HO |
| 3 | Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2)   | BID 4713/BL-HO |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

|   |                                                                                                                                                       |                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE)                                                                    | TFOB8564-HN<br>TFOC1861           |
| 5 | Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán. | Acuerdo<br>Donación No<br>1660400 |
| 6 | Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3)                                                                                         | BID 5008/BL-HO                    |
| 7 | Proyecto Honduras - Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM en Mesoamérica y República Dominicana)                                     | GRT/MM-17339-<br>40-HO            |

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH):

Tiene como propósito incrementar la cobertura en la atención de los servicios de salud a nivel hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca y Tocoa, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).

Los principales avances físicos programados al tercer trimestre son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

| Meta Física                                                                        | Unidad de Medida | Anual        |           |             | III Trimestre 2025 |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|
|                                                                                    |                  | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación       | Ejecución | % Ejecución |
| Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.         | Informe de obra  | 21           | 8         | 38.1%       | 6                  | 5         | 83.3%       |
| Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa               | Informe de obra  | 19           | 6         | 31.6%       | 6                  | 3         | 50%         |
| Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales, | Informe          | 17           | 0         | -           | 0                  | 0         | -           |
| Realizada la gestión de gastos administración del proyecto                         | Informe          | 75           | 64        | 85.3%       | 19                 | 24        | 100%        |

Fuente: SESAL-UAP-PARH al 30/09/2025



Para el tercer trimestre la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:

- Seguimiento al proceso de Contratación de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo **Hospital Regional del Sur en Choluteca** (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS), contrato suscrito el 07 de octubre de 2024.
  - Etapa 1 (Preinversión): Se dio orden de inicio a partir del 22 de octubre del 2024 con fecha (ampliada) para su fin al mes de octubre de 2025. Se reporta un avance físico de 67% y financiero del 47% (US\$1,128,614.07).
  - De los 3 productos que componen la Fase 1 se aprobaron los dos primeros; el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se reprogramó su fecha de entrega para el mes de octubre 2025, por falta de presentación de productos de parte del contratista.
  - Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes:
    - Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA.
    - Entrega de la Carpeta completa de infraestructura.
    - Entrega de carpeta a SESAL.
  - Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 20 de octubre de 2024; con fecha de fin (prevista) al 15 de marzo de 2026. Se reporta un avance físico del 28.15% y financiero del 36.9% (US\$11,499,205.03).
  - Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 30 de septiembre se listan a continuación:
    - Encofrado de columnas en el Bloque A, Segmento 3, Segundo nivel.
    - Construcción de paredes en bloques A, B, C, D y E.
    - Fundición de vigas y losa de entrepiso de Bloque G.
    - Ranurado de tubería EMT (conector de compresión) en paredes.
    - Fundición de soleras y castillos en paredes de primer nivel.
- Seguimiento al proceso de Contratación de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo **Hospital San Isidro de Tocoa** (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS), contrato suscrito el 11 de octubre de 2024.
  - Etapa 1 (Preinversión): Se indicó orden de inicio a partir del 21 de octubre del 2024 con fecha (prevista) de finalización el 25 de agosto de 2025. Se reporta un avance físico de 67% y financiero del 51% (US\$1,881,187.84).



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

- De los 3 productos que componen la Fase 1 se tiene aprobado el primer y segundo productos; mientras que el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se estima estará listo durante el mes de octubre de 2025.
- Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes:
  - Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA.
  - Entrega de la Carpeta completa de infraestructura.
  - Entrega de carpeta a SESAL
- Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 21 de octubre de 2024; fecha de fin (prevista) al 20 de julio de 2026. Se reporta un avance físico de 10.11% y financiero del 26.44% (US\$10,960,450.02).
- Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 30 de septiembre se listan a continuación:
  - Encofrado en fosa de ascensor en N3.
  - Abastecimiento de concreto tipo mortero con uso del FIORI.
  - Ingreso de 2 rastras con bloques prefabricados de MADEYSO.
  - Revisión de muros de bloque, en conjunto con planos taller, residente de consorcio, inspector de calidad del consorcio y residente de la AGS.
  - Movimiento de material con retroexcavadora para relleno en vigas.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica: del Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH) al tercer trimestre 2025:

| Proyecto                                                                                                                                                             | Convenio             | Costo Total         |                       | Fecha de Inicio - Fin    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras | BCIE-2329            | US\$                | 135,000,000           | 30/07/2024<br>01/08/2028 |
|                                                                                                                                                                      |                      | Lempiras            | 3,538,188,000         |                          |
|                                                                                                                                                                      | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución              |
| III Trimestre 2025                                                                                                                                                   | 1,485,722,612        | 1,196,400,341       | 168,885,507           | 14%                      |
| Acumulado 2025                                                                                                                                                       | 1,485,722,612        | 1,196,400,341       | 367,401,509           | 31%                      |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                                                                                                        | 3,538,188,000        | 3,538,188,000       | 730,606,648           | 21%                      |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00



## 2. Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras

Mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán se mejorará la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).

Los principales avances físicos programados para el año 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

| Meta Física                                                                                                                        | Unidad de Medida | Anual             |           |                  | III Trimestre 2025 |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                    |                  | Progra-<br>mación | Ejecución | % Eje-<br>cución | Progra-<br>mación  | Ejecución | % Eje-<br>cución |
| Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán                                                               | Informe técnico  | 15                | 16        | 100%             | 8                  | 8         | 100%             |
| Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa                          | Informe técnico  | 1                 | 0         | -                | 0                  | 0         | -                |
| Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula                       | Informe técnico  | 1                 | 0         | -                | 0                  | 0         | -                |
| Formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales | Informe          | 55                | 0         | -                | 15                 | 0         | -                |
| Reorganizar y fortalecer la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales | Informe          | 7                 | 0         | -                | 1                  | 0         | -                |
| Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025                                                                       | Informe          | 158               | 138       | 87.3%            | 52                 | 52        | 100%             |

**Fuente:** SESAL-GESALUD al 30/09/2025



Al tercer trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 2% y financiero de 5.3%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).

Así mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), al tercer trimestre se reporta para la **Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán**, avance físico (obra) del 23.85% y financiero del 14.26% (US\$6,227,081.29) indicando las siguientes actividades en ejecución:

- Colocación e instalación de tubería de PVC sanitario de diferentes pulgadas de diámetro y accesorios para red de drenaje en el interior del edificio existente.
- Preparación de terreno para fundición de firme de concreto en sótano edificio existente.
- Colocación de relleno en muro de contención Norte.
- Colado de muros perimetrales de concreto en Actuación 1 (Cisterna) 1ra etapa.
- Colado de muro perimetral Actuación 2.
- Izaje de columnas y vigas de acero en Actuación 2.
- Colación de enchachado en Actuación 3.
- Suministro de columnas y vigas metálicas para Actuación 3.
- Trabajos de canalización de tubería eléctrica al interior del edificio existente.
- Trabajos de canalización de tubería y escalerilla para instalación de comunicaciones al interior del edificio existente.
- Habilitado de acero de refuerzo de zapata segunda sección en Muro de Contención Sur.
- Colado de secciones del Muro de Contención Sur.

En cuanto al **Diseño Hospitales de Traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula**, se reporta un avance del 98% en ambos; cabe señalar que ambos diseños se realizan bajo contrato con el Consorcio PLANHO/TASH, con fecha de finalización contractual (ampliada) al 15 de noviembre del 2025.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras al tercer trimestre 2025:



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

| Proyecto                                                                                                                                                     | Convenio             | Costo Total         |                       | Fecha de Inicio - Fin    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras | BID 5790/BL-HO       | US\$                | 230,163,200           | 15/04/2024<br>15/05/2030 |
|                                                                                                                                                              |                      | Lempiras            | 6,032,301,276         |                          |
|                                                                                                                                                              | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución              |
| III Trimestre 2025                                                                                                                                           | 1,020,492,553        | 331,236,052         | 47,586,848            | 14%                      |
| Acumulado 2025                                                                                                                                               | 1,020,492,553        | 331,236,052         | 92,309,858            | 28%                      |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                                                                                                | 6,032,301,276        | 6,032,301,276       | 325,445,518           | 5%                       |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

**3. Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO):**

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autorizó a que la SEFIN, realizar las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el BID aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Préstamo No. 4713/BL-HO de fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Los principales avances físicos para el año 2025 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2025**

| Metas Física                                                           | Unidad de Medida | Anual         |           |             | III Trimestre 2025 |           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|
|                                                                        |                  | Progra-mación | Ejecución | % Ejecución | Progra-mación      | Ejecución | % Ejecución |
| Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL | Equipo           | 1             | 0         | 0           | 1                  | 0         | 0           |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

| Metas Física                                                                                                                                                  | Unidad de Medida | Anual             |           |                | III Trimestre 2025 |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|----------------|
|                                                                                                                                                               |                  | Progra-<br>mación | Ejecución | %<br>Ejecución | Progra-<br>mación  | Ejecución | %<br>Ejecución |
| Adquiridos generadores eléctricos para 5 hospitales                                                                                                           | Equipo           | 1                 | 0         | 0              | 1                  | 0         | 0              |
| Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales de 5 hospitales | Equipo           | 601               | 596       | 99%            | 5                  | 0         | 0%             |
| Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2025                                                                                  | Informe          | 80                | 29        | 36.3%          | 18                 | 19        | 100%           |

**Fuente:** SESAL-GESALUD al 30/09/2025

Al tercer trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 91% y financiero de 88.3%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):

- Proceso Adecuación Centro de Datos de la SESAL: se remitió a no objeción el plan de adquisiciones al obtener respuesta, se realizará la publicación del proceso.
- Pago de estimación de obra No. 2 para la Subestación eléctrica del Hospital Escuela (julio y septiembre).
- Pago de honorarios a personal de apoyo (consultores) para UTINH y GESALUD (julio a septiembre).
- Se procesó pago por la presentación del 5to Informe de Diseños del Hospitales de Traumas de Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente.
- Se realizó transferencia al Tribunal Superior de Cuentas, por la Auditoría al 31 de diciembre del 2025 según Enmienda 1 al Convenio Firmado.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) al tercer trimestre 2025:



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

| Proyecto                                                                                                                                                      | Convenio             | Costo Total         |                       | Fecha de Inicio - Fin    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) | BID 4713/BL-HO       | US\$                | 53,820,000            | 01/10/2021<br>31/08/2026 |
|                                                                                                                                                               |                      | Lempiras            | 1,410,557,616         |                          |
|                                                                                                                                                               | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución              |
| III Trimestre 2025                                                                                                                                            | 184,054,191          | 248,561,957         | 46,250,296            | 19%                      |
| Acumulado 2025                                                                                                                                                | 184,054,191          | 248,561,957         | 90,982,437            | 37%                      |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                                                                                                 | 1,410,557,616        | 1,410,557,616       | 1,115,543,070         | 79%                      |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

#### 4. Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Con el propósito de proveer de infraestructura física adecuada para un funcionamiento óptimo del área técnico-administrativa del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Los principales avances físicos programados para el año 2025 son los siguientes:

##### Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

| Meta Física                                                                                                  | Unidad de Medida     | Anual             |           |                  | III Trimestre 2025 |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                              |                      | Progra-<br>mación | Ejecución | % Ejecu-<br>ción | Progra-<br>mación  | Ejecución | % Ejecu-<br>ción |
| Construido el edificio administrativo y del laboratorio con equipo tecnológico y de oficina para el año 2025 | Informe de ejecución | 1                 | 0         | 0                | 0                  | 0         | 0                |
| Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2025                                       | Equipo               | 1                 | 0         | 0                | 1                  | 0         | 0                |
| Adquirido, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de Salud                     | Equipo               | 1                 | 0         | 0                | 1                  | 0         | 0                |

**Fuente:** SESAL-UAFCE al 30/09/2025

Para el tercer trimestre la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) reporta las siguientes acciones:

- Adquiridos y entregados 467 ítems: aplicaciones informáticas (20 antivirus, 20 software Microsoft 365 empresarial), equipo de comunicación (3



pantallas electrónicas táctiles), electrodomésticos (6 microondas, 4 cafeteras, 3 refrigeradoras de 14 pies cúbicos, 7 dispensadores de agua, 1 refrigeradora de pies cúbicos), muebles varios de oficina.

- Se realizó el Estudio de Suelo del lugar donde será construido el Edificio Administrativo del LNV (fondos nacionales).
- Se reporta **avance de obra en 47.46%** de la construcción del Edificio del Laboratorio (LNV) (ejecutado directamente con recursos de la donación JICA).

A continuación, véase la ejecución financiera histórica de la Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) al tercer trimestre 2025:

| Proyecto                                                                                                                                              | Convenio                           | Costo Total         |                       | Fecha de Inicio - Fin    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán. | Acuerdo Donación No 1660400 (JICA) | Lempiras            | 251,326,119           | 01/09/2023<br>31/03/2026 |
|                                                                                                                                                       | Presupuesto Aprobado               | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución              |
| III Trimestre 2025                                                                                                                                    | 112,668,942                        | 116,466,058         | 644,348               | 1%                       |
| Acumulado 2025                                                                                                                                        | 112,668,942                        | 116,466,058         | 25,897,644            | 22%                      |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                                                                                         | 251,326,119                        | 251,326,119         | 140,046,993           | 56%                      |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

### **d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2025**

Durante el tercer trimestre, la **UAP-PARH** reporta un nuevo contrato (No. 10) y mantienen en ejecución los siguientes contratos:

- Coordinación General, Contrato UEP-PARH-001-2025-SS.
- Especialista financiero, Contrato UEP-PARH-002-2025-SS.
- Especialista en adquisiciones, Contrato UEP-PARH-003-2025-SS.
- Especialista ambiental Social, Contrato UEP-PARH-004-2025-SS.
- Especialista biomédico, Contrato UEP-PARH-005-2025-SS.
- Asistente administrativo, Contrato UEP-PARH-006-2025-SS.
- Miembro Único del DAAB, Dispute Adjudication And Avoidance Board, para el Contrato de Diseño, Construcción y Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca. Contrato UEP-PARH-007-2025-SS.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

- Miembro Único del DAAB, Dispute Adjudication And Avoidance Board, para el Contrato de Diseño, Construcción y Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro de Tocoa. Contrato UEP-PARH-008-2025-SS.
- Apoyo a la Gestión y Supervisión para el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras. Contrato UEP-PARH-009-2025-SS.
- Servicios de Auditoría Externa para el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH). Contrato UEP-PARH-010-2025-SS

Por su parte **GESALUD**, reporta la ejecución el Contrato para la Construcción y Equipamiento del Hospital General de Roatán; y Contrato para la "Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital General del Municipio de Roatán".

Asimismo, se encuentran en ejecución los contratos de consultoría en apoyo a la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH), GESALUD y UGI (alrededor de 31 contratos por trimestre).

Continúan en ejecución con Convenios de Gestión con la Asociación de desarrollo en el área de Santa Barbara (ADASBA) (San Agustín, Copán y Lucerna, Ocotepeque) y la Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz (MAMLESIP) (Cabañas, Tutule y Matazano, La Paz).

Continúa en ejecución el Convenio de Gestión con la organización "Community Health Assessment Initiative (CHAI)" en el marco del Proyecto Honduras - Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, hasta el cierre en el año 2025.

Por su parte la **UAFCE**, mantiene dos contratos vigentes, firmados por la SESAL, con financiamiento de donación externa:

- Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud, (contratista Tokura Corporation Japón) por un monto de contrato de JPY1,141,000.00, del cual se ha realizado un 62% del pago del contrato al 30 de septiembre de 2025.
- Supervisión de obra del Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud, (Contratista Azusa Sekkei) LTD, por un monto de contrato de JPY 156,000.00 con un nivel de pagos realizados al 30 de septiembre de 2025, de JPY96,220,000.00.

En cuanto a la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Humana (**PROSALH**), cuenta con 9 contratos al tercer trimestre:

- 3 consultores para asistencia técnica (Asesor Técnico de Inmunizaciones, Especialista Técnico en Infraestructura y Especialista en Vacunación). Monto Contratado US\$128,598.0, ejecutado en 55%.



- Contratación de Recurso Humano en apoyo al Programa Ampliado de Inmunización-PAI (4 oficiales administrativos y logísticos, 11 supervisores). Monto contratado US\$160,312.0, ejecutado 56%.
- Contrato HN-SESAL-427033-NC-RFB, Empresa de transporte de personal para las jornadas de vacunación a nivel nacional. Monto contratado US\$763,300.0, ejecutado 36%.
- Adquisición de indumentaria PAI para la estrategia de vacunación. Monto contratado US\$263,060.0, ejecutado 47%.
- HN-SESAL-407026-CS-IND, Especialista para el Restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal. Monto contratado US\$40,740.0, ejecutado 69%.
- HN-SESAL-48733-NC-DIR, Actualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). Monto contratado US\$1,677,740.40, ejecutado 14%.
- Contratación de Recurso Humano en apoyo a la Unidad de Gestión de Información (UGI) (16 facilitadores UGI y 2 administradores de base de datos). Monto contratado US\$108,374.75, ejecutado 52%.
- Consultorías de Apoyo a la gestión del proyecto (UAP-PROSALH/GAVI). Monto contratado US\$1,000,000.0, ejecutado 94%.
- HN-SESAL-460976-NC-RFQ, Contratación de servicios de transporte para apoyo de actividades RESHAPE. Monto contratado US\$30,000.0, ejecutado 69%.

#### **d.2. Programas Sociales**

Al tercer trimestre, la SESAL cuenta con L6,110.5 millones asignados para Inversiones Sociales conformados por Programas Sociales (L5,037.2 millones) y Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) por un monto de L1,073.3 millones.

En su conjunto, se registró ejecución financiera de L4,196.4 millones equivalentes al 69%; destinados principalmente a atención a enfermedades transmisibles, atención a grupos priorizados, atención a grupos y enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervención de prevención y promoción de la salud, prevención, atención y control de emergencias epidemiológicas, entre otras intervenciones sociales. Así mismo, se consideran adquisición de al menos 32 ambulancias para el sistema de salud pública, atención a enfermedades transmisibles priorizadas, atención de grupos priorizados, desarrollo del recurso humano, dirección y coordinación de riesgo poblacional, intervenciones de prevención de salud.



### **e. Gestión de la Inversión**

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Durante el tercer trimestre se atendieron 11 solicitudes de Modificaciones Presupuestarias con proyecto.
- Se emitieron 05 Opiniones complementarias a solicitud de la Dirección de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras (DGEFFA) para la Exoneración de Franquicias aduaneras relacionadas a proyectos de inversión pública.

### **f. Problemática y Acciones durante el III Trimestre-2025**

Al tercer trimestre, se reportó por desfase en 5.14% con relación al avance físico para el Hospital de Roatán, representando una desviación igual a 26 días: De acuerdo con lo reportado, se encuentra en campo alrededor de 138 trabajadores (mano de obra) para agilizar el avance de obras.

Adicionalmente, en cuanto a la consultoría para los diseños de hospitales de traumatología en Tegucigalpa y San Pedro Sula; se ha demorado la entrega de los productos finales, las cuales se esperaban desde el mes de diciembre de 2024 y se otorgó nueva ampliación a la entrega para el 15 de noviembre de 2025 (al cierre del trimestre se indica un avance del 98% en los diseños para ambos hospitales).

En cuanto a las obras de infraestructura relacionadas al Edificio administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), se indicó por parte de la UAFCE, que la SESAL ha realizado en casa los estudios de suelo durante el presente año por parte de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) realizando modificaciones al diseño previamente establecido para este edificio; identificando un nuevo costo por L41.9 millones el cual deberá ser gestionados sus recursos posterior a la Enmienda a Nota de Prioridad por incremento en el costo.



## **V. Conclusiones**

- Al tercer trimestre del año 2025, la ejecución reportada por la SESAL se registra a nivel de devengado en 59.4% (L4,855.4 millones) de los cuales la Inversión Productiva reporta L659.0 millones (14%) y un 86% (L4,196.3 millones) para la Inversión Social (Formación Bruta de Capital + Programas Sociales) ambas en relación con el Presupuesto Vigente asignado; ello denota la tendencia en ejecución se reflejó consistente al tercer trimestre del año anterior considerando las asignaciones en su conjunto para la Inversión Pública de la SESAL.
- Durante el tercer trimestre del año 2025, se dio formal a las actividades del Proyecto “Servicios esenciales de salud y preparación ante emergencias”, el cual en dicho trimestre indicó 20 procesos iniciados en su plan de adquisiciones y contrataciones; de los cuales 9 son contratos en ejecución bajo el convenio de financiamiento de la Alianza para la Vacunación (GAVI).
- Al término del tercer trimestre la SESAL mantiene el desfase en la recepción de productos importantes como ser los diseños de hospitales de traumatología; no obstante, mantiene la postura permisiva de continuar ampliando los plazos contractuales a la empresa de diseños, siendo el nuevo plazo de entrega al 15 de noviembre de 2025. Manteniendo desfazado el proceso para lanzar la licitación para la construcción y equipamiento de dichos hospitales.

## **VI. Recomendaciones**

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones conjuntas que permitan la eficiencia de los procesos y la gestión oportuna para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda a las Unidades Ejecutoras en SESAL, contar con mecanismos de control y aplicación de penalizaciones por desfase en entrega de productos (principalmente los generados por los diseños de hospitales de traumatología) mediante los cuales las empresas contratistas asuman la responsabilidad y la entrega de los productos en tiempo y forma.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

- Se recomienda registrar y mantener actualizada la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# ANEXOS



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

**ANEXO No. 1**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución/ Programa o Proyecto                                                                                                                                    | Convenio                    | Presupuesto Aprobado |                        |                        | Presupuesto Vigente |                        |                        | Ejecutado III Trimestre |                      |                      |                        | Ejecutado Anual (Devengado) |                      |                      |                        | Compromiso Aprobado |                      |                      |                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|           |                                                                                                                                                                     |                             | Fondos Nacionales    | Fondos Externos        | Total                  | Fondos Nacionales   | Fondos Externos        | Total                  | Fondos Nacionales       | Fondos Externos      | Total                | % Ejecución (Dev./Vig) | Fondos Nacionales           | Fondos Externos      | Total                | % Ejecución (Dev./Vig) | Fondos Nacionales   | Fondos Externos      | Total                | % Ejecución (Comp./Vig) |
| 8         | Inversión Productiva                                                                                                                                                |                             | 6,351,810.0          | 3,269,750,046.0        | 3,276,101,856.0        | 10,148,926.0        | 2,056,665,480.0        | 2,066,814,406.0        | 644,348.0               | 311,050,925.6        | 311,695,273.6        | 15%                    | 644,348.0                   | 658,392,390.1        | 659,036,738.1        | 32%                    | 688,627.4           | 800,263,539.5        | 800,952,166.9        | 39%                     |
| 8         | 0060 - Secretaría de Salud                                                                                                                                          |                             | 6,351,810.0          | 3,269,750,046.0        | 3,276,101,856.0        | 10,148,926.0        | 2,056,665,480.0        | 2,066,814,406.0        | 644,348.0               | 311,050,925.6        | 311,695,273.6        | 15%                    | 644,348.0                   | 658,392,390.1        | 659,036,738.1        | 32%                    | 688,627.4           | 800,263,539.5        | 800,952,166.9        | 39%                     |
| 1         | APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO                                                                                                           | 5008/BL-HO                  |                      | 45,357,049.0           | 45,357,049.0           |                     | 40,457,049.0           | 40,457,049.0           |                         | 8,098,840.5          | 8,098,840.5          | 20%                    |                             | 22,187,898.9         | 22,187,898.9         | 55%                    |                     | 26,099,293.7         | 26,099,293.7         | 65%                     |
|           | <b>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>                                                                                              |                             |                      | <b>45,357,049.0</b>    | <b>45,357,049.0</b>    |                     | <b>40,457,049.0</b>    | <b>40,457,049.0</b>    |                         | <b>8,098,840.5</b>   | <b>8,098,840.5</b>   | <b>20%</b>             |                             | <b>22,187,898.9</b>  | <b>22,187,898.9</b>  | <b>55%</b>             |                     | <b>26,099,293.7</b>  | <b>26,099,293.7</b>  | <b>65%</b>              |
| 2         | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN                | Acuerdo Donación No 1660400 | 6,351,810.0          | 106,317,132.0          | 112,668,942.0          | 10,148,926.0        | 106,317,132.0          | 116,466,058.0          | 644,348.0               | -                    | 644,348.0            | 1%                     | 644,348.0                   | 25,253,296.1         | 25,897,644.1         | 22%                    | 688,627.4           | 25,253,296.1         | 25,941,923.5         | 22%                     |
|           | <b>Total CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LAB</b>                                                                                      |                             | <b>6,351,810.0</b>   | <b>106,317,132.0</b>   | <b>112,668,942.0</b>   | <b>10,148,926.0</b> | <b>106,317,132.0</b>   | <b>116,466,058.0</b>   | <b>644,348.0</b>        | <b>-</b>             | <b>644,348.0</b>     | <b>1%</b>              | <b>644,348.0</b>            | <b>25,253,296.1</b>  | <b>25,897,644.1</b>  | <b>22%</b>             | <b>688,627.4</b>    | <b>25,253,296.1</b>  | <b>25,941,923.5</b>  | <b>22%</b>              |
| 3         | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES RENALES Y SERVICIOS CONEXOS HOSPITALARIOS                                                                               |                             |                      | 290,112,603.0          | 290,112,603.0          |                     | -                      | -                      |                         | -                    | -                    | 0%                     |                             | -                    | -                    | 0%                     |                     | -                    | -                    | 0%                      |
|           | <b>Total FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES RENALES Y SERVICIOS CONEXOS HOSPITALA</b>                                                                      |                             |                      | <b>290,112,603.0</b>   | <b>290,112,603.0</b>   |                     | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>              |                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>              |                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>               |
| 4         | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS        | BID 5790/BL-HO              |                      | 1,020,492,553.0        | 1,020,492,553.0        |                     | 331,236,052.0          | 331,236,052.0          |                         | 47,586,848.0         | 47,586,848.0         | 14%                    |                             | 92,309,857.9         | 92,309,857.9         | 28%                    |                     | 144,492,858.2        | 144,492,858.2        | 44%                     |
|           | <b>Total PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDR</b>                                                                      |                             |                      | <b>1,020,492,553.0</b> | <b>1,020,492,553.0</b> |                     | <b>331,236,052.0</b>   | <b>331,236,052.0</b>   |                         | <b>47,586,848.0</b>  | <b>47,586,848.0</b>  | <b>14%</b>             |                             | <b>92,309,857.9</b>  | <b>92,309,857.9</b>  | <b>28%</b>             |                     | <b>144,492,858.2</b> | <b>144,492,858.2</b> | <b>44%</b>              |
| 5         | PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECAY TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | BCIE-2329                   |                      | 1,485,722,612.0        | -                      |                     | 1,196,400,341.0        | 1,196,400,341.0        |                         | 168,885,507.1        | 168,885,507.1        | 33%                    |                             | 367,401,508.9        | 367,401,508.9        | 72%                    |                     | 369,236,614.4        | 369,236,614.4        | 72%                     |
|           | <b>Total PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDA</b>                                                                        |                             |                      | <b>1,485,722,612.0</b> | <b>1,485,722,612.0</b> |                     | <b>1,196,400,341.0</b> | <b>1,196,400,341.0</b> |                         | <b>168,885,507.1</b> | <b>168,885,507.1</b> | <b>14%</b>             |                             | <b>367,401,508.9</b> | <b>367,401,508.9</b> | <b>31%</b>             |                     | <b>369,236,614.4</b> | <b>369,236,614.4</b> | <b>31%</b>              |
| 6         | PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS                                                                                            | TF088564-HN                 |                      | 14,381,332.0           | 14,381,332.0           |                     | 336,000.0              | 336,000.0              |                         | -                    | -                    | 0%                     |                             | -                    | -                    | 0%                     |                     | -                    | -                    | 0%                      |
|           |                                                                                                                                                                     | TF0C1861                    |                      | 74,931,699.0           | 74,931,699.0           |                     | 120,776,949.0          | 120,776,949.0          |                         | 36,889,724.2         | 36,889,724.2         | 31%                    |                             | 56,917,681.9         | 56,917,681.9         | 47%                    |                     | 66,906,642.1         | 66,906,642.1         | 55%                     |
|           |                                                                                                                                                                     | IDA 7142-HN                 |                      | 26,380,875.0           | 26,380,875.0           |                     | -                      | -                      |                         | -                    | -                    | 0%                     |                             | -                    | -                    | 0%                     |                     | -                    | -                    | 0%                      |
|           | <b>Total PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS</b>                                                                               |                             |                      | <b>115,693,906.0</b>   | <b>115,693,906.0</b>   |                     | <b>121,112,949.0</b>   | <b>121,112,949.0</b>   |                         | <b>36,889,724.2</b>  | <b>36,889,724.2</b>  | <b>30%</b>             |                             | <b>56,917,681.9</b>  | <b>56,917,681.9</b>  | <b>47%</b>             |                     | <b>66,906,642.1</b>  | <b>66,906,642.1</b>  | <b>55%</b>              |
| 7         | PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA                                                    | GRT/MM-17339-40-HO          |                      | 22,000,000.0           | 22,000,000.0           |                     | 12,580,000.0           | 12,580,000.0           |                         | 3,339,709.7          | 3,339,709.7          | 27%                    |                             | 3,339,709.7          | 3,339,709.7          | 27%                    |                     | 3,650,959.7          | 3,650,959.7          | 29%                     |
|           | <b>Total PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESO</b>                                                                     |                             |                      | <b>22,000,000.0</b>    | <b>22,000,000.0</b>    |                     | <b>12,580,000.0</b>    | <b>12,580,000.0</b>    |                         | <b>3,339,709.7</b>   | <b>3,339,709.7</b>   | <b>27%</b>             |                             | <b>3,339,709.7</b>   | <b>3,339,709.7</b>   | <b>27%</b>             |                     | <b>3,650,959.7</b>   | <b>3,650,959.7</b>   | <b>29%</b>              |
| 8         | RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)  | BID 4713/BL-HO              |                      | 184,054,191.0          | 184,054,191.0          |                     | 248,561,957.0          | 248,561,957.0          |                         | 46,250,296.1         | 46,250,296.1         | 19%                    |                             | 90,982,436.7         | 90,982,436.7         | 37%                    |                     | 164,623,875.2        | 164,623,875.2        | 66%                     |
|           | <b>Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (CO</b>                                                                      |                             |                      | <b>184,054,191.0</b>   | <b>184,054,191.0</b>   |                     | <b>248,561,957.0</b>   | <b>248,561,957.0</b>   |                         | <b>46,250,296.1</b>  | <b>46,250,296.1</b>  | <b>19%</b>             |                             | <b>90,982,436.7</b>  | <b>90,982,436.7</b>  | <b>37%</b>             |                     | <b>164,623,875.2</b> | <b>164,623,875.2</b> | <b>66%</b>              |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución/ Programa o Proyecto                                             | Convenio | Presupuesto Aprobado   |                        |                        | Presupuesto Vigente    |                        |                        | Ejecutado III Trimestre |                      |                      | % Ejecución (Dev./Vig) | Ejecutado Anual (Devengado) |                      |                        | % Ejecución (Dev./Vig) | Compromiso Aprobado  |                      |                        | % Ejecución (Comp./Vig) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|           |                                                                              |          | Fondos Nacionales      | Fondos Externos        | Total                  | Fondos Nacionales      | Fondos Externos        | Total                  | Fondos Nacionales       | Fondos Externos      | Total                |                        | Fondos Nacionales           | Fondos Externos      | Total                  |                        | Fondos Nacionales    | Fondos Externos      | Total                  |                         |
|           | Inversión Social                                                             |          | 5,225,953,253.0        | 2,150,661,015.0        | 7,376,614,268.0        | 3,287,196,179.0        | 1,749,961,097.0        | 5,037,157,276.0        | 1,151,170,188.3         | 886,009,802.9        | 2,037,179,991.2      | 40%                    | 2,463,913,215.0             | 1,347,391,941.8      | 3,811,305,156.8        | 76%                    | 2,571,003,686.3      | 1,387,527,305.5      | 3,958,530,991.8        | 79%                     |
|           | 0060 - Secretaría de Salud                                                   |          | 5,225,953,253.0        | 2,150,661,015.0        | 7,376,614,268.0        | 3,287,196,179.0        | 1,749,961,097.0        | 5,037,157,276.0        | 1,151,170,188.3         | 886,009,802.9        | 2,037,179,991.2      | 40%                    | 2,463,913,215.0             | 1,347,391,941.8      | 3,811,305,156.8        | 76%                    | 2,571,003,686.3      | 1,387,527,305.5      | 3,958,530,991.8        | 79%                     |
|           | ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD                 |          | 530,476,975.0          | -                      | 530,476,975.0          | 12,060,000.0           | -                      | 12,060,000.0           | -                       | -                    | -                    | 0%                     | -                           | -                    | -                      | 0%                     | -                    | -                    | -                      | 0%                      |
|           | <b>Total ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD</b>    |          | <b>530,476,975.0</b>   | <b>-</b>               | <b>530,476,975.0</b>   | <b>12,060,000.0</b>    | <b>-</b>               | <b>12,060,000.0</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>0%</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>0%</b>               |
|           | ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS                         |          | 93,452,861.0           | -                      | 93,452,861.0           | 86,903,425.0           | 883,494.0              | 87,786,919.0           | 28,653,135.8            | 141,122.5            | 28,794,258.3         | 33%                    | 51,800,439.0                | 351,122.5            | 52,151,561.5           | 59%                    | 51,800,439.0         | 404,439.0            | 52,204,878.0           | 59%                     |
|           | <b>Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS</b>            |          | <b>93,452,861.0</b>    | <b>-</b>               | <b>93,452,861.0</b>    | <b>86,903,425.0</b>    | <b>883,494.0</b>       | <b>87,786,919.0</b>    | <b>28,653,135.8</b>     | <b>141,122.5</b>     | <b>28,794,258.3</b>  | <b>33%</b>             | <b>51,800,439.0</b>         | <b>351,122.5</b>     | <b>52,151,561.5</b>    | <b>59%</b>             | <b>51,800,439.0</b>  | <b>404,439.0</b>     | <b>52,204,878.0</b>    | <b>59%</b>              |
|           | ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS                            |          | 366,515,423.0          | -                      | 366,515,423.0          | 101,843,640.0          | 1,435,922.0            | 103,279,562.0          | 32,136,207.4            | 407,560.1            | 32,543,767.6         | 32%                    | 57,080,701.5                | 557,560.1            | 57,638,261.6           | 56%                    | 57,080,701.5         | 817,560.1            | 57,898,261.6           | 56%                     |
|           | <b>Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS</b>               |          | <b>366,515,423.0</b>   | <b>-</b>               | <b>366,515,423.0</b>   | <b>101,843,640.0</b>   | <b>1,435,922.0</b>     | <b>103,279,562.0</b>   | <b>32,136,207.4</b>     | <b>407,560.1</b>     | <b>32,543,767.6</b>  | <b>32%</b>             | <b>57,080,701.5</b>         | <b>557,560.1</b>     | <b>57,638,261.6</b>    | <b>56%</b>             | <b>57,080,701.5</b>  | <b>817,560.1</b>     | <b>57,898,261.6</b>    | <b>56%</b>              |
|           | ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS                                                |          | 193,721,873.0          | -                      | 193,721,873.0          | 183,718,462.0          | 2,132,970.0            | 185,851,432.0          | 94,309,069.8            | 114,700.0            | 94,423,769.8         | 51%                    | 142,672,908.8               | 318,770.0            | 142,991,678.8          | 77%                    | 142,672,908.8        | 492,652.0            | 143,168,738.3          | 77%                     |
|           | <b>Total ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS</b>                                   |          | <b>193,721,873.0</b>   | <b>-</b>               | <b>193,721,873.0</b>   | <b>183,718,462.0</b>   | <b>2,132,970.0</b>     | <b>185,851,432.0</b>   | <b>94,309,069.8</b>     | <b>114,700.0</b>     | <b>94,423,769.8</b>  | <b>51%</b>             | <b>142,672,908.8</b>        | <b>318,770.0</b>     | <b>142,991,678.8</b>   | <b>77%</b>             | <b>142,672,908.8</b> | <b>492,652.0</b>     | <b>143,168,738.3</b>   | <b>77%</b>              |
|           | ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS                              |          | 121,367,852.0          | -                      | 121,367,852.0          | 83,782,043.0           | 18,297,460.0           | 102,079,503.0          | 23,236,795.8            | 2,923,019.8          | 26,159,815.6         | 26%                    | 48,904,189.0                | 15,312,375.3         | 64,216,564.2           | 63%                    | 49,331,749.6         | 15,507,232.0         | 64,838,981.6           | 64%                     |
|           | <b>Total ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS</b>                 |          | <b>121,367,852.0</b>   | <b>-</b>               | <b>121,367,852.0</b>   | <b>83,782,043.0</b>    | <b>18,297,460.0</b>    | <b>102,079,503.0</b>   | <b>23,236,795.8</b>     | <b>2,923,019.8</b>   | <b>26,159,815.6</b>  | <b>26%</b>             | <b>48,904,189.0</b>         | <b>15,312,375.3</b>  | <b>64,216,564.2</b>    | <b>63%</b>             | <b>49,331,749.6</b>  | <b>15,507,232.0</b>  | <b>64,838,981.6</b>    | <b>64%</b>              |
|           | ATENCIÓNES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19                               |          | 29,930,982.0           | -                      | 29,930,982.0           | -                      | -                      | -                      | -                       | -                    | -                    | 0%                     | -                           | -                    | -                      | 0%                     | -                    | -                    | -                      | 0%                      |
|           | <b>Total ATENCIÓNES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19</b>                  |          | <b>29,930,982.0</b>    | <b>-</b>               | <b>29,930,982.0</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>0%</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>0%</b>               |
|           | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                     |          | 1,339,428,593.0        | -                      | 1,339,428,593.0        | 1,153,529,981.0        | 214,731,229.0          | 1,368,261,210.0        | 403,182,789.5           | 101,317,522.8        | 504,500,312.3        | 37%                    | 872,738,850.8               | 118,930,071.0        | 991,668,921.8          | 72%                    | 881,349,408.6        | 119,280,069.0        | 1,000,629,477.6        | 73%                     |
|           | <b>Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                                        |          | <b>1,339,428,593.0</b> | <b>-</b>               | <b>1,339,428,593.0</b> | <b>1,153,529,981.0</b> | <b>214,731,229.0</b>   | <b>1,368,261,210.0</b> | <b>403,182,789.5</b>    | <b>101,317,522.8</b> | <b>504,500,312.3</b> | <b>37%</b>             | <b>872,738,850.8</b>        | <b>118,930,071.0</b> | <b>991,668,921.8</b>   | <b>72%</b>             | <b>881,349,408.6</b> | <b>119,280,069.0</b> | <b>1,000,629,477.6</b> | <b>73%</b>              |
|           | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RIESGO POBLACIONAL                               |          | 112,948,321.0          | -                      | 112,948,321.0          | 9,589,078.0            | 119,151,376.0          | 128,740,454.0          | 362,250.0               | 9,937,150.5          | 9,589,078.9          | 8%                     | 47,084,565.5                | 56,673,642.3         | 56,673,642.3           | 44%                    | 9,589,078.9          | 47,084,565.5         | 56,673,642.3           | 44%                     |
|           | <b>Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RIESGO POBLACIONAL</b>                  |          | <b>112,948,321.0</b>   | <b>-</b>               | <b>112,948,321.0</b>   | <b>9,589,078.0</b>     | <b>119,151,376.0</b>   | <b>128,740,454.0</b>   | <b>362,250.0</b>        | <b>9,937,150.5</b>   | <b>9,589,078.9</b>   | <b>8%</b>              | <b>47,084,565.5</b>         | <b>56,673,642.3</b>  | <b>56,673,642.3</b>    | <b>44%</b>             | <b>9,589,078.9</b>   | <b>47,084,565.5</b>  | <b>56,673,642.3</b>    | <b>44%</b>              |
|           | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR                                            |          | -                      | -                      | -                      | 60,818.0               | 60,817.4               | 60,817.4               | 60,817.4                | 60,817.4             | 60,817.4             | 100%                   | 60,817.4                    | 60,817.4             | 60,817.4               | 100%                   | 60,817.4             | 60,817.4             | 60,817.4               | 100%                    |
|           | <b>Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>                               |          | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>60,818.0</b>        | <b>60,817.4</b>        | <b>60,817.4</b>        | <b>60,817.4</b>         | <b>60,817.4</b>      | <b>60,817.4</b>      | <b>100%</b>            | <b>60,817.4</b>             | <b>60,817.4</b>      | <b>60,817.4</b>        | <b>100%</b>            | <b>60,817.4</b>      | <b>60,817.4</b>      | <b>60,817.4</b>        | <b>100%</b>             |
|           | INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD                                        |          | 362,881,225.0          | -                      | 362,881,225.0          | 199,024,087.0          | 4,250,722.0            | 203,274,819.0          | 61,319,690.6            | 2,108,286.9          | 63,427,977.5         | 31%                    | 172,500,330.7               | 2,733,101.4          | 175,233,632.1          | 86%                    | 173,986,342.0        | 3,681,177.4          | 177,667,519.4          | 87%                     |
|           | <b>Total INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD</b>                           |          | <b>362,881,225.0</b>   | <b>-</b>               | <b>362,881,225.0</b>   | <b>199,024,087.0</b>   | <b>4,250,722.0</b>     | <b>203,274,819.0</b>   | <b>61,319,690.6</b>     | <b>2,108,286.9</b>   | <b>63,427,977.5</b>  | <b>31%</b>             | <b>172,500,330.7</b>        | <b>2,733,101.4</b>   | <b>175,233,632.1</b>   | <b>86%</b>             | <b>173,986,342.0</b> | <b>3,681,177.4</b>   | <b>177,667,519.4</b>   | <b>87%</b>              |
|           | INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD                                      |          | 223,868,129.0          | -                      | 223,868,129.0          | 260,142,889.0          | 2,691,348.0            | 262,834,237.0          | 71,175,067.1            | 454,570.0            | 71,629,637.1         | 27%                    | 198,133,368.2               | 454,570.0            | 198,587,938.2          | 76%                    | 200,948,235.1        | 1,207,067.1          | 202,155,302.2          | 77%                     |
|           | <b>Total INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                         |          | <b>223,868,129.0</b>   | <b>-</b>               | <b>223,868,129.0</b>   | <b>260,142,889.0</b>   | <b>2,691,348.0</b>     | <b>262,834,237.0</b>   | <b>71,175,067.1</b>     | <b>454,570.0</b>     | <b>71,629,637.1</b>  | <b>27%</b>             | <b>198,133,368.2</b>        | <b>454,570.0</b>     | <b>198,587,938.2</b>   | <b>76%</b>             | <b>200,948,235.1</b> | <b>1,207,067.1</b>   | <b>202,155,302.2</b>   | <b>77%</b>              |
|           | PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS                |          | 3,000,000.0            | -                      | 3,000,000.0            | 3,000,000.0            | -                      | 3,000,000.0            | -                       | -                    | -                    | 0%                     | 3,000,000.0                 | 3,000,000.0          | 3,000,000.0            | 100%                   | 3,000,000.0          | 3,000,000.0          | 3,000,000.0            | 100%                    |
|           | <b>Total PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS</b>   |          | <b>3,000,000.0</b>     | <b>-</b>               | <b>3,000,000.0</b>     | <b>3,000,000.0</b>     | <b>-</b>               | <b>3,000,000.0</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0%</b>              | <b>3,000,000.0</b>          | <b>3,000,000.0</b>   | <b>3,000,000.0</b>     | <b>100%</b>            | <b>3,000,000.0</b>   | <b>3,000,000.0</b>   | <b>3,000,000.0</b>     | <b>100%</b>             |
|           | RECTORÍA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS                                 |          | 1,472,352.0            | -                      | 1,472,352.0            | 55,484.0               | 85,300.0               | 140,784.0              | 27,421.5                | 84,392.0             | 111,813.5            | 79%                    | 84,392.0                    | 111,813.5            | 111,813.5              | 79%                    | 55,483.2             | 84,392.0             | 139,875.2              | 99%                     |
|           | <b>Total RECTORÍA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS</b>                    |          | <b>1,472,352.0</b>     | <b>-</b>               | <b>1,472,352.0</b>     | <b>55,484.0</b>        | <b>85,300.0</b>        | <b>140,784.0</b>       | <b>27,421.5</b>         | <b>84,392.0</b>      | <b>111,813.5</b>     | <b>79%</b>             | <b>84,392.0</b>             | <b>111,813.5</b>     | <b>111,813.5</b>       | <b>79%</b>             | <b>55,483.2</b>      | <b>84,392.0</b>      | <b>139,875.2</b>       | <b>99%</b>              |
|           | REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL              |          | -                      | -                      | -                      | -                      | 2,087,133.0            | 2,087,133.0            | 27,135.6                | 27,135.6             | 27,135.6             | 1%                     | 27,135.6                    | 27,135.6             | 27,135.6               | 1%                     | 27,135.6             | 27,135.6             | 27,135.6               | 1%                      |
|           | <b>Total REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL</b> |          | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>2,087,133.0</b>     | <b>2,087,133.0</b>     | <b>27,135.6</b>         | <b>27,135.6</b>      | <b>27,135.6</b>      | <b>1%</b>              | <b>27,135.6</b>             | <b>27,135.6</b>      | <b>27,135.6</b>        | <b>1%</b>              | <b>27,135.6</b>      | <b>27,135.6</b>      | <b>27,135.6</b>        | <b>1%</b>               |
|           | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES                                        |          | 85,149,652.0           | 3,299,690.0            | 88,449,342.0           | 85,149,652.0           | 3,299,690.0            | 88,449,342.0           | 11,920,540.0            | -                    | 11,920,540.0         | 13%                    | 23,066,680.0                | -                    | 23,066,680.0           | 26%                    | 23,066,680.0         | -                    | 23,066,680.0           | 26%                     |
|           | <b>Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES</b>                           |          | <b>85,149,652.0</b>    | <b>3,299,690.0</b>     | <b>88,449,342.0</b>    | <b>85,149,652.0</b>    | <b>3,299,690.0</b>     | <b>88,449,342.0</b>    | <b>11,920,540.0</b>     | <b>-</b>             | <b>11,920,540.0</b>  | <b>13%</b>             | <b>23,066,680.0</b>         | <b>-</b>             | <b>23,066,680.0</b>    | <b>26%</b>             | <b>23,066,680.0</b>  | <b>-</b>             | <b>23,066,680.0</b>    | <b>26%</b>              |
|           | SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA                                  |          | 352,039,451.0          | 2,147,361,325.0        | 2,499,400,776.0        | 398,225,684.0          | 1,083,642,686.0        | 1,481,868,370.0        | 114,867,522.9           | 633,574,304.4        | 748,441,827.3        | 51%                    | 385,060,623.3               | 958,958,125.4        | 1,344,018,748.6        | 91%                    | 393,820,843.8        | 961,968,525.7        | 1,355,789,369.5        | 91%                     |
|           | <b>Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA</b>                     |          | <b>352,039,451.0</b>   | <b>2,147,361,325.0</b> | <b>2,499,400,776.0</b> | <b>398,225,684.0</b>   | <b>1,083,642,686.0</b> | <b>1,481,868,370.0</b> | <b>114,867,522.9</b>    | <b>633,574,304.4</b> | <b>748,441,827.3</b> | <b>51%</b>             | <b>385,060,623.3</b>        | <b>958,958,125.4</b> | <b>1,344,018,748.6</b> | <b>91%</b>             | <b>393,820,843.8</b> | <b>961,968,525.7</b> | <b>1,355,789,369.5</b> | <b>91%</b>              |
|           | SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA                                     |          | 166,152,823.0          | -                      | 166,152,823.0          | 194,529,304.0          | 31,716,667.0           | 226,245,971.0          | 138,470,698.5           | 10,570,745.3         | 149,041,443.9        | 66%                    | 164,512,645.5               | 16,978,834.5         | 171,491,480.0          | 76%                    | 164,512,645.5        | 18,500,763.5         | 183,253,740.2          | 81%                     |
|           | <b>Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA</b>                        |          | <b>166,152,823.0</b>   | <b>-</b>               | <b>166,152,823.0</b>   | <b>194,529,304.0</b>   | <b>31,716,667.0</b>    | <b>226,245,971.0</b>   | <b>138,470,698.5</b>    | <b>10,570,745.3</b>  | <b>149,041,443.9</b> |                        |                             |                      |                        |                        |                      |                      |                        |                         |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

| No. Proy.                  | Institución/ Programa o Proyecto                                      | Convenio     | Presupuesto Aprobado |                     |                      | Presupuesto Vigente  |                      |                        | Ejecutado III Trimestre |                    |                     |                        | Ejecutado Anual (Devengado) |                    |                      |                        | Compromiso Aprobado  |                    |                      |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|                            |                                                                       |              | Fondos Nacionales    | Fondos Externos     | Total                | Fondos Nacionales    | Fondos Externos      | Total                  | Fondos Nacionales       | Fondos Externos    | Total               | % Ejecución (Dev./Vig) | Fondos Nacionales           | Fondos Externos    | Total                | % Ejecución (Dev./Vig) | Fondos Nacionales    | Fondos Externos    | Total                | % Ejecución (Comp./Vig) |
|                            | <b>Formación Bruta de Capital</b>                                     |              | <b>158,769,455.0</b> | <b>12,306,705.0</b> | <b>171,076,160.0</b> | <b>648,886,420.0</b> | <b>424,462,310.0</b> | <b>1,073,348,730.0</b> | <b>75,127,790.7</b>     | <b>2,790,311.7</b> | <b>77,918,102.3</b> | <b>7%</b>              | <b>378,375,114.0</b>        | <b>6,687,820.0</b> | <b>385,062,934.0</b> | <b>36%</b>             | <b>452,933,917.7</b> | <b>6,687,820.0</b> | <b>459,621,737.7</b> | <b>43%</b>              |
| 0060 - Secretaría de Salud |                                                                       |              | 158,769,455.0        | 12,306,705.0        | 171,076,160.0        | 648,886,420.0        | 424,462,310.0        | 1,073,348,730.0        | 75,127,790.7            | 2,790,311.7        | 77,918,102.3        | 7%                     | 378,375,114.0               | 6,687,820.0        | 385,062,934.0        | 36%                    | 452,933,917.7        | 6,687,820.0        | 459,621,737.7        | 43%                     |
|                            | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL SISTEMA DE SALUD EN HONDURAS       |              | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | 3,724,000.0            | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | 3,707,439.4        | 3,707,439.4          | 100%                   | -                    | 3,707,439.4        | 3,707,439.4          | 100%                    |
|                            | Total ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL SISTEMA DE SALUD EN HONDURAS |              | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | 3,724,000.0            | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | 3,707,439.4        | 3,707,439.4          | 100%                   | -                    | 3,707,439.4        | 3,707,439.4          | 100%                    |
|                            | ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD          | 340,000.0    | -                    | 340,000.0           | 340,000.0            | 29,004,936.0         | -                    | 29,004,936.0           | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 123,092.6            | -                  | 123,092.6            | 0%                      |
|                            | Total ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD    | 340,000.0    | -                    | 340,000.0           | 340,000.0            | 29,004,936.0         | -                    | 29,004,936.0           | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 123,092.6            | -                  | 123,092.6            | 0%                      |
|                            | ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS                  | 455,391.0    | -                    | 455,391.0           | 455,391.0            | 662,372.0            | -                    | 662,372.0              | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 203,000.0            | -                  | 203,000.0            | 31%                     |
|                            | Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS            | 455,391.0    | -                    | 455,391.0           | 455,391.0            | 662,372.0            | -                    | 662,372.0              | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 203,000.0            | -                  | 203,000.0            | 31%                     |
|                            | ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS                     | 212,500.0    | -                    | 212,500.0           | 212,500.0            | 212,500.0            | -                    | 212,500.0              | 191,109.0               | -                  | 191,109.0           | 90%                    | 191,109.0                   | -                  | 191,109.0            | 90%                    | 191,109.0            | -                  | 191,109.0            | 90%                     |
|                            | Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS               | 212,500.0    | -                    | 212,500.0           | 212,500.0            | 212,500.0            | -                    | 212,500.0              | 191,109.0               | -                  | 191,109.0           | 90%                    | 191,109.0                   | -                  | 191,109.0            | 90%                    | 191,109.0            | -                  | 191,109.0            | 90%                     |
|                            | ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS                                         | 3,087,557.0  | -                    | 3,087,557.0         | 2,031,454.0          | 1,457,510.0          | -                    | 3,488,964.0            | 574,532.8               | 1,456,993.0        | 2,031,525.8         | 58%                    | 1,752,071.7                 | 1,456,993.0        | 3,209,064.7          | 92%                    | 1,752,071.7          | 1,456,993.0        | 3,209,064.7          | 92%                     |
|                            | Total ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS                                   | 3,087,557.0  | -                    | 3,087,557.0         | 2,031,454.0          | 1,457,510.0          | -                    | 3,488,964.0            | 574,532.8               | 1,456,993.0        | 2,031,525.8         | 58%                    | 1,752,071.7                 | 1,456,993.0        | 3,209,064.7          | 92%                    | 1,752,071.7          | 1,456,993.0        | 3,209,064.7          | 92%                     |
|                            | ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS                       | 554,958.0    | -                    | 554,958.0           | 406,138.0            | -                    | 406,138.0            | 100,000.0              | -                       | -                  | 100,000.0           | 25%                    | -                           | -                  | 100,000.0            | 25%                    | -                    | -                  | 100,000.0            | 25%                     |
|                            | Total ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS                 | 554,958.0    | -                    | 554,958.0           | 406,138.0            | -                    | 406,138.0            | 100,000.0              | -                       | -                  | 100,000.0           | 25%                    | -                           | -                  | 100,000.0            | 25%                    | -                    | -                  | 100,000.0            | 25%                     |
|                            | COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES                      | 165,000.0    | -                    | 165,000.0           | 165,000.0            | 465,000.0            | -                    | 465,000.0              | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | -                    | -                  | -                    | 0%                      |
|                            | Total COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES                | 165,000.0    | -                    | 165,000.0           | 165,000.0            | 465,000.0            | -                    | 465,000.0              | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | -                    | -                  | -                    | 0%                      |
|                            | COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD       | 30,000.0     | -                    | 30,000.0            | 330,000.0            | -                    | 330,000.0            | 178,880.2              | -                       | -                  | 178,880.2           | 54%                    | 178,880.2                   | -                  | 178,880.2            | 54%                    | 178,880.2            | -                  | 178,880.2            | 54%                     |
|                            | Total COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD | 30,000.0     | -                    | 30,000.0            | 330,000.0            | -                    | 330,000.0            | 178,880.2              | -                       | -                  | 178,880.2           | 54%                    | 178,880.2                   | -                  | 178,880.2            | 54%                    | 178,880.2            | -                  | 178,880.2            | 54%                     |
|                            | COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN                                   | -            | -                    | -                   | 3,732,409.0          | -                    | 3,732,409.0          | 99,855.7               | -                       | -                  | 99,855.7            | 3%                     | -                           | -                  | 99,855.7             | 3%                     | 2,951,845.3          | -                  | 2,951,845.3          | 79%                     |
|                            | Total COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN                             | -            | -                    | -                   | 3,732,409.0          | -                    | 3,732,409.0          | 99,855.7               | -                       | -                  | 99,855.7            | 3%                     | -                           | -                  | 99,855.7             | 3%                     | 2,951,845.3          | -                  | 2,951,845.3          | 79%                     |
|                            | DESARROLLO DE RECURSO HUMANO                                          | 11,384,262.0 | -                    | 11,384,262.0        | 17,279,262.0         | -                    | 17,279,262.0         | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 2,587,007.1          | -                  | 2,587,007.1          | 15%                     |
|                            | Total DESARROLLO DE RECURSO HUMANO                                    | 11,384,262.0 | -                    | 11,384,262.0        | 17,279,262.0         | -                    | 17,279,262.0         | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 2,587,007.1          | -                  | 2,587,007.1          | 15%                     |
|                            | DIRECCION Y COORDINACION                                              | 56,233,491.0 | -                    | 56,233,491.0        | 117,893,411.0        | -                    | 117,893,411.0        | 28,936,956.8           | -                       | -                  | 28,936,956.8        | 25%                    | 39,383,378.0                | -                  | 39,383,378.0         | 33%                    | 73,234,978.8         | -                  | 73,234,978.8         | 62%                     |
|                            | Total DIRECCION Y COORDINACION                                        | 56,233,491.0 | -                    | 56,233,491.0        | 117,893,411.0        | -                    | 117,893,411.0        | 28,936,956.8           | -                       | -                  | 28,936,956.8        | 25%                    | 39,383,378.0                | -                  | 39,383,378.0         | 33%                    | 73,234,978.8         | -                  | 73,234,978.8         | 62%                     |
|                            | DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE                                  | 278,101.0    | -                    | 278,101.0           | 732,901.0            | -                    | 732,901.0            | 345,764.9              | -                       | -                  | 345,764.9           | 47%                    | 385,549.7                   | -                  | 385,549.7            | 53%                    | 445,234.7            | -                  | 445,234.7            | 61%                     |
|                            | Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE                            | 278,101.0    | -                    | 278,101.0           | 732,901.0            | -                    | 732,901.0            | 345,764.9              | -                       | -                  | 345,764.9           | 47%                    | 385,549.7                   | -                  | 385,549.7            | 53%                    | 445,234.7            | -                  | 445,234.7            | 61%                     |
|                            | DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULIME                                  | 12,233,692.0 | -                    | 12,233,692.0        | 9,191,293.0          | -                    | 9,191,293.0          | 272,141.8              | -                       | -                  | 272,141.8           | 3%                     | 1,927,901.8                 | -                  | 1,927,901.8          | 21%                    | 2,535,554.3          | -                  | 2,535,554.3          | 28%                     |
|                            | Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULIME                            | 12,233,692.0 | -                    | 12,233,692.0        | 9,191,293.0          | -                    | 9,191,293.0          | 272,141.8              | -                       | -                  | 272,141.8           | 3%                     | 1,927,901.8                 | -                  | 1,927,901.8          | 21%                    | 2,535,554.3          | -                  | 2,535,554.3          | 28%                     |
|                            | DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTPG                                   | 530,000.0    | -                    | 530,000.0           | 860,000.0            | -                    | 860,000.0            | 177,967.1              | -                       | -                  | 177,967.1           | 21%                    | 177,967.1                   | -                  | 177,967.1            | 21%                    | 177,967.1            | -                  | 177,967.1            | 21%                     |
|                            | Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTPG                             | 530,000.0    | -                    | 530,000.0           | 860,000.0            | -                    | 860,000.0            | 177,967.1              | -                       | -                  | 177,967.1           | 21%                    | 177,967.1                   | -                  | 177,967.1            | 21%                    | 177,967.1            | -                  | 177,967.1            | 21%                     |
|                            | DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL                        | 9,155,059.0  | -                    | 9,155,059.0         | 16,558,656.0         | -                    | 16,558,656.0         | 1,631,432.0            | -                       | -                  | 1,631,432.0         | 10%                    | 5,333,916.4                 | -                  | 5,333,916.4          | 32%                    | 6,507,626.4          | -                  | 6,507,626.4          | 39%                     |
|                            | Total DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL                  | 9,155,059.0  | -                    | 9,155,059.0         | 16,558,656.0         | -                    | 16,558,656.0         | 1,631,432.0            | -                       | -                  | 1,631,432.0         | 10%                    | 5,333,916.4                 | -                  | 5,333,916.4          | 32%                    | 6,507,626.4          | -                  | 6,507,626.4          | 39%                     |
|                            | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR                                     | -            | -                    | -                   | 800,000.0            | -                    | 800,000.0            | 222,933.3              | -                       | -                  | 222,933.3           | 28%                    | 222,933.3                   | -                  | 222,933.3            | 28%                    | 512,750.5            | -                  | 512,750.5            | 64%                     |
|                            | Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR                               | -            | -                    | -                   | 800,000.0            | -                    | 800,000.0            | 222,933.3              | -                       | -                  | 222,933.3           | 28%                    | 222,933.3                   | -                  | 222,933.3            | 28%                    | 512,750.5            | -                  | 512,750.5            | 64%                     |
|                            | GESTION DE LA INFORMACION                                             | 450,000.0    | -                    | 450,000.0           | 4,780,000.0          | -                    | 4,780,000.0          | 154,611.8              | -                       | -                  | 154,611.8           | 3%                     | 154,611.8                   | -                  | 154,611.8            | 3%                     | 154,611.8            | -                  | 154,611.8            | 3%                      |
|                            | Total GESTION DE LA INFORMACION                                       | 450,000.0    | -                    | 450,000.0           | 4,780,000.0          | -                    | 4,780,000.0          | 154,611.8              | -                       | -                  | 154,611.8           | 3%                     | 154,611.8                   | -                  | 154,611.8            | 3%                     | 154,611.8            | -                  | 154,611.8            | 3%                      |
|                            | GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES           | -            | -                    | -                   | -                    | -                    | 15,080,273.0         | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | -                    | -                  | -                    | 0%                      |
|                            | Total GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES     | -            | -                    | -                   | -                    | -                    | 15,080,273.0         | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | -                    | -                  | -                    | 0%                      |
|                            | INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD                                 | 5,881,843.0  | -                    | 5,881,843.0         | 6,722,742.0          | -                    | 6,722,742.0          | 2,532,376.5            | -                       | -                  | 2,532,376.5         | 38%                    | 3,890,280.2                 | -                  | 3,890,280.2          | 58%                    | 5,012,325.2          | -                  | 5,012,325.2          | 75%                     |
|                            | Total INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD                           | 5,881,843.0  | -                    | 5,881,843.0         | 6,722,742.0          | -                    | 6,722,742.0          | 2,532,376.5            | -                       | -                  | 2,532,376.5         | 38%                    | 3,890,280.2                 | -                  | 3,890,280.2          | 58%                    | 5,012,325.2          | -                  | 5,012,325.2          | 75%                     |
|                            | INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD                               | 5,808,567.0  | -                    | 5,808,567.0         | 6,249,779.0          | -                    | 6,249,779.0          | 1,306,296.2            | -                       | -                  | 1,306,296.2         | 21%                    | 2,320,975.7                 | -                  | 2,320,975.7          | 37%                    | 3,278,542.6          | -                  | 3,278,542.6          | 52%                     |
|                            | Total INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD                         | 5,808,567.0  | -                    | 5,808,567.0         | 6,249,779.0          | -                    | 6,249,779.0          | 1,306,296.2            | -                       | -                  | 1,306,296.2         | 21%                    | 2,320,975.7                 | -                  | 2,320,975.7          | 37%                    | 3,278,542.6          | -                  | 3,278,542.6          | 52%                     |
|                            | PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL                  | 447,689.0    | -                    | 447,689.0           | 777,689.0            | -                    | 777,689.0            | 217,573.1              | -                       | -                  | 217,573.1           | 28%                    | 404,409.5                   | -                  | 404,409.5            | 52%                    | 587,259.5            | -                  | 587,259.5            | 76%                     |
|                            | Total PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL            | 447,689.0    | -                    | 447,689.0           | 777,689.0            | -                    | 777,689.0            | 217,573.1              | -                       | -                  | 217,573.1           | 28%                    | 404,409.5                   | -                  | 404,409.5            | 52%                    | 587,259.5            | -                  | 587,259.5            | 76%                     |
|                            | PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS         | 1,000,000.0  | -                    | 1,000,000.0         | 1,000,000.0          | -                    | 1,000,000.0          | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 299,977.5            | -                  | 299,977.5            | 30%                     |
|                            | Total PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS   | 1,000,000.0  | -                    | 1,000,000.0         | 1,000,000.0          | -                    | 1,000,000.0          | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | -                           | -                  | -                    | 0%                     | 299,977.5            | -                  | 299,977.5            | 30%                     |
|                            | RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS                          | 700,000.0    | -                    | 700,000.0           | 298,873.0            | -                    | 298,873.0            | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | 298,872.4                   | -                  | 298,872.4            | 100%                   | 298,872.4            | -                  | 298,872.4            | 100%                    |
|                            | Total RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS                    | 700,000.0    | -                    | 700,000.0           | 298,873.0            | -                    | 298,873.0            | -                      | -                       | -                  | -                   | 0%                     | 298,872.4                   | -                  | 298,872.4            | 100%                   | 298,872.4            | -                  | 298,872.4            | 100%                    |
|                            | REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL       | -            | -                    | -                   | -                    | -                    | 40,305,001.0         | 40,305,001.0           | -                       | -                  | 1,333,318.7         | 3%                     | 1,523,387.6                 | -                  | 1,523,387.6          | 4%                     | 1,523,387.6          | -                  | 1,523,387.6          | 4%                      |
|                            | Total REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL | -            | -                    | -                   | -                    | -                    | 40,305,001.0         | 40,305,001.0           | -                       | -                  | 1,333,318.7         | 3%                     | 1,523,387.6                 | -                  | 1,523,387.6          | 4%                     | 1,523,387.6          | -                  | 1,523,387.6          | 4%                      |
|                            | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES                                 | 4,913,787.0  | 12,306,705.0         | 17,220,492.0        | 297,537,877.0        | -                    | 661,433,403.0        | 500,393.8              | -                       | -                  | 500,393.8           | 0%                     | 263,343,490.5               | -                  | 263,343,490.5        | 40%                    | 263,664,195.9        | -                  | 263,664,195.9        | 40%                     |
|                            | Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES                           | 4,913,787.0  | 12,306,705.0         | 17,220,492.0        | 297,537,877.0        | -                    | 661,433,403.0        | 500,393.8              | -                       | -                  | 500,393.8           | 0%                     | 263,343,490.5               | -                  | 263,343,490.5        | 40%                    | 263,664,195.9        | -                  | 263,664,195.9        | 40%                     |
|                            | SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO                              | -            | -                    | -                   | 1,150,000.0          | -                    | 1,150,000.0          | 67,009.4               | -                       | -                  | 67,009.4            | 6%                     | 255,586.4                   | -                  | 255,586.4            | 22%                    | 717,416.0            | -                  | 717,416.0            | 62%                     |
|                            | Total SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO                        | -            | -                    | -                   | 1,150,000.0          | -                    | 1,150,000.0          | 67,009.4               | -                       | -                  | 67,009.4            | 6%                     | 255,586.4                   | -                  | 255,586.4            | 22%                    | 717,416.0            | -                  | 717,416.0            | 62%                     |



**ANEXO No. 2**

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública – Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025**

| Proyecto                                                                                                                                                                           | Resultado                                                                                                    | Unidad de Medida     | Anual             |                |                | III Trimestre 2025 |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                      | Progra-<br>mación | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución | Progra-<br>mación  | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución |
| Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)                                                                                                                    | Fortalecimiento de Servicios de Salud Materno Infantil                                                       | Informe              | 129               | 146            | 100.0%         | 41                 | 41             | 100.0%         |
| Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán (Acuerdo Donación No 1660400) | Construido el edificio administrativo y del laboratorio con equipo tecnológico y de oficina para el año 2025 | Informe de ejecución | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                                                                    | Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2025                                       | Equipo               | 1                 | 0              | 0.0%           | 1                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                                                                    | Adquirido, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de Salud                     | Equipo               | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
| Programa de construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras (BID 5790/BL-HO)         | Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán                                         | Informe técnico      | 15                | 17             | 100.0%         | 8                  | 8              | 100.0%         |
|                                                                                                                                                                                    | Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa    | Informe técnico      | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025**

| Proyecto                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                                          | Unidad de Medida | Anual             |                |                | III Trimestre 2025 |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                  | Progra-<br>mación | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución | Progra-<br>mación  | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución |
|                                                                                                                                                                                  | Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula                       | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                                                                  | Formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales | Informe          | 55                | 0              | 0.0%           | 15                 | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                                                                  | Reorganizar y fortalecer la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitario de emergencia de los tres hospitales   | Informe          | 7                 | 0              | 0.0%           | 1                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                                                                  | Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025                                                                       | Informe          | 158               | 133            | 84.2%          | 52                 | 52             | 100.0%         |
| Programa de diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (BCIE-2329) | Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.                                                         | Informe de obra  | 21                | 8              | 38.1%          | 6                  | 5              | 83.3%          |
|                                                                                                                                                                                  | Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa                                                               | Informe de obra  | 19                | 6              | 31.6%          | 6                  | 3              | 50.0%          |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025**

| Proyecto                                                                                  | Resultado                                                                                                 | Unidad de Medida | Anual             |                |                | III Trimestre 2025 |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                                           |                                                                                                           |                  | Progra-<br>mación | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución | Progra-<br>mación  | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución |
|                                                                                           | Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales                         | Informe          | 17                | 0              | 0.0%           | 8                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                           | Realizada la gestión de gastos administración del proyecto                                                | Informe          | 75                | 64             | 85.3%          | 18                 | 24             | 100.0%         |
| Proyecto Servicios Esenciales de salud y preparación ante emergencias (RESHAPE) (TF01861) | Fortalecido el sistema de cadena de frío y realizada las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional. | Informe          | 9                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                           | Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y laboratorio de virología nacional                      | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 1                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                           | Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto                                               | Informe          | 6                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                           | Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)                                            | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                           | Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.                       | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025**

| Proyecto                                                                                                                                      | Resultado                                                                                                              | Unidad de Medida | Anual             |                |                | III Trimestre 2025 |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                  | Progra-<br>mación | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución | Progra-<br>mación  | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución |
|                                                                                                                                               | Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional.                                                      | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                               | Fortalecido el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV).                                                   | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                               | Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto                                                            | Informe          | 1                 | 0              | 0.0%           | 0                  | 0              | 0.0%           |
| Proyecto Honduras Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM en Mesoamérica y República Dominicana) (GRT/MM-17339-40-HO)          | Fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos de malaria. | Informe          | 4                 | 1              | 25.0%          | 1                  | 1              | 100.0%         |
|                                                                                                                                               | Fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica de malaria                                       | Informe          | 3                 | 2              | 66.7%          | 1                  | 1              | 100.0%         |
|                                                                                                                                               | Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto.                                                           | Informe          | 3                 | 1              | 33.3%          | 1                  | 1              | 100.0%         |
| Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en | Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL                                                 | Equipo           | 1                 | 0              | 0.0%           | 1                  | 0              | 0.0%           |
|                                                                                                                                               | Adquiridos generadores eléctricos para 5 hospitales                                                                    | Equipo           | 1                 | 0              | 0.0%           | 1                  | 0              | 0.0%           |



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025**

| Proyecto                              | Resultado                                                                                                                                                     | Unidad de Medida | Anual             |                |                | III Trimestre 2025 |                |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                                               |                  | Progra-<br>mación | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución | Progra-<br>mación  | Ejecu-<br>ción | %<br>Ejecución |
| Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO) | Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales de 5 hospitales | Equipo           | 601               | 596            | 99.2%          | 5                  | 0              | 0.0%           |
|                                       | Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2025                                                                                  | Informe          | 80                | 10             | 12.5%          | 18                 | 19             | 100.0%         |

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Proyectos SESAL, 30/09/2025
