



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al I trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Abril, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, la SESAL contó con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L459.7 millones, al término del Primer Trimestre su presupuesto vigente asignado ascendió a L638.0 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 23% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.


Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	459,672,298
Presupuesto Vigente	638,012,885
Devengado I Trimestre-2020	165,237,931
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente)	26%
Devengado Anual	165,237,931
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	26%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	292,436,753
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	46%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

En el primer trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L165.2 millones (26%) a nivel de devengado y L292.4 millones (46%) a nivel de compromisos; producto de la ejecución de cinco proyectos adscritos, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña.

Gráfico No. 01
Secretaría de Salud:
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)

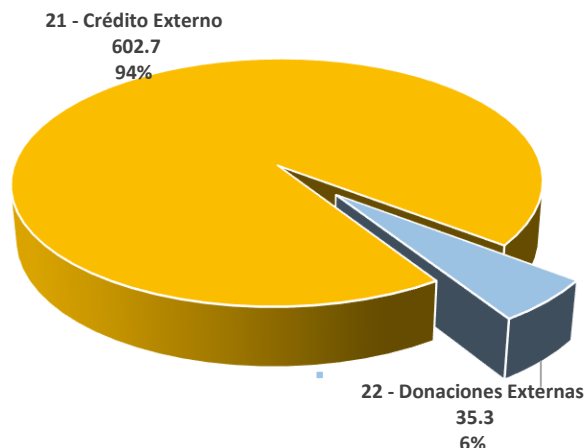

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos provenientes de Convenios de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los cuales, el Crédito Externo representa el 94% (L602.7 millones) y Donaciones externas 6% (L35.3 millones), distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

En forma comparativa al I trimestre del año 2020, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L997.2 millones,

SECRETARIA DE FINANZAS

reportó ejecución en 5% (L.53.8 millones); para el año 2021, la tendencia en ejecución mejora considerablemente (26%), tomando en cuenta las asignaciones para los proyectos que apoyan la emergencia sanitaria y las acciones relacionadas con la contratación de servicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la adquisición de bienes e insumos médicos y de bioseguridad; no obstante la disminución de la asignación presupuestaria en L359.2 millones (36%). Cabe destacar que durante el período en evaluación, el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	US\$	30,000,000	30/12/2016 14/07/2021
		Lempiras	725,871,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2021	46,623,337	48,843,809	8,400,958	17%
Acumulado 2021	46,623,337	48,843,809	8,400,958	17%
Acumulado Vida del Proyecto *	725,871,000	725,871,000	678,444,442	93%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.1957 por US\$1.00

El objetivo del proyecto consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.

El proyecto, tiene focalizado atender a una Población de 414,046 personas, en 7 departamentos y 39 municipios descritos a continuación: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucia); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

SECRETARIA DE FINANZAS

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al I Trimestre del 2021.

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 100% de avance físico al I Trimestre, misma que corresponde a la planificación de ejecución en 10 municipios hasta el mes de julio del año 2021, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel: Garantizar la atención de servicios en 10 municipios priorizados:
 - Publicación para la Educación y Contratación de Gestores.
 - Realizar las adquisiciones de Bienes e Insumos en apoyo a la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria.
 - Desarrollar los procesos de contrataciones de Obras, y Consultorías
 - Recepción de Ofertas de los procesos de Equipo de Cómputo, Insumos de Entomología, Kit de Colvol y Mobiliarios para Centros de Microscopia.
 - En ejecución la Reparación de Insectario Nacional.
 - Finalización de las Impresiones de Materiales educativos de malaria.
- ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel: Firma de 3 convenios de gestión para el segundo nivel de atención:
 - Seguimiento y monitoreo a la continuidad en la prestación de servicios con los Hospitales, Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
 - Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificación Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
 - Firmados los Convenios de prestación de Servicios con los Gestores: Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP), Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC) y Fundación de Apoyo al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela.
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales: Adquisición de Equipo Médico Sistema de Radiografía Digital, Estacionario, Accesorios y Servicios Conexos:
 - Elaboración de Especificaciones Técnicas y NO Objeción del Banco.
 - Elaboración del Documento Base y su Publicación.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría: Contratación e Informe de auditoría del Proyecto:
 - Contratación de la Auditoría con el Tribunal Superior de Cuentos (TSC).

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	30/06/2020 30/01/2022
		Lempiras	1,209,785,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2021	23,299,050	511,527,016	155,231,510	30%
Acumulado 2021	23,299,050	511,527,016	155,231,510	30%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,209,785,000	1,209,785,000	862,540,492	71%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.1957 por US\$1.00

En fecha 30 de junio de 2020, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Convenio Modificatorio a las Operaciones 3815/BL-HO, 4449/BL-HO y 4518/BL-HO mediante el cual se reorientan US\$50.0 millones; con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 4 lotes de equipo médico.
- Fortalecer en un 70% la Red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 2 lotes de equipo médico.
- Celebrar 8 Convenios para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.
- Implementar las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, para atender los pacientes con COVID19, en al menos 90% de las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021 (46 informes de aseguramiento).
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al I Trimestre del 2021.

Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 10 Informes de los Consultores de la Unidad Ejecutora; así mismo, se suscribieron “Adendas de Tiempo” a 45 Convenios con Gestores de primer y segundo nivel; se firmó un nuevo convenio con Leonardo Martínez para habilitación de 50 camas. Se desarrollaron “Adendas de Presupuesto” a 15 Convenios con Gestores de Primer y Segundo Nivel. Adicionalmente, se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:
 - Contratación de la Coordinación del Programa.
 - Equipar sala situacional para vigilancia epidemiológica.
 - Contratación de Consultor para apoyo de procesos técnicos y Administrativos.
 - Contratación de Consultor para el apoyo a la implementación de procesos para el plan de vacunación.
 - Adquisición de Equipo de Computo
- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
 - Elaboración de Contratos de técnicos de la UGD y GESALUD.
 - Definidas Especificaciones Técnicas del equipo e insumos a adquirir equipo de protección personal (EPP).
 - Entrega de 40,800 Mascarillas al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
 - Especificaciones Técnica de EPP para comprar a través de KID COVID (Proceso Publicado).
 - Se firmaron 13 Adendas a Convenios de Primer Nivel para Equipos de Respuestas Rápida (ERR).
 - Contrato adjudicado para el Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Nacional.
 - Publicación del proceso para la adquisición de Equipo de Cómputo y Tablet.
- ✓ Interrupción de la cadena de transmisión:
 - Publicación de Términos de referencia (TdRs) para la Estrategia de Comunicación.
 - Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas para la Consultoría de la Estrategia de Comunicación.
 - Definir TdRs para la Contratación Directa de las materiales de Impresión.
 - Adjudicación y Contratación de la Empresa para la impresión de materiales.
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
 - Elaborado de nuevos Convenios con gestores para atención en el primer y segundo nivel, en lo relacionado con adendas de tiempo y financiamiento.
 - Publicación para la adjudicación y contratación del proceso de Telemedicina.
 - Seleccionada la Empresa Consultora para el proceso de Telemedicina.
 - Elaboración de Especificaciones Técnicas para la adquisición de Ambulancias.
 - Publicado el Documento de licitación internacional para adjudicación de 26 ambulancias.
 - Elaboración de Especificaciones Técnicas del Equipo de Computo a adquirir.
 - Acuerdo Firmado para la Adquisición de la Vacuna COVID.

SECRETARIA DE FINANZAS

- Definida las especificaciones del equipo a adquirir mediante catalogo electrónico.
- ✓ Administración del Programa:
 - Unidad Ejecutora contratada en 100%.
 - Desarrollar procesos para contratación de la Unidad Ejecutora
 - Elaboración de TdRs para la Contratación del Especialista en Gestión Ambiental.
 - Adjudicación al Contrato del Especialista en Gestión Ambiental.

Limitantes en la Ejecución:

- Pocos oferentes o falta de interés de los mismos, afecta el desarrollo normal en los procesos.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	5,000,000		08/09/2020
			120,978,500	07/02/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2021	42,375,354	42,375,354	717,093	2%
Acumulado 2021	42,375,354	42,375,354	717,093	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	120,978,500	120,978,500	717,093	1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.1957 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocotepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al I Trimestre del 2021.

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), se ha realizado la elaboración de especificaciones técnicas para la contratación de Gestores; asimismo, se efectuó el pago de honorarios para consultores de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD).

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Primer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Enero - Diciembre) de ejecución para el Año 2021 y sus correspondientes actualizaciones a los meses de febrero y marzo.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Mediante Nota Técnica No. 05, se procedió a la Incorporación Presupuestaria de Crédito Externo (parcial) para el Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras por L190.4 millones.
- Mediante Memorandos No. DGIP-PROGSEG-037-2021 de fecha 3 de febrero de 2021 y No. DPMF-021-2021 de fecha 25 de enero de 2021 en cumplimiento al Artículo No. 27 del Decreto Legislativo No. 182-2020; se procedió a la Incorporación Presupuestaria de Crédito Externo (parcial) para el Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras por L300.0 millones.
- Mediante Nota Técnica No. 06, se procedió a la Incorporación Presupuestaria de Donaciones Externas, para los Proyectos: “Honduras Salud Mesoamérica (Tercera Operación Individual)” y “Honduras - Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (HIREM en Mesoamérica y República Dominicana)” por L13.9 millones.
- Se llevó a cabo la I Revisión Técnica de Cartera de Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del año 2021.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0002-2021 para la Ampliación al Plazo de Último Desembolso y Ejecución al Contrato de Préstamo BID 3815/BL-HO-2 que apoya la ejecución del Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP), hasta el 30 de septiembre de 2021 y 31 de enero de 2022 respectivamente.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).

Conclusiones

- A partir del mes de febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de

las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.

- Para el Primer Trimestre del año 2021, la ejecución reportada por la SESAL registra un 26% (L165.2 millones) a nivel de devengado en relación al Presupuesto Vigente asignado; considerando los compromisos pendientes de pago al PNUD del año 2020 así mismo el desarrollo de actividades principalmente de apoyo a la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente está en proceso de liquidar saldos en los estados financieros, así como llevando a cabo las actividades finales para su cierre oportuno durante el presente ejercicio fiscal 2021.
- A partir del Año 2021, se inicia la ejecución del Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, el cual será coejecutado por la SEDIS y SESAL, con el cual se pretende ampliar el acceso a los servicios de salud, mediante los Modelos de Gestión Descentralizada.

Recomendaciones

- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
6	Gabinete Social			-	459,672,298	459,672,298	-	638,012,885	638,012,885	-	165,237,931	165,237,931	26	-	165,237,931	165,237,931	26	-	292,436,753	292,436,753	46
6	0060 - Secretaría de Salud			-	459,672,298	459,672,298	-	638,012,885	638,012,885	-	165,237,931	165,237,931	26	-	165,237,931	165,237,931	26	-	292,436,753	292,436,753	46
1	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 31/05/2024	-	326,072,625	326,072,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE			-	326,072,625	326,072,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	4449/BL-HO BID 3815/BL-HO-2 BID 4449/BL-HO-2 BID 4518/BL-HO-3	30/06/2020 31/01/2022	-	-	-	-	11,980,999	11,980,999	-	9,237,120	9,237,120	77	-	9,237,120	9,237,120	77	-	9,237,120	9,237,120	77
				-	-	-	-	138,543,961	138,543,961	-	73,096,256	73,096,256	53	-	73,096,256	73,096,256	53	-	119,581,906	119,581,906	86
				-	-	-	-	144,843,501	144,843,501	-	55,052,415	55,052,415	38	-	55,052,415	55,052,415	38	-	102,282,001	102,282,001	71
				-	23,299,050	23,299,050	-	216,158,555	216,158,555	-	17,845,720	17,845,720	8	-	17,845,720	17,845,720	8	-	43,798,313	43,798,313	20
	Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CC			-	23,299,050	23,299,050	-	511,527,016	511,527,016	-	155,231,510	155,231,510	30	-	155,231,510	155,231,510	30	-	274,899,341	274,899,341	54
3	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 30/06/2021	-	46,623,337	46,623,337	-	48,843,809	48,843,809	-	8,400,958	8,400,958	17	-	8,400,958	8,400,958	17	-	9,330,349	9,330,349	19
	Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN			-	46,623,337	46,623,337	-	48,843,809	48,843,809	-	8,400,958	8,400,958	17	-	8,400,958	8,400,958	17	-	9,330,349	9,330,349	19
4	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 21/05/2021	-	-	-	-	2,641,180	2,641,180	-	382,922	382,922	14	-	382,922	382,922	14	-	384,050	384,050	15
	Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO			-	-	-	-	2,641,180	2,641,180	-	382,922	382,922	14	-	382,922	382,922	14	-	384,050	384,050	15
5	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 30/11/2023	-	21,301,932	21,301,932	-	32,625,526	32,625,526	-	505,448	505,448	2	-	505,448	505,448	2	-	4,897,713	4,897,713	15
	Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA M			-	21,301,932	21,301,932	-	32,625,526	32,625,526	-	505,448	505,448	2	-	505,448	505,448	2	-	4,897,713	4,897,713	15
6	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	BID 5008/BL-HO	08/09/2020 07/02/2025	-	42,375,354	42,375,354	-	42,375,354	42,375,354	-	717,093	717,093	2	-	717,093	717,093	2	-	2,925,300	2,925,300	7
	Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			-	42,375,354	42,375,354	-	42,375,354	42,375,354	-	717,093	717,093	2	-	717,093	717,093	2	-	2,925,300	2,925,300	7

Fuente: SIAFI al 31/03/2021

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	14 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 453,372 personas	Persona	1	0	0%	1	0	0%
	15 - Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Contrato	3	0	0%	1	0	0%
	16 - Equipo de ultrasonidos entregados	Lote de Equipo	2	0	0%	1	0	0%
	17 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	Contrato	15	0	0%	13	0	0%
	18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	4	0	0%	2	0	0%
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	05 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	4	0	0%	1	0	0%
	06 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	07 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Convenio	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	65	0	0%	25	0	0%
	09 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.(4518)	Publicidad	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	11 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	7	0	0%	6	0	0%
	12 - Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, para atender pacientes con Covid 19, en al meno un 90% en las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021	Informe	46	0	0%	0	0	0%
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	15 - Mejorada cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	312	0	0%	117	0	0%
	16 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	Convenio	2	0	0%	2	0	0%
	17 - Mejorado el equipamiento en hospitales seleccionados	Lote de Equipo	3	0	0%	1	0	0%
	18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	3	0	0%	1	0	0%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	20 - Realizadas las Atenciones en preconcepción en embarazos, partos y puerperios	Atención	6	0	0%	1	0	0%
	21 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a gestores.	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	22 - Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados, en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	20	0	0%	15	0	0%
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagnóstico de malaria.	Informe	456	0	0%	114	0	0%

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	07 - Continuidad de consultorías de Personal médico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	Informe	312	0	0%	78	0	0%
	08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	1	0	0%	1	0	0%
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Persona	403,308	0	0%	100,827	0	0%

Fuente: SIAFI, al 31/03/2021
