



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al IV trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Enero, 2022

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	459,672,298
Presupuesto Vigente	1,857,066,176
Devengado IV Trimestre-2021	824,611,169
% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)	44%
Devengado Anual	1,750,641,516
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	94%

Fuente: SIAFI, 31/12/2021


Cifras preliminares

Para el Ejercicio Fiscal 2021, la SESAL contó con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de **L459.7** millones, al Cuarto Trimestre su presupuesto vigente asignado ascendió a **L1,857.0** millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), tomando en cuenta la suscripción de nuevos contratos de crédito principalmente para apoyo a la adquisición de vacunas contra la COVID-19 e incremento de presupuesto para la respuesta inmediata para contener y controlar la COVID-19, mismo que representó el 78.6% del Presupuesto Vigente en el Sector. La ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Al cierre del Año 2021, la SESAL reportó una ejecución presupuestaria acumulada de L1,750.6 millones (94%) a nivel de devengado; producto de la ejecución de siete de los proyectos adscritos, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña; complementariamente para el año 2021, se gestionó la adquisición de vacunas certificadas por las Autoridades Regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los grupos de la población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la covid-19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o más (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con morbilidades y trabajadores esenciales).

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

GRÁFICO NO. 01
SECRETARÍA DE SALUD:
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE
(CIFRAS EN LEMPIRAS)

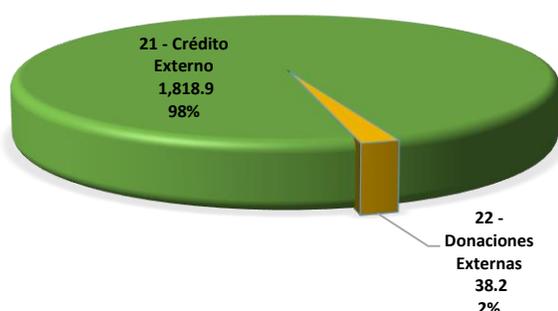

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos provenientes de Convenios de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), Italia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de los cuales, el Crédito Externo representa el 98% (L1,818.9 millones) y Donaciones externas 2% (L38.2 millones), distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

En forma comparativa al IV trimestre del año 2020, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L1,563.7 millones, reportó ejecución en 89% (L.1,392.9 millones); para el cierre del año 2021, la tendencia en ejecución mejora hacia el alza en 6 puntos porcentuales (94%), tomando en cuenta las asignaciones para los proyectos que apoyan la emergencia sanitaria y las acciones relacionadas con la contratación de servicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la adquisición de bienes e insumos médicos y de bioseguridad, convenios de gestión de I y II nivel de atención, cadenas de frío, ambulancias, así como la adquisición de al menos un millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas, entre otros.

Cabe destacar que, durante el período en evaluación, el país continúa en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos en el Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	30,000,000		30/12/2016 31/12/2021
			726,045,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	46,623,337	62,970,952	22,398,573	36%
Acumulado 2021	46,623,337	62,970,952	61,129,416	97%

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	US\$	30,000,000	30/12/2016 31/12/2021
		Lempiras	726,045,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
Acumulado Vida del Proyecto *	726,045,000	726,045,000	731,172,900	100%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00
 Cifras Preliminares

Objetivo del proyecto: consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.

El proyecto, tiene focalizado atender a una Población de 414,046 personas, en 7 departamentos y 39 municipios descritos a continuación: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucia); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Considerando que este proyecto finalizó su ejecución al 31 de diciembre de 2021, (Componente de Salud); por parte de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta los avances para el cierre del proyecto:

Convenios de Gestión para fortalecimiento de servicios de salud:

En el mes de noviembre la Unidad Ejecutora de Proyectos recibió la notificación del Director de País y Representante Legal Plan Internacional Inc. y Plan Honduras, en el cual se informó la devolución de fondos realizada por el Gestor Plan Internacional correspondiente a excedentes de los convenios de gestión de los periodos 2019, en este sentido, GESALUD procedió a realizar ante la Secretaría de Finanzas y resto de instituciones involucradas la devolución de los fondos para que sean acreditados Convenio de Crédito No. 3723/BL-HO, Proyecto "Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente" por valor de L11,369,470.86.

En ese sentido se remitió para No Objeción del Banco las enmiendas a los convenios de gestión de administración de recursos para servicios integrales de Salud de Segundo Nivel de Atención entre la Secretaría de Salud y la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación de apoyo al Hospital San Lorenzo.

Equipamiento para establecimiento de salud y hospitales:

Durante este periodo se logró la adjudicación y recepción de equipo Médico Rayos X fijo e insumos para unidad de radiología en el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato del departamento de Intibucá, dicho equipo tiene un monto \$131,475.00.

Actividades como aporte local a la IREM:

Para apoyo en el incremento de la cobertura y calidad de servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de Malaria (DTI-R), se adquirió kits y equipo de protección para uso de los Colaboradores Voluntarios, adquisición de Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) para detección de casos.

En el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica se compró mobiliario y los insumos para centros de microscopía, mejoramiento de la infraestructura y mantenimiento de bodegas y de la red de laboratorios de microscopía en zonas endémicas; adquisición de equipo de cómputo para la Unidad Vigilancia de la Salud.

Financiamiento al convenio gestión SESAL-CHAI para apoyo a las actividades de la IREM:

Con este financiamiento y a través del gestor se logró contratar 107 RRHH para apoyar en 12 departamentos: 5 médicos, 5 microbiólogos, 39 microscopistas, 15 digitadores, 43 promotores

Además, se financiaron las actividades establecidas en los microplanes de 60 focos (activos y residuales) L. 3,587,575.07 y lo requerido por las 12 Regiones sanitarias y 63 municipios (L. 2,900,000.00) para la supervisión y monitoria de estas actividades. Se apoyó, además, los procesos de capacitación de personal institucional y comunitario, traslado de muestras para control de calidad entre los diferentes niveles.

Administración del Programa:

Con las actividades de cierre y debido a que no se contaba con financiamiento completo para la Unidad Ejecutora; después de verificar el cumplimiento de todos los productos Matriz de Resultados se financió con los remantes la unidad ejecutora por 3 meses en el 2021.

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	50,000,000	14/08/2020 14/08/2022
Lempiras	1,210,075,000			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	23,299,050	500,071,392	10,070,844	2%
Acumulado 2021	23,299,050	500,071,392	468,488,489	94%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,210,075,000	1,210,075,000	1,175,797,471	97%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00
 Cifras Preliminares

Objetivo: contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 4 lotes de equipo médico.
- Fortalecer en un 70% la Red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 2 lotes de equipo médico.
- Celebrar 8 Convenios para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.
- Implementar las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, para atender los pacientes con COVID19, en al menos 90% de las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021 (46 informes de aseguramiento).
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reportó los siguientes avances por componentes:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:

Presentó una ejecución física del 76% de las actividades, con una ejecución financiera del 68%. Los avances al 31 de diciembre sobre las actividades en el fortalecimiento de la conducción de país; en cuales se realizó la contratación de consultorías (un consultores senior y junior, tres desarrolladores, 4 consultorías para soporte de regiones y 13 digitadores), para la estrategia de soluciones digitales en el marco del plan nacional para la respuesta en el cual se desea implementar el expediente clínico electrónico, sistema de referencia y respuesta. También se adquirió equipo para la Sala situacional de la Unidad de Vigilancia de la salud (pantalla interactiva táctil, televisores, sistema de audio, impresora, computadoras portátiles y escritorio, retroproyector entre otros) con un monto de US\$45,830.08,

✓ Detección y seguimiento de los casos:

Contó con ejecución física de 85% de las actividades y financiera en 99%, aquí se financió la conformación de 218 equipos de Respuesta Rápida para el seguimiento de casos en primer nivel de atención a través de firma de convenios de gestión con ONG'S. Además de la adquisición de insumos para 4 laboratorios regionales importantes del país.

En este periodo fue entregada la obra de mejoramiento de la infraestructura y climatización Laboratorio Nacional por un monto de US\$95,924.27, adquisiciones de KIT de pruebas RT-PCR por un monto de \$1,244,831.51, se fortaleció la capacidad diagnóstica en dos laboratorios regionales. Adicionalmente, se adquirió equipo de protección personal beneficiando a 47 unidades de salud de la red de hospitales y para el equipo que realizaron el proceso de vacunación COVID-19 por un monto de \$1,873,394.61.

✓ Interrupción de la cadena de transmisión:

Presenta 95% de avances financiero y 70% físico; en este componente se realizó actividades al apoyo de la ejecución del Plan Nacional de Introducción de la vacuna COVID-19 2020-2021; en cuanto al "Diseño y Producción de la Campaña Promocional" de introducción de la vacuna contra COVID-19 con cobertura a toda población durante 3 meses, impresión de 1,800 ejemplares de Lineamientos de Farmacovigilancia Vacuna Covid-19 para todas las Regiones Sanitarias, Establecimientos de Salud Públicos y no públicos, IHSS, impresión y diseño de 2,000 Lineamientos técnicos y operativos de introducción de la vacuna contra la COVID 19 para todos los establecimientos de salud, impresión de 2 millones de carnet para jornada de vacunación contra covid-19, siendo beneficiados 2 millones de hondureños, diseño e impresión de 300,000 formularios de registro diario y consolidado mensual para la vacuna COVID-19, para la conservación, manejo y distribución de las vacunas COVID-19 se adquirió 371 ítem de equipo de cadena de frío.

✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:

Este componente reporta los mayores avances, con una ejecución física de 87%, y una ejecución financiera de 97.5%. Para el componente de fortalecimiento de la prestación de servicios se firmaron 47 convenios de gestión con 21 Gestores para el manejo de fondos de la emergencia por Covid-19, 26 convenios para el Segundo Nivel de Atención (Hospitales) y 21 convenios para el Primer Nivel de Atención (Regiones) los cuales ya culminaron su ejecución.

SECRETARIA DE FINANZAS

La importancia de este componente es que se logró en el 2020 y 2021 más de 500 personas de salud en primer nivel brindando servicios a pacientes COVID-19, detección y seguimiento de casos, y apoyo en la jornada de vacunas contra la COVID-19, esta última actividad fundamental para descenso acelerado de casos en el país y reducción de la ocupación hospitalaria.

En atención primaria se beneficiaron 164 municipios; los equipos de respuesta rápida visitaron 13,887 comunidades, 769,438 casas visitadas, 1,591,121 de atenciones ambulatorias casa a casa, 204,640 pruebas diagnósticas y 323 referencias realizadas al segundo nivel de atención garantizando atención oportuna.

Además, se adquirió 47 ambulancias y equipo médico para toda la red hospitalaria, actualmente se ha entregado el 50% del equipo; mediante acuerdo con PNUD. Se está adjudicando el proceso de construcción de depósitos (Casetas) para el manejo de residuos en 12 hospitales del país; para el fortalecimiento de manejo ambiental de desechos generados a raíz de la pandemia.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 07/02/2025
		Lempiras	121,007,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	42,375,354	12,278,362	1,766,299	14%
Acumulado 2021	42,375,354	12,278,362	4,219,358	34%
Acumulado Vida del Proyecto *	121,007,500	121,007,500	4,219,358	3%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00
Cifras Preliminares

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Para el cierre del año 2021; la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta para este Programa una ejecución física acumulada 8%, y financiera de 3.6%; las

actividades priorizadas por el equipo técnico de la Unidad de Gestión Descentralizada en este periodo fueron las siguientes:

Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres: Evaluación de ofertas presentadas por los gestores: En proceso de evaluación de las propuestas técnicas de los gestores que expresaron su interés en la gestión de servicios en los 5 Municipios beneficiados con el Programa.

Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad: Diagnóstico de las capacidades técnicas de los ESFAM en AIN-C, Criando con Amor e interculturalidad: Se elaboró e implemento una guía de auto-aplicación para el personal de los establecimientos de salud de los municipios priorizados por el programa.

Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras	BCIE 2271	US\$	35,000,000	14/05/2021 14/11/2022
		Lempiras	847,052,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	-	746,064,146	327,152,128	44%
Acumulado 2021	-	746,064,146	730,882,433	98%
Acumulado Vida del Proyecto *	847,052,500	847,052,500	730,882,433	86%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00
 Cifras Preliminares

Objetivo: contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19, a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.

Para el año 2021 se esperaba adquirir 1,434,768 de vacunas (2 dosis) contra la COVID-19 para una población estimada de 1,434,768 personas a partir del segundo trimestre del 2021, que representan el 30.8% de la población estimada a vacunar por el Gobierno de Honduras (4,662,000 personas) en base a información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI/SESAL).

Para el cierre del año 2021; la Unidad Administradora de Cooperación Externa (UAFCE) reportó los siguientes logros del Programa:

- Se ejecutó \$29,949,946.50 en la compra de vacunas contra la Covid-19, que significa un 89.99%, lo cual **equivale a la compra de 4,399,110 dosis de vacunas**, para ser vacunados un total de 2,199,555 personas con 1er y 2da dosis de Pfizer.
- Transferencia a OPS por un monto de US\$649,694.62.

SECRETARIA DE FINANZAS

En relación al Componente de Asistencia Técnica OPS. Entregados los 2 primeros Informes Bimensuales, a pesar de no contar con la contratación de los 2 supervisores que se reflejan en el PGI. La ejecución total del proyecto asciende a US\$30,432,173.12 al 31/12/2021 de los \$35,000,000.00 equivalente a 86.95%; mismo que incluye un lote programado para el mes de enero de 2022 de 884,128 vacunas.

Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	US\$ 40,000,000 Lempiras 968,060,000
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	-	23,001,120	20,934,397	91%
Acumulado 2021	-	23,001,120	20,934,397	91%
Acumulado Vida del Proyecto *	968,060,000	968,060,000	189,061,881	20%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00

Cifras Preliminares

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con COVID-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frío para los establecimientos de salud priorizados.

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-030-2021, se autoriza a la Secretaría de Finanzas a realizar los procedimientos legales necesarios con el objetivo de efectuar el cambio de organismo ejecutor de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) para Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19, financiado con recursos de la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH) se reporta que la ejecución física y financiera del Proyecto asciende a un 75.6% de avance; mismo que incluye la ejecución previa realizada por parte de INVESTH y las actividades realizadas en SESAL, mismas que se detallan a continuación:

Ejecución INVEST-H: El Financiamiento de los fondos del proyecto IDA-6626-H por un monto de US\$20 millones, ejecutados por parte de INVEST-H al 31 de julio del 2021, asciende a US\$14,266,075.61, que representa un 71% del proyecto, en cuanto a la ejecución física se tiene un avance del 73%.

- Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP) (guantes estériles, guantes no estériles, mascarillas, respiradores N95, gafas protectoras, entre otros). (100% ejecutado)

- Almacenamiento y transporte del EPP de China a Honduras. (100% ejecutado)
- Adquisición de diez rayos X portátiles y diez ultrasonógrafos portátiles. (100% ejecutado)
- Servicios de instalación, capacitación y mantenimiento de los equipos médicos adquiridos a Siemens. (Avance en 70%; Pago pendiente: US\$56,940.14 Empresa Guatemalteca certificada para mantenimiento de equipo Siemens).
- Provisión de equipamiento médico y no médico. Recepción y traslado de Equipo de Protección Personal a los centros estratégicos de distribución y traslado de los bienes a los destinos finales (32 hospitales y 20 regiones sanitarias) priorizadas por la SESAL. (Avance en 85%; Pago pendiente por US\$605,660.0 el cual deberá pagarse tres meses después de la firma del acuerdo contra entrega del primer informe de situación).

Ejecución SESAL:

Las principales actividades realizadas con la intervención de PROSALH en el año 2021 se detallan a continuación:

Técnicas:

- Coordinación con INVEST-H y SESAL; para la elaboración de documento de comunicación oficial a proveedores de la subrogación de derechos y obligaciones de contratos suscritos por INVEST-Honduras a la SESAL, conforme al PCM 030-2021. Dirigido a: UNOPS, Programa Mundial de Alimentos y DISS Guatemala.
- Coordinación con UNOPS y la SESAL, acerca de listado y cantidades de equipo a adquirir a través del contrato suscrito.
- Seguimiento a la entrega de equipo médico y no médico que UNOPS ha entregado a los Hospitales.
- Seguimiento a la empresa DISS Guatemala, acerca del mantenimiento de los 10 equipos de rayos x y 10 ultrasonografos adquiridos.
- Ajuste y adecuación de los documentos de gestión ambiental y social:
 - a. Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS)
 - b. Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)
 - c. Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO)
- Conformación de la UAP-PROSAL, contratación de la Coordinación General, Especialista Financiero, Especialista en Adquisiciones, Especialista en Monitoreo, Especialista en Gestión Ambiental y Social, encargado de servicios generales y personal de apoyo.
- Elaboración del Plan de Adquisiciones del Proyecto y su registro en el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (STEP).

Financieras

- Complemento del 15% del contrato con UNOPS. Este contrato fue suscrito con INVEST-H, se realizó una enmienda de subrogación de derechos.
- Complemento pago DISS-Honduras, empresa contratada por INVEST-H, para el mantenimiento de 10 rayos x y 10 ultrasonografos.
- Pago de las adquisiciones de la UAP-PROSALH: Vehículo, Mobiliario y equipo de oficina, Equipo de Cómputo, entre otros.

SECRETARIA DE FINANZAS

Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 01/10/2023
		Lempiras	1,302,524,730	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	-	464,282,620	429,503,415	93%
Acumulado 2021	-	464,282,620	429,503,415	93%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,302,524,730	1,302,524,730	1,136,812,396	87%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00
 Cifras Preliminares

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Contrato para la adquisición de insumos y reactivos para el procesamiento de las pruebas de detección del COVID-19.
- Contrato para el fortalecimiento de la estrategia de comunicación y adquisición de dos millones de vacunas contra el COVID-19.
- Convenio para la contratación de Gestores para la provisión de servicios de salud a los pacientes con COVID-19.
- Elaboración de 1 informe de administración de fondos para realizar las acciones del proyecto.
- Contratación de recurso humano especializado en apoyo a la SESAL.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), al finalizar el segundo semestre de 2021, el Programa RISP-HO-2 logró culminar todas las condiciones de elegibilidad del contrato modificatorio. Así como establecer mecanismos de comunicación con todas las instancias de la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas que le permitieron la

ejecución administrativa, técnica y financiera en el periodo 2021 presenta avances en la ejecución física de 9 % y financiera de 33%.

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

Se ejecutaron las consultorías para realizar apoyo técnico a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan en la gestión administrativa de servicios de salud en hospitales y regiones mediante convenios de gestión firmados con la SESAL.

- ✓ Componente 2: Detección y seguimiento de los casos:

Se sostuvieron reuniones con la Unidad de vigilancia de la Salud y el Laboratorio Nacional para la planificación de las actividades planteadas en este componente. Además, se realizó el proceso de contratación de la asistencia técnica para el Monitoreo, análisis de tendencia, calidad de dato y análisis de la información que se reporta de la pandemia por COVID-19.

- ✓ Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión:

Pago del anticipo de la vacuna contra COVID-19 mediante mecanismo de compra bilateral con laboratorios fabricante de vacuna mediante extensión de contrato formalizando una enmienda para el mismo el cual recibió no objeción de BID.

- ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

Se fortalecieron los servicios de salud de los triajes, centros de estabilización y hospitales para la atención de pacientes COVID, así como se aseguró la continuidad de la atención esencial en otros servicios de salud.

Con el propósito de garantizar una respuesta eficiente y oportuna al contexto actual de la pandemia, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas decidió el uso de fondos nacionales para la respuesta ante COVID-19 mientras se estaba en proceso de reformulación del préstamo 4713/BL-HO, posterior se solicitó la No Objeción al reembolso de pagos realizados con fondos Nacionales (fuente 11) por la Secretaría de Salud a Gestores I y II Nivel de Atención a ser realizados con fondos del RISP-HO-2, por un monto de US\$13,219,897.26, recibiendo No objeción el 18 de noviembre del 2021.

Para esta operación se contó con el apoyo de ONG's como gestores de servicios de salud de primer y segundo nivel el cual la SESAL suscribió convenios de gestión, siendo un total 17 gestores con 27 convenios para hospitales y 20 convenios para apoyo atención primaria en salud priorizando actividades de atención pacientes covid-19 y vacunación.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Cuarto Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre - diciembre) de ejecución para el Año 2021.

- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo para el Proceso de traspaso Proyecto COVID-19 de INVEST-H a SESAL.
- Apoyo en la gestión para la resolución de Problemas para Adicionar BIP 23888 en UEPEX (Convenio IDA 6626-HN para SESAL).
- Apoyo en la gestión para la resolución de incidencias a nivel de Sistemas – SEFIN, en el traspaso del Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).
- Se emitió Dictamen Técnico No. 063-2021 para la Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes al Programa “Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del servicio, en Honduras” (BID 3815/BL-HO-2, BID 4518/BL-HO-3 y BID 4449/BL-HO-2).

Conclusiones

- Para el Cuarto Trimestre del año 2021, la ejecución reportada por la SESAL registró una ejecución del 94% (L1,750.6 millones) a nivel de devengado en relación al Presupuesto Vigente asignado; considerando principalmente adquisiciones dentro del acuerdo de asistencia técnica con PNUD, pago a Gestores de I y II Nivel de atención y la adquisición de vacunas contra COVID-19, así mismo, la regularización de gastos por equipo recepcionado en el HMEP.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), culmina su ejecución al cierre del 2021.
- A partir del año 2021, se inicia la ejecución del Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, el cual será coejecutado por la SEDIS y SESAL, con el cual se pretende ampliar el acceso a los servicios de salud, mediante los Modelos de Gestión Descentralizada.
- Así mismo, se incorporan a la ejecución el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19, financiado con recursos de crédito externo provenientes del BCIE Convenio 2271 y el Programa de Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) financiado con recursos de crédito externo del BID Contrato 4713/BL-HO.
- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-030-2021, el Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19, financiado con recursos del Acuerdo de Financiamiento del Banco Mundial No.6626-HN debe ser ejecutado por la Secretaría de Salud (SESAL) con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Recomendaciones

- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempias

No.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado IV Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
8	SALUD			-	459,672,298	459,672,298	-	1,857,066,176	1,857,066,176	-	1,750,641,516	1,750,641,516	94%	-	824,611,169	824,611,169	44%
8	0060 - Secretaría de Salud			-	459,672,298	459,672,298	-	1,857,066,176	1,857,066,176	-	1,750,641,516	1,750,641,516	94%	-	824,611,169	824,611,169	44%
1	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	27/02/2007 31/12/2022		-	-		10,200,000	10,200,000		7,703,888	7,703,888	76%			-	0%
2	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL */	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 31/05/2024		326,072,625	326,072,625		-	-				0%			-	0%
3	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	4449/BL-HO	30/06/2020 31/01/2022		-	-		7,804,673	7,804,673		25,312,222	25,312,222	324%			-	0%
		BID 3815/BL-HO-2			-	-		126,831,787	126,831,787		126,457,437	126,457,437	100%		263,465	263,465	0%
		BID 4449/BL-HO-2			-	-		149,019,827	149,019,827		127,997,798	127,997,798	86%			-	0%
		BID 4518/BL-HO-3			23,299,050	23,299,050		216,415,105	216,415,105		188,721,032	188,721,032	87%		9,807,378	9,807,378	5%
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 30/06/2021		46,623,337	46,623,337		62,970,952	62,970,952		61,129,416	61,129,416	97%		22,398,573	22,398,573	36%
5	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 21/05/2021		-	-		13,055,498	13,055,498		12,902,159	12,902,159	99%		10,937,502	10,937,502	84%
6	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 30/11/2023		21,301,932	21,301,932		25,142,086	25,142,086		14,877,961	14,877,961	59%		1,848,011	1,848,011	7%
7	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 07/02/2025		42,375,354	42,375,354		12,278,362	12,278,362		4,219,358	4,219,358	34%		1,766,299	1,766,299	14%
8	029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	14/05/2021 14/11/2022		-	-		746,064,146	746,064,146		730,882,433	730,882,433	98%		327,152,128	327,152,128	44%
9	031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	IDA 6626-HN	15/04/2020 30/04/2023		-	-		23,001,120	23,001,120		20,934,397	20,934,397	91%		20,934,397	20,934,397	91%
		IDA 6868-HN			-	-		-	-		-	-	0%			-	0%
10	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	01/10/2021 01/10/2023		-	-		464,282,620	464,282,620		429,503,415	429,503,415	93%		429,503,415	429,503,415	93%

Fuente: SIAFI al 31/12/2021

*/ Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipo Biomédico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9.	Lote de Equipo	2	0	0%	2	0	0%
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	14 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 453,372 personas	Persona	1	0	0%	0	0	0%
	15 - Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Contrato	3	0	0%	2	0	0%
	16 - Equipo de ultrasonidos entregados	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%
	17 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	Contrato	15	0	0%	0	0	0%
	18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	4	0	0%	0	0	0%
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	05 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	4	0	0%	0	0	0%
	06 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Convenio	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	09 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.(4518)	Publicidad	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
	11 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	7	0	0%	0	0	0%
	12 - Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, para atender pacientes con Covid 19, en al meno un 90% en las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021	Informe	46	0	0%	0	0	0%
	20 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico para atender los pacientes con COVID -19	Informe	20	0	0%	0	0	0%
	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	15 - Mejorada cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	312	0	0%	0	0
16 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención		Convenio	2	0	0%	0	0	0%
17 - Mejorado el equipamiento en hospitales seleccionados		Lote de Equipo	3	0	0%	0	0	0%
18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados		Informe	3	0	0%	0	0	0%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	20 - Realizadas las Atenciones en preconcepción en embarazos, partos y puerperios	Atención	6	0	0%	0	0	0%
	21 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a gestores.	Informe	2	0	0%	0	0	0%
	22 - Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados, en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	21	0	0%	0	0	0%

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagnóstico de malaria.	Informe	456	0	0%	114	0	0%
	07 - Continuidad de consultorías de Personal médico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	1	0	0%	0	0	0%
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Persona	403,308	0	0%	100,827	0	0%
029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	18 - Desarrollada y gestionada administrativamente las actividades para la implementación (adquisición, almacenamiento y procesos de vacunación)	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	19 - Desarrolladas las acciones de monitoreo (verificación de la calidad de las vacunas a adquirir, la capacidad, condiciones de almacenamiento y transporte de las vacunas y Contratada y realizada la auditoria externa	Informe	1	0	0%	0	0	0%
031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	21 - Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	22 - Adquirido equipo medico, no medico , insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales y laboratorios nacionales y regionales	Lote	1	0	0%	1	0	0%
032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	22 - Adquisición de insumos y reactivos para el procesamiento de las pruebas de detección del COVID-19.	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
	23 - Fortalecimiento de la estrategia de comunicación y adquisición de dos millones de vacunas contra el COVID-19.	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
	24 - Contratación de Gestores para la provisión de servicios de salud a los pacientes con COVID-19	Convenio	1	0	0%	1	0	0%
	25 - Administrados los fondos para realizar las acciones del proyecto	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	26 - Contratación de recurso humano especializado en apoyo a la SESAL.	Contrato	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2021
