

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión  
Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL IV TRIMESTRE 2022**

**Secretaría de Agricultura y  
Ganadería  
(SAG)**

Tegucigalpa, Honduras  
Febrero, 2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG) asciende a **L639.1 millones**, representativos del 6.42% del Programa de Inversión Pública 2022 (**L9,951.62 millones**); Dicho monto fue disminuido mediante Nota Técnica No. 7 del 2022, llegando a un presupuesto vigente de 603.9 millones de los cuales se logró ejecutar un monto de **L231.4 millones**; es decir el 38% del presupuesto vigente, de este porcentaje, el 12% se ejecutó durante el cuarto trimestre del año.. Ver cuadro No.1.

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022**  
 Cifras en Lempiras


| Descripción  | Monto       |
|--|-------------|
| Presupuesto Aprobado                                 | 639,066,233 |
| Presupuesto Vigente                                  | 603,878,159 |
| Devengado IV Trimestre-2023                          | 69,723,240  |
| <b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)</b> | <b>12%</b>  |
| Devengado Anual                                      | 231,357,566 |
| <b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>       | <b>38%</b>  |

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

En relación a la representación de la institución con el Sector Desarrollo Productivo es un 12% y en el Sector Riego del 100% de su ejecución Vigente.


#### Financiamiento de la Inversión

**Gráfico No. 1**  
**Financiamiento de la Inversión por Organismo**  
 Cifras en Millones de Lempiras

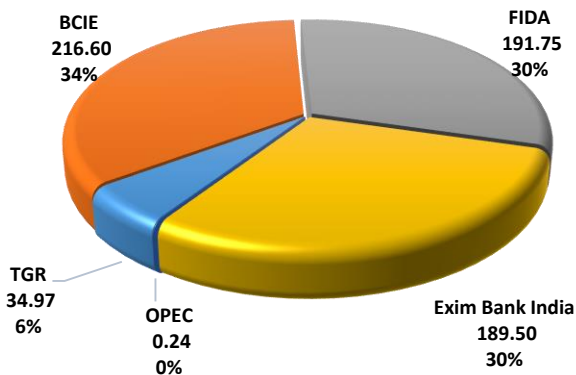

El Presupuesto Vigente del Programa de Inversiones Públicas de la SAG fue financiado en un 94% por recursos de Crédito externo; de los cuales el 34% proviene de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un monto de L216.60 millones, seguido por los fondos Exim Bank – India y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) con una participación del 30% (L189.50 millones) y 30% (L191.75)

respectivamente y L0.24 millones por parte de la OPEC con. Por otra parte, se contó con un monto de L34.97 millones participación del 6% provenientes Fondos del Tesoro Nacional tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

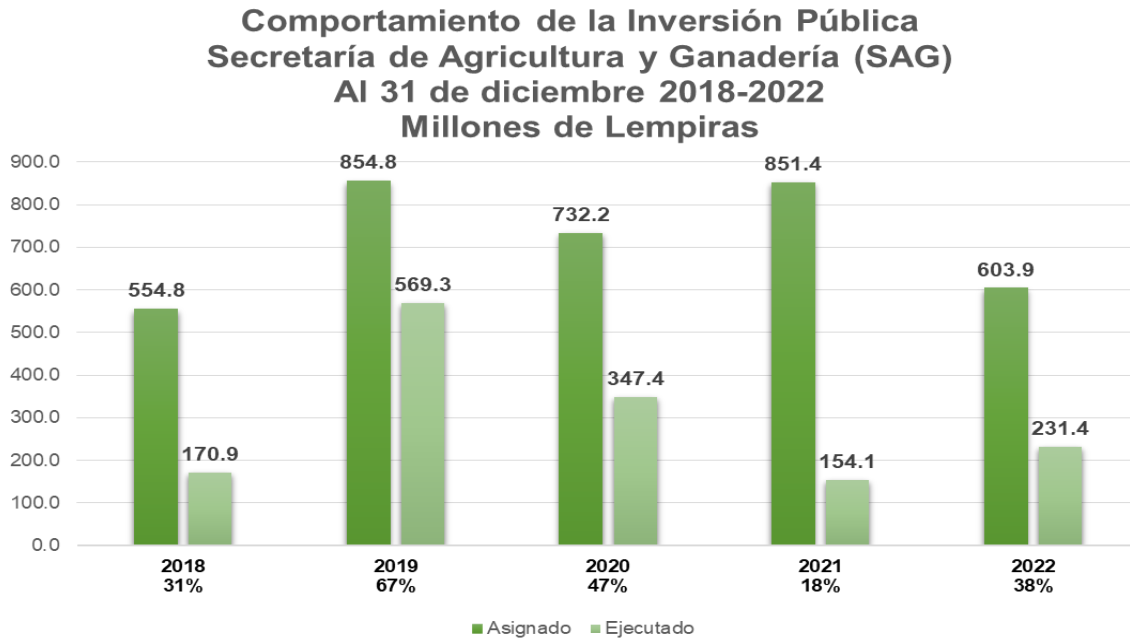**Ejecución histórica 2018-2022**

En el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2022, la SAG ha administrado ocho (8) proyectos de inversión pública que han sido financiados con recursos otorgados por el Exim Bank – India, BCIE, OPEC y FIDA, El Programa de Inversiones Públicas histórico de la SAG en los últimos 5 años presenta bajos porcentajes de ejecución. Lo anterior, debido a que se reestructuró la Unidad de Planificación de la Gestión (UPEG) y personal clave de la administración de los proyectos. Sumado a ello, para el año 2021 producto de los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria, y a que se formuló un presupuesto de inversión muy por encima de lo que la institución podría ejecutar de conformidad a sus capacidades institucionales; se observa que a diciembre 2021 se obtuvo una ejecución 32 puntos porcentuales debajo de lo ejecutado en el 2020, finalizando con una ejecución del 38% al cierre del 2022.

**3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

El Programa de Inversión Pública de la SAG se concentra en 4 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo al Desarrollo Productivo y Riego del país.

## Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)

| Proyecto  | Convenio             | Costo Total del Proyecto |             | Fecha de Inicio - Fin    |
|---|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|   |                      | US\$                     |             |                          |
| 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA | FIDA-I-899-HN<br>GEF | 27,483,100               |             | 03/03/2014<br>31/03/2023 |
|   |                      |                          | 665,132,245 |                          |
| Financiera  |                      |                          |             |                          |
|   | Aprobado             | Vigente                  | Devengado   | % Ejecución              |
| IV Trimestre 2022   | 118,949,002          | 118,949,002              | 12,603,755  | 10.6                     |
| Acumulado 2022  | 118,949,002          | 118,949,002              | 63,893,224  | 53.7                     |
| Acumulado Vida del Proyecto */  | 665,132,245          | 665,132,245              | 445,198,412 | 66.9                     |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cuarto trimestre del 2022, en cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto, se encuentran en la implementación en campo, 51 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes.

Este producto tendrá avance, una vez que los planes de fortalecimiento sean elaborados, implementados y revisados para someter a la aprobación de las organizaciones beneficiarias.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la señora ministra de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico.

Por otra parte, se ha realizado el Establecimiento de sistemas agroforestales iniciando el proceso de adquisiciones, el cual se encuentra en proceso de evaluación de ofertas; asimismo, se realizaron acercamientos con ICF con el que actualmente se trabaja un borrador de acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar reforestaciones con árboles maderables en la zona de La Paz.

## Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

| Proyecto  | Convenio                      | Costo Total del Proyecto |             | Fecha de Inicio - Fin    |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|   |                               | US\$                     | Lempiras    |                          |
| 013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) | LOAN No. 13754P<br>2000002595 | 39,087,574               | 945,977,922 | 01/09/2021<br>01/09/2027 |
|   |                               |                          |             |                          |
| Financiera  |                               |                          |             |                          |
|   | Aprobado                      | Vigente                  | Devengado   | % Ejecución              |
| IV Trimestre 2022   | 86,749,031                    | 73,266,321               |             | 0.0                      |
| Acumulado 2022  | 86,749,031                    | 73,266,321               | 228,487     | 0.3                      |
| Acumulado Vida del Proyecto */  | 945,977,922                   | 945,977,922              | 228,487     | 0.0                      |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En el mes de diciembre, se programó una ejecución que correspondió la priorización de una cadena de valor, el diseño de una campaña de concientización, inversión productiva y capacitaciones brindadas a administradores de las estaciones agroclimáticas.

La ejecución en el mes diciembre corresponde al pago de salario de personal contratada.

## Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

| Proyecto   | Convenio                               | Costo Total del Proyecto |               | Fecha de Inicio - Fin   |
|--|--|--------------------------|---------------|-------------------------|
|  |  | US\$                     | Lempiras      |                         |
| 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) | BCIE-2101<br>PNUD<br>Fondos Nacionales | 55,123,754               | 1,334,077,532 | 12/4/2020<br>31/12/2023 |
|  |  |                          |               |                         |
| Financiera   |  |                          |               |                         |
|  | Aprobado                               | Vigente                  | Devengado     | % Ejecución             |
| IV Trimestre 2022  | 243,867,200                            | 222,161,836              | 53,421,500    | 24.0                    |
| Acumulado 2022   | 243,867,200                            | 222,161,836              | 167,235,855   | 75.3                    |
| Acumulado Vida del Proyecto */                           | 1,334,077,532                          | 1,334,077,532            | 857,491,260   | 64.3                    |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En este período, sigue el proceso de las pruebas de las tuberías en los sub proyectos de Tascalapa y Selguapa, no así en Maralito. Para el proyecto de “Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua”. El avance ha sido mínimo considerando la demora que tomó la firma de la Adenda No. 3 del contratista, pues sin esta no se podía adquirir los compromisos para la adquisición del equipo de riego del proyecto de Joya de Ramos, sin el cual no se puede obtener el permiso para continuar con la instalación de la tubería de la línea de conducción del proyecto de San Sebastián.

Actualmente se cuenta con un avance del 55% realizando avances físicos enresanes, muro de mampostería; muro de gaviones; concreto ciclópeo y el suministro e instalación de 500 mm de tubería en la línea de conducción.

Para el Proyecto “Construcción, Rehabilitación y Modernización Sistema de Riego Selguapa, Comayagua”. se realizaron reuniones con la constructora y supervisora del proyecto, sin que se llegara todavía a un arreglo para el pago de la Estimación de cierre No. 29, a pesar de ello el Acta de Recepción Final, ya fue discutida y aprobada por todas las partes involucradas en el proyecto, por lo que actualmente está en proceso de firma.

### Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de JAMASTRAN FASE 1

| Proyecto   | Convenio         | Costo Total del Proyecto |                  | Fecha de Inicio - Fin    |
|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|  |                  | US\$                     |                  |                          |
| 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1 | EXIM BANK -INDIA | US\$                     | 26,500,000       | 16/06/2016<br>30/08/2022 |
|  |                  | Lempiras                 | 641,339,750      |                          |
| <b>Financiera</b>  |                  |                          |                  |                          |
|  | <b>Aprobado</b>  | <b>Vigente</b>           | <b>Devengado</b> | <b>% Ejecución</b>       |
| IV Trimestre 2022  | 189,501,000      | 189,501,000              | 228,487          | 0.1                      |
| Acumulado 2022   | 189,501,000      | 189,501,000              | 228,487          | 0.1                      |
| Acumulado Vida del Proyecto */   | 641,339,750      | 641,339,750              | 205,514,928      | 32.0                     |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se programaron 20 nuevas instalaciones de estaciones de bombeo y equipamiento en los módulos de riego, que beneficiarían a 68 familias. Esto representa un avance de 50% de la obra para el año 2022. El proyecto se encuentra en proceso de evaluación técnica asimismo existen temas legales en proceso, a espera de resolución del TSC.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones técnicas para agilizar la ejecución de los proyectos
- Acompañamiento físico y financiero a proyectos.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2022.
- Requerimiento de matriz departamental del presupuesto de inversión 2022

### Conclusiones

- La rotación histórica del personal técnico en las unidades ejecutoras de proyectos ha afectado de manera significativa el avance adecuado de los proyectos ejecutados por la institución.

- La supervisión permanente y ejecución de acciones son indispensables conjuntamente con la SEFIN y las áreas Involucradas a fin de que los financiamientos se ejecuten en tiempo y forma para lograr el objetivo de cada uno de los proyectos.
- Es indispensable el proceso de reinicio de actividades del Proyecto Llave en Mano de Infraestructura de Riego en el Valle de Jamastrán; se debe analizar la reorientación de los recursos del proyecto.

### **Recomendaciones**

- Hacer contrataciones efectivas del personal técnico de la unidad ejecutora de los proyectos y evitar su rotación mientras los proyectos no sean finalizados
- Agilizar los procesos para la adecuada ejecución de los proyectos de la institución.
- Se debe contar con un Plan de Acción sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos para un seguimiento puntual y cumplimiento de metas de parte de la Unidad Ejecutora.

**ANEXO**



# SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022  
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto  | Presupuesto Aprobado |                 |             | Presupuesto Vigente |                 |             | Ejecutado (Devengado/Anual) |                 |            |                         | Ejecutado Anual Devengado |                 |                      |             |                         |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|           |   | Fondos Nacionales    | Fondos Externos | Total       | Fondos Nacionales   | Fondos Externos | Total       | Fondos Nacionales           | Fondos Externos | Total      | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales         | Fondos Externos | 21 - Crédito Externo | Total       | % Ejecución (Dev./Vig.) |
| 4         | 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería  | 34,974,001           | 604,092,232     | 639,066,233 | 5,785,927           | 598,092,232     | 603,878,159 | 3,697,985                   | 66,025,255      | 69,723,240 | 11.5%                   | 4,736,492                 | 226,621,074     | 226,621,074          | 231,357,566 | 38.3%                   |
| 1         | Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA             |                      | 118,949,002     | 118,949,002 |                     | 118,949,002     | 118,949,002 |                             | 12,603,755      | 12,603,755 | 10.6%                   |                           | 63,893,224      | 63,893,224           | 63,893,224  | 53.7%                   |
| 2         | Total 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)  | 27,262,801           | 216,604,399     | 243,867,200 | 5,557,437           | 216,604,399     | 222,161,836 | 3,469,498                   | 53,421,500      | 56,890,998 | 25.6%                   | 4,508,005                 | 162,727,850     | 162,727,850          | 167,235,855 | 75.3%                   |
| 3         | Total 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1  |                      | 189,501,000     | 189,501,000 |                     | 189,501,000     | 189,501,000 | 228,487                     | -               | 228,487    | 0.1%                    |                           | -               | -                    | -           | 0.0%                    |
| 4         | 013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) | 7,711,200            | 78,797,831      | 86,509,031  | 228,490             | 72,797,831      | 73,026,321  |                             | -               | -          | 0.0%                    | 228,487                   | -               | -                    | 228,487     | 0.3%                    |

Fuente: SIAFI, 31/12/2022
