

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Desarrollo e Inclusión  
Social  
(SEDIS)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para el año 2022 se le aprobó un monto de L433.4 millones y al cuarto trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L131.3 millones, para la ejecución de tres proyectos enmarcados en el Programa de Inversión Pública (PIP).

Dicho presupuesto es financiado con fondos externos de la siguiente forma: el 16% (L21,129,824) está financiado con fondos del Banco Mundial, el 84% (L108,011,759) con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el 2% (L2,125,000) del Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE), tal y como se indica en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	433,429,973
Presupuesto Vigente	131,266,583
Devengado IV Trimestre-2022	20,846,612
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2022 / Vigente)</b>	<b>16%</b>
Devengado Anual	48,909,999
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>37%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

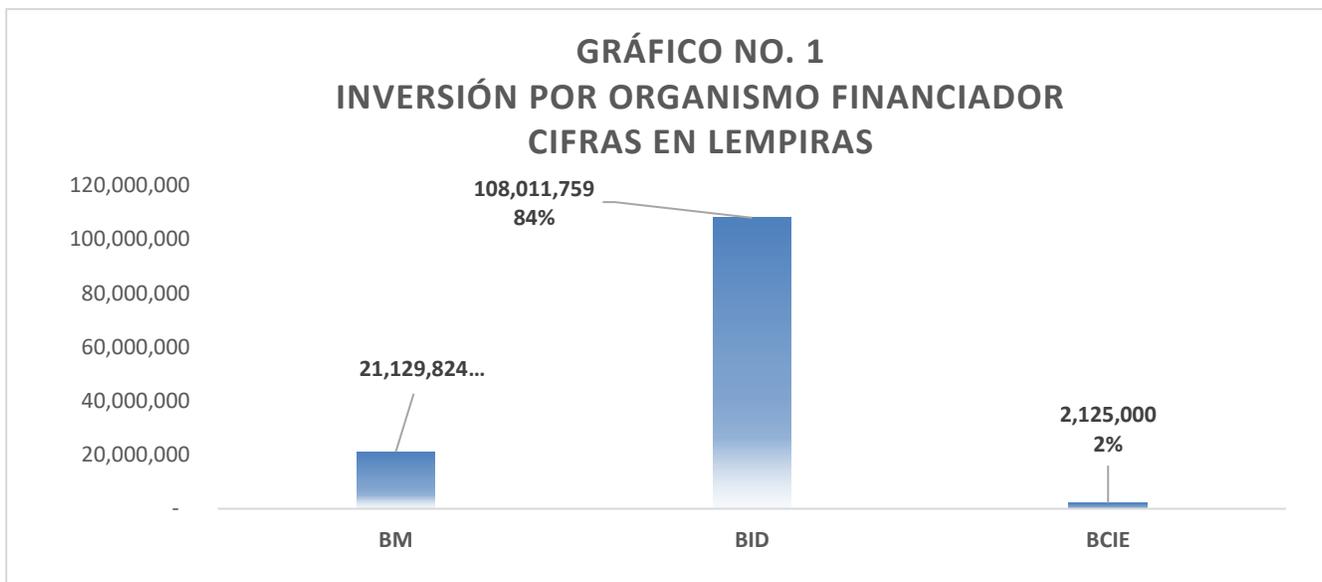

Es importante mencionar que de acuerdo con el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 de fecha 6 de abril de 2022, se suprime la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y se crea la Secretaría de Desarrollo Social y como brazo ejecutor de los proyectos la Red Solidaria, por lo anterior los proyectos se encuentran en proceso de traslado de SEDIS a la Red Solidaria.


En el transcurso del cuarto trimestre, la SEDIS presenta ejecución financiera de L48,910,000, a que representa el 37% del presupuesto vigente. Fondos que fueron utilizados para pago de honorarios profesionales del personal técnico en campo y de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), varias adquisiciones de bienes y publicaciones.

El Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social en este sentido trabajaremos por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone,

## SECRETARÍA DE FINANZAS

como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

### 3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2018-2022):

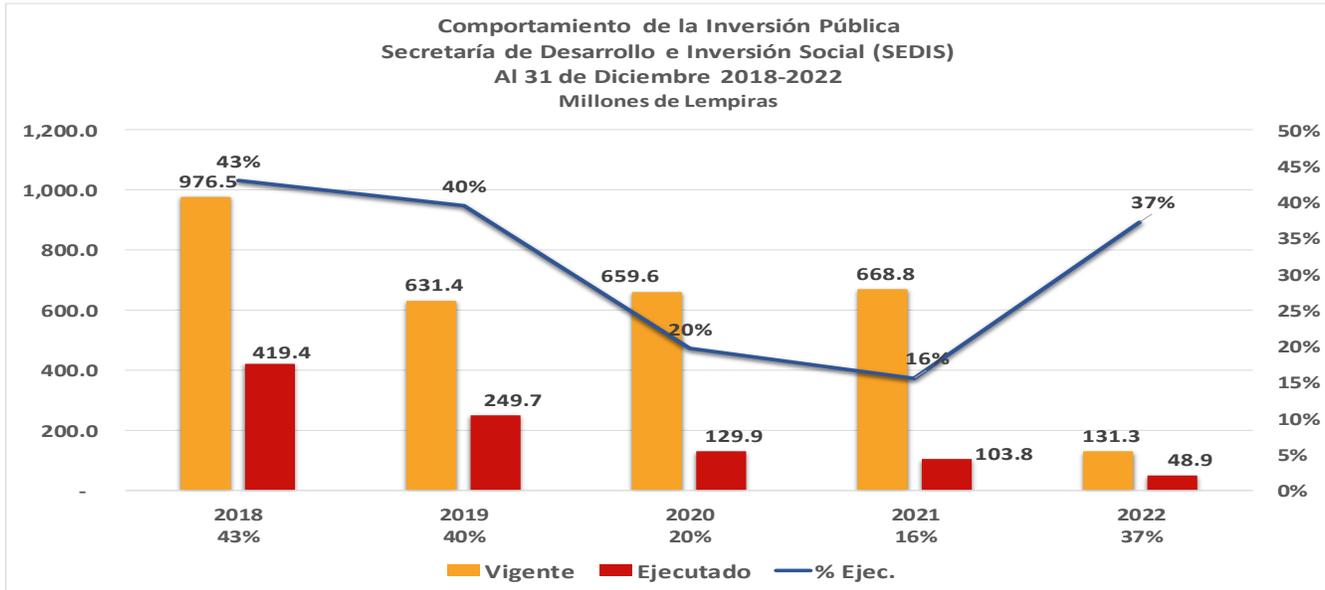

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) en el período comprendido de enero a diciembre de 2018 al 2022 ha administrado nueve (9) proyectos de inversión pública con un promedio de ejecución de L229.2 millones (29.7%), dichos proyectos han sido dirigidos a beneficiar hogares en pobreza extrema, rehabilitación de Centros de Educación Básica, los cuales han sido financiados con recursos otorgados por el BID, BM, BCIE y el Gobierno de Honduras a través de fondos nacionales. En el presente año muestra ejecución de L48.9 millones (37%), únicamente para la ejecución de dos proyectos.

En el Presente año el presupuesto solamente comprende 3 proyectos financiados con fondos del BID, Banco Mundial y BCIE,

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cinco (5) proyectos relevantes que apoyan las Tránsferencias a las familias de extrema pobreza, así como el fortalecimiento de la Secretaría de Salud y Educación, proyectos que son financiados con fondos externos de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Existen 2 Proyectos que no están formulados en el presente año fiscal, debido a que se encontraban en fase de negociación y firma al momento del proceso de formulación de presupuesto 2023-2025, los cuales se trasladarán al Programa de la Red Solidaria.

➤ **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L736,374,000	30/06/2024	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2022	219,495,369	21,129,824	5,115,472	24%
Acumulado 2022	219,495,369	21,129,824	7,948,563	38%
Acumulado Vida del Proyecto*/	736,374,000	736,374,000	317,676,483	43%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7208 por US\$1.00

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Avance físico al IV trimestre de 2022:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, No se realizó entrega de TMC con recursos de esta operación. Al revisar la ruta crítica los tiempos no permitían que se realizará entrega bajo la SEDIS para contar con una liquidación antes del 31 de octubre del 2022 fecha máxima de ejecución del proyecto bajo la SEDIS de acuerdo con el PCM 05-2022 considerando que el sistema de pago de BANADESA, aún no estaba lista para implementarse en producción.

Se encuentra en proceso de emisión contrato modificatorio de cambio de ejecutor, que permita realizar la entrega bajo el PRS.

- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se realizó el pago de honorarios profesionales de las consultorías que apoyan el Sistema de Información Gerencial (SIG), brindan el soporte, mantenimiento e información del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.
- **Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social**, Se efectuó el pago por la adquisición de diez (10) Scanner de alto rendimiento para garantizar la digitalización de los documentos de respaldo de la Ficha Socioeconómica Unica (FSU) del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).
- **Componente Gestión del Proyecto**, se efectuó el pago de la publicación en los diarios de mayor circulación del país de los procesos de adquisición y contratación. Se adquirieron Suministros de Oficina para la operatividad de la UCP, Adquisición insumos de bioseguridad personal UCP y licencias informáticas. De igual manera se realizaron los pagos correspondientes a la Firma Auditora Externa contra entrega de los productos correspondientes al periodo 2021.

SECRETARÍA DE FINANZAS

➤ Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,330,382,360	29/06/2024	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2022	213,934,604	108,011,759	15,731,140	15%
Acumulado 2022	213,934,604	108,011,759	40,961,436	38%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,330,382,360	1,330,382,360	848,211,670	64%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7208 por US\$1.00

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Avance Físico al IV Trimestre 2022:

- **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** Recursos financieros del Subcomponente ejecutado en el año 2021.
- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS:** se efectuó el pago por la adquisición del Hiperconvergente, para el apoyo y fortalecimiento de la Secretaría de Salud. Asimismo, se realizaron los pagos de los honorarios de Gestores Sociales, Asistente Operativo de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas (1), Asesor Legal de la SEDIS y Técnico Administrativo en Género y Diversidad.
- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos:** Se realizó los pagos del personal la Unidad de corresponsabilidad de la Secretaría de Educación.
- **Componente Ordenamiento del Piso de Protección Social:** se realizó el pago de honorarios Consultoría para un Coordinador Técnico Especialista en pobreza y pisos de protección Social Secretaría de Coordinación General de Gobierno Gabinete Social. También, se realizó el pago de la Implementación de Segunda Fase de Modelo de Focalización, a la firma PROSPERIA.
- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** se continuó con los servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), quienes garantizan la operatividad de acuerdo con las actividades de programación, técnica, adquisiciones, fiduciaria y administrativa del Programa. Se asignaron viáticos al personal que realizó las giras para obtener firma de contratos de los Gestores Sociales.

El Proyecto se encuentra en proceso de transición a la Red Solidaria, pendiente respuesta por parte del organismo ejecutor a la solicitud de cambio de ejecutor, contrato modificatorio.

➤ **Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático, (BCIE-2282)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenomenos Naturales producto del Cambio Climático	BCIE-2282	US\$70,000,000	20/08/2021	
		1,694,105,000	15/05/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2021		2,125,000	0.0	0%
Acumulado 2021		2,125,000	0.0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,694,105,000	1,694,105,000	339,813,551	20%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7208 por US\$1.00

Convenio de Crédito firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en fecha 20 de agosto de 2021, por un monto de USD70.0 millones, el objetivo del Programa Mejorar el ingreso, calidad de vida e incentivar la actividad económica local de las familias vulnerables en los territorios a los cuales está dirigido.

Asimismo, el Proyecto se encuentra en proceso de transición a la Red Solidaria, pendiente respuesta por parte del organismo ejecutor a la solicitud de cambio de ejecutor, contrato modificatorio.

Avance Físico al IV Trimestre de 2022:

**Componente 2: Gestión y administración del Programa**, se realizó la incorporación presupuestaria con el objetivo de realizar el pago a la Firma Auditora Externa, quien auditará la entrega del Bono a Familias vulnerables entregado en 2021.

➤ **Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus, (BID 5289/BL-HO)**

Convenio de Crédito firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 20 de agosto de 2021, por un monto de USD45.0 millones, el objetivo de contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los huracanes ETA y IOTA.

Este convenio se trasladó al Programa Red Solidaria, según Acuerdo Ejecutivo PCM-05-2022 de fecha 6 de abril de 2022.

En el mes de diciembre 2022 fue trasladado operativa y financieramente al Programa de Red Solidaria, en la cual presenta ejecución física y financiera.

➤ **Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social (IDA 6918-HN)**

En fecha 17 de diciembre de 2021, se recibió de parte del Banco Mundial, la declaración de efectividad del Programa.

Asimismo, el Proyecto se encuentra en proceso de transición a la Red Solidaria, pendiente

## SECRETARÍA DE FINANZAS

respuesta por parte del organismo ejecutor a la solicitud de cambio de ejecutor, contrato modificatorio, para continuar con el proceso de traslado operativo del mismo a la nueva institución.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento y ejecución de acciones para la transición de los proyectos a la Red Solidaria.
- Solicitud de cuotas de compromiso mensual de fondos externos para cada uno de los proyectos ejecutados por la SEDIS.
- Solicitud de Proyección Mensual de Ejecución del año 2022.
- Seguimiento a las modificaciones presupuestarias.

### Conclusiones

- La SEDIS al cuarto trimestre presenta ejecución física y financiera por un monto de L48,910,000, que representa el 37% del presupuesto vigente.
- La baja ejecución en esta influye varios factores, cambio de autoridades a nivel de gobierno y la Secretaría, traslado de proyectos al Programa Red Solidaria, delegaciones de firmas a nivel interno de la secretaría que atrasa los procesos para los cuales se requiere autorizaciones y firmas.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos.
- Mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 publicado el en Diario Oficial La Gaceta de fecha 6 de abril de 2022, Artículo 21, suprime la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y el Programa Vida Mejor. creando asimismo la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

### Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Crédito Externo	Total	Fondos Nacionales	Crédito Externo	Total	Fondos Nacionales	Crédito Externo	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Crédito Externo	Total	% Ejecución
3	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			433,429,973	433,429,973		131,266,583	131,266,583		20,846,612	20,846,612	15.9%		48,909,999	48,909,999	37.3%
1	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN		219,495,369	219,495,369		21,129,824	21,129,824		5,115,472	5,115,472	24.2%		7,948,563	7,948,563	37.6%
	<b>Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>			<b>219,495,369</b>	<b>219,495,369</b>		<b>21,129,824</b>	<b>21,129,824</b>		<b>5,115,472</b>	<b>5,115,472</b>	<b>24.2%</b>		<b>7,948,563</b>	<b>7,948,563</b>	<b>37.6%</b>
2	022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO		213,934,604	213,934,604		108,011,759	108,011,759		15,731,140	15,731,140	14.6%		40,961,436	40,961,436	37.9%
	<b>Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>			<b>213,934,604</b>	<b>213,934,604</b>		<b>108,011,759</b>	<b>108,011,759</b>		<b>15,731,140</b>	<b>15,731,140</b>	<b>14.6%</b>		<b>40,961,436</b>	<b>40,961,436</b>	<b>37.9%</b>
3	025 - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	BCIE-2282		-	-		2,125,000	2,125,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	<b>Total 025 - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2,125,000</b>	<b>2,125,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
