

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Salud
(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública,
al IV Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	113,937,594
Presupuesto Vigente	904,349,787
Devengado IV Trimestre-2022	118,417,079
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	13%
Devengado Anual	407,449,869
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	45%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.


Para el Ejercicio Fiscal 2022, la SESAL contó con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de **L113.9 millones**, el cual al cierre del mismo ascendió a **L904.3 millones** como Presupuesto Vigente de **L.908.1 millones** dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para contar con la adquisición oportuna de vacunas contra Covid-19, contratación de servicios de salud mediante gestores descentralizados y fortalecer la estrategia para la eliminación de la malaria en el país. Registró ejecución financiera anual del **45%** del Presupuesto Vigente asignado. La ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Al término del año 2022, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria acumulada de L407.4 millones (45%) en relación a su presupuesto vigente; producto de la ejecución reportada en siete de **nueve proyectos adscritos**, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña; mejorar la eficiencia en la gestión en salud mediante medios informáticos, complementariamente se continúa con el despliegue de vacunación contra la covid-19 (edad desde los 6 meses en adelante), Sarampión, Rubeola y Parotiditis (SRP) así como Poliomiélitis en menores de 5 años.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al cuarto trimestre se financia con recursos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Italia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de los cuales, el Crédito Externo representa el 96% (L867.1 millones) y Donaciones externas 4% (L37.3 millones), distribuidos de acuerdo con el Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01
Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

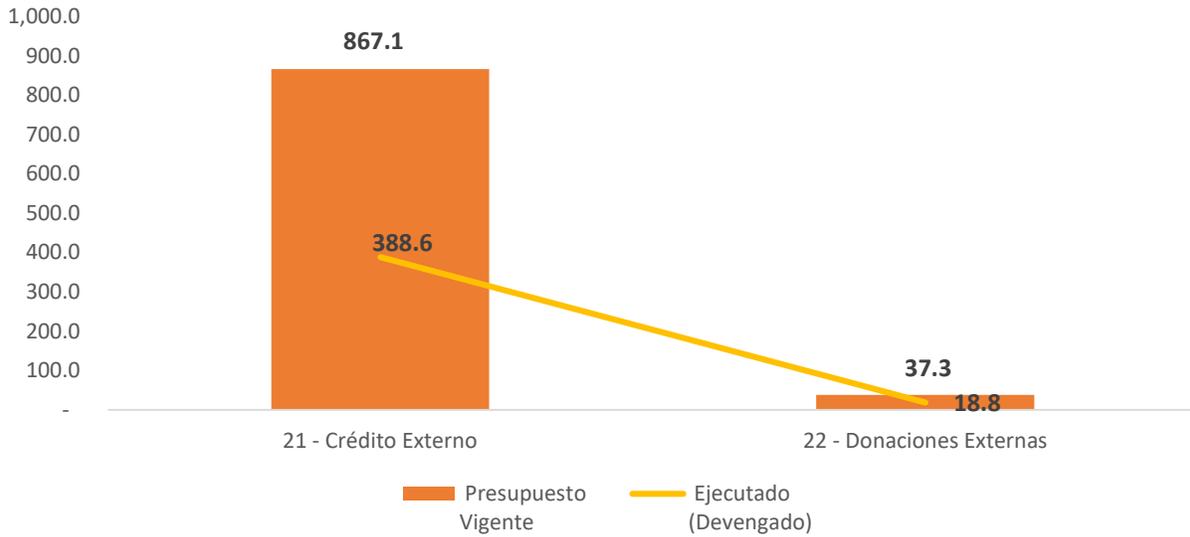

En forma comparativa al IV trimestre del año 2021, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L1,857.0 millones, reportó ejecución en 94.3% (L1,750.6 millones); la tendencia en ejecución refleja un porcentaje menor tomando en cuenta que la asignación para el año 2022 se disminuye en 51.3% (L952.7 millones menos); sumado a esta situación, el proceso por cambio de Gobierno y cambios en las directrices de las nuevas Autoridades Institucionales ha sido la justificación en el desfase en la ejecución de los programas y proyectos; adicionalmente el proceso tardío de las modificaciones presupuestarias tanto a lo interno de la institución como las que dependen de autorización por parte de la SEFIN, otro factor incidente, producto de las nuevas decisiones en las Autoridades es la ejecución de actividades no establecidas (no planificadas) en los POA para el presente ejercicio fiscal y finalmente, el cambio de personal clave afectó las gestiones a lo interno debido al proceso de adaptación y conocimiento a los procesos internos en las instituciones específicamente en la SESAL.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.


3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2018 – 2022):

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 15 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 97.6% con recursos de crédito externo, 1.9% recursos de donación externa y el 0.5% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L5,092.5 millones; reflejando un promedio de ejecución de 81% (L4,136.6 millones) al mes de diciembre de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge la Emergencia Sanitaria por COVID-19 permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, considerando que, para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el PNUD y la OPS.

Gráfico No.2
Comportamiento de la Inversión Pública
 (Secretaría de Salud)
 Al 31 de diciembre 2018-2022
 Millones de Lempiras

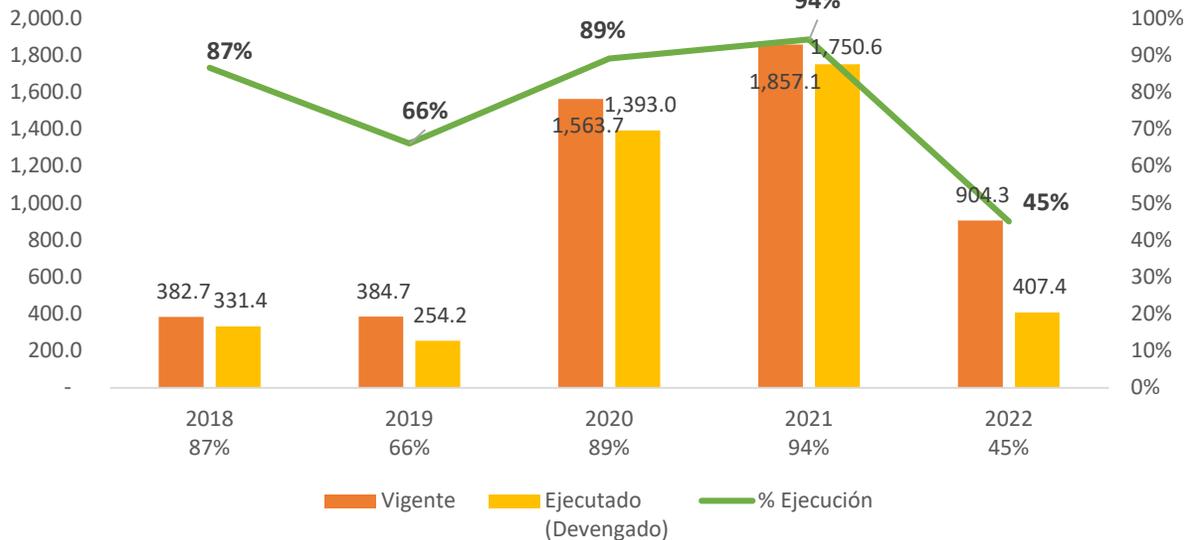

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	14/08/2020 28/11/2023
		Lempiras	1,236,684,524	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	3,591,822	25,141,824	4,637,971	18.4%
Acumulado 2022	3,591,822	25,141,824	8,911,096	35.4%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,236,684,524	1,236,684,524	1,184,708,567	95.8%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2022 (BCH): L24.7337 por US\$1.00

Objetivo: contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, a través de informes de avance de consultorías (23 contratos).
- Celebrar 1 Convenio para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta que Programa presenta avance físico del 89% y avance financiero del 98%, detallando su ejecución por componentes:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:

Las actividades para el fortalecimiento de la conducción de país; se realizaron los pagos de honorarios profesionales de las consultorías siguientes: consultoría para tres desarrolladores en apoyo a la estrategia para la conducción de respuesta (pago de honorarios octubre a diciembre) y pago final a la consultoría senior (entrega de tres productos finales).

✓ Detección y seguimiento de los casos:

Para el cuarto trimestre del año no se reporta ejecución física; debido, a que el proceso de adquisición de reactivos en apoyo al Laboratorio Nacional se realizó, sin embargo, los oferentes no lograron acreditar su representación exclusiva en el país, por lo cual no pudo concluir el proceso.

✓ Interrupción de la cadena de transmisión:

Para el cuarto trimestre del año no se reporta ejecución física; debido a que el proceso para la consultoría para la Violencia Contra la Mujer (VCM) fue fracasado; al cierre del 2022 se inició un nuevo proceso del cual se encuentra en evaluación de hojas de vida de los ofertantes.

✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:

Se realizó el segundo y tercer pago a la empresa COVADI por la construcción de 12 casetas para el manejo de desechos en hospitales priorizados.

Logros del Proyecto en el año 2022:

Construcción de 12 depósitos para almacenamiento de desechos hospitalarios en los Hospitales: Hospital Escuela Universitario (2), Hospital General San Felipe, Instituto Nacional Cardiopulmonar “El Tórax”, Hospital General Atlántida, Hospital de Tela, Hospital El Progreso, Hospital Manuel de Jesús Subirana, Hospital de Puerto Cortés, Hospital San Isidro, Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Hospital Juan Manuel Gálvez.

Equipamiento de los establecimientos de salud: con 47 ambulancias (21 para el I Nivel y 26 para el II Nivel), y los Hospitales del país con: 83 Aspirador de secreciones, 522 Bombas de Infusión, 60 Camas eléctricas de hospital de múltiples posiciones, 71 Camas de Cuidados Intensivos, 72 Camilla de transporte hidráulica/neumática, 60 Carros de Emergencia, 60 Desfibriladores, 48 Electrocardiógrafos, 15 Monitores de Signos Vitales, 35 Monitores de Signos Vitales Avanzado, 219 Monitores de Signos Vitales Básico/Intermedios, 14 Rayos X móvil, 14 Estaciones de trabajo para Rayos X móvil, 200 Silla de Ruedas, 6 Sistemas de video laringoscopio con monitor, 30 Ultra sonógrafos, 27 Incubadora Neonatal de Cuidado Intensivo, 7 Plantas eléctricas, 255 Camas mecánicas, 2 Electrocardiógrafos, 5 Impresoras Digitales, 3 Incubadoras de Transporte, 46 Incubadoras neonatales de cielo abierto, 4 Lámparas de Fototerapia, 15 Sondas endocavitarias para Ultrasonidos, 2 Ultrasonidos, 1 Autoclave, vapor, hospitalario 150L, 6 Lavadoras Industriales de Uso Hospitalario, 6 Rayos X móvil, 6 Estaciones de trabajo para Rayos X móvil, 5 Rayos X, estacionario, digital, 10 Camillas Hidráulicas, 30 Carros rojo de emergencia, entre otros.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 11/12/2024
		Lempiras	123,668,452	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	33,119,323	36,909,200	1,687,936	4.6%
Acumulado 2022	33,119,323	36,909,200	6,954,872	18.8%
Acumulado Vida del Proyecto *	123,668,452	123,668,452	11,174,230	9.0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2022 (BCH): L24.7337 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 111 municipios, en intervenciones de 20 trimestralmente.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta:

Pago parcial de servicio de alquiler de oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD).

Pagos de honorarios profesionales de seis consultorías en apoyo a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), viáticos y alimentación al personal que participó en el Taller Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) para el análisis del alcance de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) en Lempira (Gracias), Intibucá (La Esperanza), Copán y La Paz.

Este proyecto reporta desfase en la ejecución principalmente por las siguientes razones:

- No se logró avanzar la contratación de gestores para los 5 municipios priorizados (a la espera de toma de decisión de las autoridades SESAL).
- No se cuenta con definición para los términos de referencia de consultoría Desarrollo de los estudios para el desarrollo de módulos de promoción de buenas prácticas tradicionales en Salud Materno Infantil.
- A la espera de toma de decisión de las autoridades SESAL para definir el modelo de ejecución para los 5 municipios, que permita continuar con el proceso de adquisición de Micronutrientes, Equipo de ultrasonido y equipo médico priorizado.

Logros del Proyecto en el año 2022:

Fortalecidos los ESFAM de los 52 municipios priorizados fortalecidos con 3 talleres en los Departamentos de La Paz, Intibucá y Copán.

Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras	BCIE 2271	US\$	35,000,000	14/05/2021 14/11/2022
		Lempiras	865,679,167	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	45,351,702	45,351,702	538,516	1.2%
Acumulado 2022	45,351,702	45,351,702	538,516	1.2%
Acumulado Vida del Proyecto *	865,679,167	865,679,167	731,420,950	84.5%

Nota: Mediante Oficio No.1776-SS-2022 de fecha 15/06/2022; la SESAL solicita el cese de desembolsos para el Contrato de Préstamo No. 2271 con el BCIE, con relación al proyecto de inversión.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2022 (BCH): L24.7337 por US\$1.00

Objetivo: contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19, a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Adquisición de **130,368 dosis** de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el Plan de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19.
- Elaborar 4 informes de administración y ejecución del Proyecto.
- Contratar la Auditoría y supervisión externa del Proyecto.

Por disposiciones de las Autoridades de la SESAL se determinó cancelar los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo BCIE 2271, por un monto estimado de US\$4.3 millones; en vista que los recursos ya no serían requeridos para la adquisición de vacunas y que el uso de estos de acuerdo con el contrato suscrito únicamente puede ser utilizados para dicho fin. Por otra parte, la Autoridad ha gestionado la obtención de vacunas mediante otras cooperaciones en calidad de donación.

Al cuarto trimestre, se registró el pago a Horwath Central America, S.deR.L. de C.V. correspondiente al del **Contrato de Auditoría externa de los estados financieros**, revisión operativa del Programa y cumplimiento contractual del mismo.

Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	US\$
		Lempiras	989,347,619	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	-	293,225,691	96,898,856	33.0%
Acumulado 2022	-	293,225,691	108,380,917	37.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	989,347,619	989,347,619	472,556,693	47.8%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2022 (BCH): L24.7337 por US\$1.00

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frio para los establecimientos de salud priorizados.

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Realizar 15 procesos de licitación para la adquisición de equipo y mobiliario médico para los Hospitales, Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional.
- Elaborar 9 informes de administración, Gastos Operativos, Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.

Durante el primer semestre del 2022; se realizaron acciones conjuntas SESAL-PROSALH y SEFIN, para la identificación de espacio presupuestario para la ejecución; mismo que fue identificado mediante Notas Técnicas No.001-2022 y 004-2022 para el traslado de espacio presupuestario parcial por un monto de L293.2 millones para honrar pagos que no pudieron ser efectuados durante el año 2021, debido al desfase relacionado al proceso de traslado de INVESTH a SESAL, en cumplimiento al PCM-030-2021; actividad que también impactó en no poder formular dicho proyecto para el año 2022.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH), las principales actividades realizadas se resumen a continuación:

Al cuarto trimestre el proceso de contratación del personal del despliegue de vacunación concretó recurso humano de **530 personas** (16 coordinadores de regionales, 15 supervisores de personal en campo, 9 técnicos logísticos, 14 transcritores de datos, 9 guardalmacén, 29 buscador/a y 438 vacunadores/as).

Al cierre del 2022, se ha llegado a los municipios con más bajo nivel de cobertura en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, alcanzándose alrededor de **192,972 personas** de las cuáles aceptaron vacunarse, 127,409 con un rechazo del 24.4% y un 9.6% que ya se encontraban con el esquema completo o su próxima dosis correspondía a una fecha diferente al momento de la visita.

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

Convenio IDA-6626-HN:

1. Adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso; los bienes ya se encuentran embarcados y se espera la llegada al País para el 04 de febrero 2023.
2. Adquisición de 71 monitores de signos vitales; los bienes se encuentran en proceso de fabricación se espera que los mismos ingresen al País en marzo 2023.
3. Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19 (continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023)
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%)

Convenio IDA-6868-HN:

1. Personal de Despliegue y aplicación del Despliegue (contratación de 430 personas); continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023.
2. Adquisición de 650 mil jeringas; 120 mil de cajas de seguridad y 300 set de destructores de agujas; En proceso de embarque de china al Honduras.
3. Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19; (Shifo Foundation).
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$46,287.78)
5. Adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19; En proceso de fabricación y entrega.
6. Adquisición de camisetas, carnet, gorras, chalecos para el proceso de despliegue; En proceso de fabricación y entrega.
7. Contratación de consultor para el diseño e implementación de la página web del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19).
8. Insumos y materiales para el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI); En proceso de impresión y entrega.
9. Actividades para movilización en seguimiento al despliegue de aplicación de vacunas (servicio de transporte, viáticos)

Logros del Proyecto en el año 2022:

- 90.8% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.

- 59% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,405,645; Población 2da dosis: 5,675,207).
- Laboratorios designados con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
- 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.
- 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.

Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 01/10/2023
		Lempiras	1,331,167,221	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	-	462,428,545	5,521,004	1.2%
Acumulado 2022	-	462,428,545	263,846,539	57.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,331,167,221	1,331,167,221	693,349,954	52.1%

Presupuesto Aprobado (Año 2022) fue formulado en AEPASH, traslado presupuestario a SESAL en cumplimiento al PCM-092-2021

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2022 (BCH): L24.7337 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Considerando que las directrices de reorientación de los recursos y la formulación del nuevo proyecto se realizaron posterior a la fecha de formulación presupuestaria 2022; la asignación quedó registrada bajo el presupuesto de AEPAS H, por lo que durante el primer trimestre se iniciaron las acciones de traslado de espacio presupuestario entre Instituciones, correspondiente al Convenio BID 4713/BL-HO.

Avance Físico: Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2022 (12 informes programados).
- Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2022 (1 informes programado).
- 5 contratos para la implementación de la estrategia de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población.
- 1 Convenio de Gestión para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales.
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **22%** y financiero del **51%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

Pago de 3 consultoras en apoyo a las intervenciones del Programa, para apoyo financiero y monitoreo (octubre a diciembre).

Se reporta no ejecución del 50% de la meta programada debido a que no se dio al proceso de contratación de Técnicos en monitoreo para Departamento de Primer y Segundo Nivel de Atención de la SESAL (las autoridades no aprobaron el proceso).

- ✓ Componente 2: Detección y seguimiento de casos:

Se realizó la adquisición de equipo para mejoramiento de la red interna de la SESAL.

Se presentó desfases considerando:

- Proceso para la adquisición de reactivos para la detección de Covid-19 fue cancelado, a petición del Banco se envió solicitud a los proveedores para cada uno de los tipos de reactivos que acreditaran su representación exclusiva en el país, la cual no lograron acreditar en tiempo.
- No se inició el proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo para sistema de información y mejorar conectividad de hospitales y regiones, esto debido a que no se recibió solicitud de este por parte de la Unidad de Gestión de la Información (UGI).
- No se inició el proceso para la adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL, debido a que no se recibió solicitud, por parte de la UGI, para dar inicio al proceso

- ✓ Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión:

Pendiente un último desembolso a la enmienda para la adquisición de Vacunas de Pfizer, ya que no se realizó requerimiento.

Se inició el proceso de la adquisición de 2 Generadores Eléctricos y un banco de transformadores para almacenes de biológicos, pero se detectó que las especificaciones técnicas no estaban claras, por lo que la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) se encargó de revisarlas y ajustarlas.

Contratación de firma consultora para elaboración de Diseños de Cinco Hospitales (no se han definido los términos de referencia para esta consultoría).

✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

Se realizó el pago (octubre a diciembre) a la consultoría en apoyo a los procesos de Control Interno con los Gestores, así mismo el pago de recurso humano en apoyo a los hospitales.

Se presentó desfases considerando:

- Que el proceso de construcción de las Dos (2) salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19. La UTGP realizó ajustes a las especificaciones técnicas ya que estaban para la construcción de un hospital y no para salas.
- Este proceso de Contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata en el marco de la Pandemia COVID-19 está en elaboración de informes de evaluaciones para ser enviados a No Objeción del Banco. Se inició el para la contratación de Ingenieros Biomédicos, Sistemas, Civiles y Consultor en Infraestructura Hospitalaria (se envió a No Objeción del Banco el PEP con esta actividad nueva).
- Pendiente la Contratación de personal de apoyo.
- Equipamiento de Hospitales /Equipo Médico para Hospital Escuela. A la espera que se definan los TDR para esta consultoría (actividad nueva de fondos remanentes).
- Contratación de firma para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria.
- Pendiente la Contratación de consultoría para proceso de telemedicina, esto debido a que se está a la espera que se defina la consultoría pagada con el proyecto RISP-HO, y definir si se continúa con este modelo.

✓ Componente 5: Administración del programa:

Se realizaron los pagos correspondientes a 13 consultores para GESALUD en apoyo a las actividades del Programa; servicios públicos, viáticos para gira en apoyo a las intervenciones del RISP-HO-2; así mismo se contrató dos consultores en apoyo a las actividades de la UGI. Se recibieron dos productos de la consultoría de Gestión Ambiental.

En cuanto al proceso de Evaluación Operativa del Programa, no se logró adjudicar la consultoría para la evaluación del Programa (etapa de evaluación de ofertas). La revisión de trabajo de Aseguramiento Razonable. Se han realizado ajustes a los TDR para esta consultoría.

El proceso de Auditoría del Programa. Se está a la espera por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) del convenio firmado.

Logros del Proyecto en el año 2022:

- Adquisición de 1,788,930 de vacunas para adultos contra la Covid-19 a la empresa Pfizer para beneficio de la población hondureña.

- Fortalecida la Red de internet del Despacho de la SESAL
- Contratación de un Consultor para el Fortalecimiento a los Gestores en temas de control interno, logrando capacitar a los Gestores en temas de liquidación de fondos y control de procesos administrativos, adquisiciones y Control Interno.
- Proceso para la Contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata en el marco de la Pandemia COVID-19 para la atención de pacientes COVID-19 en la Red Hospitalaria del País: 7 ayudantes de enfermería, Un Médico Especialista en Pediatría, 3 microbiólogos, 2 técnicos en Laboratorio, 1 técnico en Anestesiología.
- Contratada la consultoría para la Asistencia Técnica para la implementación de los Planes de Gestión Ambiental, logrando la socialización de los planes en los Establecimientos de Salud de I y II Nivel de Atención

3.3.1 INVERSIÓN SOCIAL

Para el año 2022 la SESAL ejecutó otras inversiones de carácter social por L1,982.3 millones, registrando una ejecución financiera del 53.8% (L1,018.7 millones) destinados principalmente a la adquisición de vacunas contra covid-19 y otras patologías.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre - diciembre) de ejecución para el Año 2022.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0033-2022 para la Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes al Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO) Convenio BID 4518/BL-HO-3.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre del año 2022, la ejecución reportada por la SESAL registró una ejecución a nivel de devengado del 45% (L407.4 millones) en relación al Presupuesto Vigente asignado; cabe señalar que la baja ejecución se ha visto afectada por el proceso por cambio de Gobierno y cambios en las directrices de las nuevas Autoridades Institucionales; adicionalmente la el proceso tardío de las modificaciones presupuestarias tanto a lo interno de la institución como las que dependen de autorización por parte de la SEFIN, otro factor incidente, producto de las nuevas decisiones en las Autoridades es la ejecución de actividades no establecidas (no planificadas) en los

POA del año 2022 finalmente, el cambio de personal clave afecto la gestión interna y el proceso de adaptación a los procesos internos en las instituciones.

- Al inicio del año 2022, las Unidades Ejecutoras de la SESAL ingresaron requerimientos para incorporación presupuestaria por alrededor de L.1,220.2 millones (tanto de crédito externo, cómo de donaciones externas), de las cuales se identificó espacio presupuestario parcial mediante Notas Técnicas 001-2022, 003-2022, 004-2022 y 007-2022.
- En relación con la asignación para el Proyecto Reequipamiento Biomédico del Hospital Maria de Especialidades Pediátricas (HMEP), no reportó regularización para el año 2022; sin justificación por parte de la Unidad Ejecutora.
- El Proyecto Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras (BCIE 2271), una vez finalizado el proceso de auditoría externa de los estados financieros, revisión operativa; deberá presentar los correspondientes informes de cierre del proyecto.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
9	0060 - Secretaría de Salud		-	113,937,594.00	113,937,594.00	-	904,349,787.00	904,349,787.00	-	118,417,079.39	118,417,079.39	13.1%	-	407,449,869.22	407,449,869.22	45.1%
1	019 - HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total 019 - HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)		-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
2	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID -	BID 3815/BL-HO-2 BID 4518/BL-HO-3	-	3,591,822.00	3,591,822.00	-	25,043,301.00	25,043,301.00	-	4,637,971.31	4,637,971.31	18.5%	-	8,813,941.24	8,813,941.24	35.2%
	Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID -		-	3,591,822.00	3,591,822.00	-	25,141,824.00	25,141,824.00	-	4,637,971.31	4,637,971.31	18.4%	-	8,911,095.74	8,911,095.74	35.4%
3	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	-	-	-	-	2,439,457.00	2,439,457.00	-	-	-	0.0%	-	2,384,331.80	2,384,331.80	97.7%
	Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO		-	-	-	-	2,439,457.00	2,439,457.00	-	-	-	0.0%	-	2,384,331.80	2,384,331.80	97.7%
4	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	GRT/MM-17339-40-HO	-	24,222,016.00	24,222,016.00	-	27,200,637.00	27,200,637.00	-	9,132,796.02	9,132,796.02	33.6%	-	16,433,597.59	16,433,597.59	60.4%
	Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA		-	24,222,016.00	24,222,016.00	-	27,200,637.00	27,200,637.00	-	9,132,796.02	9,132,796.02	33.6%	-	16,433,597.59	16,433,597.59	60.4%
5	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	33,119,323.00	33,119,323.00	-	36,909,200.00	36,909,200.00	-	1,687,936.05	1,687,936.05	4.6%	-	6,954,872.03	6,954,872.03	18.8%
	Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		-	33,119,323.00	33,119,323.00	-	36,909,200.00	36,909,200.00	-	1,687,936.05	1,687,936.05	4.6%	-	6,954,872.03	6,954,872.03	18.8%
6	029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	-	45,351,702.00	45,351,702.00	-	45,351,702.00	45,351,702.00	-	538,516.26	538,516.26	1.2%	-	538,516.26	538,516.26	1.2%
	Total 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS		-	45,351,702.00	45,351,702.00	-	45,351,702.00	45,351,702.00	-	538,516.26	538,516.26	1.2%	-	538,516.26	538,516.26	1.2%
7	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	-	7,652,731.00	7,652,731.00	-	7,652,731.00	7,652,731.00	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total 030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS		-	7,652,731.00	7,652,731.00	-	7,652,731.00	7,652,731.00	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
8	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	-	-	-	-	130,760,513.00	130,760,513.00	-	14,600,444.12	14,600,444.12	11.2%	-	25,129,611.28	25,129,611.28	19.2%
	Total 031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19		-	-	-	-	162,465,178.00	162,465,178.00	-	82,298,411.47	82,298,411.47	50.7%	-	83,251,305.22	83,251,305.22	51.2%
9	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	-	-	-	-	462,428,545.00	462,428,545.00	-	5,521,004.16	5,521,004.16	1.2%	-	263,846,539.30	263,846,539.30	57.1%
	Total 032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)		-	-	-	-	462,428,545.00	462,428,545.00	-	5,521,004.16	5,521,004.16	1.2%	-	263,846,539.30	263,846,539.30	57.1%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2022			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Secretaría de Salud	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipadas las salas de quirófano, otorrinolaringología, cirugía, cuidados intensivos, sala de imagenología, entre otras con equipo biomédico especializado en el HMEP	Lote de Equipo	2	0	0	2	0	0	
		08 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Informe	56	0	0	0	0	0	
		09 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Informe	7	0	0	0	0	0	
		10 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	19	0	0	0	0	0	
		17 - Fortalecida la Red de diagnostico notificacion, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Informe	4	0	0	0	0	0	
		18 - Realizada la Implementacion de la Estrategia de comunicacion a traves del diseño de materiales infograficos para la promocion de conductas y habitos saludables en la poblacion, que garantice la accesibilidad de la informacion a la poblacion diversa y capacitacion de normas y lineamientos al personal de salud.	Informe	4	0	0	0	0	0	
		19 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Informe	1	0	0	0	0	0	
		026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	12 - Realizadas las Atenciones en preconcepción en embarazos, partos, puerperios, tamizaje cáncer cervicouterino y planificación familiar	Informe	6	0	0	0	0	0
			13 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y realizado el acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a los gestores del primer y segundo nivel de atención.	Informe	3	0	0	0	0	0
	14 - Realizadas las gestiones administrativas y proceso de cierre del proyecto		Informe	8	0	0	0	0	0	
	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagnóstico de malaria.	Informe	66	0	0	18	0	0	
		07 - Continuidad de consultorías de Personal médico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	Informe	1	0	0	1	0	0	
		08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	28	0	0	2	0	0	
	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Informe	1	0	0	1	0	0	
	029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	09 - Adquiridas 130368 dosis de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el plan de introducción de la vacuna contra la COVID 19	Vacuna	130,368	0	0	0	0	0	
		10 - Administracion y Ejecucion del Proyecto	Informe	4	0	0	1	0	0	
		11 - Supervision externa y Auditoria	Auditoría	2	0	0	1	0	0	
	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	06 - Capacitado el personal de los Hospitales Gabriela Alvarado y Puerto Cortes en Gestión Hospitalaria	Informe	2	0	0	1	0	0	
		07 - Adquirido, instalado y funcionando Equipo Infotecnologico en los hospitales seleccionados	Equipo	8	0	0	3	0	0	
		08 - Ejecutados los fondos de la gestión administrativa	Informe	12	0	0	3	0	0	

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	13 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	9	0	0	3	0	0
		14 - Adquirido equipo y mobiliario médico para los Hospitales , Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional	Licitación	15	0	0	3	0	0
		15 - Adquiridas vacunas para la población objetivo de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y Adquisición de equipo para cadena de frío	Contrato	2	0	0	0	0	0
	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	12 - Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2023	Informe	12	0	0	3	0	0
		13 - Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2023.	Informe	1	0	0	1	0	0
		14 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población, que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud en al menos un 90% para el año 2023.	Contrato	5	0	0	2	0	0
15 - Fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales para el 2023.		Convenio	1	0	0	1	0	0	
	16 - Realizadas las gestiones Administrativas y Auditados en un 100% los fondos del credito al año 2023	Informe	188	0	0	56	0	0	

Fuente: SIAFI, 31/12/2022
