

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Salud
(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

En lo que respecta a la **Inversión Pública** vigente para SESAL al segundo trimestre del 2023 asciende a **L10,934.4 millones**, la que a su vez se agrupa en *Inversión Social* la cual se destina principalmente a fortalecer áreas de intervención como adquisición de vacunas y medicamentos, adicionalmente se destina parte de los recursos a la finalización de obras y equipamiento del Hospital de Roatán; al segundo trimestre dicha inversión asciende a L9,154.0 millones de los cuales se ejecutó un 16.8%, es decir L1,533.8 millones.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* (Proyectos de Inversión Pública) cuentan con una asignación vigente al mes de junio por *L746.9 millones, para la ejecución de 7proyectos*, asimismo, un espacio presupuestario por L1,033.5 millones destinados a proyectos en etapa de Preinversión para la construcción de 5 hospitales: Ocotepeque, Salamá, Santa Bárbara, Traumas San Pedro Sula y Traumas Tegucigalpa (actualmente en proceso la gestión de negociación, elaboración de documento de perfil de proyecto.).

Al cierre del II trimestre de 2023, se cuenta con un presupuesto vigente de L746.9 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para fortalecer las unidades del Segundo Nivel de atención (construcción, equipo, telemedicina y contratación de recurso humano); fortalecer la red de diagnóstico: notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias; fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria; mejora de la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,769,477,260
Presupuesto Vigente	746,902,994
Devengado II Trimestre, 2023	87,067,996
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/ Vigente)	12%
Ejecutado (Devengado Anual)	159,642,045
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	21%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	231,019,358
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	31%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023


materno infantil; instalación del equipo médico y no médico adquirido, así como insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales; adquisición de 151,000 vacunas bivalentes contra COVID-19 y fortalecimiento de los almacenes de biológicos con equipo para cadena de frío; adquisición de reactivos e insumos para laboratorios públicos; Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa, contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

La SESAL registró ejecución presupuestaria al segundo trimestre del 21% (L159.6 millones) a nivel de devengado y compromisos por L231.0 millones (31%) del Presupuesto Vigente asignado (la ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1), producto de la ejecución reportada de los siete proyectos adscritos en ejecución.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al segundo trimestre del 2023 se financia con recursos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Italia y Taiwán de los cuales, el Crédito Externo representa el 95% (L706.5 millones) y Donaciones externas 5% (L40.4 millones), distribuidos de acuerdo con el Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01
Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

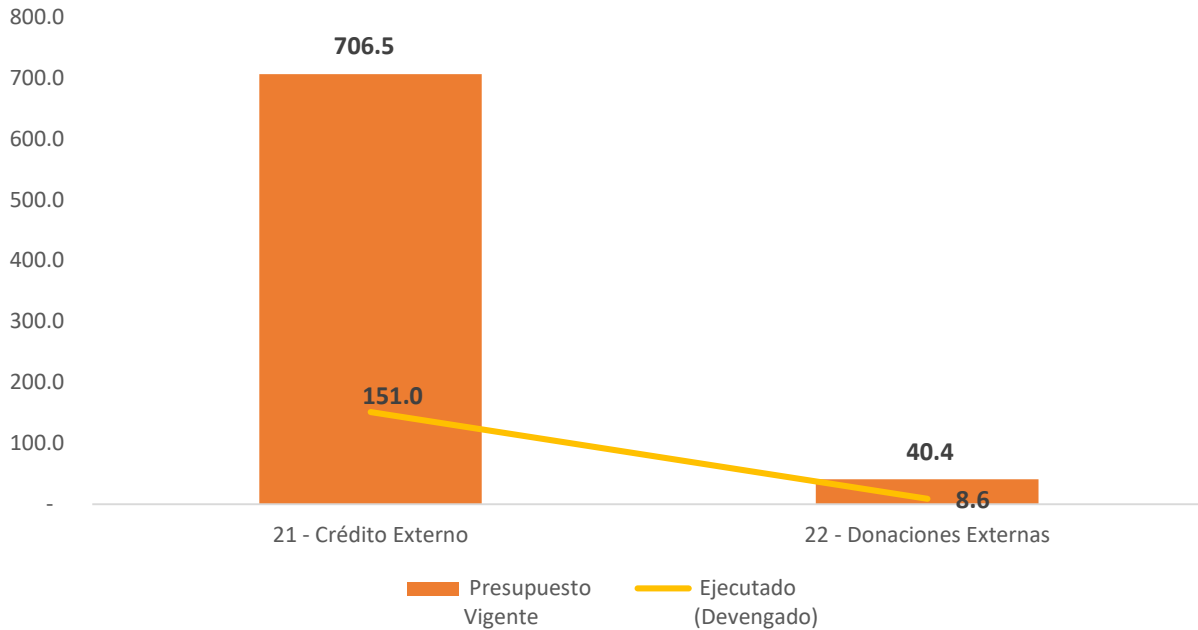

En forma comparativa al II trimestre del año 2022, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L908.0 millones, reportó ejecución en 26% (L237.5 millones); la tendencia en ejecución refleja un porcentaje menor en 5 puntos porcentuales, tomando en cuenta que la asignación para el año 2023 es menor en L161.1 millones. Es de considerar que para este trimestre el proyecto coejecutado con Red Solidaria, Contrato de Préstamo

BID 5008/BL-HO, continua su desfase de ejecución tomando en cuenta el contrato modificatorio No.1 específicamente al Anexo único, la sección 4 “Ejecución”; establece que la SESAL administrará los recursos y realizará procesos de adquisiciones del componente 3 mediante la Unidad Ejecutora del programa financiado con el Préstamo BID 4619/BL-HO (actualmente adscrito a la Red Solidaria).


Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2019 – 2023):

En el período comprendido de los años 2019 al 2023, el Programa de Inversión Pública (PIP) de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 14 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 97% con recursos de crédito externo, 3% recursos de donación externa.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L4,487.2 millones; reflejando un promedio de ejecución del 25% (L1,107.0 millones) al mes de junio de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; sin embargo, no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, considerando que, para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

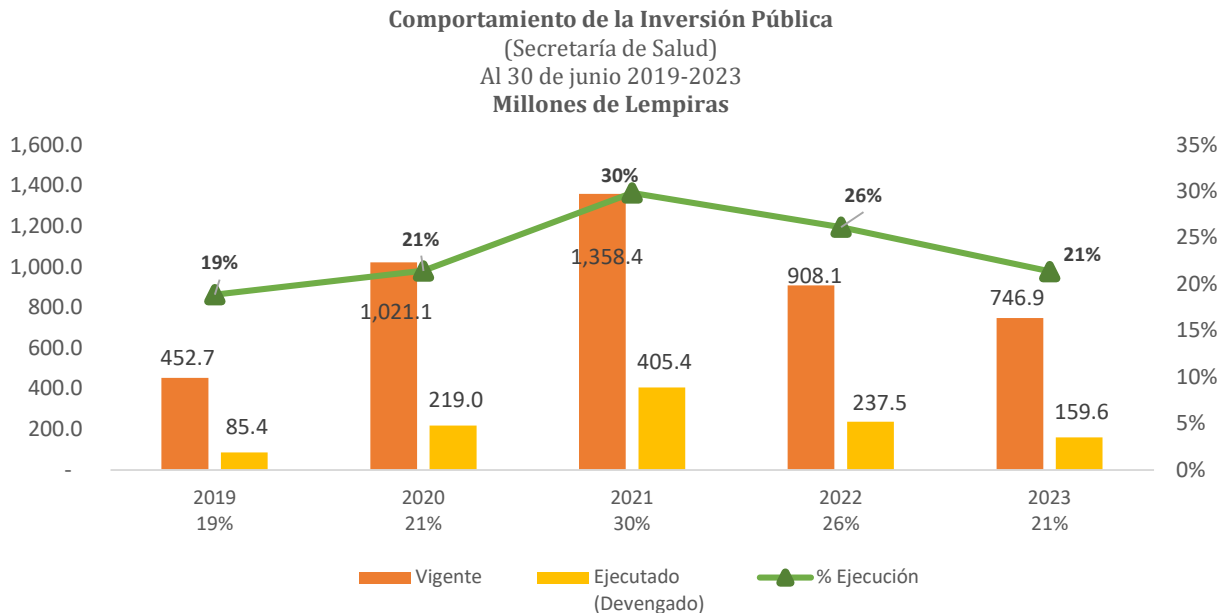

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 11/12/2024
		Lempiras	123,582,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2023	37,822,172	59,040,584	-	0%
Acumulado 2023	37,822,172	59,040,584	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	123,582,500	123,582,500	11,174,230	9%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L24.7165 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocotepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 169 municipios, en intervención en 39 al segundo trimestre.

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 29% y financiero del 9.2%, continua el desfase en la ejecución tomando en cuenta el contrato modificadorio No.1 al Contrato de Préstamo BID 5008/BL-HO, específicamente al *Anexo único, la sección 4 "Ejecución"*; establece que la SESAL administrará los recursos y realizará procesos de adquisiciones del componente 3 mediante la Unidad Ejecutora del programa financiado con el Préstamo BID 4619/BL-HO (actualmente adscrito a la Red Solidaria).

Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	US\$ Lempiras
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2023	205,444,615	205,444,615	53,425,691	26%
Acumulado 2023	205,444,615	205,444,615	115,304,115	56%
Acumulado Vida del Proyecto *	988,660,000	988,660,000	587,860,808	59%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L24.7165 por US\$1.00

Consiste en apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frío para los establecimientos de salud priorizados.

Avance Físico: Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Instalación del equipo médico, no médico y adquisición de insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales (4 lotes).
- Adquisición de 151,000 dosis y aplicación de las vacunas COVID-19 a la población de acuerdo con el Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecer los almacenes biológicos con equipo para cadena de frío.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:

- 92% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.
- 60% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,502,601; Población 2da dosis: 5,760,184).
- Laboratorio designado con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
- 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.
- 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.

- Actualmente se encuentra en proceso de implementación de la Tecnología de Papel Inteligente (SPT) en la Región Metropolitana del Distrito Central.
- Actualmente se encuentra en funcionamiento el formulario de Quejas, Reclamos y Sugerencias en línea <https://prosalh.hn/quejas-y-reclamos/>

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

Convenio IDA-6626-HN:

1. Adquiridos 6 rayos X, contrato firmado y se espera la entrega en un periodo de 14 semanas. Se proyecta pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023.
2. Contratación de personal de los Centros de Atención a Migrantes Retornados en puntos fronterizos, se ha ejecutado el 50% del contrato al 30 de junio 2023. Finaliza en el mes de diciembre de 2023.
3. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%).

Convenio IDA-6868-HN:

1. Adquiridos 2 tomógrafos de 64 cortes y 1 Arco en C Hemodinamia, contrato firmado se espera la entrega en un periodo de 19 semanas. Se proyecta pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023.
2. Adquiridos de 2 rayos x móviles y 4 ultrasonidos, se tiene previsto en el mes de julio 2023 realizar anticipo del 10% del monto del contrato.
3. Consultoría para la Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19. Se realizó una adenda en tiempo al 30 de octubre 2024.
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$46,287.78)
5. Contratación de consultor para el diseño del Sistema de quejas del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19).
6. Actividades para movilización en seguimiento al despliegue de aplicación de vacunas (servicio de transporte, viáticos).

Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 01/10/2023
		Lempiras	1,330,242,030	

SECRETARIA DE FINANZAS

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2023	460,761,338	446,787,469	24,427,354	5%
Acumulado 2023	460,761,338	446,787,469	35,049,279	8%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,330,242,030	1,330,242,030	728,399,233	55%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L24.7165 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Avance Físico: Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- 18 contratos de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.
- 2 contratos para la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos.
- 3 contratos de firmas consultoras para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
- Contratación de recurso humano para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes de COVID-19.
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **51%** y financiero del **54%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

2 consultorías en apoyo a las intervenciones del programa, para apoyo financiero y monitoreo.

- ✓ Componente 2: Detección y seguimiento de casos:

Se inició el proceso de adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI).

- ✓ Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión:

En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos.

- ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

Pagos del personal médico contratado (176 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: 16 ayudantes de enfermería, 41 Auxiliares de enfermería, 3 microbiólogos, 55 licenciados en enfermería, 1 médico anesthesiologo, 1 médico cirujano, 3 médicos internistas, 2 médicos pediatras, 2 médicos Gineco obstetra, 45 médicos generales, 2 técnicos de Laboratorio Clínico, 1 técnico en anestesia y 4 técnicos en radiología; 1 especialista en infraestructura hospitalaria.

- ✓ Componente 5: Administración del Programa:

Pago a 16 consultores de GESALUD (consultorías administrativas GESALUD).

3.3.1 INVERSIÓN SOCIAL

De los L9,154.0 millones asignados para Inversiones Sociales en la SESAL, se registra ejecución por L1,533.8 millones, equivalentes a una ejecución financiera del 16.8% destinados principalmente a la adquisición de medicamentos. Como parte de estas inversiones sociales, la SESAL se encuentra en proceso de realizar transferencia por L.100.0 millones a la Municipalidad de Roatán para la finalización de obras y equipamiento del Hospital de Roatán.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (junio - diciembre) de ejecución para el Año 2023 (con actualización mensual).
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0017-2023 para la ampliación del plazo de cierre de ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Honduras (SNIPH) por 12 meses y 15 días.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0016-2023 para la ampliación del plazo de cierre de ejecución al Proyecto Respuesta Inmediata de salud para contener y controlar el coronavirus (COVID-19) en Honduras (RISPHO), por 7 meses.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0019-2023 para la Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes al Proyecto Honduras - Iniciativa Regional de eliminación de la malaria (IREM en Mesoamérica y República Dominicana), Convenio No. GRT/MM-17339-HO.

- Se emitió Dictamen Técnico No. 0020-2023 para la Modificación entre Categorías de Inversión y Componentes al Proyecto Respuesta Inmediata de salud para contener y controlar el coronavirus (COVID-19) en Honduras (RISPHO), Componente BID 4518/BL-HO-3.
- Participación en la Revisión de Cartera correspondiente a los Proyectos financiados por el Banco Mundial.

Conclusiones

- Al segundo trimestre del año 2023, la ejecución reportada por la SESAL se registra a nivel de devengado en 21% (L159.6 millones) y compromisos por L231.0 millones (31%) en relación al Presupuesto Vigente asignado; cabe señalar que la baja ejecución se ha visto afectada entre otros, por no contar con la disponibilidad para ejecución en una de las operaciones (BID 5008/BL-HO) debido a la resolución y aclaraciones en relación a la responsabilidad de la ejecución de los recursos considerando los cambios suscitados mediante contratos modificatorios; se mantiene la situación en cuanto a los procesos internos de modificación presupuestaria que permitiera la disponibilidad de los recursos en las líneas presupuestarias correspondientes.
- Al término del segundo trimestre la gestión para la incorporación que permita el pago final de supervisión y auditoría del Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271) no logró avances.
- Así mismo, en cuanto a la regularización de pagos por parte del Proyecto Reequipamiento Biomédico Hospital Maria Especialidades Pediátricas (HMEP) no se logró concretar durante el segundo trimestre debido a que la UAFCE/SESAL no contó con la documentación para justificar el proceso de regularización.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inicio-Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
7	0060 - Secretaría de Salud			-	731,518,063.0	731,518,063.0	-	746,902,994.0	746,902,994.0	-	159,642,045.5	159,642,045.5	21.4	-	87,067,995.8	87,067,995.8	11.7	-	231,019,358.0	231,019,358.0	30.9
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 11/12/2024	-	37,822,172.0	37,822,172.0	-	34,012,479.0	34,012,479.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			-	37,822,172.0	37,822,172.0	-	34,012,479.0	34,012,479.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	15/04/2021 15/04/2023	-	9,159,152.0	9,159,152.0	-	9,159,152.0	9,159,152.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS			-	9,159,152.0	9,159,152.0	-	9,159,152.0	9,159,152.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	24/04/2020 31/10/2024	-	15,000,000.0	15,000,000.0	-	25,678,101.0	25,678,101.0	-	8,636,095.0	8,636,095.0	33.6	-	4,890,653.7	4,890,653.7	19.0	-	8,636,321.9	8,636,321.9	33.6
		IDA 6868-HN	24/7/2023 31/10/2024	-	190,444,615.0	190,444,615.0	-	179,766,514.0	179,766,514.0	-	106,668,020.2	106,668,020.2	59.3	-	48,535,037.2	48,535,037.2	27.0	-	122,719,259.6	122,719,259.6	68.3
	Total Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19			-	205,444,615.0	205,444,615.0	-	205,444,615.0	205,444,615.0	-	115,304,115.2	115,304,115.2	56.1	-	53,425,690.9	53,425,690.9	26.0	-	131,355,581.6	131,355,581.6	63.9
4	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 28/02/2024	-	18,330,786.0	18,330,786.0	-	31,215,717.0	31,215,717.0	-	8,604,787.5	8,604,787.5	27.6	-	8,531,087.3	8,531,087.3	27.3	-	8,626,338.7	8,626,338.7	27.6
	Total PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DO			-	18,330,786.0	18,330,786.0	-	31,215,717.0	31,215,717.0	-	8,604,787.5	8,604,787.5	27.6	-	8,531,087.3	8,531,087.3	27.3	-	8,626,338.7	8,626,338.7	27.6
5	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA-HOS/MARIA	19/3/2007 31/12/2023	-	-	-	-	2,500,000.0	2,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)			-	-	-	-	2,500,000.0	2,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 4449/BL-HO-2	14/08/2020	-	-	-	-	1,200,000.0	1,200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BID 4518/BL-HO-3	28/11/2023	-	-	-	-	16,583,562.0	16,583,562.0	-	683,863.3	683,863.3	4.1	-	683,863.3	683,863.3	4.1	-	8,650,850.2	8,650,850.2	52.2
	Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN			-	-	-	-	17,783,562.0	17,783,562.0	-	683,863.3	683,863.3	3.8	-	683,863.3	683,863.3	3.8	-	8,650,850.2	8,650,850.2	48.6
7	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	01/10/2021 10/03/2025	-	460,761,338.0	460,761,338.0	-	446,787,469.0	446,787,469.0	-	35,049,279.5	35,049,279.5	7.8	-	24,427,354.4	24,427,354.4	5.5	-	82,386,587.6	82,386,587.6	18.4
	Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EF			-	460,761,338.0	460,761,338.0	-	446,787,469.0	446,787,469.0	-	35,049,279.5	35,049,279.5	7.8	-	24,427,354.4	24,427,354.4	5.5	-	82,386,587.6	82,386,587.6	18.4
	SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)			-	731,518,063.0	731,518,063.0	-	746,902,994.0	746,902,994.0	-	159,642,045.5	159,642,045.5	21.4	-	87,067,995.8	87,067,995.8	11.7	-	231,019,358.0	231,019,358.0	30.9
	0060 - Secretaría de Salud			-	1,111,794,073.0	1,111,794,073.0	-	1,033,506,894.0	1,033,506,894.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Monto Aprobado Congreso en gestión para incorporación, cambio de fuente y pendiente emisión de Nota de Prioridad)			-	1,111,794,073.0	1,111,794,073.0	-	1,033,506,894.0	1,033,506,894.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA			-	1,843,312,136.0	1,843,312,136.0	-	1,780,409,888.0	1,780,409,888.0	-	159,642,045.5	159,642,045.5	9.0	-	87,067,995.8	87,067,995.8	4.9	-	231,019,358.0	231,019,358.0	13.0
	0060 - Secretaría de Salud			1,470,000,000.0	-	1,470,000,000.0	1,788,499,584.0	7,365,465,533.0	9,153,965,117.0	604,369,350.6	929,400,122.5	1,533,769,473.1	16.8	493,495,516.3	676,515,204.1	1,170,010,720.4	12.8	604,380,000.6	969,235,525.9	1,573,615,526.4	17.2
	TOTAL INVERSIÓN SOCIAL			1,470,000,000.0	-	1,470,000,000.0	1,788,499,584.0	7,365,465,533.0	9,153,965,117.0	604,369,350.6	929,400,122.5	1,533,769,473.1	16.8	493,495,516.3	676,515,204.1	1,170,010,720.4	12.8	604,380,000.6	969,235,525.9	1,573,615,526.4	17.2
7	TOTAL GENERAL			1,470,000,000.0	1,843,312,136.0	3,313,312,136.0	1,788,499,584.0	9,145,875,421.0	10,934,975,005.0	604,369,350.6	1,089,042,168.0	1,693,411,518.5	15.5	493,495,516.3	763,583,199.9	1,257,078,716.2	11.5	604,380,000.6	1,200,254,883.9	1,804,634,884.5	16.5

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Secretaría de Salud	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	06 - Realizada la regularización de fondo de los lotes 3 y 9 del proveedor ALTHEA	Informe	1	0	0	1	0	0	
		024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	16 - Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.	Informe	3	0	0	2	0	0
		17 - Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención (construcción , equipo, telemedicina y RRHH)	Informe	26	0	0	1	0	0	
		18 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	2	0	0	1	0	0	
		19 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)	Informe	46	0	0	0	0	0	
		20 - Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0	0	0	0	
	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	06 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	Informe	4	0	0	3	0	0	
		07 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	Informe	2	0	0	1	0	0	
		08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	55	0	0	18	0	0	
	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Informe	169	0	0	39	0	0	
	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	07 - Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestión Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Capacitación	8	0	0	2	0	0	
		08 - Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	Informe	21	0	0	8	0	0	
		09 - Realizada la adquisición de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Lote de Equipo	1	0	0	1	0	0	
		10 - Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Taller de Capacitación	8	0	0	2	0	0	
		08 - Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales	Lote	1	0	0	1	0	0	
	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	09 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	1	0	0	1	0	0	
		10 - Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biologicos con equipo para cadena de frio	Vacuna	2	0	0	1	0	0	
		11 - Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0	
		09 - Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	Informe	18	0	0	6	0	0	
	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	10 - Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	Contrato	2	0	0	1	0	0	
11 - Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.		Contrato	1	0	0	1	0	0		
12 - Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19		Contrato	1	0	0	0	0	0		
13 - Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023		Informe	163	0	0	42	0	0		

Fuente: SIAFI, 30/06/2023
