

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Programa de la Red Solidaria  
(PRS)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria, creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, que ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para el año 2023 cuenta con un presupuesto vigente de L2,946,718,504 y en el cuarto trimestre presenta una ejecución financiera de L1,086,559,376, para la ejecución de siete proyectos enmarcados en el Programa de Inversión Pública (PIP).

El presupuesto aprobado para el año 2023, asciende a L3,833,179,985 recursos que se encuentran dentro de un programa de la Red solidaria, y los mismos se trasladaron a los proyectos en la medida que sus contratos modificatorios por cambio de ejecutor fueran aprobados por el organismo financiador, para su ejecución normal.

Al cuarto trimestre, el Programa de la Red Solidaria presenta una ejecución financiera acumulada de L1,603,655,021, que representa el 54% del presupuesto vigente, correspondiente a la ejecución de 7 proyectos, fondos que fueron utilizados para pago de consultorías, fortalecimiento de las corresponsabilidades, honorarios profesionales del personal técnico en campo y de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y entregas de transferencias monetarias condicionadas.

El presupuesto del Programa de la Red Solidaria es financiado con fondos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial.

Cuadro No. 01


#### Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,833,179,985
Presupuesto Vigente	2,946,718,504
Ejecutado IV Trimestre	1,086,559,376
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)</b>	<b>37%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	1,603,655,021
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>54%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

**GRÁFICO NO. 1**  
**INVERSIÓN POR ORGANISMO FINANCIADOR**  
**CIFRAS EN LEMPIRAS**

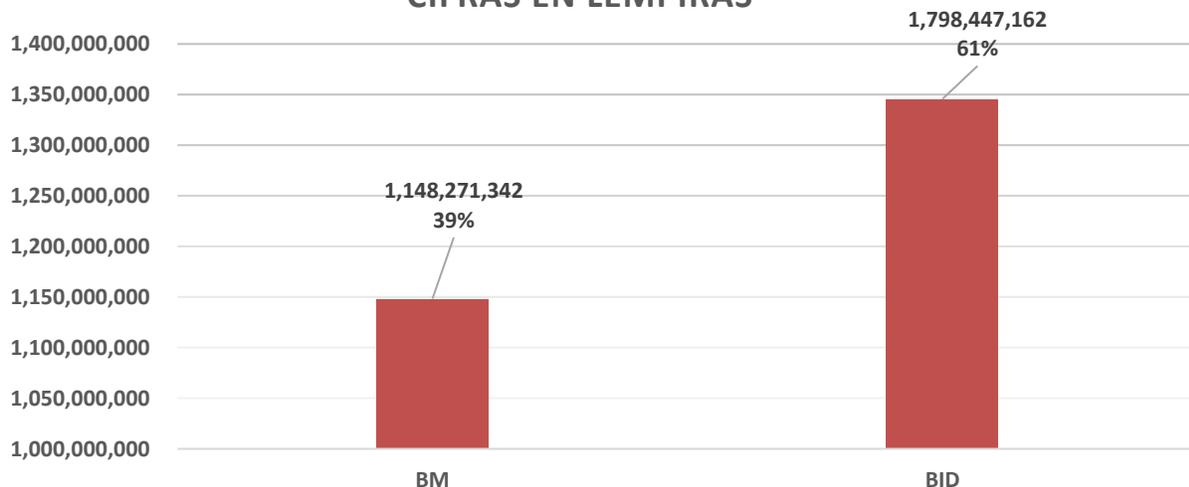

## SECRETARÍA DE FINANZAS

El Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

### 3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE:

El Programa de la Red Solidaria (PRS) fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 2 de mayo de 2022, es una institución de reciente creación, en el año 2022 bajo su estructura presupuestaria se encontraba un proyecto para su ejecución, al cual se incorporaron recursos en diciembre de 2022 por un monto de L302,163,390 ejecutando un monto de L268,062,198 representando el 88.7% de ejecución.

Para el año 2023, gradualmente se fueron incorporando los proyectos de acuerdo con la aprobación de los contratos modificatorios por cambio de ejecutor dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, actualmente cuenta con 7 proyectos en Cartera.

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Al cuarto trimestre 2023, la inversión de la institución se concentra en siete proyectos que apoya las transferencias monetarias condicionadas a familias en pobreza y extrema pobreza. Asimismo, apoyos orientados al fortalecimiento de la educación de jóvenes del tercer ciclo en modalidades alternativas y mejoramiento de la salud neonatal a través de atención médica de primer y segundo nivel, construcción y equipamiento de Salas de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en hospitales priorizados, restauración de hectáreas de bosque público y privado afectado por el gorgojo, fortalecimiento del sistema de Alerta Temprana que monitorea el Instituto de Conservación Forestal (ICF), capacitación de técnicos en salud forestal, proyectos que son financiados con recursos externos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se describe la ejecución física y financiera de los proyectos siguientes:

#### 1. Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus (BID 5289-HO):

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	5289/BL-HO	US\$45,000,000	20/08/2021	
		1,111,653,000	02/10/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	341,343,418	781,045,053	289,383,570	37%
Acumulado 2023	781,045,053	781,045,053	592,538,071	76%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,111,653,000	1,111,653,000	868,600,268	78%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7746 por US\$1.00 fecha 31/12/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 de agosto de 2021, cuyo objetivo es Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los huracanes ETA y IOTA.

### Avance físico al 31 de diciembre del 2023:

- **Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)**, se realizó entrega de TMC de Seguridad Alimentaria a 60,249 hogares beneficiados y TMC de incorporación a 23,350 hogares a nivel nacional por un monto de L540,214,618.
- **Sub-Componente Estrategias Complementarias**, se suscribió convenio con INE para efectuar el Levantamiento de Información Socioeconómica en las aldeas y sus caseríos del Departamento de Lempira, y caseríos de los 17 departamentos que quedaron pendientes en el primer censo.
- **Componente Gestión del Proyecto**, Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.
- Contratación de firma auditora para el acompañamiento de la entrega de la TMC del año 2023 y auditoría de los estados financieros correspondiente al periodo 2023.

### 2. Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878-HO):

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$	25,000,000	07/4/2017
		Lempiras	617,585,000	07/8/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2023	94,759,970	112,444,970	46,722,646	42%
Acumulado 2023	112,444,970	112,444,970	60,843,094	54%
Acumulado Vida del Proyecto *	617,585,000	617,585,000	492,112,623	80%

**Nota:** Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

La ejecución incluye montos ejecutados en AEPAS-H (1 de julio 2020 al 31 diciembre de 2022)

La ejecución incluye montos ejecutados en PRS (1 de enero 2023 al 31 diciembre de 2023)

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7746 por US\$1.00 al 31/12/2023

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar y mantener los Servicios Eco sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficia a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de Comayagua (Comayagua, Villa de San Antonio, Ojos de

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Agua, Esquías, Meámbar, San Luis, El Rosario, Minas de Oro, La Trinidad, Lamaní, San Jerónimo, Humuya, Siguatopeque y Lajas), Francisco Morazán (Ojojona, Lepaterique, Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles, Marale y Orica), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Continuar con la restauración de hectáreas de bosque de pino (públicas) afectadas por el gorgojo (34,000 hectáreas).
- Contratar el personal técnico de campo para dar asistencia a las organizaciones, para bosque público.
- Contratación de la consultoría para el diseño de la Estrategia de comunicación y visibilidad del proyecto.
- Realizar 3 Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al cambio climático.
- Capacitar Técnicos en manejo forestal sostenible, salud y sanidad forestal.
- Continuar con el equipamiento al departamento de sanidad forestal (incluyendo unidades de sanidad forestal).
- Continuidad de servicios para el personal técnico y fiduciario del proyecto.
- 1 informe de auditoría del Proyecto.

### **Avance Físico al 31 de diciembre del 2023**

- Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 37 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 33,373.10 hectáreas, lo que representa un 98.16% en relación con la meta del proyecto (34,000 has).
- La plataforma del GeoForestal del ICF cuenta con una base de 18,373 hectáreas en proceso de restauración.
- Aprobado el Plan de Restauración que integra a tres comunidades indígenas de la Tribu Tolupán, con un área de 990.47 hectáreas, incorporándose en las actividades de protección forestal a 54 personas de 3 comunidades indígenas de la Tribu Tolupán representados a través de la Asociación de Comunidades Indígenas Tolupanes de la Montaña de La Flor (ACITMF).
- En ejecución la asistencia técnica para la implementación del Programa Piloto de Incentivos a la restauración de bosques privados en áreas afectadas por plagas.
- Identificadas un total de 7,705.70 hectáreas para la restauración de bosque privado distribuidos en 61 beneficiarios; de las cuales 5,080.16 hectáreas (65.93%) corresponden a la modalidad de protección con fines ecosistémicos y 2,625.55 hectáreas (34.07%) corresponden a la modalidad de protección con fines productivos. Las áreas han sido identificadas en 14 municipios: Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, Talanga y Tatumbla en el Departamento de Francisco Morazán y los municipios de Lamaní, Meámbar, Siguatopeque, Villa de San Antonio, San Luis, Esquías, La Libertad, San Jerónimo y Las Lajas en el Departamento de Comayagua.
- En ejecución “Diplomado Introducción y contexto a la salud y sanidad forestal”, a través del cual se están fortaleciendo las capacidades de 25 profesionales vinculados al sistema nacional de salud y sanidad forestal.

- Capacitados 33 profesionales en temas vinculados a restauración de tierras forestales degradadas mediante procesos de restauración pasiva (regeneración natural) y activa (reforestación y recuperación de suelos), proceso formativo que contribuye al producto 2.2 Banco de germoplasma de especies resilientes al CC constituido y operando.
- En ejecución el V Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF.
- En funcionamiento la Plataforma de Salud y Sanidad Forestal (PSSF) en el marco del elemento de Medición y Monitoreo del Sistema de Alerta Temprana para el Gorgojo Descortezador del Pino de Honduras.
- Fortalecida la operatividad del Sistema de Monitoreo del Gorgojo Descortezador del Pino (*Dendroctonus frontalis*) utilizando Trampas Cebadas con Semioquímicos a través de la dotación de feromonas, insumos químicos y equipo de laboratorio.
- Fortalecidas las capacidades de la Oficina Coordinadora de Proyectos de ICF, a través de la dotación de equipo de infotecnología.
- En proceso de contratación consultoría para la elaboración del portafolio de inversiones ambientales y de manejo forestal sostenible que será ejecutado por la Unidad de Proyectos Estratégicos (UPE) en coordinación con el eje de infraestructura social y medio ambiente del Programa de la Red Solidaria (PRS).
- Fortalecidas las capacidades de un funcionario de la Unidad de Gestión Económica y Financiera para Cambio Climático (UGEFCC) de SEFIN en materia de acceso al financiamiento climático, a través de su participación como representante del país en la COP 28 realizada en la Ciudad de Dubái.
- En proceso de adquisición la compra de equipo de Infotecnología para la UGEFCC/SEFIN, UPE/PRS y SERNA.

### 3. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449-HO)

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	2/2/2018 3/06/2025
		Lempiras	1,111,653,000	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2023	440,955,448	430,404,158	73,424,897.0	17%
Acumulado 2023	430,404,158	430,404,158	173,658,504.0	40%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,111,653,000	1,111,653,000	732,558,573	66%

#### Notas:

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

c. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en AEPAS-H (1 de junio 2020 al 31 de diciembre 2022)

d. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en Programa Red Solidaria (del 1 de enero al 31 de diciembre 2023)

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7746 por US\$1.00 al 31/12/2023

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

En general el proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados, así mismo la rehabilitación de 9 centros educativos afectados por el fenómeno climático ETA & IOTA. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Ejecución del convenio con IHER.
- Ejecución del convenio con UPN
- Desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH).
- Adquisición de equipamiento informático para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH).
- Conformación de equipos técnicos de la SEDUC.
- Desarrollo y presentación del informe de Auditoría del Proyecto.
- Construcción de módulos escolares para 35 CEB's priorizados del Programa.

#### **Avance Físico al 31 de diciembre del 2023:**

- Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo **de 3,125 estudiantes** pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 174 gestores educativos.
- Se recibió la no objeción por parte del banco del informe de evaluación de las ofertas recibidas en la licitación para la construcción de 35 Módulos de aulas con su batería de baños en Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 CEB.
- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) para la implementación del Programa de Formación Docente para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica, se concluyó con la formación de **1,745 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.**
- Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Programa de la Red Solidaria, Secretaría de Educación y Fundación Zamora Terán, para la implementación del componente de formación para 1,024 docentes del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, fueron formados y acompañados, **950 docentes de 72 centros educativos a nivel nacional.**
- Con la plataforma de formación docente se ha firmado un contrato para la adquisición de 20,000 licencias de la plataforma TERRITORIUM con el fin de facilitar la formación y certificación de competencias docentes la cual está en proceso de implementación.

- Instalación de servicios de conectividad a Internet en 29 centros educativos y se adquirieron los equipos de conectividad inalámbrica para el Edificio DGDP y los cuatro centros de formación regional.
- En ejecución la consultoría internacional para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH) y la Plataforma de Inteligencia de Negocios de la SEDUC, la cual presenta un avance acumulado del 63%.
- Se diseñó la Estrategia de Comunicaciones del PNTED, que contempla lograr alianzas con socios estratégicos (gubernamentales, comerciales, académicos y de cooperación externa) y posicionar y visualizar el PNTED ante la población general por medio de redes sociales con comunicación de las actividades desarrolladas en el marco del programa.
- Se ampliaron los servicios de conectividad fija a Internet con el servicio de filtrado de contenido para 29 de los centros educativos beneficiarios del PNTED y se realizaron giras de seguimiento en 5 departamentos que cuentan con centros educativos beneficiarios del PNTED.

#### 4. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (4619/BL-HO)

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019 7/07/2024
		Lempiras	1,704,513,900	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2023	239,751,573	239,751,573	116,537,416	49%
Acumulado 2023	239,751,573	239,751,573	169,804,689	71%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,704,513,900	1,704,513,900	881,782,767	52%

##### Notas:

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

(c) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por AEPAS-H (1 de agosto 2020 al 31 de diciembre de 2022).

(d) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por PRS (1 de enero al 31 de diciembre de 2023).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7746 por US\$1.00 al 31/12/2023

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Proceso de contratación de consultores para atención de servicios de salud en la comunidad, a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM), en el primer nivel de atención.
- En segundo nivel de atención y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribirán 4 convenios de servicios de salud.
- Recepción de los diseños de obras en los hospitales priorizados.
- Lanzamiento del proceso de licitación de obras de construcción.
- Proceso de auditoría del Proyecto.

**Avance Físico al 31 de diciembre del 2023:**

- En segundo nivel de atención y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribieron 4 convenios de gestión, lográndose un total de **27,042 atenciones hospitalarias gineco-obstétrica, pediatría, medicina interna y cirugía general**, en los siguientes hospitales:
  - Fundación Gestora de la Salud (FUNDAGES) del Hospital Enrique Aguilar Cerrato
  - Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP)
  - Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela
  - Comité Hospital Roberto Suazo Córdova

En ejecución la consultoría para desarrollar las competencias, habilidades y destrezas en telesonografía obstétrica y ginecológica, a través de un proceso de capacitación dirigido a médicos que brindan atención prenatal en los establecimientos (ES) de salud de Primer Nivel priorizados, en redes con gestión y prestación de servicios descentralizadas y centralizadas, de las Regiones Sanitarias priorizadas por la SESAL (Copán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Intibucá, La Paz y Choluteca) con el fin de mejorar el diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones obstétricas y neonatales.

- **Diseño-Supervisión-Construcción de obras:** Finalizada la Consultoría “Diseño y supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”, suscrito con la empresa Taller de Arquitectura Sánchez - Horneros SLP (TASH) Honduras, suscrito en fecha 10 de julio del 2022 con vigencia hasta el 10 de julio del 2024, para los siguientes hospitales:
  - Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán.
  - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Escuela, Tegucigalpa
  - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santa Teresa, Comayagua
  - Sala de Neonatología y Hogar Materno del Hospital Roberto Suazo Córdova, La Paz
  - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Francisco, Juticalpa
- Se desarrolló el proceso de licitación pública internacional PMGCSSMN-273-LPI-O-PRS-4619-LPI-013-2023 para la construcción de las obras en los hospitales antes mencionados, lográndose la adjudicación del Bloque Materno Neonatal del Hospital de Occidente, por un monto de L475,626,642.08; y se hizo efectivo el pago del anticipo.
- Asimismo, se publicaron nuevamente los documentos de licitación para las 4 obras hospitalarias restantes, previéndose la apertura de ofertas para el mes de enero 2024.
- Se formalizó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y el Programa de la Red Solidaria para la construcción y el equipamiento de las obras hospitalarias los Hospital de Occidente, Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova, Hospital Santa Teresa, Hospital San Francisco y Hospital Escuela; asimismo, se suscribió el Convenio entre Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud, referente al equipamiento médico de los hospitales focalizados.
- En base al desfase en el inicio de la construcción de las obras hospitalarias previstas, se realizó la solicitud de ampliación del plazo del último desembolso del Programa ante la Secretaría de Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, lográndose un período de ampliación de veinte y cuatro (24) meses, es decir al Diez (10) de Julio del 2026.

**5. Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L736,374,000	30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	158,621,760	289,747,084	74,237,219	26%
Acumulado 2023	289,747,084	289,747,084	114,596,419	40%
Acumulado Vida del Proyecto*/	736,374,000	736,374,000	430,282,196	58%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

incluye ejecutoria historica en la SEDIS ( del 17 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2022)

incluye ejecutoria historica en el PRS ( del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023)

Tasa de Cambio L24.7746 por US\$1.00 al 31/12/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

**Avance físico al 31 de diciembre del 2023:**

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, Se realizó entrega de TMC a 10,894 hogares transferencias de incorporación de nuevos hogares elegibles y Seguridad alimentaria.
- **Componente 1.2 Primera Fase de Implementación de la Estrategia de Transición Urbana**, se encuentra en etapa de revisión por parte del Banco Mundial la restructuración.
- **Componente Fortalecimiento del Sistema de Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas**, se contrató una empresa consultora para la definición organizacional de la Secretaría de Desarrollo Social. Se financiaron los gastos operativos para entregas de TMC a nivel nacional.
- **Componente 3. Gestión del Proyecto**, Se hicieron los pagos pendientes a la auditoria financiera de 2022 y 2023. Se fortaleció el área de adquisiciones de UCP con la contratación de un especialista en adquisiciones.

## 6. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,330,382,360	29/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	221,614,713	234,801,408	56,459,179	24%
Acumulado 2023	234,801,408	234,801,408	62,420,796	27%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,330,382,360	1,330,382,360	910,632,466	68%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto ejecución histórica en SEDIS (del 29 de junio al 31 de diciembre 2022)

El proyecto incluye ejecución histórica en PRS (del 1 de enero al 31 de diciembre 2023)

Tasa de Cambio L24.7651 por US\$1.00 al 31/12/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

### Avance físico al 31 de diciembre del 2023:

- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional del organismo ejecutor:** Se efectuó la contratación de 104 Gestores sociales para la implementación del PRS en las 2,007 aldeas. Se adquirieron 305 motocicletas para personal de campo y 8 vehículos pick up para actividades de implementación del PRS en campo. Se fortaleció el Sistema de informática del PRS (SIREs) con la contratación de consultores en soporte y redes, analistas programadores y coordinador de desarrollo.
- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos, priorizando el tercer ciclo:** se logró la adquisición de 2 vehículos pick up para apoyar el eje de educación de la RS y las actividades de la SEDUC.
- **Componente Ordenamiento del Piso de Protección Social:** Se realizaron intercambios de experiencia en el extranjero para ampliar el conocimiento, conocer el avance en otros países para mejorar las políticas de protección social.

Se suscribió convenio con el INE para efectuar el Levantamiento de Información Socioeconómica en las aldeas y sus caseríos del Departamento de Lempira, y caseríos de los 17 departamentos que quedaron pendientes en el primer censo.

Se fortaleció la Unidad Técnica Presidencial, con equipamiento, y consultorías de apoyo.

- **Componente Administración y Auditorías del Proyecto:** Se realizaron talleres de planificación para las actividades 2024.

Se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.

Se adquirieron insumos de oficina para la operatividad de UCP.

## 7. Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social (IDA 6918-HN)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social	6918-HN	US\$70,000,000	20/08/2021 30/06/2024	
		L1,730,134,000		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	989,649,582	858,524,258	429,793,448	50%
Acumulado 2023	858,524,258	858,524,258	429,793,448	50%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,730,134,000	1,730,134,000	429,793,448	25%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Incluye ejecutoria historica en la SEDIS ( del 17 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2022)

incluye ejecutoria historica en el PRS ( del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023)

Tasa de Cambio L24.7746 por US\$1.00 al 31/12/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial (BM) el 20 de agosto 2021, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

En fecha 18 de abril de 2023, se firmó contrato modificadorio por cambio de ejecutor al Programa de la Red Solidaria.

### Avance físico al 31 de diciembre del 2023:

- **Sub-Componente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas**, se beneficiaron 68,489 hogares con TMC de Incorporación y Seguridad alimentaria.
- **Sub-Componente 1.2 Primera Fase de Implementación de la Estrategia de Transición Urbana**, se encuentra en reestructuración.
- **Componente 3. Gestión del Proyecto**, Se realizó la contratación de un especialista en adquisiciones, para fortalecer la unidad ejecutora.

### 3.3.1 INVERSIÓN PROGRAMAS SOCIALES

Es importante mencionar que la inversión en programas sociales ejecutados por la Red Solidaria que forma parte del sector social, la Red Solidaria ejecutó acciones en los siguientes ejes: eje de educación que comprende becas y alfabetización para la formación de recurso humano, eje de protección social (TMC de seguridad alimentaria, nuevas incorporaciones, educación y salud), eje de fortalecimiento local y humano para miembros de las mesas solidarias, eje de oportunidades de ingreso enfocado a las cajas rurales, eje de infraestructura básica, social y medio ambiente enfocado a reparaciones en escuelas y centros de salud. El presupuesto vigente para los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria es de L947,327,830 con una ejecución de L947,327,807.81 que representa el 100% del presupuesto vigente.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a solicitudes de modificaciones presupuestarias presentadas por los proyectos de la Red Solidaria.
- Solicitud de cuotas de compromiso mensual de fondos externos para cada uno de los proyectos ejecutados por PRS.
- Solicitud de Matriz Departamental Municipal de los proyectos ejecutados por la Red Solidaria.
- Solicitud de Proyección Mensual de Ejecución de abril a diciembre 2023.

### Conclusiones

- El Programa de la Red Solidaria al cuarto trimestre presenta en lo que se refiere a proyectos una ejecución física y financiera acumulada por un monto de L1,603,655,021 que representa el 54% del presupuesto vigente, ejecución no satisfactoria.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

### Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas.

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado) Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
7	0415 - Programa de la Red Solidaria		-	-	-	-	2,939,584,794	7,133,710	2,946,718,504	1,082,563,262	3,996,114	1,086,559,376	37%	1,598,089,818	5,565,203	1,603,655,021	54%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	-	-	-	234,801,408	-	234,801,408	56,459,179	-	56,459,179	24%	62,420,796	-	62,420,796	27%
	<b>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	-	-	-	234,801,408	-	234,801,408	56,459,179	-	56,459,179	24%	62,420,796	-	62,420,796	27%
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	-	-	-	-	858,524,258	-	858,524,258	429,793,448	-	429,793,448	50%	429,793,448	-	429,793,448	50%
	<b>Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>		-	-	-	-	858,524,258	-	858,524,258	429,793,448	-	429,793,448	50%	429,793,448	-	429,793,448	50%
3	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	-	-	-	112,444,970	-	112,444,970	46,722,646	-	46,722,646	42%	60,843,094	-	60,843,094	54%
	<b>Total MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>		-	-	-	-	112,444,970	-	112,444,970	46,722,646	-	46,722,646	42%	60,843,094	-	60,843,094	54%
4	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	-	-	-	423,270,448	-	423,270,448	69,428,783	-	69,428,783	16%	168,093,301	-	168,093,301	40%
		ATN/OC-18869-HO	-	-	-	-	-	7,133,710	7,133,710	-	3,996,114	3,996,114	56%	-	5,565,203	5,565,203	78%
	<b>Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>		-	-	-	-	423,270,448	7,133,710	430,404,158	69,428,783	3,996,114	73,424,897	17%	168,093,301	5,565,203	173,658,504	40%
5	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO	-	-	-	-	781,045,053	-	781,045,053	289,383,570	-	289,383,570	37%	592,538,071	-	592,538,071	76%
	<b>Total PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS</b>		-	-	-	-	781,045,053	-	781,045,053	289,383,570	-	289,383,570	37%	592,538,071	-	592,538,071	76%
6	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	-	-	-	289,747,084	-	289,747,084	74,237,219	-	74,237,219	26%	114,596,419	-	114,596,419	40%
	<b>Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>		-	-	-	-	289,747,084	-	289,747,084	74,237,219	-	74,237,219	26%	114,596,419	-	114,596,419	40%
7	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	-	-	-	239,751,573	-	239,751,573	116,538,416	-	116,538,416	49%	169,804,689	-	169,804,689	71%
	<b>Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>		-	-	-	-	239,751,573	-	239,751,573	116,538,416	-	116,538,416	49%	169,804,689	-	169,804,689	71%

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de la Red Solidaria	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	19 - Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivados para el manejo forestal sostenible.	44 - HECTÁREA	22,600	0	0	22,600	0	0
		20 - Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando	82 - SISTEMA	1	0	0	1	0	0
		21 - Agencias gubernamentales que han modificado sus instrumentos legales y administrativos para alinearse con la reforma de la gobernanza climática.	150 - INSTITUCION	3	0	0	3	0	0
		22 - Funcionando la Unidad de Gestión del Proyecto a través de consultorías para el fortalecimiento Institucional.	369 - CONSULTORÍA	6	0	0	0	0	0
		23 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	2	0	0	1	0	0
		24 - Planes de restauración en bosque público y privado implementados.	469 - PLAN OPERATIVO ANUAL	36	0	0	36	0	0
		25 - Convenios tripartitos suscritos entre beneficiarios, Red Solidaria e ICF.	26 - CONVENIO	36	0	0	36	0	0
		26 - Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas	1005 - INFORME DE INVESTIGACIÓN	3	0	0	3	0	0
		27 - Banco de germoplasma de especies resilientes al Cambio Climático construido y operando.	1134 - BANCO DE GERMOPLASMA	1	0	0	1	0	0
		04 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación BID 5289/BL-HO.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	42,961	0	0	42,961	0	0
	001 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	05 - Fortalecimiento Institucional del Programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	54	0	0	12	0	0
		06 - Sistema de Pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) fortalecido	82 - SISTEMA	1	0	0	1	0	0
		07 - Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica.	3 - ALUMNO (A)	6,808	0	0	6,808	0	0
		08 - Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos	3 - ALUMNO (A)	45,000	0	0	45,000	0	0
		09 - Herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	75 - PORCENTAJE	1	0	0	0	0	0
		10 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0	0	0	0
		11 - Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	3 - ALUMNO (A)	5,008	0	0	5,008	0	0
		12 - Módulos escolares construidos.	101 - CENTRO EDUCATIVO	15	0	0	15	0	0

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2023			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
	<b>002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>	13 - Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	31 - DOCENTE	1,654	0	0	1,654	0	0	
		14 - Licencias de plataforma de formación y certificación docente.	31 - DOCENTE	20,000	0	0	20,000	0	0	
		15 - Reproducción y entrega de guías para la nivelación de aprendizajes en Matemáticas.	32 - DOCUMENTO	940,518	0	0	0	0	0	
		16 - Licencias de plataforma adaptativa de matemáticas para facilitar el aprendizaje.	3 - ALUMNO (A)	10,000	0	0	0	0	0	
		17 - Evaluación de rendimiento académico con muestra municipal.	38 - EVALUACION	298	0	0	0	0	0	
		46 - Asistencia técnica especializada para la SEDUC en materia de educación híbrida a través del uso de tecnologías digitales.	369 - CONSULTORÍA	3	0	0	3	0	0	
		47 - Alianzas estratégicas con actores del sector educativo tanto público como privado para el posicionamiento del PNTEd.	26 - CONVENIO	2	0	0	1	0	0	
		48 - Realizada la auditoría externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0	1	0	0	
	<b>002 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>	13 - Familias atendidas con transferencia monetaria (TMC)	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0	95,909	0	0	
		14 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa	1016 - EDUCANDO	800	0	0	800	0	0	
		15 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0	2	0	0	
		16 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social	1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0	5	0	0	
		18 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	170,210	0	0	170,210	0	0	
		19 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio rural	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0	95,909	0	0	
		<b>003 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>	20 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio urbano	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	74,301	0	0	74,301	0	0
			21 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa.	1016 - EDUCANDO	800	0	0	800	0	0
	22 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC.		1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0	2	0	0	
	23 - Fortalecimiento para el análisis de la información para la articulación de programas sociales		1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0	5	0	0	

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	<b>003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>	31 - Convenios de Gestión de Segundo nivel de atención para la prestación de servicios de salud suscritos.	26 - CONVENIO	4	0	0	0	0	0
		32 - Planos para el diseño de obras de Unidades de Cuidados Intensivos y Bloque Materno Infantil finalizados.	429 - LOTE	5	0	0	0	0	0
		33 - Equipo de radiocomunicación adquirido.	392 - EQUIPO	1	0	0	0	0	0
		34 - Capacidad técnica de la SESAL fortalecida.	155 - CONTRATO	2	0	0	2	0	0
		35 - Auditoría externa del Proyecto realizada.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0	1	0	0
		36 - Contratación de Recurso humano para Equipos de salud familiar.	155 - CONTRATO	31	0	0	31	0	0
		37 - Dotado de equipo médico menor para los Equipos de Salud Familiar, ESFAM.	1082 - LOTE DE EQUIPO	20	0	0	20	0	0
		38 - Tablet para los ESFAM adquiridas.	392 - EQUIPO	20	0	0	20	0	0
		39 - Capacitados Equipos de Salud Familiar (ESFAM) sobre Guia técnica.	1009 - CAPACITACIÓN	2	0	0	2	0	0
		40 - Contratada Consultoria Individual de Telesonografía.	155 - CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		41 - Lotes adjudicados para la construcción de Obra en Hospitales Seleccionados.	429 - LOTE	5	0	0	5	0	0
		42 - Taller de Capacitación para fortalecimientos de Departamento de Hospitales Fortalecidos en gestión de procesos y de gestores descentralizados hospitalario.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0	2	0	0
		43 - Contratación de Firma para la Evaluación de Linea Base y Evaluación Operativa Elaborado Realizada.	155 - CONTRATO	1	0	0	1	0	0
		44 - Contratación de consultorias para la operatividad de la unidad ejecutora realizada.	155 - CONTRATO	5	0	0	2	0	0
	<b>004 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>	08 - Fortalecimiento institucional del programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	6	0	0	6	0	0
		09 - Educandos matriculados en tercer ciclo bajo una modalidad alternativa	1016 - EDUCANDO	2	0	0	2	0	0
		10 - Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas	1007 - NUMERO DE UNIDAD	800	0	0	800	0	0
		11 - Informe de Transferencias Monetarias Condicionadas	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	1	0	0	1	0	0
