

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG)***

Tegucigalpa, Honduras
Enero, 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
 Cifras en Lempiras

El presupuesto de inversión pública aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el año 2023, asciende a **L1,860.9 millones**, representativos del 2.6% del Programa de Inversión Pública 2023 (**L71,846.95 millones**);

Su presupuesto de inversión vigente al Cuarto Trimestre 2023 es L1,552.1


millones, para la ejecución de 8 proyectos; y su ejecución financiera en dicho periodo es de L139.6 millones representado un 9%, y una ejecución acumulada al 31 de diciembre de L235.5 millones, alcanzando un 15% de ejecución respecto al presupuesto vigente. Lo que se considera bastante bajo ya que la SAG es la encargada del sector agroalimentario del país, y considerando que tiene bajo su cargo importantes proyectos de producción agrícola. Ver cuadro No.1.

Al cierre del cuarto trimestre la SAG, muestra las acciones ejecutadas en el sector con relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos; mostrando los impactos socioeconómicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,860,950,990.00
Presupuesto Vigente	1,552,056,235.00
Ejecutado IV Trimestre	139,640,320.00
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	9%
Ejecutado (Devengado Anual)	235,518,614.00
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	15%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023


Financiamiento de la Inversión

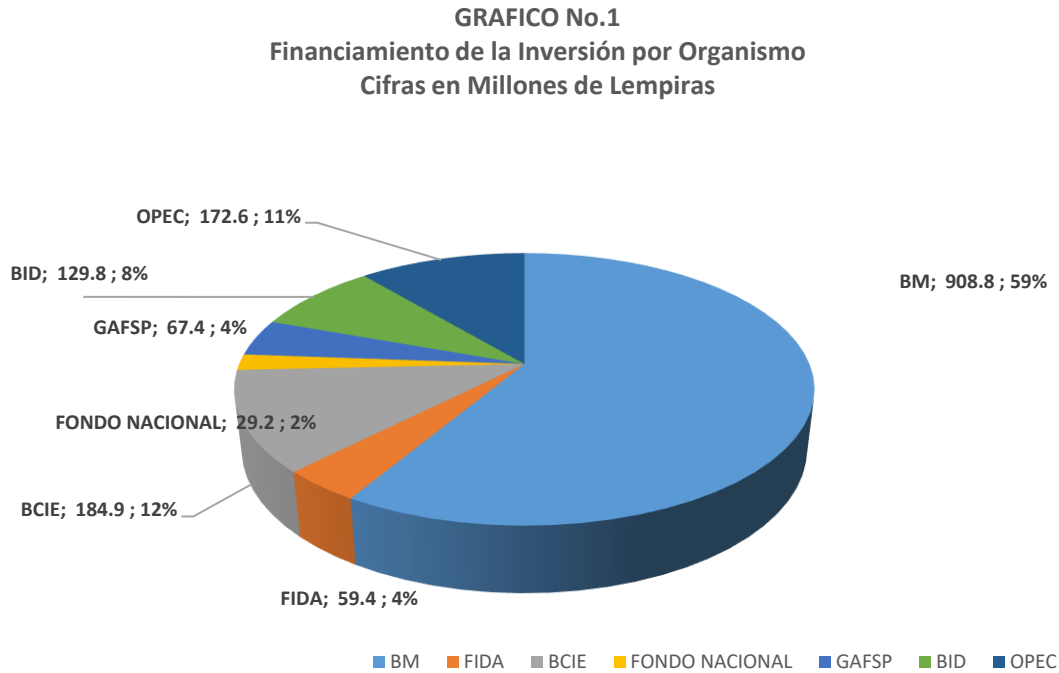

El Presupuesto Vigente del Programa de Inversiones Públicas de la SAG es financiado en un **98%** por recursos de Crédito externo; de los cuales el 59% proviene de préstamos del Banco Mundial (BM) con un monto de L908.8, seguido del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 12% de participación con un monto de L184.9 millones, el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) absorben en su conjunto un 12% con un monto de inversión de L59.4 millones. Asimismo, se cuenta con un 15% de donaciones externas financiada por GAFSP y OPEC

Por otra parte, se contó con un monto de L29.1 millones, representativos del 2% de participación, Fondos del Tesoro Nacional tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Ejecución histórica 2019-2023

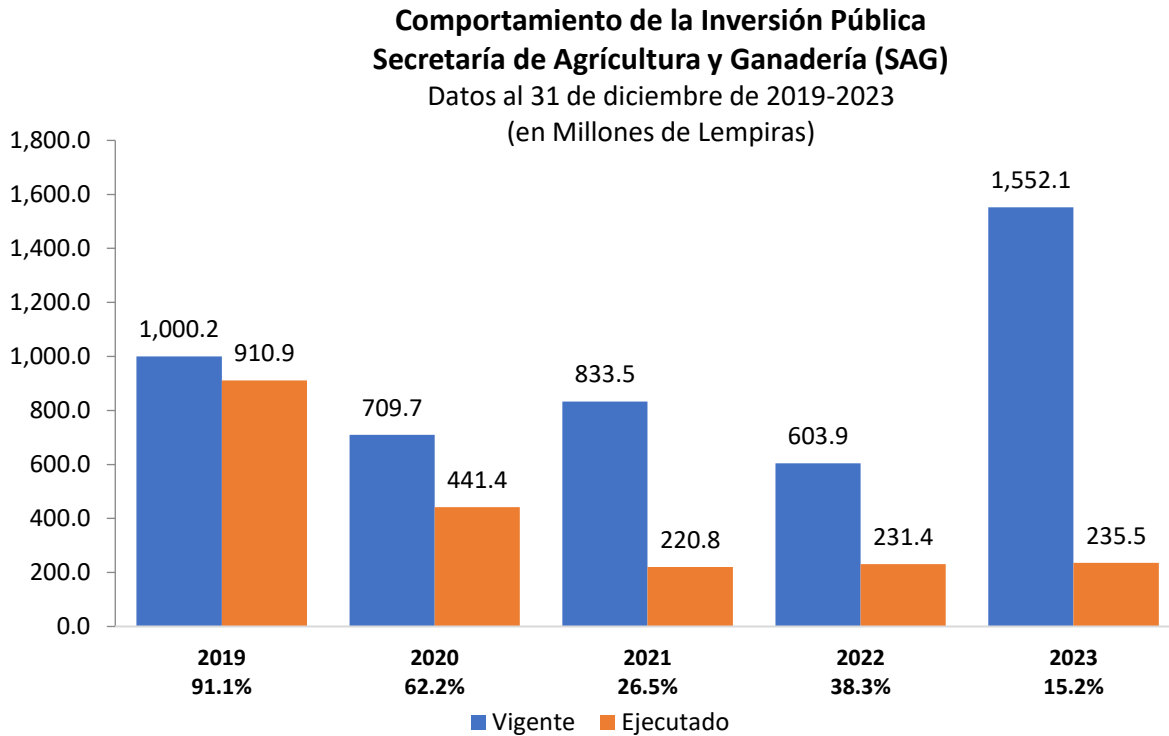

Fuente: SIAFI

En el periodo comprendido entre el año 2019 y el 2023, la SAG ha administrado ocho (8) proyectos de inversión pública financiados con recursos otorgados por el BM, BCIE, OPEC, FIDA, BID, LOAN y GASFP. El Programa de Inversiones Públicas histórico de la SAG en los últimos 5 años presenta bajos porcentajes de ejecución. Lo anterior, debido a que se reestructuró la Unidad de Planificación de la Gestión (UPEG), y a que se formuló un presupuesto de inversión muy por encima de lo que la institución podría ejecutar de conformidad a sus capacidades institucionales; se observa que a septiembre 2022 tenía un vigente de L633.4 millones, ejecutado L161.6 millones, con un 26%, al 30 de septiembre de 2023 cuenta con un presupuesto vigente de L1,552.1 millones, con una ejecución 6% con L95.9 millones.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la SAG se concentra en 8 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo al Desarrollo Productivo y Riego del país, los mismos se describen a continuación:

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN FIDA-II-200000125200	27,483,100		03/03/2014
			665,132,245	31/03/2023
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	52,935,274.0	59,435,274.0	0.0	0.0
Acumulado 2023	52,935,274.0	59,435,274.0	21,572,238.4	36.3
Acumulado Vida del Proyecto */	665,132,244.7	665,132,244.7	536,166,896.3	80.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.6422 por US\$1.00

El proyecto finalizó durante el tercer trimestre se realizó el cierre administrativo. La ejecución financiera del año fue del 36.3% respecto al presupuesto vigente.

Actualmente, estos productos fueron revisados por el FIDA. La UAP-SAG ya socializó internamente los resultados.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico. Se sigue de la mano con 100 asistencias técnicas en temas administrativos y financieros brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (FIDA II).

Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	LOAN No. 13754P 2000002595	39,087,574		01/09/2021 01/09/2027
			945,977,922	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	266,361,663	184,490,557	9,555.79	6.0

SECRETARÍA DE FINANZAS

Acumulado 2023	266,361,663	184,490,557	18,871.85	12.0
Acumulado Vida del Proyecto */	945,977,922	945,977,922	28,427,640	3.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cierre del IV trimestre, el proyecto refleja una baja ejecución trimestral (6%) y una ejecución acumulada anual de 12% lo que representa L18.8 millones del total anual, reflejando una baja ejecución en comparación al presupuesto anual de L184.5 millones, debido principalmente que el proyecto entró en operatividad en el mes de junio de 2023 y no cuenta con todo el personal para la ejecución del proyecto.

Se han elaborado términos de referencia de las diversas consultorías previstas para iniciar los logró enviar a FIDA la actualización del POA y PACC de 2023.

La ejecución corresponde al pago de Servicios de Consultoría del personal técnico del proyecto y compra de mobiliario y equipo adquirido para la instalación de las oficinas en Tocoa y Olanchito.

Actualmente se encuentra en la etapa de elaboración de términos de referencia para los siguientes procesos:

Estudios competitividad integral por cadena(consultoría);

Facilitador técnico de plataformas 1;

Facilitador técnico de plataformas 2; Estrategia sectorial de cadena (consultoría);

Evaluación de riesgo climático (SECAP).

Se tiene previsto iniciar la implementación en la gestión 2024.

En el mes de diciembre se realizaron visitas de campo por parte de FIDA, UGP y UAP, para tener una mayor comprensión sobre los territorios y los potenciales beneficiarios del proyecto.

El proyecto presenta un problema en la parte administrativa por no contar con la totalidad de los bienes (vehículo), se encuentra en proceso de contratos y recepción de bienes esperando que en el primer trimestre de 2024 cuenten con el insumo; en la parte técnica no se ha podido arrancar con el porcentaje previsto en la proyección presentada se realizaron y prepararon términos de referencia para la contratación de consultorías para que se pueda ejecutar sin contratiempos.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101 PNUD Fondos Nacionales	US\$	55,123,754	12/4/2020 29/11/2025
		Lempiras	1,334,077,532	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	202,158,612	202,158,612	2,322.222	1.0

SECRETARÍA DE FINANZAS

Acumulado 2023	202,158,612	202,158,612	17,884.000	9.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,334,077,532	1,334,077,532	821,953,765	61.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cierre del IV trimestre, el proyecto refleja una baja ejecución trimestral (1.0%) y una ejecución acumulada anual de 9% lo que representa L17.8 millones del total anual, reflejando una baja ejecución en comparación al presupuesto anual de L202.2 millones, debido a que el proyecto no contaba con una buena planificación, estudios desfasados no cumplieron los tiempos de ejecución, procesos fracasados de licitaciones, conflicto en la autorización de pasos de servidumbre de los proyectos contratados.

Se le otorgo una nueva ampliación al proyecto con la aprobación del banco, su fecha de cierre es 29 de noviembre de 2025.

Para este IV trimestre se cumplió el 100 %, con la instalación de los sistemas de Intrafinca en el proyecto Sulaco, los cuales se instalaron para el riego de maíz, plátano, hortalizas, etc.

Asimismo, se programó la siembra de 38 hectáreas de cultivos no tradicionales, reportándose en noviembre en el proyecto Sulaco la siembra de 20 hectáreas con cultivo de plátano y Yuca, bajo la modalidad de siembra por contrato, donde los beneficiarios han firmado contrato con 2 empresas agroexportadoras: HONDUPRODUCE e INALMA, y 29 hectáreas en el mes de diciembre en el proyecto Selguapa, con cultivos como Papaya, maracuyá, bangaña, sandía, berenjena, guayaba, Okra etc., para un total de 49 hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales.

Se socializó el plan de ordenamiento de la subcuenca Rio Cuyamapa, mismo que fue recién aprobado por el ICF. Se desarrollaron talleres en los municipios de Victoria y Yoro con actores clave de la conservación de los recursos naturales.

Por otra parte en Gestión Ambiental no se tenía programado el desarrollo de talleres, sin embargo, se desarrollaron tres (3) eventos de educación ambiental que estaban pendiente, para completar la meta anual de 12 talleres programados para 2023. Se desarrollaron tres (3) talleres de educación ambiental, en el municipio Comayagua, específicamente, en las comunidades de El Taladro, Voluntades Unidas y Los Cascabeles, todas aledañas al canal de riego Selguapa. Participaron 76 personas, de las cuales 40 son hombres, 36 son mujeres y 95% son jóvenes (72 alumnos) de centros educativos de la zona aledaña al canal de riego Selguapa.

En Gestión Ambiental de los 12 talleres desarrollados en el año, participaron 349 personas (197 hombres, 152 mujeres) siendo 208 jóvenes.

La ejecución se ha visto afectada por metas planificadas no ejecutadas en el diseño de construcción y supervisión de obras, en vista que el único proyecto actualmente pendiente de finalizar es el proyecto San Sebastián, el cual no se ha reactivado porque el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no se ha pronunciado en cuanto a la

“No Objeción” para la ampliación del plazo y monto del contrato con la constructora SEDECO, por lo que el proyecto continúa suspendido.

Los proyectos de riego de Sulaco y Selguapa fueron ya concluidos y entregados, por lo que, actualmente, únicamente se les da un seguimiento en las operaciones de los sistemas de riego, revisando reparaciones de algunas obras que, se encuentran bajo las garantías de calidad que fueron entregadas por los contratistas a favor de la SAG.

Contratos suscritos de comercialización y financiamiento: La meta anual de 6 contratos se cumplió al 100% en agosto 2023, con la firma de 6 contratos de compraventa del cultivo de plátano con la empresa agroexportadora HONDUPRODCE y los productores de plátano de Sulaco.

También se han suscrito 40 contratos de financiamiento entre beneficiarios de Sulaco y la entidad Financiera BANADESA.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	12/4/2020 12/4/2025	
		Lempiras	1,815,112,500		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023		476,495,835	476,495,835	56,191,630	12.0
Acumulado 2023		476,495,835	476,495,835	85,819,640	18.0
Acumulado Vida del Proyecto */		1,815,112,500	1,815,112,500	476,717,160	26.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

A través del proyecto se fortalecen los sistemas de investigación, desarrollo e innovación vinculados a las demandas de Organizaciones de Productores Rurales (OPRs), que implementan planes de negocio en el sector agrícola; además adopta un enfoque más incluyente beneficiando dentro de su grupo meta a pequeños productores de seguridad alimentaria con el propósito de facilitarles el acceso a factores de producción que les permita insertarse en la dinámica económica de cadenas de valor.

Durante el IV trimestre, se llevó a cabo el lanzamiento de 7 procesos nuevos de contratación de personal vacante y nuevo a contratar el cual están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP., se aprobaron 18 Planes de negocios por el Comité Directivo.

Se logro realizar las transferencias No reembolsables de 7 OPRs, por un monto de L35.9 Millones.

El Plan de Aceleración del proyecto puesto en marcha y en seguimiento a las actividades pendientes por componente.

El Lanzamiento del proceso de evaluación de firma implementadora de la ventana 1, por Sub región Sur y Sub-Región Occidente por el monto de US\$5.2 Millones.

Se firmó 4 convenios Interinstitucionales, ARSA, SENASA, SENPRENDE y SERNA por un monto de US\$4.3 Millones.

Se logró operativizar la ventana 1, bajo la identificación de 3 Planes de Negocios. implementadora para la ventanilla 1, los cuales están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PRO-OCCIDENTE) 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID 4940/BL-HO BID 4936/BL-HO	US\$
		Lempiras	1,331,082,500	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	129,755,922	150,255,922	51,048,090	34.0
Acumulado 2023	129,755,922	150,255,922	57,333,230	38.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,331,082,500	1,331,082,500	70,235,153	5.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto iniciará actividades formales de implementación en campo en 2024. Los planes elaborados permitirán agilizar la implementación en 2024.

En el IV trimestre los planes de inversión corresponden a acciones desarrolladas dentro del componente 1. Fortalecimiento Productivo; La ejecución de este componente contempla el desarrollo de planes de asistencia técnica, abarcando el cofinanciamiento de inversiones productivas.

Durante el último trimestre 2023 y con la formalización del contrato con la firma sub-implementadora (28 de septiembre 2023), se realizó un trabajo de coordinación entre los técnicos regionales especialistas en campo del proyecto y consultores independientes de la firma sub implementadora, para elaborar los planes de inversión, de acuerdo con los criterios de elegibilidad y contenidos mínimos requeridos por el proyecto.

Esta acción da inicio al proceso de implementación que se desarrollará durante 2024. Junto a los demás planes que sean elaborados en el transcurso del año.

Al 31 de diciembre 2023, se elaboraron 20 planes de inversión, dando cumplimiento a la meta anual al 100%.

Se ha contratado al Coordinador General (01.12.2023), Coordinador del Componente 1 (01.11.2023) y se evaluaron los candidatos para el especialista en adquisiciones, Coordinador de Componente II y de oficial financiero.

Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
4) Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US\$	45,000,000	24/09/2021	
		Lempiras	1,089,067,500	30/04/2025	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023		242,285,548	242,285,548	5,287,770	2.0
Acumulado 2023		242,285,548	242,285,548	10,840,230	4.4
Acumulado Vida del Proyecto */		1,089,067,500	1,089,067,500	17,704,559	1.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto muestra una baja ejecución trimestral (4.0%). Todavía están en proceso de revisión los TDR para la contratación del personal técnico y las empresas ejecutoras y supervisoras, para someterlo a No Objeción ante el organismo financiador (BM) y continuar con la licitación de obras de infraestructura, compra de insumos en beneficio de los entes municipales beneficiados.

En el IV Trimestre se realizó: un Plan de inversión de subproyectos de rehabilitación, una evaluación de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS), un Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación, 5 Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS.

En el mes de diciembre de 2023 se realizó la Misión de Evaluación de Medio Término del Proyecto, en la que se acordó solicitar a la Secretaría de Finanzas y Banco Mundial la ampliación del plazo de implementación del Proyecto por 15 meses, llevando su finalización al 31 de marzo de 2027. La solicitud de ampliación fue presentada por la SEFIN al Banco Mundial en fecha 15 de diciembre de 2023, esperando la No Objeción del organismo financiador.

Cabe destacar que, en diciembre, se elaboró un plan de acción en conjunto con la Unidad Técnica de la Presidencia (UTP), SEDESPA, la UAP y la UGP, en apoyo a la SAG para acelerar la ejecución de la cartera de proyectos del BM y BID y de igual forma, abordar temas que podrían poner en riesgo el avance de la implementación del Proyecto.

ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO - PROSASUR. (USAID-GAFSP)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	GAFSP TF017904	6,256,998.71	141,426,942	24/03/2015 31/12/2024
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	67,392,925	67,392,925	13,427,730	20.0
Acumulado 2023	67,392,925	67,392,925	15,520,300	23.0
Acumulado Vida del Proyecto */	648,569,099	648,569,099	15,520,302	2.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

El proyecto tiene una baja ejecución trimestral (20.0%). Este fue el último proyecto en recibir la efectividad (30 de junio 2023) del organismo financiador (BM). Actualmente, está en proceso la contratación del director ejecutivo y de los coordinadores de los componentes, así como la finalización del proceso de negociación para la firma de contrato con la empresa sub implementadora.

En el cuarto trimestre del año 2023, después de una serie de reuniones entre las partes involucradas, el personal de la UAP/ SAG y el apoyo del Banco Mundial se logra la No Objeción al contrato de implementación y posteriormente su firma en fecha 29 de noviembre de ese año, para el inicio de operaciones la firma implementadora presentó en el mes de diciembre un total de 3 informes denominados entregables en el proyecto, sujetos a pago, que corresponden a: Informe de Inicio del Fondo Original Remanente (FOR), Plan de Información, Comunicación y Educación (ICE) y Plan de Monitoreo y Evaluación, mismos que han sido evaluados y dictaminados por UAP/ SAG, se encuentran pendiente la presentación de informe importantes entre ellos el Plan Operativo Anual el que deberá comprender las actividades administrativas y técnicas para la ejecución de los fondos de inversión, se espera el Consultor Implementador realice su presentación en los primeros días del mes de enero. Durante el periodo reportado se ha elaborado y enviado al Banco Mundial el borrador del POA 2024 del Fondo Original Remanente y se está trabajando en el POA del Fondo Adicionan. De igual manera, la UAP /SAG continúa realizando esfuerzos para lograr la contratación del personal vacante del proyecto.

Durante el año 2023 no fue posible cumplir con la ejecución de las metas físicas del proyecto debido a la presencia de situaciones adversas ajenas al proyecto, sin embargo, con la contratación del CI a finales del mes de noviembre se espera cumplir con las metas y compromisos adquiridos con el donante durante el año 2024.

Cabe destacar que, en diciembre, se elaboró un plan de acción en conjunto con la Unidad Técnica de la Presidencia (UTP), SEDESPA, la UAP y la UGP, en apoyo a la SAG para acelerar la ejecución de la cartera de proyectos del BM y BID y de igual forma, abordar temas que podrían poner en riesgo el avance de la implementación del Proyecto.

Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	6,256,998.71	85,000,000	01/04/2021 30/09/2026	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023		190,041,562	190,041,562	2,246,980	1.2
Acumulado 2023		190,041,562	190,041,562	8,114,920	4.2
Acumulado Vida del Proyecto */		17,958,390	17,958,390	8,114,925	45.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

El 22 de mayo 2023 se recibió la nota del BM confirmando las condiciones de efectividad estipuladas en la Primera Enmienda del Acuerdo de Financiamiento, de fecha 6 de enero de 2023, las que han sido cumplidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y por lo tanto el Proyecto puede continuar su ejecución bajo el nuevo ente ejecutor.

Durante el IV trimestre dentro de los acuerdos establecidos en la Misión Técnica de Apoyo a la Implementación del Proyecto está la programación de reuniones adicionales en el mes de octubre para continuar con las revisiones de posibles escenarios de reestructuración del Proyecto: a) Escenario 1, con actividades que se puedan lograr concretar al 31 de diciembre de 2025, b) Escenario 2, con actividades que se puedan completar en un plazo de 23 meses adicionales, hasta noviembre de 2027 y c) Escenario 3, revisar de nuevo la proyección presentada por la UGP para el alcance total del Proyecto que trasciende los 23 meses adicionales de plazo.

De igual forma, es importante mencionar que en los meses de octubre y noviembre 2023 se visitaron las Alcaldías de Intibucá, La Paz, Curarén y La Venta. El propósito de estas visitas fue para completar los insumos para la preparación de los TdR de la Asistencia Técnica de la Etapa I, e informar a las partes interesadas sobre el estado actual del Proyecto con relación a los subproyectos de SIAS existentes y los próximos pasos planificados para su implementación.

Además, se hizo la consulta sobre la necesidad de asistencia técnica para fortalecer la gobernanza municipal en GIRH incluyendo instrumentos de gestión territorial, mejoramiento/construcción de viveros municipales y, de ser posible, en las zonas de influencia del Proyecto y la capacitación de personal municipal.

Por otra parte, se logró en noviembre de 2023 la conformación de la Junta de Regantes en la comunidad de Hato Tejera, en el municipio de Curarén.

Igualmente, la SEFIN solicitó mediante oficio DGCP-FEMS-348/2023 con fecha 15 de diciembre del 2023, de manera oficial al Banco Mundial, la ampliación de tiempo del proyecto por 23 meses hasta noviembre del 2027. Por otra parte, la UAP solicitó el 22 de diciembre de 2023 la No Objeción al BM para la recontractación del personal de la UGP recibiendo la respuesta el 26 de diciembre de 2023.

El Banco Mundial realizó la Misión de Evaluación de Medio Término del proyecto del 08 y el 15 de diciembre. Durante la Misión se revisaron escenarios de las metas del proyecto al 2025 y al 2027, mostrando el BM anuencia para la aprobación de la ampliación de tiempo del proyecto.

3.4 PROGRAMAS SOCIALES

Se han ejecutado un monto de L1,300.0 millones correspondientes a los programas presidenciales destinados a los Bonos Cafetalero para la fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores con un 100% de ejecución, Bono Tecnológico Productivo con un 100% en su ejecución y Bono Ganadero con el 100% de su ejecución.

Considerando una ejecución efectiva del 100% en relación con el presupuesto vigente total de L1,300 millones.

3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento técnico para agilizar la ejecución de los proyectos.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2023.
- Requerimiento de matriz departamental del presupuesto de inversión 2023
- Participación en las misiones del BM-BID-BCIE
- Revisión de cartera con el BM-BID-BCIE
- Se elaboró un plan de acción en conjunto con la Unidad Técnica de la Presidencia (UTP), SEDESPA, la UAP y la UGP, en apoyo a la SAG para acelerar la ejecución de la cartera de proyectos del BM y BID y de igual forma, abordar temas que podrían poner en riesgo el avance de la implementación de los Proyectos.

Conclusiones

- La rotación histórica y las plazas que no se cubren del personal clave y técnico en las unidades ejecutoras de proyectos ha afectado en gran manera el avance adecuado de los proyectos ejecutados por la institución.
- La supervisión permanente y ejecución de acciones son indispensables juntamente con la SEFIN y las áreas involucradas a fin de que los financiamientos se ejecuten en tiempo y forma para lograr el objetivo de cada uno de los proyectos.

Recomendaciones

- Hacer contrataciones efectivas del personal técnico de la unidad ejecutora de los proyectos y evitar su rotación mientras los proyectos no sean finalizados.
- Agilizar los procesos para la adecuada ejecución de los proyectos de la institución.
- Se debe contar con un Plan de Acción sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos para un seguimiento puntual y cumplimiento de metas de parte de la Unidad Ejecutora.
- Se recomienda acelerar la ejecución de los diferentes proyectos que ejecuta la institución.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		29,154,981	492,300,568	521,455,549	29,154,981	1,522,901,254	1,552,056,235	1,857,980	137,782,345	139,640,325	9%	6,399,966	229,116,559	235,516,524	15%
	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	TF017904	-	-	-	-	67,392,925	67,392,925	-	13,427,726	13,427,726	20%	-	15,520,297	15,520,297	23%
	Total ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)		-	-	-	-	67,392,925	67,392,925	-	13,427,726	13,427,726	20%	-	15,520,297	15,520,297	23%
	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	-	-	-	-	242,285,548	242,285,548	-	5,287,771	5,287,771	2%	-	10,840,228	10,840,228	4%
	Total Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		-	-	-	-	242,285,548	242,285,548	-	5,287,771	5,287,771	2%	-	10,840,228	10,840,228	4%
	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	IDA-6448-HN	-	-	-	-	476,495,835	476,495,835	-	56,191,633	56,191,633	12%	-	85,819,645	85,819,645	18%
	Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		-	-	-	-	476,495,835	476,495,835	-	56,191,633	56,191,633	12%	-	85,819,645	85,819,645	18%
	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	-	33,373,000	33,373,000	-	36,223,000	36,223,000	-	439,892	439,892	-1%	-	17,017,147	17,017,147	47%
		FIDA-II-200000125200	-	19,562,274	19,562,274	-	23,212,274	23,212,274	-	-	-	0%	-	4,115,200	4,115,200	18%
	Total PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		-	52,935,274	52,935,274	-	59,435,274	59,435,274	-	439,892	439,892	-1%	-	21,132,347	21,132,347	36%
	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BOI-E-2101	17,216,651	184,941,961	202,158,612	17,216,651	184,941,961	202,158,612	271,612	2,050,608	2,322,220	1%	1,794,360	16,089,644	17,884,004	9%
	Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)		17,216,651	184,941,961	202,158,612	17,216,651	184,941,961	202,158,612	271,612	2,050,608	2,322,220	1%	1,794,360	16,089,644	17,884,004	9%
	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	2000002595	11,938,330	130,683,333	142,621,663	11,938,330	103,683,333	115,621,663	1,586,367	7,969,426	9,555,793	8%	4,605,606	14,266,249	18,871,854	16%
		LOAN No. 13754P	-	123,740,000	123,740,000	-	48,368,894	48,368,894	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)		11,938,330	254,423,333	266,361,663	11,938,330	152,052,227	163,990,557	1,586,367	7,969,426	9,555,793	6%	4,605,606	14,266,249	18,871,854	12%
	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	-	-	-	-	190,041,562	190,041,562	-	2,246,978	2,246,978	1%	-	8,114,923	8,114,923	4%
	Total PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		-	-	-	-	190,041,562	190,041,562	-	2,246,978	2,246,978	1%	-	8,114,923	8,114,923	4%
	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO	-	-	-	-	33,113,726	33,113,726	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		4940/BL-HO	-	-	-	-	117,142,196	117,142,196	-	51,048,095	51,048,095	44%	-	57,333,226	57,333,226	49%
	Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		-	-	-	-	150,255,922	150,255,922	-	51,048,095	51,048,095	34%	-	57,333,226	57,333,226	38%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023
