

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Salud***  
***(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras  
Octubre, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01

## Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	113,937,594
Presupuesto Vigente	908,052,300
Devengado III Trimestre-2022	51,573,529
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>6%</b>
Devengado Anual	289,032,790
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>32%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	354,238,143
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>39%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

Para el Ejercicio Fiscal 2022, la SESAL cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de **L113.9** millones, el cual se incrementó al término del segundo trimestre y manteniéndose al tercer trimestre con un Presupuesto Vigente de **L.908.1** millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para contar con la adquisición oportuna de vacunas contra Covid-19, contratación de servicios de salud mediante gestores descentralizados y fortalecer la estrategia para la eliminación de la malaria en el país. Al cierre del trimestre alcanzó una ejecución financiera del 32% del Presupuesto Vigente asignado. La ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.


Al término del tercer trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria acumulada de L289.0 millones (32%) a nivel de devengado y registró compromisos por un orden de L.354.2 millones (39%) en relación al presupuesto vigente asignado; producto de la ejecución reportada en seis de **nueve proyectos adscritos**, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña; mejorar la eficiencia en la gestión en salud mediante medios informáticos, complementariamente a partir del año 2021, se gestionó la adquisición de vacunas certificadas por las Autoridades Regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los grupos de la población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la

covid-19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o más (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con morbilidades y trabajadores esenciales).

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al tercer trimestre se financia con recursos externos provenientes de Convenios de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Italia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de los cuales, el Crédito Externo representa el 95% (L867.1 millones) y Donaciones externas 5% (L41.0 millones), distribuidos de acuerdo con el Gráfico No. 01.

**Gráfico No. 01**  
**Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente**  
Cifras en Millones de Lempiras

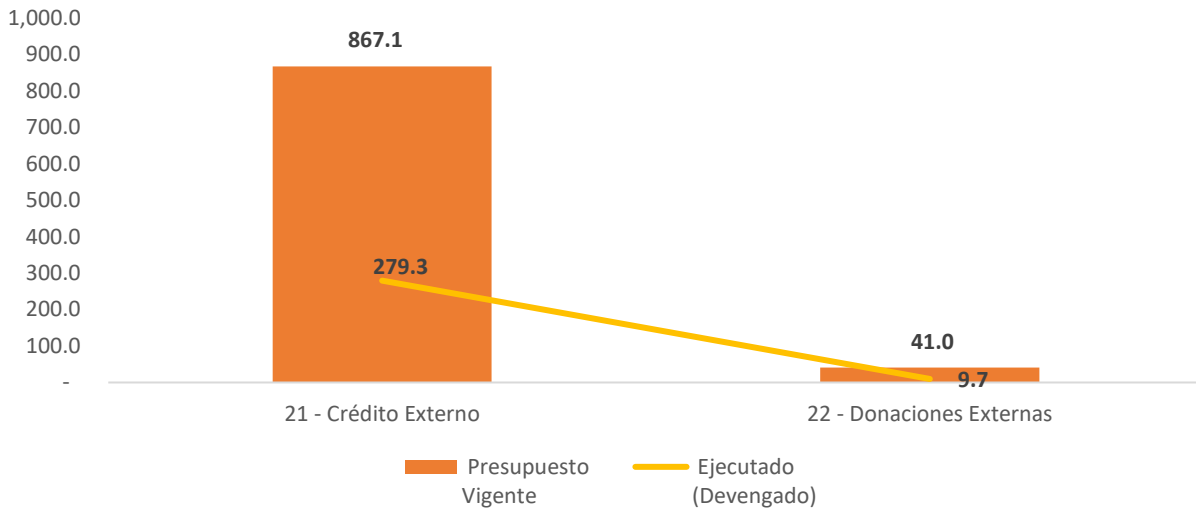

En forma comparativa al III trimestre del año 2021, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L.1,412.7 millones, reportó ejecución en 66% (L.926.0 millones); la tendencia en ejecución refleja un porcentaje menor en 34 puntos porcentuales; tomando en cuenta que la asignación para el año 2022 es menor en 35.7% (L.504.6 millones menos); sumado a esta situación, el proceso por cambio de Gobierno y cambios en las directrices de las nuevas Autoridades Institucionales ha sido la justificación en el desfase en la ejecución de los programas y proyectos; adicionalmente el proceso tardío de las modificaciones presupuestarias tanto a lo interno de la institución como las que dependen de autorización por parte de la SEFIN, otro factor incidente, producto de las nuevas decisiones en las Autoridades es la ejecución de actividades no establecidas (no planificadas) en los POA para el presente ejercicio fiscal y finalmente, el cambio de personal clave ha afectado en vista que dicho personal aún se encuentra en proceso de adaptación a los procesos internos en las instituciones específicamente en la SESAL.

Al tercer trimestre se mantienen pendientes de aprobación por el Congreso Nacional 4 contratos que trascendieron período de Gobierno, los cuales no pueden continuar con su ejecución hasta no contar con su aprobación y publicación.


Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

**3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2018 – 2022):**

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 15 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 97% con recursos de crédito externo, 3% recursos de donación externa y el 1% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L.4,510.9 millones; reflejando un promedio de ejecución del 45% (L.2,019.7 millones) al mes de septiembre de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge la Emergencia Sanitaria por COVID-19 permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, considerando que, para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el PNUD y la OPS.

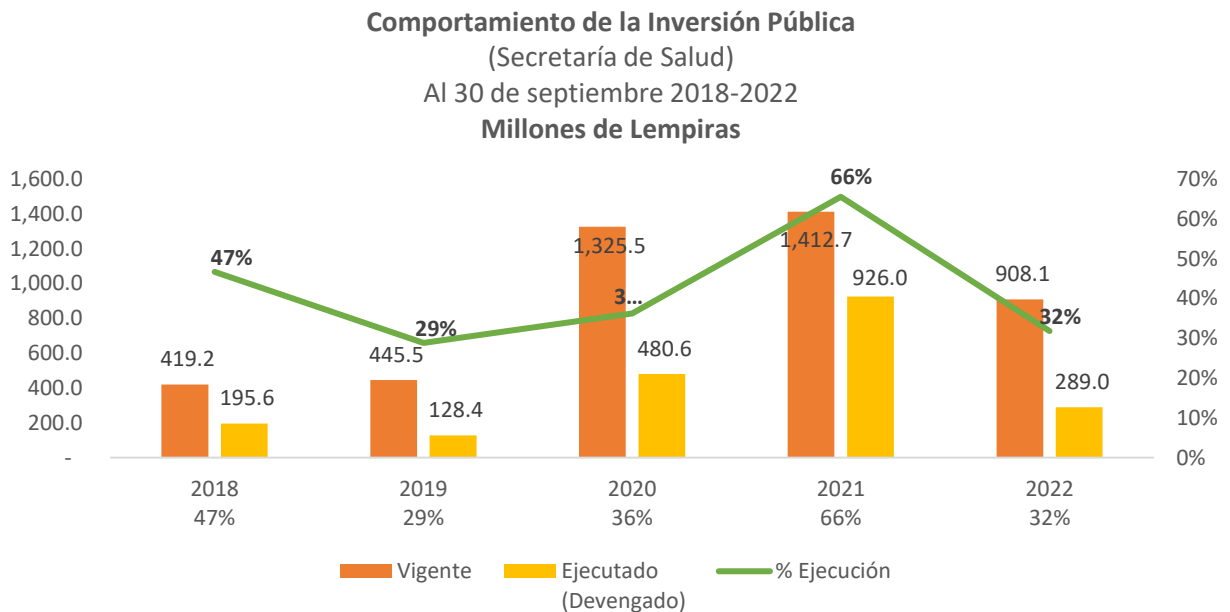

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

**Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	14/08/2020 31/12/2022
		Lempiras	1,235,579,048	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2022	3,591,822	24,141,824	2,860,312	11.8%
Acumulado 2022	3,591,822	24,141,824	3,636,733	15.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,235,579,048	1,235,579,048	1,179,434,204	95.5%

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2022 (BCH): L24.7116 por US\$1.00

**Objetivo:** contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

**Avance Físico:** Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, a través de informes de avance de consultorías (23 contratos).
- Celebrar 1 Convenio para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.
- Realizar la Auditoría del Proyecto.

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reportó los siguientes avances por componentes:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:

Las actividades en el fortalecimiento de la conducción de país; se realizaron los pagos de honorarios profesionales de las consultorías siguientes: un consultor senior (por Producto), un consultor junior (2 Productos), tres desarrolladores, 12 digitadores (meses de enero a

## SECRETARIA DE FINANZAS

abril) para la estrategia de soluciones digitales en el marco del plan nacional para la respuesta en el cual se desea implementar el expediente clínico electrónico, sistema de referencia y respuesta y 1 Consultoría Nacional como Asistencia de soporte Técnico 2 (del 11 de enero al 10 de febrero).

✓ Detección y seguimiento de los casos:

En apoyo técnico a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan en la gestión administrativa de servicios de salud en hospitales y regiones mediante convenios de gestión firmados con la SESAL, se realizó el pago de honorarios de una consultoría de monitoreo (UGD).

✓ Interrupción de la cadena de transmisión:

Pago de Servicio de Impresión de Materiales, 100 Banner Promocional de Vacunación Pediátrica, Impreso en Lona vinílica, Full Color, Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:

Primer pago del anticipo del 20%, sobre monto del contrato, construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados.

✓ Gestión del Programa y Auditoría:

Pagos del Servicio de Energía Eléctrica, pagos de honorarios profesionales de las consultorías y pago de anticipo de viáticos.

### **Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 07/02/2025
		Lempiras	123,557,905	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2022	33,119,323	44,409,200	1,813,883	4.1%
Acumulado 2022	33,119,323	44,409,200	4,149,948	9.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	123,557,905	123,557,905	8,369,306	6.8%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2022 (BCH): L24.7116 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

## SECRETARIA DE FINANZAS

**Avance Físico:** Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 111 municipios, en intervenciones de 20 trimestralmente.

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta:

Pago parcial de servicio de alquiler de oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD).

Pagos de honorarios profesionales de las consultorías en apoyo a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), misma que realizan el monitoreo, evaluación y administración del programa.

Pago de honorarios profesionales de las consultorías de la Unidad Ejecutora GESALUD.

**Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):**

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras	BCIE 2271	US\$	35,000,000	14/05/2021
		Lempiras	864,905,333	14/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2022	45,351,702	45,351,702	-	0.0%
Acumulado 2022	45,351,702	45,351,702	-	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	864,905,333	864,905,333	730,882,433	84.5%

**Nota:** Mediante Oficio No.1776-SS-2022 de fecha 15/06/2022; la SESAL solicita el cese de desembolsos para el Contrato de Préstamo No. 2271 con el BCIE.

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2022 (BCH): L24.7116 por US\$1.00

**Objetivo:** contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19, a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.

**Avance Físico:** Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Adquisición de 130,368 dosis de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el Plan de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19.
- Elaborar 4 informes de administración y ejecución del Proyecto.
- Contratar la Auditoría y supervisión externa del Proyecto.

Por disposiciones de las Autoridades de la SESAL se determinó cancelar los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo BCIE 2271, por un monto estimado de US\$4.3 millones; en vista que los recursos ya no serían requeridos para la



## SECRETARIA DE FINANZAS

adquisición de vacunas y que el uso de los mismos de acuerdo al contrato suscrito únicamente puede ser utilizados para dicho fin. Por otra parte, la Autoridad ha gestionado la obtención de vacunas mediante otras cooperaciones en calidad de donación.

### **Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):**

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	US\$	40,000,000	15/04/2020
	IDA 6868-HN	Lempiras	988,463,238	24/04/2023
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2022	-	293,225,691	5,912,663	2.0%
Acumulado 2022	-	293,225,691	5,912,663	2.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	988,463,238	988,463,238	370,088,439	37.4%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2022 (BCH): L24.7116 por US\$1.00

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frío para los establecimientos de salud priorizados.

**Avance Físico:** Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Realizar 15 procesos de licitación para la adquisición de equipo y mobiliario médico para los Hospitales, Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional.
- Elaborar 9 informes de administración, Gastos Operativos, Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.

Durante el primer semestre del 2022; se realizaron acciones conjuntas SESAL-PROSALH y SEFIN, para la identificación de espacio presupuestario para la ejecución; mismo que fue identificado mediante Notas Técnicas No.001-2022 y 004-2022 para el traslado de espacio presupuestario parcial por un monto de L293.2 millones para honrar pagos que no pudieron ser efectuados durante el año 2021, debido al desfase relacionado al proceso de traslado de INVESTH a SESAL, en cumplimiento al PCM-030-2021; actividad que también impactó en no poder formular dicho proyecto para el año 2022.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH), las principales actividades realizadas se resumen a continuación:



Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso de contratación de recurso humano (783 personas) para el despliegue y aplicación de la vacuna en 230 municipios a través de 79 equipos que considera 711 personas en brigadas y 72 coordinadores.

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

### **Convenio IDA-6626-HN:**

1. Se recibieron Kit para exámenes de laboratorio, el pago de transporte aéreo se encuentra en proceso por US\$15,327.00 (en proceso de regularización de pago).
2. Se encuentra el proceso de contratación para la reparación de 2 tomógrafos (Hospital Mario Catarino Rivas e Instituto Cardiopulmonar Tórax, (ya se recibieron propuesta y se encuentra en proceso de evaluación).
3. Adquisición se 26 lavadores y 10 secadoras, se encuentran en proceso de recepción de oferta. (ya se recibieron propuestas y se encuentra en proceso de evaluación).
4. Contrato suscrito por US\$ 195,865 para la adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso, se espera cancelar este año. (En proceso primer pago)
5. Adquisición de 3 ultra sonógrafos en proceso de adquisición. (Proceso de recepción de ofertas)
6. Adquisición de camas hospitalarias y 71 monitores de signos vitales en proceso de firma de contrato
7. Adquisición de 1 autoclave y 7 estufas industriales en proceso de publicación US\$48,500.00 (Proceso de recepción de ofertas)
8. En proceso de firma de contrato la adquisición de equipo de cómputo para diferentes unidades de la SESAL y sala situacional de la SESAL por un monto de US\$242,000 (Contrato adjudicado, proceso de recepción de equipo)
9. En proceso de recepción de oferta mobiliario para la sala situacional de la SESAL. (proceso de recepción de ofertas)
10. Auditoria del Proyecto (Contrato ya suscrito) y asistencias especializadas en mortalidad materna (contrato ya suscrito)

### **Convenio IDA-6868-HN:**

1. Equipo de cadena de frio contrato ya firmado US\$388,652.00, proceso de suscribir contrato con OPS US\$587,610.
2. Adquisición de compra de algodón para el despliegue y aplicación de la vacuna. (Licitación se publicó en septiembre 2022)
3. Adquisición de equipo de protección personal (EPP) para el desplazamiento de la vacuna y para el Programa ampliado de inmunizaciones (PAI). El proceso ya se encuentra en proceso de evaluación de ofertas.
4. Adquisición de destructores de agudas (en proceso de recepción de ofertas)
5. Proceso de adquisición de gestión ambiental y social Por US\$23,500.00
6. En proceso de licitación la adquisición de indumentaria para la identificación de personal US\$ 150,000.00 (en proceso de evaluación las ofertas)
7. En proceso de firma de contrato el sistema de información para captura de información. (en proceso de firma de contrato)

8. Adicionalmente se financiará gastos de movilización, combustibles, para el personal de despliegue.

**Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 01/10/2023
		Lempiras	1,329,977,287	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2022	111,496,350	455,928,545	221,520,520	48.6%
Acumulado 2022	111,496,350	455,928,545	221,520,520	48.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,329,977,287	1,329,977,287	651,023,934	49.0%

Presupuesto Aprobado (Año 2022) fue formulado en AEPASH, traslado presupuestario a SESAL en cumplimiento al PCM-092-2021

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2022 (BCH): L24.7116 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Considerando que las directrices de reorientación de los recursos y la formulación del nuevo proyecto se realizaron posterior a la fecha de formulación presupuestaria 2022; la asignación quedó registrada bajo el presupuesto de AEPAS H, por lo que durante el primer trimestre se iniciaron las acciones de traslado de espacio presupuestario entre Instituciones, correspondiente al Convenio BID 4713/BL-HO.

**Avance Físico:** Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2022 (12 informes programados).
- Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2022 (1 informes programado).

- 5 contratos para la implementación de la estrategia de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población.
- 1 convenio de Gestión para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales.
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **19%** y financiero del 50% (en relación con el monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

Pagó de los honorarios profesionales de tres consultorías UGD de apoyo técnico a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan en la gestión administrativa de servicios de salud en hospitales y regiones mediante convenios de gestión firmados con la SESAL.

- ✓ Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión:

En este componente se realizó el pago de la vacuna contra COVID-19 mediante mecanismo de compra bilateral con laboratorios fabricante de vacuna mediante extensión de contrato formalizando una segunda enmienda para el mismo el cual recibió no objeción de BID. Con base a la disponibilidad presupuestaria asignada por SEFIN y solicitud de pago por parte de la Gerencia Administrativa Central.

Al término del III trimestre de 2022, se han recibido 1,788,930 dosis de vacunas.

- ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

En proceso de definir las actividades que se realizarán con los fondos remanentes de los Gestores de I y II Nivel de atención, en proceso la definición de los términos de referencia para la ampliación de dos salas COVID-19 en los Hospitales de Tela y Manuel de Jesús Subirana.

- ✓ Componente 5: Administración del programa:

Se realizaron los pagos correspondientes a servicio de energía, telefonía fija (lo pendiente del año 2021 y pagos del 2022), pago parcial de servicio de alquiler de oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), del año 2022, anticipo y reembolso de viáticos y los honorarios profesionales consultorías de la UE proyectos GESALUD.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (julio - diciembre) de ejecución para el Año 2022.

- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Consolidación de la Matriz departamental para SESAL referente a la ejecución financiera al 30 de junio de 2022.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0027-2022 para la Ampliación de Plazo de Ejecución y Cierre en SNIPH al Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO).
- Se continuó con las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2023 – 2026 para la SESAL.
- Como parte de las actividades del PIP 2023, se solicitó y consolidó la información Departamental por proyecto, así como las metas físicas de los proyectos de 2023.
- Se llevó a cabo la Segunda Revisión General de Cartera de Proyectos financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

### Conclusiones

- Para el tercer trimestre del año 2022, la ejecución reportada por la SESAL registró una ejecución del 32% (L.289.0 millones) a nivel de devengado y compromisos suscritos por L.354.2 millones (39%) en relación al Presupuesto Vigente asignado; considerando que durante los trimestres anteriores se incrementó la asignación presupuestaria en forma parcial en relación a los requerimientos realizados en función de la programación mensual para el año 2022; cabe señalar que la baja ejecución se ha visto afectada por el proceso por cambio de Gobierno y cambios en las directrices de las nuevas Autoridades Institucionales; adicionalmente la el proceso tardío de las modificaciones presupuestarias tanto a lo interno de la institución como las que dependen de autorización por parte de la SEFIN, otro factor incidente, producto de las nuevas decisiones en las Autoridades es la ejecución de actividades no establecidas (no planificadas) en los POA para el presente ejercicio fiscal y finalmente, el cambio de personal clave ha afectado en vista que dicho personal aún se encuentra en proceso de adaptación a los procesos internos en las instituciones.
- Al inicio del año 2022, las Unidades Ejecutoras de la SESAL ingresaron requerimientos para incorporación presupuestaria por alrededor de L.1,220.2 millones (tanto de crédito externo, cómo de donaciones externas), de las cuales se identificó espacio presupuestario parcial mediante Notas Técnicas 001-2022, 003-2022, 004-2022 y 007-2022.

### Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

**ANEXO No. 04**  
**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS**  
**Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2022**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	<b>PROTECCION SOCIAL</b>				33,119,323.0	33,119,323.0		44,409,200.0	44,409,200.0		5,266,936.0	5,266,936.0	12%		1,116,987.6	1,116,987.6	3%		6,352,694.5	6,352,694.5	14%
1	<b>0060 - Secretaría de Salud</b>				33,119,323.0	33,119,323.0		44,409,200.0	44,409,200.0		5,266,936.0	5,266,936.0	12%		1,116,987.6	1,116,987.6	3%		6,352,694.5	6,352,694.5	14%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 - 07/02/2025		33,119,323.0	33,119,323.0		44,409,200.0	44,409,200.0		5,266,936.0	5,266,936.0	12%		1,116,987.6	1,116,987.6	3%		6,352,694.5	6,352,694.5	14%
	<i>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</i>				33,119,323.0	33,119,323.0		44,409,200.0	44,409,200.0		5,266,936.0	5,266,936.0	12%		1,116,987.6	1,116,987.6	3%		6,352,694.5	6,352,694.5	14%
8	<b>SALUD</b>				80,818,271.0	80,818,271.0		863,643,100.0	863,643,100.0		283,765,853.9	283,765,853.9	33%		50,456,541.3	50,456,541.3	6%		347,885,448.9	347,885,448.9	40%
8	<b>0060 - Secretaría de Salud</b>				80,818,271.0	80,818,271.0		863,643,100.0	863,643,100.0		283,765,853.9	283,765,853.9	33%		50,456,541.3	50,456,541.3	6%		347,885,448.9	347,885,448.9	40%
1	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	14/05/2021 - 14/11/2022		45,351,702.0	45,351,702.0		45,351,702.0	45,351,702.0		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
	<i>Total APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA</i>				45,351,702.0	45,351,702.0		45,351,702.0	45,351,702.0		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
2	HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	15/10/2018 - 29/5/2022		-	-		2,439,457.0	2,439,457.0		2,384,331.8	2,384,331.8	98%		1,823,026.8	1,823,026.8	75%		2,397,365.0	2,397,365.0	98%
	<i>Total HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO</i>				-	-		2,439,457.0	2,439,457.0		2,384,331.8	2,384,331.8	98%		1,823,026.8	1,823,026.8	75%		2,397,365.0	2,397,365.0	98%
3	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	19/3/2007 - 31/12/2022		-	-		4,000,000.0	4,000,000.0		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
	<i>Total HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)</i>				-	-		4,000,000.0	4,000,000.0		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
4	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	15/04/2021 - 15/04/2023		7,652,731.0	7,652,731.0		7,652,731.0	7,652,731.0		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
	<i>Total MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS</i>				7,652,731.0	7,652,731.0		7,652,731.0	7,652,731.0		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
5	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	15/04/2020 - 24/04/2023		-	-		119,709,468.0	119,709,468.0		10,529,167.2	10,529,167.2	9%		4,616,504.1	4,616,504.1	4%		14,706,134.2	14,706,134.2	12%
		IDA 6868-HN			-	-		173,516,223.0	173,516,223.0		952,893.8	952,893.8	1%		952,893.8	952,893.8	1%		1,323,482.1	1,323,482.1	1%
	<i>Total Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19</i>				-	-		293,225,691.0	293,225,691.0		11,482,060.9	11,482,060.9	4%		5,569,397.8	5,569,397.8	2%		16,029,616.3	16,029,616.3	5%
6	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 - 30/11/2023		24,222,016.0	24,222,016.0		30,903,150.0	30,903,150.0		7,300,801.6	7,300,801.6	24%		5,622,709.7	5,622,709.7	18%		24,439,365.7	24,439,365.7	79%
	<i>Total PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA)</i>				24,222,016.0	24,222,016.0		30,903,150.0	30,903,150.0		7,300,801.6	7,300,801.6	24%		5,622,709.7	5,622,709.7	18%		24,439,365.7	24,439,365.7	79%
7	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 3815/BL-HO-2	14/08/2020 - 28/11/2023		-	-		98,523.0	98,523.0		97,154.5	97,154.5	99%		-	-	0%		97,154.5	97,154.5	99%
		BID 4518/BL-HO-3			3,591,822.0	3,591,822.0		24,043,301.0	24,043,301.0		4,175,969.9	4,175,969.9	17%		636,391.5	636,391.5	3%		11,915,028.8	11,915,028.8	50%
	<i>Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS</i>				3,591,822.0	3,591,822.0		24,141,824.0	24,141,824.0		4,273,124.4	4,273,124.4	18%		636,391.5	636,391.5	3%		12,012,183.3	12,012,183.3	50%
8	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	01/10/2021 - 01/10/2023		-	-		455,928,545.0	455,928,545.0		258,325,535.1	258,325,535.1	57%		36,805,015.5	36,805,015.5	8%		293,006,918.6	293,006,918.6	64%
	<i>Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)</i>				-	-		455,928,545.0	455,928,545.0		258,325,535.1	258,325,535.1	57%		36,805,015.5	36,805,015.5	8%		293,006,918.6	293,006,918.6	64%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022
