

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Dirección Nacional de Ciudad Mujer
(DNCM)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto vigente para el año 2023, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L22,041,275; financiado en un 100% de fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); de los cuales L 6,585,600; corresponden a crédito y L15,455,675 a donaciones externas como se muestra en el gráfico No.1.

Al segundo trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L3,269,623.00 de lo cual se alcanzó una ejecución de L6,213,404.00; representando el 28% respecto del presupuesto vigente, el Cuadro No. 1 describe la ejecución financiera.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	22,041,275
Presupuesto Vigente	22,041,275
Ejecutado II Trimestre	3,269,623
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	15%
Ejecutado (Devengado Anual)	6,213,404
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	28%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	17,492,138
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	79%


Fuente: SIAFI, 30/06/2023



El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICO PERIODO COMPRENDIDO (2019-2023)

Respecto al comportamiento de Inversión Pública histórica en el período comprendido entre el 2019 y el 2023 al segundo trimestre, los porcentajes de ejecución han ido disminuyendo del 2019-2020; incrementándose después e incrementando sus porcentajes de ejecución, en el 2023 el presupuesto vigente es menor que año 2022, debido a que el proyecto se encuentra en cierre el proyecto de Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres.

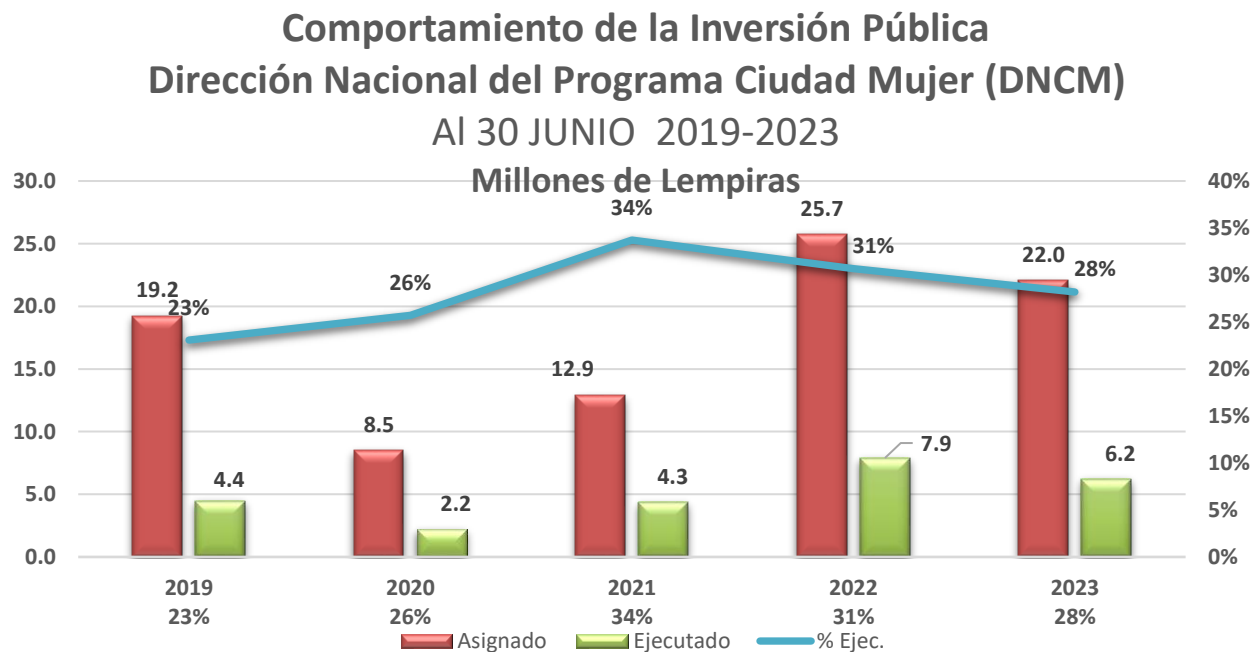

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad; en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM ejecuta un total de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones que fueron ejecutados por INVEST-H como Co ejecutor del programa.

A continuación, se describe la ejecución histórica al II Trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
001 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	<u>"484,000,000.00"</u> 484,000,000.00		17/5/2017 31/08/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	175,424.60	3%
Acumulado 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	175,424.60	3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	484,000,000.00	484,000,000.00	466,803,738.72	96%
Observaciones: El proyecto está en su etapa de cierre, se solicitó a SEFIN la cuarta Ampliación de Plazo de Tiempo y Cierre del Proyecto por un periodo de (2.5) meses; hasta el 31 de agosto del 2023 con el propósito de efectuar los pagos del cierre del contrato de suministro e instalación del equipo de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y Choloma y cierre del convenio de crédito BID-3771/BL-HO				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L 24.7165 por US\$1.00

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	<u>"57,076,475.00"</u> 57,076,475.00		23/12/2020 23/12/2024
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	3,269,622.65	21%
Acumulado 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	6,037,979.31	39%
Acumulado Vida del Proyecto*/	57,076,475.00	57,076,475.00	14,390,751.18	25%
Observaciones: Al 30 de junio del 2023, la ejecución del proyecto es financiada con fondos de la Cooperación Técnica WE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ascendió a L6,037,979.31, representativas del 39 % del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER, así como los consultores que apoyan la gestión del proyecto y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial. El 26 de				

mayo del presente año, se solicitó desembolso por US\$ 300,000.00 al BID; no obstante, por problemas con el donante no se pudo desembolsar todo lo requerido, alcanzándose únicamente un desembolso de US\$ 150,000.00 el 23 de junio del 2023.

^{*/} Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L 24.7165 por US\$1.00

Entre los avances en este trimestre se tiene:

- a) Finalización del Desarrollo y ajustes de la plataforma INNOVAMUJER del Centro de Servicios para la Transformación Digital de Negocios, portal de conexión con los oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial, diagnóstico empresarial, plan de mejora y plan de acción, como herramientas de Servicios de Desarrollo Empresarial.
- b) Implementación de capacitación básica y seminarios presenciales para 3,500 empresarias en la transformación digital de sus empresas y otros temas claves para sus empresas.
- c) Se ha piloteado y afinado el proceso de atención a las empresarias, estableciendo una metodología y herramientas que permitirán el logro de los objetivos e indicadores del proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial.
- d) A la fecha del presente informe se cuenta con la inscripción de 331 empresarias de las cuales con elegibles o cumplen con los requisitos 265 Servicios de Desarrollo Empresarial.
- e) Se ha puesto en marcha el suministro e instalación del equipo de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y Choloma que ya está operando y suministrando energía.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se dio seguimiento y asistencia técnica a la institución. En ese marco, se solicitó la ejecución municipal y departamental de la inversión de la institución al segundo trimestre además de la programación de su ejecución al final del año.

Problemática:

- Los Consultores contratados para el proyecto, no entregaron los productos en tiempo y forma, retrasando el avance del desarrollo de la plataforma.
- Falta de interés de empresarias en participar en plataformas digitales, incidiendo en el no cumplimiento de la meta del proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial.
- Los Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) reportan atrasos para cierre del proyecto debido que el BID tiene que dar la no objeción al informe presentado por experto al suministro e instalación del equipo de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y Choloma que ya está operando y suministrando energía.

Conclusiones:

- **Los proyectos han demostrado un nivel ejecución física y financiera en este segundo trimestre en aumento debido que se logrado avanzar en las actividades establecidas.**
- Por medios de los proyectos de Ciudad Mujer se ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos relacionados al apoyo a la mujer en cuanto a la atención integral y servicios de desarrollo empresarial y un entorno favorable para las empresarias de Honduras para reflexionar y muchas otras las han sido reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación en los mismos

Recomendaciones:

- Contratar Consultores comprometidos con los objetivos y metas de los Proyectos para que no existan atrasos en la actividades y ejecución de estos.
- Reuniones con las autoridades de la SEFIN, Ciudad Mujer y BID para monitoreo y supervisión de los proyectos para mejorar los procesos y la ejecución física y financiera.
- Estructuración de nuevas estrategias de comunicación y mayor socialización los proyectos.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) Anual					Ejecutado (Devengado) al II Trimestre			
			Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Externos	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		22,041,275.0	6,585,600.0	15,455,675.0	22,041,275.0	6,585,600.0	15,455,675.0	22,041,275.0	6,213,403.9	175,424.6	6,037,979.3	6,213,403.9	28.2%	3,269,622.7	3,269,622.7	3,269,622.7	14.8%	
	Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	6,585,600.0	6,585,600.0	-	6,585,600.0	6,585,600.0	-	6,585,600.0	175,424.6	175,424.6	-	175,424.6	2.7%	-	-	-	0.0%	
	Total Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)		6,585,600.0	6,585,600.0	-	6,585,600.0	6,585,600.0	-	6,585,600.0	175,424.6	175,424.6	-	175,424.6	2.7%	-	-	-	0.0%	
	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	15,455,675.0	-	15,455,675.0	15,455,675.0	-	15,455,675.0	15,455,675.0	6,037,979.3	-	6,037,979.3	6,037,979.3	39.1%	3,269,622.7	3,269,622.7	3,269,622.7	21.2%	
	Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		15,455,675.0	-	15,455,675.0	15,455,675.0	-	15,455,675.0	15,455,675.0	6,037,979.3	-	6,037,979.3	6,037,979.3	39.1%	3,269,622.7	3,269,622.7	3,269,622.7	21.2%	

Ejecución al II Trimestre 2023; Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	05 - Equipamiento de los Centros Ciudad Mujer SPS y Choloma con sistemas fotovoltaicos	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	-
		06 - Informe de Auditoría Externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	-
	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	08 - Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
Total Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				6	0	0%	1	0	0%

