

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

### *Programa de la Red Solidaria (PRS)*

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

## IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

## 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social, de las acciones tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>4,587,477,553</b>
Inversión Productiva	3,781,059,327
Inversión Social	806,418,226
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>4,587,477,553</b>
Inversión Productiva	1,928,155,104
Inversión Social	2,659,322,449
<b>Ejecutado I Trimestre</b>	<b>162,776,960</b>
Inversión Productiva	57,676,960
Inversión Social	105,100,000
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)</b>	<b>3.5%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	209,100,916
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>4.6%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2024

El Gobierno actual, en su Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación

Al primer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L4,587.4 millones** detallado para la Inversión Productiva **L1,928.1 millones** y la Inversión Social **L2,659.3 millones**, y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L162.8 millones** lo que representa el (3.5%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (6) seis proyectos enfocados en entregas de transferencias monetarias, salud, educación y ambiente, Infraestructura Escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

#### 4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,928.1 millones**. Dicha inversión es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el **65.4%** y el Banco Mundial con **34.6%**.

#### 4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2024):

En los años 2022 al 2024, los proyectos de Inversión Pública del Programa de la Red Solidaria han considerado la ejecución de al menos 6 Proyectos de Inversión, de los cuales son financiados el 100% con recursos de crédito externo.

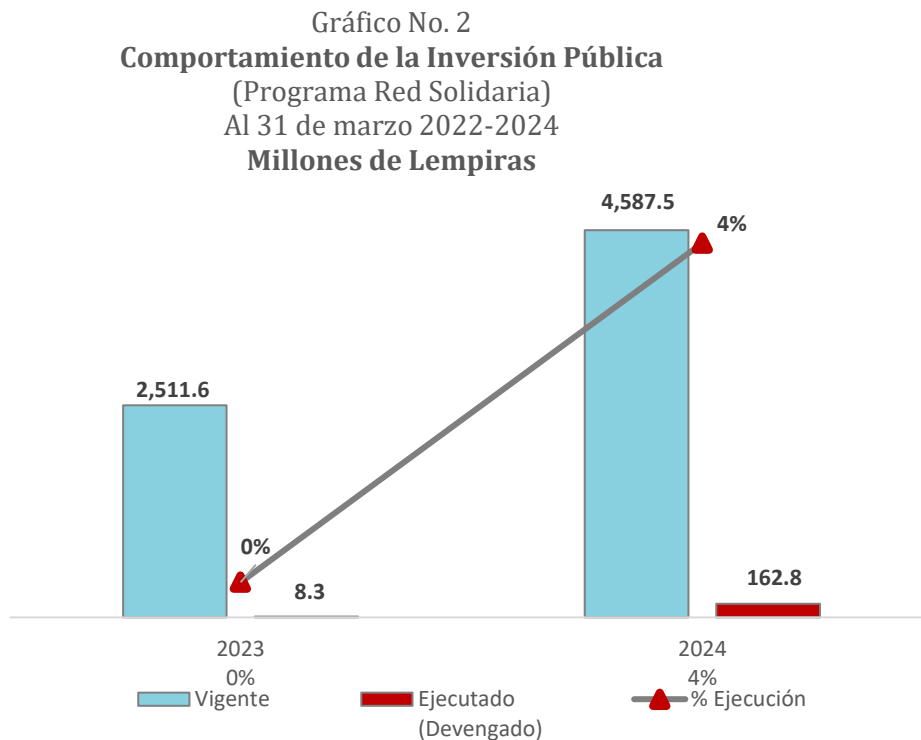

\* Es importante mencionar que el Programa de la Red Solidaria fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022. por lo que, al Primer

Trimestre del año 2022, no tendría ejecución presupuestaria por encontrarse en proceso de estructuración y el traslado de los proyectos de SEDIS y AEPAS-H.

\* En el año 2022 a finales se trasladó a la Red Solidaria solamente un proyecto, el resto se encontraba en proceso de emisión de contratos modificatorios por cambio de ejecutor.

\* En el año 2023, el Programa de Inversión Pública de la Red Solidaria se conformó con la ejecución de 7 Proyectos de Inversión, los cuales son financiados el 100% con recursos de crédito externo.

\* En el año 2024 cuenta un Plan de Inversión Pública de 6 proyectos financiados con fondos externos en su presupuesto, asimismo cuenta con seis ejes de inversión los cuales se financian con fondos nacionales provenientes del tesoro nacional. Por otra parte, de acuerdo con la gráfica No.2, se observa un crecimiento de un 82.6% en cuanto al presupuesto del año 2024 que en términos monetarios asciende a L2,075.9 millones, respecto al presupuesto del año 2023.

\* La Red Solidaria para el presente año 2024, está abriendo su cartera de programas con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiará apoyo a emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa; así como una donación de Banco Mundial la cual servirá para levantamiento de información de grupos etarios de infantes en la zona Atlántica del país.

#### 4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Se detallan los proyectos que conforman el Plan de Inversión Pública 2024 al primer trimestre:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)
3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)
4. Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO)
5. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)
6. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).

A continuación, se muestran los avances físicos y financieros de los proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

## 1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)

El Objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

Las principales metas físicas al 31 de marzo de 2024 son las siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
metafísica	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Dotación de Centros de Educación con Equipo tecnológico	Centro Educación Básica	50	0	0%	No programó metas		
Dotación de Centros de Educación con Mobiliario Educativo	Centro Educación Básica	40	0	0%	No programó metas		
Estudiantes matriculados en el Tercer Ciclo de Educación Básica a través de una modalidad alternativa	alumnos	800	0	0%	No programó metas		
Estudiantes matriculados en Educación Media a través de una Modalidad Alternativa	alumnos	200	0	0%	No programó metas		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se observa que no hay avances de metas ni metas programadas para el primer trimestre del año, en vista que las metas programadas para el año estarían cumplidas para el tercer trimestre de 2024. Sin embargo; la unidad coordinadora ha realizado las siguientes actividades:

- Se ha firmado el convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, para el levantamiento de información socioeconómica en las aldeas y sus caseríos en condición de extrema pobreza del departamento de Lempira, aldeas focalizadas dentro de las 2007 priorizadas dentro del Programa de la Red Solidaria.
- Se está negociando el convenio con el IHER, para modalidad alternativa de educación en el tercer ciclo y reproducción de textos para apoyar las escuelas PROHECO.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	Dólares Lempiras
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
I Trimestre 2024	268,450,744	268,450,744	23,550,608	9%
Acumulado 2024	268,450,744	268,450,744	23,550,608	9%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>1,343,515,020</b>	<b>1,343,515,020</b>	<b>934,183,074</b>	<b>70%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

Es importante mencionar que con el proyecto, se ha destinado los recursos disponibles para fortalecimiento institucional del Programa de la Red Solidaria y apoyo a la Unidad de Monitoreo Programático de la SEDESOL. Para financiar la contratación de **94 gestores sociales**, personal de apoyo para los ejes del PRS, en Protección Social, Salud, Educación, y oportunidades de ingreso.

## 2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Para el año 2024 el proyecto solo ha programado dos actividades principales y su ejecución será reflejada en el próximo trimestre

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	hogares	60,000	0	0%	No programó metas		
Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	Gestores	162	0	0%	No programó metas		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Durante el primer trimestre la unidad coordinadora ha realizado las siguientes actividades:

- Las entregas de TMC esta programadas realizarse en el mes de **Mayo**, por lo que se está trabajando en los requisitos y actividades previos al proceso de entrega.
- El proyecto ha sufrido ajustes a nivel de convenio, está en proceso de reestructuración en el organismo financiador, se implementarán nuevas actividades que no han iniciado porque no se cuenta con el contrato modificadorio, lo que ha generado atrasos en la ejecución.
- Actualmente en proceso la contratación de **38 gestores** sociales para apoyar las actividades en campo compra de equipo informático y contratación de personal clave para la unidad ejecutora.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	Dólares	US\$30,000,000.00	17/07/2019 30/06/2024
		Lempiras	L743,643,000.00	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	81,149,117	81,149,117	390,944	0.5%
Acumulado 2024	81,149,117	81,149,117	390,944	0.5%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>743,643,000</b>	<b>743,643,000</b>	<b>430,673,140.00</b>	<b>58%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

### 3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Durante el primer trimestre la unidad ejecutora no presenta ejecución de metas físicas en el proyecto, sin embargo, ha llevado a cabo varias actividades que contribuyen para el logro de los objetivos de este.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	hogares	113,464	0	0%	No programó metas		
Contratación de gestores sociales para mejorar la cobertura	gestores	44	0	0%	No programó metas		
Actualización de la Base de Datos del SIRBHO, y su inclusión de Urbano	informe	2	0	0%	No programó metas		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

- Las entregas de TMC esta programadas realizarse en el mes de **Mayo y Noviembre**, por lo que se está trabajando en los requisitos y actividades previos al proceso de entrega.
- Este proyecto ha sufrido ajustes a nivel de convenio, está en proceso de reestructuración en el organismo financiador, se implementarán nuevas actividades que no han iniciado porque no se cuenta con el contrato modificatorio, lo que ha generado un atraso en la en la ejecución.
- Se está trabajando en identificación de actividades para preparar los términos de referencia para llevar a cabo el levantamiento de línea de base para evaluación de resultados de TMC, para oportunidades de mejora del programa.
- En proceso la compra de equipo informático y tecnológico para fortalecer el sistema de información del PRS.

Se detalla la ejecución financiera histórica del programa:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Dólares	Lempiras	
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6918-HN	US\$70,000,000	L1,735,167,000	20/08/2021 30/06/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	586,437,748	586,437,748	1,144,948	0.2%
Acumulado 2024	586,437,748	586,437,748	1,144,948	0.2%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>1,735,167,000</b>	<b>1,735,167,000</b>	<b>430,938,396.00</b>	<b>25%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00



#### 4. Proyecto: Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878 BL-HO)

Objetivo: Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

En el cuadro siguiente se detallan las principales metas físicas programadas, el cual muestra que únicamente tiene avance físico en una Meta: *Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático* indicando un avance físico del 100% en dicha meta, respecto a lo programado al trimestre.

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Número de hectáreas restauradas bosque privado	hectáreas	6,500	0	0%	No programó metas		
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al CC realizadas y validadas	Informes de investigación	4	2	50%	2	2	100%
Banco de germoplasma de especies resilientes al CC constituido y operando	Informe	1	0	0%	No programó metas		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Por otra parte, también el proyecto ha indicado que cuenta con avances acumulados en la vida del proyecto como ser:

- En la restauración de bosque público a la fecha se han restaurado **34,034.06 hectáreas**; cumpliendo con la meta de las 34,000 hectáreas programadas del proyecto en el año 2023.

- Con el bosque privado se encuentran en proceso de restauración de 6,500 hectáreas a la fecha se han aprobado planes de restauración para 5,765.62 hectáreas, las cuales estarían restauradas al mes de julio de 2024.
- Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a Financiamiento Climático, Manejo Forestal Sostenible (MFS) y Pago de Servicios Ambientales (PSA) puesto en marcha, implementación de una plataforma, actualmente se está trabajando en el desarrollo de esta, la cual debe estar finalizada en el mes de agosto del año 2024. Fecha en que concluye el proyecto.

Detalle de la Ejecución Financiera histórica

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Dólares Lempiras	US\$25,000,000 L619,702,500	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	75,884,937	75,884,937	6,297,778	8.3%
Acumulado 2024	75,884,937	75,884,937	6,297,778	8.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>619,702,500</b>	<b>619,702,500</b>	<b>498,112,623</b>	<b>80%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

**5. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)**

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

En cuanto a metas físicas el proyecto tiene como meta global la construcción de 50 módulos escolares con su respectiva área de baños en Centros de Educación Básica (CEB's) y la rehabilitación de 9 CEB's.

Sin embargo, para el primer trimestre del 2024 no muestra ningún avance en dichos centros escolares básicos.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación, se presentan las metas físicas programadas para el año 2024.

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	Educando	5,008	0	0%	No programó metas		
Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	35	0	0%	7		
Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	9	0	0%	1		
Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	Sistema	1	0	0%	No programó metas		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Se ha programado la construcción de 35 módulos y la rehabilitación de 9 CEB's. Es de mencionar que actualmente se está llevando la construcción de 7 módulos escolares y la rehabilitación de 1 CEB's. pero no presentan avances de obras, asimismo, se está licitando las obras restantes y su respectiva supervisión.

La unidad ejecutora indica que el resto de las obras se estarán contratando para el próximo trimestre 2024.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del proyecto Joven.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Dólares	US\$45,000,000	
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	Lempiras	L1,115,464,500	03/06/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	234,531,191	253,133,891	21,474,249	8.5%
Acumulado 2024	253,133,891	253,133,891	21,474,249	8.5%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>1,115,464,500</b>	<b>1,115,464,500</b>	<b>754,558,573</b>	<b>68%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

## 6. Programa del Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (4619/BL-HO)

Objetivo: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales a nivel descentralizado fortalecido	Informe	2	0	0%	1		
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construídas	obras	5	0	20%	1		
Capacidades técnicas de la SESAL fortalecidas.	Informe	4	0	0%	4		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

La contratación de consultoría individual Formación de las Capacidades de Diagnóstico a Través de la Telesonografía Obstétrica para Proveedores de Salud de los Servicios de Primer Nivel de Atención en las Regiones Sanitarias Priorizadas: Copán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Intibucá, La Paz y Choluteca, con el fin de mejorar el diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones obstétricas y neonatales.

En construcción la obra hospitalaria del Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente, con los siguientes avances físicos: Instalaciones previas (90%), demolición del edificio (90%), tala de árbol, zapata de cimentación de hormigón armado (20%), viga entre zapatas (20%), capa de hormigón de limpieza (80%), foso de ascensor (60%).

El resto de las obras hospitalarias a ejecutarse, se encuentra en revisión del BID el informe de evaluación ajustado de la licitación para la contratación de la construcción de las obras hospitalarias: Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz; Sala de Neonatología del Hospital Santa Teresa de Comayagua, Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco, Remodelación de la actual unidad de neonatología en el 5to nivel y

Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to nivel (cuartos de apoyo, lavandería, bodega y oficinas médicas, junto con un aula educacional). referente al Hospital Escuela, la contratación de las obras se realizaría en los meses de abril y mayo.

La unidad ejecutora debe sostener reunión con las autoridades de la SESAL para definir el alcance del mecanismo de comunicación de la red hospitalaria.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	Dólares Lempiras	US\$69,000,000 L1,710,378,900	19/03/2019 10/07/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	681,701,367	645,322,702	4,818,432	0.7%
Acumulado 2024	645,322,702	645,322,702	4,818,432	0.7%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>1,710,378,900</b>	<b>1,710,378,900</b>	<b>886,601,199</b>	<b>52%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

#### 4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

Durante el primer trimestre se firmaron los contratos del personal que labora para las unidades ejecutoras y personal de campo.

Se firmó el convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, para el levantamiento de información socioeconómica.

Están en proceso de contratación de bienes, servicios y adquisición de equipo informático.

#### 4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

La inversión de los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria se conforma en seis ejes de inversión para atender diferentes grupos beneficiarios; Eje de Protección Social, Eje de Salud, Eje de Educación, Eje de Fortalecimiento Humano, Eje de Infraestructura y Ambiente, y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

Metas al primer trimestre del 2024, los resultados son los siguientes:

Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta I Trimestre		% de Ejecución Trimestre	% de Ejecución Anual
			Programada	Ejecutada		
Hogares en situación de pobreza y pobreza extrema recibiendo al menos 1 atención del servicio básico integral	Hogares	218,206	6,058	6,316	104%	3%
Familias capacitadas con seguimiento en desarrollo infantil temprano en aldeas focalizadas	Familias	22,000	5,000	5,362	107%	24%
Voluntarios (as) capacitados (as) en vigilancia nutricional y desarrollo infantil temprano en aldeas focalizadas	Voluntarios	2,079	1,058	954	90%	46%
Cajas rurales financiando emprendimientos productivos con igualdad y equidad de genero, generando empleos e ingresos para los participantes focalizados	Participantes	2,357	-	151	-	6%

Fuente: PRS

La ejecución financiera de los programas sociales asciende a un monto de **L105.1 millones**, contenida en los ejes de: Formación y Organización de Consejos Comunales y Comisiones Ciudadanas de Transparencia; y Fortalecimiento de Mecanismos para Oportunidades de Ingreso.

#### 4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones en la Dirección General de Inversiones Públicas.
  - Solicitud a las unidades ejecutoras de proyectos la proyección de ejecución presupuestaria de enero a diciembre del 2024.
  - Solicitudes a los proyectos de las cuotas mensuales de compromiso.
  - Participación en la Revisión de Cartera de Proyectos de Banco Mundial y Banco Interamericano de desarrollo (BID).
  - Dictamen Técnico de Modificación entre categorías de inversión y componentes para el Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO).
  - Revisión y aprobación por parte de la DGIP de modificaciones presupuestarias de los proyectos.
  - Participación en reuniones con las unidades ejecutoras para ver avances físicos y financieros de los proyectos, para ver problemática, cuellos de botella y tomar acciones para agilizar la ejecución.

#### 4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

La baja ejecución presentada por los proyectos ejecutados por el Programa de la Red Solidaria se debe a aprobaciones pendientes por parte del organismo financiador (Banco Mundial y BCIE) a los contratos modificatorios que sufrieron cambios en su estructura, al finalizar del trimestre no se cuenta con dicha aprobación.

El Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus se encuentra en proceso de incorporación al presupuesto, debido a que se amplió su fecha de desembolsos, ejecución y cierre, este deberá estar incorporado para el segundo trimestre.

El programa de la Red Solidaria no presenta metas físicas terminadas, ni avances de las mismas en sus programaciones para el año 2024, dado que las metas están programadas para el último trimestre del presente año, programaciones que no van de acuerdo con las múltiples necesidades que sufre la población, ya que el Programa debe cumplir con el mandato del Gobierno para lo cual fue creada, mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

#### Conclusiones

- El Programa de la Red Solidaria al primer trimestre presenta una ejecución física de 0% y financiera de L162.8 millones lo que representa un 3.5% respecto al presupuesto vigente, por lo que dicha ejecución no es satisfactoria, dado que la ejecución de la Inversión Productiva es únicamente por L57.7 millones misma que está representada por los proyectos y financiados con créditos de los organismos multilaterales.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

## Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales a fin de realizar las entregas de los beneficios a la población oportunamente.
- Se insta a los organismos financiadores de estos proyectos a dar prioridad a las gestiones pendientes, a fin de no seguir retrasando la ejecución de los proyectos y brindar un mayor apoyo a las unidades ejecutoras en cuantos a capacitaciones y fortalecimiento institucional.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas.



# ANEXOS

**ANEXO No. 1**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Presupuesto devengado			% Ejecución (Ejec./Vigte.)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	
	<b>0415 - Programa de la Red Solidaria</b>		<b>806,418,226</b>	<b>3,781,059,327</b>	<b>4,587,477,553</b>	<b>806,418,226</b>	<b>3,781,059,327</b>	<b>4,587,477,553</b>	<b>105,100,000</b>	<b>57,676,960</b>	<b>162,776,960</b>	<b>3.5%</b>
<b>6</b>	<b>Inversión Productiva</b>			<b>3,781,059,327</b>	<b>3,781,059,327</b>	-	<b>1,928,155,104</b>	<b>1,928,155,104</b>	-	<b>57,676,960</b>	<b>57,676,960</b>	<b>3.0%</b>
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	268,450,744	268,450,744	-	268,450,744	268,450,744	-	23,550,608	23,550,608	8.8%
	<b>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	<b>268,450,744</b>	<b>268,450,744</b>	-	<b>268,450,744</b>	<b>268,450,744</b>	-	<b>23,550,608</b>	<b>23,550,608</b>	<b>8.8%</b>
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	-	586,437,748	586,437,748	-	586,437,748	586,437,748	-	1,144,948	1,144,948	0.2%
	<b>Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>		-	<b>586,437,748</b>	<b>586,437,748</b>	-	<b>586,437,748</b>	<b>586,437,748</b>	-	<b>1,144,948</b>	<b>1,144,948</b>	<b>0.2%</b>
3	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	75,884,937	75,884,937	-	93,660,902	93,660,902	-	6,297,778	6,297,778	6.7%
	<b>Total MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>		-	<b>75,884,937</b>	<b>75,884,937</b>	-	<b>93,660,902</b>	<b>93,660,902</b>	-	<b>6,297,778</b>	<b>6,297,778</b>	<b>6.7%</b>
4	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	234,531,191	234,531,191	-	253,133,891	253,133,891	-	21,474,249	21,474,249	8.5%
		ATN/OC-18869-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	<b>Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>		-	<b>234,531,191</b>	<b>234,531,191</b>	-	<b>253,133,891</b>	<b>253,133,891</b>	-	<b>21,474,249</b>	<b>21,474,249</b>	<b>8.5%</b>
	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS)	N/D	-	1,852,904,223	1,852,904,223	-	-	-	-	-	-	0.0%
	<b>Total PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS)</b>		-	<b>1,852,904,223</b>	<b>1,852,904,223</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0.0%</b>
5	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	81,149,117	81,149,117	-	81,149,117	81,149,117	-	390,944	390,944	0.5%
	<b>Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>		-	<b>81,149,117</b>	<b>81,149,117</b>	-	<b>81,149,117</b>	<b>81,149,117</b>	-	<b>390,944</b>	<b>390,944</b>	<b>0.5%</b>
6	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	681,701,367	681,701,367	-	645,322,702	645,322,702	-	4,818,432	4,818,432	0.7%
	<b>Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>		-	<b>681,701,367</b>	<b>681,701,367</b>	-	<b>645,322,702</b>	<b>645,322,702</b>	-	<b>4,818,432</b>	<b>4,818,432</b>	<b>0.7%</b>
	<b>0415 - Inversión Social</b>		<b>806,418,226</b>	<b>-</b>	<b>806,418,226</b>	<b>806,418,226</b>	<b>1,852,904,223</b>	<b>2,659,322,449</b>	<b>105,100,000</b>	<b>-</b>	<b>105,100,000</b>	<b>4.0%</b>
	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR RS		-	-	-	-	1,852,904,223	1,852,904,223	-	-	-	0.0%
	PROCESO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		10,420,000	-	10,420,000	10,420,000	-	10,420,000	-	-	-	0.0%
	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO		144,000,000	-	144,000,000	144,000,000	-	144,000,000	-	-	-	0.0%
	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS		531,850,009	-	531,850,009	531,850,009	-	531,850,009	-	-	-	0.0%
	FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA		90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	100.0%
	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA OPORTUNIDADES DE INGRESO		15,148,217	-	15,148,217	15,148,217	-	15,148,217	15,100,000	-	15,100,000	99.7%
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	0.0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2024

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 2  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0415 - Programa de la Red Solidaria</b>								
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)	Dotación de Centros de Educación con Equipo Informático	Centro Educativo	50	proceso de licitacion en curso	0%	No programó metas		
	Dotación de Centros de Educación con Mobiliario Educativo	Centro Educativo	40	proceso de licitacion en curso	0%	No programó metas		
	Estudiantes matriculados en Educación Media a través de una Modalidad Alternativa	Estudiantes	800	en ejecución	0%	No programó metas		
	Estudiantes matriculados en Educación Media a través de una Modalidad Alternativa	Estudiantes	200	proceso de licitacion en curso	0%	No programó metas		
	Número de Gestores fortalecido para atención al participante a nivel local	Contratos	58	en ejecución	0%	No programó metas		
	Oficinas de Atención al Participante fortalecidas	Oficinas	18	Proceso no iniciado	0%	No programó metas		
	Parejas Participantes del PRS con talleres de ¡Cuidate!	parejas	2000	Proceso no iniciado	0%	No programó metas		
	Estrategia de Comunicación Social Implementada	informe	1	Proceso no iniciado	0%	No programó metas		
	Unidad Técnica del Piso de Protección Social fortalecida	informe	1	en ejecución	0%	No programó metas		
Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)	Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas	hogares	60,000	0	0%	No programó metas		
	Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	Gestores	162	0	0%	No programó metas		
	Actualización de la Base de Datos del SIRBHO, y su inclusión de Urbano	Informe	2	0	0%	No programó metas		
	Certificación de la Base de Datos de SIRBHO	Informe	1	0	0%	No programó metas		
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)	Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas	hogares	113,464	0	0%	No programó metas		
	Contratación de gestores sociales para mejorar la cobertura	gestores	44	0	0%	No programó metas		
	Actualización de la Base de Datos del SIRBHO, y su inclusión de Urbano	Informe	2	0	0%	No programó metas		
Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878 BL-HO)	Número de hectáreas restauradas bosque privado	hectáreas	6,500.00	0	0%	No programó metas		
	Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al cambio climático.	Informes de investigación	4	2	50%	2	2	100%
	Banco de germoplasma de especies resilientes al CC constituido y operando	banco	0	0	0%	No programó metas		
	Departamento de sanidad forestal equipado (incluyendo unidades de sanidad forestal)	Departamento	1	0	0%	No programó metas		
	Sistema de alerta temprana de plagas y restauración forestal operando	Plataforma	1	0	0%	No programó metas		
	Mecanismo financiero y operativo para acceder a financiamiento climático, manejo forestal sostenible (MFS), y Pago de Servicios Ambientales (PSA) diseñado y puesto en marcha	Plataforma	1	0	0%	No programó metas		
Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)	Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	educando	5,008	0	0%	No programó metas		
	Módulos Escolares construidos en la zona de influencia	Centro Educativo	35	7	20%	No programó metas		
	Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	9	1	11%	No programó metas		
	Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	Sistema	1	0	0%	No programó metas		
	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	docente	1,654	0	0%	No programó metas		
Programa del Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (4619/BL-HO)	Gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales a nivel descentralizado fortalecido	Informe	2	0	0%	No programó metas		
	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	obras	5	0	0%	No programó metas		
	Capacidades técnicas de la SESAL fortalecidas.	Informe	4	0	0%	No programó metas		

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024
