



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA

*Secretaría de Agricultura y Ganadería  
(SAG)*

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

## IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

## 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, así como diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>2,123,941,937</b>
Inversión Productiva	2,086,363,598
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	37,578,339
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>3,370,816,937</b>
Inversión Productiva	1,162,815,720
Inversión Social	1,300,000,000
Formación Bruta de Capital	908,001,217
<b>Ejecutado I Trimestre</b>	<b>87,756,789</b>
Inversión Productiva	87,641,789
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	115,000
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)</b>	<b>2.6%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	139,322,171
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>4.1%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2024

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agrícola, mediante el fortalecimiento de la producción agropecuaria y agroindustrial; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y Social. Para lo cual en el 2024 mediante la **Inversión Productiva** se estarán desarrollando 9 proyectos de inversión para lo cual se cuenta con un presupuesto aprobado de L2,086.4 millones con lo cual se atenderán 1,500 hogares con provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento (Hogares atendidos); 50 planes de inversión con tecnologías climáticamente inteligentes (TCI); implementándose en el marco de las cadenas agroalimentarias; 5 planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención; mejora de productividad y competitividad a 15,586 productores su; Implementación de 189 planes de negocio; desarrollo de 80 asistencias técnicas; fortalecimiento de 80 organizaciones; Apoyo a 24 empresas; Fortalecimiento empresarial a 22 cajas rurales de ahorro y crédito fortalecidas; 1,500 hogares atendidos con provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento (Hogares atendidos); 6 planes de inversión implementados a mujeres y jóvenes organizados; otorgamiento de 15 becas para desarrollo de innovaciones a jóvenes, hombre y mujeres beneficiarios del proyecto; Diseño y Construcción del Sistema Riego San Sebastián y 13 familias beneficiadas con la ejecución de 50 hectáreas (ha) en Joya de Ramos; 247 familias beneficiadas con 224 ha de tierra agrícola con acceso a riego del Proyecto de


instalación de Intrafinca; 44 familias beneficiadas con la ejecución de 29 ha de tierra agrícola con acceso a riego de los Proyectos de Pequeño Riego (PPR)

En cuanto a la **Inversión Social** para 2024, se cuenta con un monto de inversión de L1,300.0 millones para el desarrollo de programas de gran importancia para el país como ser el Bono Ganadero, Bono Cafetalero y Bono Tecnológico.

Al primer trimestre del 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de **L3,370.8** millones detallado para la Inversión productiva L1,162.8 millones, L1,300.0 millones para la Inversión Social y L908.0 millones para la formación bruta de capital; en cuanto a la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L87.8** millones lo que representa el (2.6%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1. Dicha ejecución corresponde a la ejecución de los proyectos de inversión productiva.

#### 4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


Gráfico No. 1  
Comportamiento de la Inversión Pública  
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
Al 31 de marzo 2020-2024  
En Millones de Lempiras

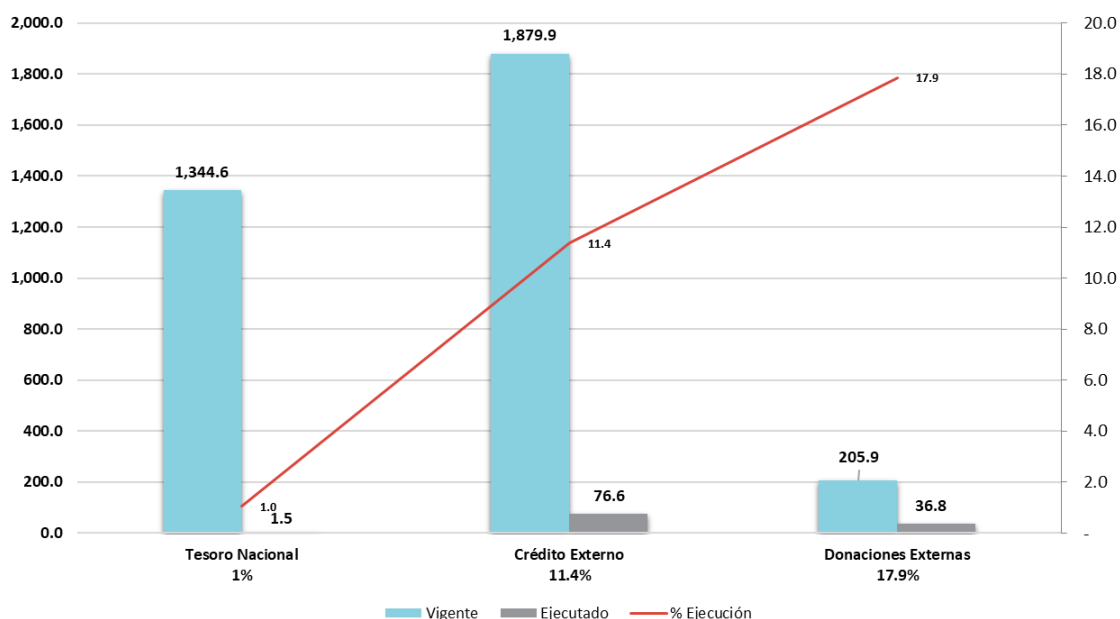

El Presupuesto Vigente de la SAG es financiado en un 60.1% por recursos de Fuente Externa los cuales se encuentran en 55% Crédito Externo; de los cuales el 46.0% proviene de préstamos del Banco Mundial (BM) con un monto de L1,551.62 millones, seguido por el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) con una participación del 5.5% correspondiente a L186.95 millones por otra parte también se cuenta con créditos externos de España, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), y OPEC que

en conjunto representan un 4.2% de las inversiones por un valor de L141.33 millones, seguido por Fondos Nacionales que representan el 39.9% de la inversión de la institución. En cuanto al restante 4.3%, el mismo corresponde a Fuente Externa proveniente de Donaciones por L142.09 (4.2%) millones por parte del BM y L4.25 (0.1%) millones por el BID.

#### 4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2020-2024):

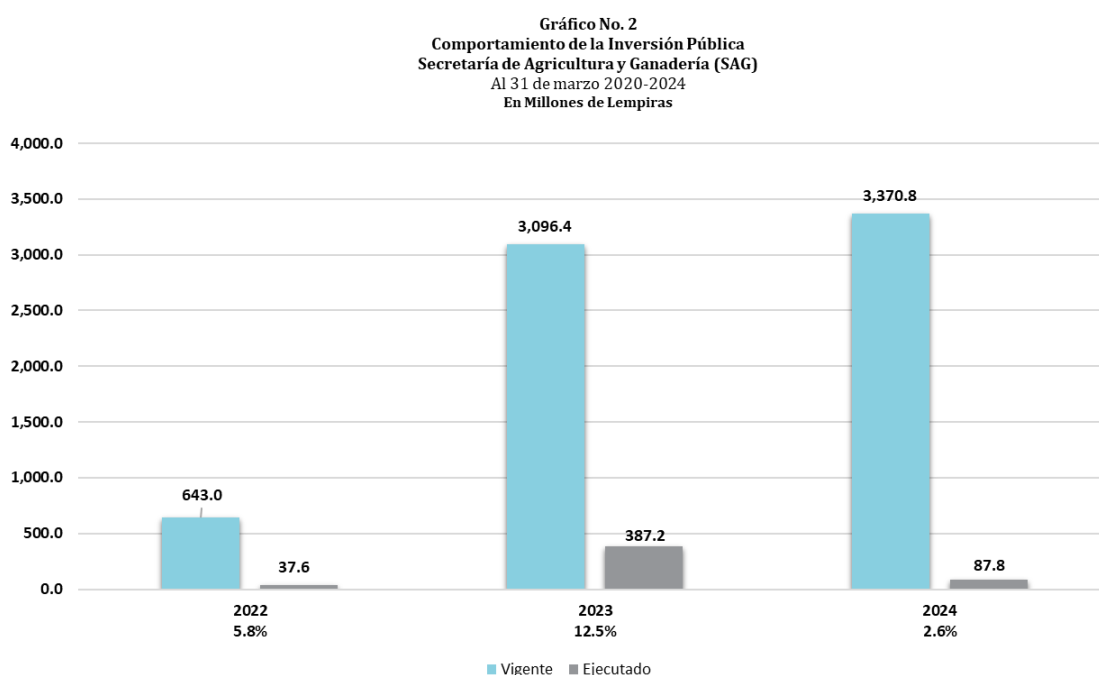

Por medio del Programa de Inversiones Pública, se han realizado acciones para mejorar la operatividad del Sector Agroalimentario con inversiones que han sido financiadas por fondos nacionales y fondos externos, ejecutándose 12 proyectos de inversión en el periodo de 2020-2024 como ser: 1) Alianza para el corredor seco, 2) Fortalecimiento y mantenimiento de la reserva estratégica de granos básicos a través de la comercialización y rehabilitación de bodegas y silos, 3) Proyecto de Competitividad Rural (I, II y III), 4) EMPRENDESUR, 5) Proyecto de abastecimiento de centros de venta de Honduras y fortalecimiento a BANASUPRO, 6) PRO-LENCA, 7) Desarrollo agrícola bajo riego (PDABR), 8) PROINORTE, 9) Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.

#### 4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Al primer trimestre del año 2024 en la inversión productiva se alcanzó una ejecución financiera de 2.6% en donde los proyectos de mayor ejecución fueron COMRURAL II con 24.7%, Proyecto Integral De Desarrollo Rural y Productividad con 13.4%, Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP) 7.1% y el Proyecto De Inclusión Económica y Social

De Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE) con 5.7%; en un menor porcentaje se encuentran los proyectos de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana con 2.2% y Proyecto De Seguridad Hídrica En El Corredor Seco De Honduras con 1%.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### 1. Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024**

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Establecer 100 PNs orientados a la Agricultura de Subsistencia (Ventana 1). 20 PNs orientados a la Agricultura en transición (Ventana 2). 3 PNs orientados a la Agricultura Comercial (Ventana 3).	Planes de Negocio	123	-	0%	-	-	-
Capacitaciones en temas ambientales, sociales y adquisiciones.	Capacitaciones	90	-	0%	-	-	-
Transferencias No Reembolsables realizadas a cuentas primarias de las Organizaciones de Productores Rurales Oprs.	Cantidad	12	-	0%	-	-	-

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

A pesar de que no se programaron metas físicas para el primer trimestre el proyecto realizó actividades como ser el proceso contratación de 11 consultorías realizándose a marzo la contratación de un oficial de adquisiciones; 16 Planes de Negocios (PNs) aprobados por el comité de evaluación del Proyecto, correspondiente a Ventana 1; Lanzamiento de convocatoria pública abierta para presentar perfiles de negocios en ventana 2; Se atendieron actividades correspondientes al Plan de Aceleración y puesta

en marcha del proyecto, así como la actualización de la hoja de ruta en conjunto con el Banco Mundial.

Por otra parte, se realizaron pagos a OPR's correspondientes a planes de negocios ratificados mediante reunión de Comité Directivo 8 del año 2023 por el monto de L27.6 millones.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	04/05/2020 30/06/2026	
		Lempiras	1,859,655,000		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2024		147,358,209	147,358,209	36,422,342	24.7
Acumulado 2024		147,358,209	147,358,209	36,422,342	24.7
Acumulado Vida del Proyecto */		1,859,655,000	1,859,655,000	513,139,506	27.6

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7654 por US\$1.00

Para el II trimestre se prevé contar con No Objeción por Banco Mundial al Plan de Inversión de la SAG por la cantidad de US\$4.3 millones; además, realizar Comité Directivo para ratificación de 9 PNs para de 10 previstos y operativizar el Comité para Habilitar el Ambiente de los Agronegocios, el cual apoyará la implementación de las actividades de Componente II.

## 2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.

Tiene como objetivo Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH) y el Objetivo Específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

## Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de Negocio	30	-	0%	-	-	-
Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención, Lempira (San Marcos de Caiquin, Erandique, Gualcinse) La Paz (Guajiquiro, Marcala, Opatoro) Intibucá (Intibucá, Yamaranguila).	Planes de Manejo	10	-	0%	-	-	-
Créditos y garantías otorgados a productores rurales a través de BANHPROVI.	Créditos y Garantías	50	-	0%	-	-	-

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

La Unidad Ejecutora en su Informe al I Trimestre del 2024 manifiesta que debido a que el Proyecto referenciado se encuentra recién implementado, se ha programado iniciar a recibir resultados en el II trimestre 2024. Ambos indicadores responden a acciones desarrolladas dentro del componente 1.

En cuanto al Fortalecimiento Productivo, Actualmente se está en proceso de la firma para la elaboración de 30 planes de inversión y se ha iniciado el enrolamiento de beneficiarios del proyecto. El primer informe trimestral presentado por la firma comprende los 9 entregables que permitirán la operatividad de acciones en campo (Plan de Monitoreo y Evaluación y su Sistema, Estrategia equidad de género y juventud, Plan de información y comunicación, Plan de participación de los pueblos indígenas, Plan de mitigación ambiental, Estrategia MyPiMes, Reglamento del fondo de inversiones Climáticamente Inteligentes y Manejo y Conservación de Microcuencas y Fortalecimiento de Mancomunidades, Metodología para el Levantamiento de la Línea Base, incluyendo sus instrumentos).

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.	BID 4936/BL-HO BID 4940/BL-HO FONPRODE GRT/WE-20251-HO	US\$	91,400,000	21/05/2020 21/08/2025
		Lempiras	2,266,299,560	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2024	220,801,170	220,801,170	29,662,852	13.4
Acumulado 2024	220,801,170	220,801,170	29,662,852	13.4
Acumulado Vida del Proyecto */	2,266,299,560	2,266,299,560	207,815,864	9.2

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7654 por US\$1.00

### 3. Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (PROINORTE)

El proyecto consiste en Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Diagnósticos territoriales elaborados a 22 municipios beneficiados por el proyecto para identificar el potencial productivo del territorio.	Informe de Diagnostico	22	-	0%	-	-	-
Estudios de competitividad integral por cadena de valor elaborados.	Estudios	7	-	0%	-	-	-
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Planes	10	-	0%	-	-	-
Planes de negocio formulados	Planes	15	-	0%	-	-	-
Kits de herramientas entregados a las Unidad Municipal Ambientales (UMA),	Kits de Herramientas	7	-	0%	-	-	-

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024



Dado que el proyecto es de reciente implementación, al primer trimestre se han realizado actividades para la elaboración de TDR's para el Diagnóstico territorial los cuales se encuentran en espera de la no objeción de FIDA, revisión del Estudio Riesgo Climático y el Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) por parte de FIDA, conformación de 2 Mesas Agroclimáticas regionales quienes fueron Conformadas (mancomunidades, productores) la del sector de Olanchito, Yoro y la de Tocoa, Colon.

Actualmente el proyecto en el área administrativa afronta las dificultades por no contar aun con los servicios de Asistente de planificación de seguimiento y evaluación, Motorista para subsede Olanchito, Yoro y el Oficial de Seguimiento y evaluación. Por otra parte, también se presentan retrasos por parte del Organismo financiador en cuanto a la emisión de las No Objeciones.

La ejecución financiera histórica del Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en La Región Noreste de Honduras (PROINORTE)	FIDA 2000002595 LOAN No. 13754P	US\$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	969,192,032	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2024	123,788,094	123,788,094	7,004,731	5.7
Acumulado 2024	123,788,094	123,788,094	7,004,731	5.7
Acumulado Vida del Proyecto */	969,192,032	969,192,032	26,105,072	2.7

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

#### 4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

Proyecto	Adquisiciones y/o Contrataciones Realizadas en el Primer Trimestre 2024
<b>Alianza Para el Corredor Seco (PROSASUR)</b>	Contratación de 22 Facilitadores en Salud y Nutrición, 12 Técnicos agrícolas y un especialista ambiental.

Proyecto	Adquisiciones y/o Contrataciones Realizadas en el Primer Trimestre 2024
<b>Seguridad Hídrica</b>	Contratación del Especialista en Agua Potable y Saneamiento, Especialista en Hidrometeorológica, Enlace Administrativo y Logística y el Especialista en Adquisiciones.
<b>COMRURAL II</b>	En Proceso de Contratación 11 Consultorías, a marzo se logró la contratación de un Oficial de Adquisiciones.  En Proceso de No Objeción la solicitud de Lista Corta y Pedido de propuesta de Firma Implementador.
<b>COMRURAL III</b>	Elaboración y Revisión de 5 TDR´s para la conformación del equipo regional de Olancho (Especialista Social, ambiental, Técnico en alianzas productivas, asistente administrativo.

#### 4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

Actualmente la SAG posee un presupuesto vigente de **L1,300,000,000** para el desarrollo tres programas sociales de gran importancia:

**Bono Cafetalero Para La Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores (L250,000,000)**, el cual apoya a los pequeños y medianos productores de café en el fortalecimiento de la producción, brindando apoyo en la fertilización de fincas, renovación de áreas, asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades y generación de valor agregado en fincas.

En 2024 se espera generar un beneficio de 97,549 pequeños y medianos caficultores por medio de la entrega de 257,952 quintales de formula cafetalera en los 15 departamentos productores de café del país. por otra parte, se otorgado un beneficio de Kits de Poda a 8,655 Productores y 322 beneficiarios con Secadoras Solares.

**Bono Ganadero (L50,000,000)** este tiene como objetivo fomentar un incremento sostenible y significativo en la producción de carne y leche por parte de los pequeños y medianos productores ganaderos a nivel nacional los cuales se lograrán por medio de la ejecución de 4 componentes los cuales son 1) Fortalecimiento Inclusivo y Participativo en la Producción de Alimento en Ganado, 2) Componente Fomento a la industrialización de la cadena de procesamiento, 3) Extensión Agrícola y 4) Fomento a las Cadenas Pecuarias.

**Bono Tecnológico Productivo (L1,000,000,000)** Programa presidencial con orientación en productos de la canasta básica al beneficio de Pequeños Productores de Subsistencia que se encuentran bajo la franja de pobreza y pobreza extrema.

#### 4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el primer trimestre se autorizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:
  - Modificación presupuestaria Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías de proyectos con ERP.
  - Solicitud de proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2024.
  - Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
  - Solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad de Proyecto de Seguridad Hídrica y Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.

#### 4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

- Procesos de Adquisiciones ya que se requiere de la integración de las Comisiones de Evaluación de cotización/ofertas/propuestas recibidas.
- Tiempo de Emisión de las Enmiendas a la Nota de Prioridad.
- Tiempo de respuesta de No Objeciones por parte de los Organismos Financiadores.
- Procesos de Contratación de Personal Clave.

#### Conclusiones

- Los Organismos Financiadores y SEFIN deben de agilizar los tiempos de respuesta de las solicitudes para continuar con un tiempo de ejecución adecuado para el proyecto.
- Para contar con una buena ejecución las Unidades Ejecutoras deben priorizar la contratación del personal clave.

## Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- La Dirección General de Inversiones Públicas deberá continuar con el seguimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos que iniciaron su ejecución en la INVEST-H, con el objetivo que los proyectos cumplan con lo planificado en su programación del año cumpliendo sus metas físicas y financieras.

# ANEXOS

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al I Trimestre			Comprometido				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
9	<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>		12,059,271	2,074,304,327	2,086,363,598	12,059,271	1,150,756,449	1,162,815,720	1,365,414	86,276,374	87,641,789	7.5%	1,365,414	137,385,049	138,750,463	11.9%
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	TF017904	-	62,920,430	62,920,430	-	62,920,430	62,920,430	-	9,682,794	9,682,794	15.4%	-	12,851,859	12,851,859	20.4%
		TF086211-HN	-	74,109,299	74,109,299	-	74,109,299	74,109,299	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)</b>		-	137,029,729	137,029,729	-	137,029,729	137,029,729	-	9,682,794	9,682,794	7.1%	-	12,851,859	12,851,859	9.4%
2	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	-	117,500,008	117,500,008	-	117,500,008	117,500,008	-	2,557,132	2,557,132	2.2%	-	8,735,072	8,735,072	7.4%
	<b>Total Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>		-	117,500,008	117,500,008	-	117,500,008	117,500,008	-	2,557,132	2,557,132	2.2%	-	8,735,072	8,735,072	7.4%
3	Generación de empleo, Proyectos de riego (equipamiento), Comercialización de granos básicos, silvicultura...	N/D	-	870,422,878	870,422,878	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total Generación de empleo, Proyectos de riego (equipamiento), Comercialización de granos básicos, silvicultura...</b>		-	870,422,878	870,422,878	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
4	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	IDA-6448-HN	-	147,358,209	147,358,209	-	147,358,209	147,358,209	-	36,422,342	36,422,342	24.7%	-	48,440,328	48,440,328	32.9%
	<b>Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)</b> Tipo de proyecto: Inversión Pública		-	147,358,209	147,358,209	-	147,358,209	147,358,209	-	36,422,342	36,422,342	24.7%	-	48,440,328	48,440,328	32.9%
5	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III)	IDA-6917-HN	-	248,744,582	248,744,582	-	195,619,582	195,619,582	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III)</b>		-	248,744,582	248,744,582	-	195,619,582	195,619,582	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
6	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
7	Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	2000002595	12,059,271	59,975,307	72,034,578	12,059,271	59,975,307	72,034,578	1,365,414	5,639,316	7,004,731	9.7%	1,365,414	16,451,933	17,817,347	24.7%
		LOAN No. 13754P	-	51,753,516	51,753,516	-	51,753,516	51,753,516	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras</b>		12,059,271	111,728,823	123,788,094	12,059,271	111,728,823	123,788,094	1,365,414	5,639,316	7,004,731	5.7%	1,365,414	16,451,933	17,817,347	14.4%
8	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	-	220,718,928	220,718,928	-	220,718,928	220,718,928	-	2,311,938	2,311,938	1.0%	-	10,203,068	10,203,068	4.6%
	<b>Total PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS</b>		-	220,718,928	220,718,928	-	220,718,928	220,718,928	-	2,311,938	2,311,938	1.0%	-	10,203,068	10,203,068	4.6%
9	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO	-	30,085,000	30,085,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
		4940/BL-HO	-	156,867,870	156,867,870	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
		GRT/WE-18107-HO	-	4,250,000	4,250,000	-	4,250,000	4,250,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
		ICO FONPRODE	-	29,598,300	29,598,300	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD</b>		-	220,801,170	220,801,170	-	220,801,170	220,801,170	-	29,662,852	29,662,852	13.4%	-	40,702,788	40,702,788	18.4%
145	<b>SUB-TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)</b>		12,059,271	2,074,304,327	2,086,363,598	12,059,271	1,150,756,449	1,162,815,720	1,365,414	86,276,374	87,641,789	7.5%	1,365,414	137,385,049	138,750,463	11.9%
	<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>		-	-	-	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES		-	-	-	250,000,000	-	250,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	BONO GANADERO		-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>SUB-TOTAL INVERSIÓN SOCIAL</b>		-	-	-	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>		32,515,839	5,062,500	37,578,339	32,515,839	875,485,378	908,001,217	115,000	-	115,000	0.0%	571,708	-	571,708	0.1%
	<b>SUB-TOTAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)</b>		32,515,839	5,062,500	37,578,339	32,515,839	875,485,378	908,001,217	115,000	-	115,000	0.0%	571,708	-	571,708	0.1%
	<b>TOTAL GENERAL</b>		44,575,110.00	2,079,366,827.00	2,123,941,937.00	1,344,575,110.00	2,026,241,827.00	3,370,816,937.00	1,480,414.35	86,276,374.17	87,756,788.52	7.5%	1,937,121.95	137,385,048.81	139,322,170.76	12.0%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024

Institución/Proyecto	Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL)	Establecer 100 PNs orientados a la Agricultura de Subsistencia (Ventana 1). 20 PNs orientados a la Agricultura en transición (Ventana 2). 3 PNs orientados a la Agricultura Comercial (Ventana 3).	Planes de Negocio	123	-	0%	-	-	-
	Capacitaciones en temas ambientales, sociales y adquisiciones.	Capacitaciones	90	-	0%	-	-	-
	Transferencias No Reembolsables realizadas a cuentas primarias de las Organizaciones de Productores Rurales Oprs.	Cantidad	12	-	0%	-	-	-
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.	Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de Negocio	30	-	0%	-	-	-
	Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención, Lempira (San Marcos de Caiquin, Erandique, Gualcince) La Paz (Guajiquiro, Marcala, Opatoro) Intibucá (Intibucá, Yamaranguila).	Planes de Manejo	10	-	0%	-	-	-
	Créditos y garantías otorgados a productores y productoras rurales a través de BANHPROVI.	Créditos y Garantías	50	-	0%	-	-	-
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	Diagnósticos territoriales elaborados a 22 municipios beneficiados por el proyecto para identificar el potencial productivo del territorio.	Informe de Diagnostico	22	-	0%	-	-	-
	Estudios de competitividad integral por cadena de valor elaborados.	Estudios	7	-	0%	-	-	-
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Planes	10	-	0%	-	-	-
	Planes de negocio formulados	Planes	15	-	0%	-	-	-
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Kits de herramientas entregados a las Unidad Municipal Ambientales (UMA).	Kits de Herramientas	7	-	0%	-	-	-
	Proyectos de rehabilitación de 8 sistemas urbanos de agua potable con contrato firmado por empresa ejecutora.	Contrato	8	-	0%	-	-	-
	Diagnósticos con línea base del nivel operativo de los prestadores de servicios urbanos aprobado	Dagnostico	1	-	0%	-	-	-
	Implementación del Plan de Asistencia Técnica (PAT).	Informe	4	-	0%	-	-	-
	Nuevos prestadores de servicios de agua potable con personal y oficinas funcionando	Cantidad	6	-	0%	-	-	-
016 - COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	Planes negocios en Agricultura de Subsistencia aprobados.	Planes de Negocio	30	-	0%	-	-	-
	Planes negocios en Agricultura en transición aprobados.	Planes de Negocio	20	-	0%	-	-	-
	Planes negocios en Apoyo a la Agricultura Comercial aprobados.	Planes de Negocio	1	-	0%	-	-	-
	12 - Planes negocios Agrologísticos y agropecuarios aprobados.	Planes de Negocio	1	-	0%	-	-	-
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	hectareas con sistemas de riego por goteo instalado y funcionando a través de planes de seguridad Alimentaria y nutricional.	Hectareas	35	-	0%	-	-	-
	Inversiones de infraestructura sanitaria	Hogares	800	-	0%	-	-	-
	Kit de bienes productivos	Hogares	1600	-	0%	-	-	-

