



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2024

Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024

www.sefin.gob.hn





IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El presupuesto vigente para el año 2024, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L43,654,014.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	35,032,354
Inversión Productiva	34,861,416
Formación Bruta de Capital	170,938
Presupuesto Vigente	43,654,014
Inversión Productiva	34,861,416
Formación Bruta de Capital	8,792,598
Ejecutado II Trimestre	16,044,331
Inversión Productiva	10,219,282
Formación Bruta de Capital	5,825,049
% Ejecución (Devengado II Trim-2024/Vigente)	36.8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	23,648,899
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	54.2%

Nota: SIAFI, 30/06/2024

Al segundo trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L43.7 millones** detallado para la Inversión productiva **L34.9 millones** y la Formación Bruta de Capital con un monto de **L8.8 millones**, y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L16.0 millones** lo que representa el (36.8%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública


El presupuesto de la Inversión Productiva es financiado en un 100% con fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); los cuales ascienden a L34.9 millones que corresponden a donación externa.

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2022-2024)

En los años 2022 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer han considerado la ejecución de al menos 2 proyectos de inversión, los cuales fueron financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.



Gráfico No. 1
Comportamiento de la Inversión Pública
(Dirección Nacional de Ciudad Mujer)
Al 30 de junio 2022-2024
Millones de Lempiras

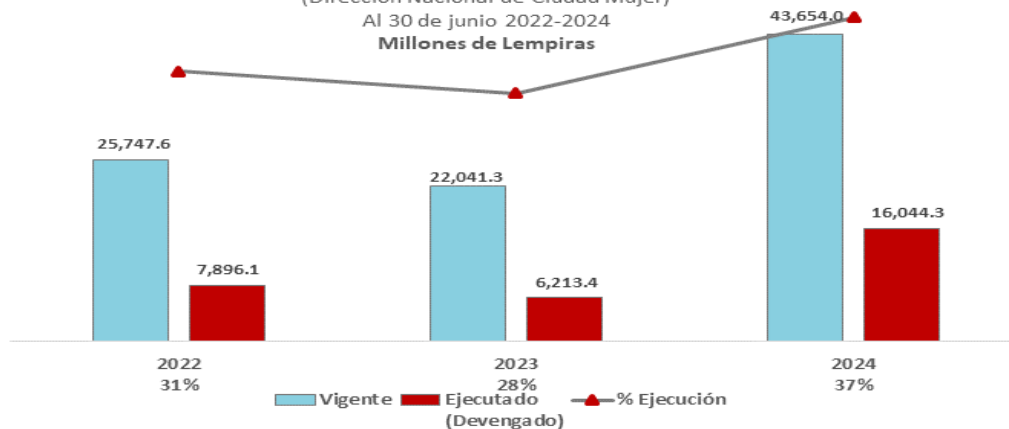

En el Gráfico No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, el pico más alto se registró en el año 2024.

Para el año 2024, solamente se considera el proyecto de donación financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo en el gráfico se incluye la Formación Bruta de Capital que realiza la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, financiando programas de apoyo a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

d. Principales Proyectos

La inversión en el segundo trimestre de 2024 se concentra en el siguiente proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).**

Cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2024 son los siguientes:



Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer	Servicio	1,920	967	50%	480	967	50%
Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	20	0	0%	20	0	0%
Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	Servicio	350	670	191%	205	457	131%

Fuente: SIAFI

Durante el segundo trimestre del 2024 el proyecto ha realizado las siguientes actividades:

- La implementación de una capacitación básica y seminarios presenciales para 3,500 empresarias en la transformación digital de sus empresas, durante este trimestre tenía planificado capacitar a 480 empresarias; se logró capacitar a 967 esto debido a que se realizaron dos promociones, dado que al inicio de año no se cumplió la meta por falta de disponibilidad de fondos.
- Para este trimestre estaba programada la certificación de 20 funcionarias encargadas de gestión empresarial, el mismo no se cumplió debido a que el proceso se encuentra en etapa de adjudicación y se tiene programado cumplir en el tercer trimestre.
- El programa de fortalecimiento de Negocios dirigido a pequeñas empresarias de micro, pequeña y mediana empresa; se había planificado beneficiar a 205 empresarias con un paquete de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), se logró ejecutar un paquete para 457 empresarias.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras al segundo trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	US\$.	2,375,000.00	23/06/2020
		Lempiras	58,687,200.00	23/06/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	34,861,416.00	34,861,416.00	5,182,533.88	14.9%
Acumulado 2024	34,861,416.00	34,861,416.00	10,219,281.59	29.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	58,687,200.00	58,687,200.00	36,453,946.51	62.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7104 por US\$1.00



d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2024

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos de la DNCM firmados durante el trimestre.

Contratos de servicios de consultoría individual nacional:

1. Proveedores regionales de Servicios de Desarrollo Empresarial con enfoque de Género.
2. Contratación de servicios de consultoría Certificación de los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial.
3. Contratación de servicios de verificación de la prestación de servicios de desarrollo empresarial.

d.2. Programas Sociales

Durante el segundo trimestre del año 2024, el Programa proporcionó un total de 87,670 atenciones integrales a mujeres y niños a nivel nacional y entregó 317,337 servicios en los Centros Ciudad Mujer (CCM).

Se han destacado los avances significativos del Programa Ciudad Mujer en la ejecución física y financiera, así como su impacto positivo en la vida de mujeres, adolescentes y niñez a nivel nacional. Los Centros Ciudad Mujer se han consolidado como espacios clave para brindar servicios integrales bajo un enfoque de género y derechos humanos, permitiendo así la aplicación concreta de políticas públicas de protección social y atención a grupos vulnerables en nuestro país.

Además, se obtuvo un crecimiento interanual del 15% y 16% respectivamente en los Centros en comparación con el primer trimestre de 2023. Estos resultados reflejan el impacto positivo de las gestiones realizadas por la Dirección Nacional del Programa, que han asegurado tanto la prestación de servicios como la provisión de insumos esenciales mediante donaciones y alianzas estratégicas. Esto ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las atenciones integrales ofrecidas a nuestras usuarias.

e. Gestión de la Inversión

- Aprobación de modificación presupuestaria para poder para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.
- Acompañamiento en la ejecución física y financiera a la institución.



- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Emisión del Dictamen Técnico de ampliación de plazo al convenio por un período de 12 meses para realizar actividades del Proyecto, el cual fue aprobado por el organismo financiador.

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2024

- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.
- Empresarias participantes se inscriben y cuando se les visita para aplicar el diagnóstico se identifica que no cumplen con los requisitos establecidos, en estos casos se dan de baja del proyecto y remiten al Módulo de Autonomía Económica (MAE).

V. CONCLUSIONES

- Realización de los ajustes necesarios al proyecto en concordancia con el lineamiento de las políticas de gobierno y del convenio en función de las necesidades de las empresarias MIPYMES para asegurar la sostenibilidad de los indicadores del proyecto en el mediano y largo plazo para fortalecer el Módulo de Autonomía Económica de los Centros Ciudad Mujer.
- En proceso de realizar los ajustes necesarios al Manual Operativo del Proyecto conforme a las acciones realizadas en la Plataforma Innova mujer y el modelo Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), alineado con la metodología y herramientas de SENPRENDE, con la intención de estandarizar procesos y buscar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo

VI. RECOMENDACIONES

- El seguimiento puntual a las actividades para que se ejecuten según su programación y que finalicen en la fecha de cierre establecido.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para poder apoyar con capital semillas a las mujeres empresarias.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2024
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado II Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		34,861,416	34,861,416	34,861,416	34,861,416	5,182,534	5,182,534	15	10,219,282	10,219,282	29	17,823,850	17,823,850	51
1	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	34,861,416	34,861,416	34,861,416	34,861,416	5,182,534	5,182,534	15	10,219,282	10,219,282	29	17,823,850	17,823,850	51
Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS			34,861,416	34,861,416	34,861,416	34,861,416	5,182,534	5,182,534	15	10,219,282	10,219,282	29	17,823,850	17,823,850	51

Fuente: SIAFI, 30/06/2024

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	11 - Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer	494 - SERVICIO	1,920	0	-	480	0	-
		23 - Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	494 - SERVICIO	20	0	-	0	0	-
		24 - Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	494 - SERVICIO	350	0	-	0	0	-
		25 - Informe de Auditoria Externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2024
