



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

*Instituto Nacional De
Estadísticas (INE)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Instituto Nacional de Estadística (INE), es una entidad gubernamental encargada de coordinar y regular el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Fue fundado en el año 2000, el INE tiene como mandato recolectar, analizar y difundir datos estadísticos confiables que reflejen la realidad nacional, apoyando así la planificación y

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	979,540,102
Inversión Productiva	978,742,102
Formación Bruta de Capital	798,000
Presupuesto Vigente	241,824,383
Inversión Productiva	144,851,681
Formación Bruta de Capital	96,972,702
Ejecutado III Trimestre	26,189
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	26,189
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	0.01%
Ejecutado Anual	59,425
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	59,425
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	0.02%
Comprometido(Devengado + Compromiso)	188,783
Inversión Productiva	-
Formación Bruta de Capital	188,783
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	0.08%

Nota: SIAFI, 30/09/2024

toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. Entre sus principales objetivos, el INE se enfoca en asegurar la calidad y accesibilidad de las estadísticas oficiales, promover una cultura estadística en la sociedad, optimizar recursos mediante la coordinación de actividades estadísticas y fomentar la capacitación e investigación en esta área.

Al tercer trimestre del 2024 la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L241.8 millones la ejecución del trimestre ascendió apenas al 0.01%, mientras que la acumulada fue de tan solo 0.02%, finalmente el compromiso ascendió a 0.08% tal como se detalla en el Cuadro No. 1.




b. Financiamiento de la Inversión Pública

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) financia sus programas y proyectos principalmente a través de dos fuentes de financiamiento: Recursos Propios y Crédito Externo.

En el presupuesto vigente, la fuente de Crédito Externo representa la fuente principal de financiamiento con una asignación de L240.5 millones mientras que los Recursos Propios suman L1.3 millones.

Gráfico No. 01
Instituto Nacional de Estadísticas: Inversión por Fuente
Cifras en millones de Lempiras

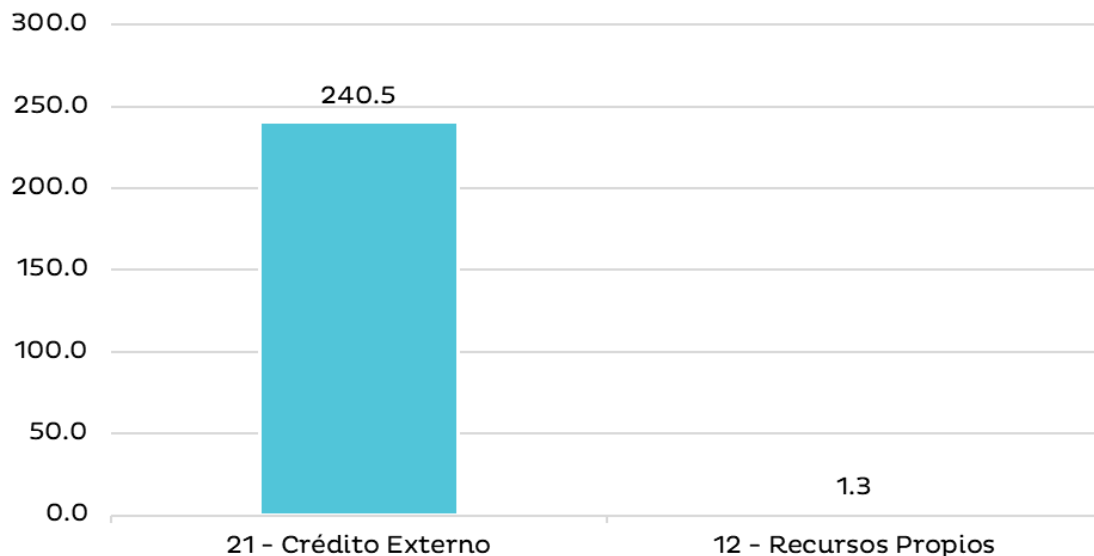

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado del INE durante los años 2020 y 2024:

Entre 2020 y 2022, los montos destinados eran muy bajos, enfocándose en proyectos rutinarios para actualizar la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, con una ejecución que aumentó gradualmente: en 2020 no hubo ejecución, en 2021 alcanzó el 48.7%, y en 2022 se ejecutó el 19.6%.


En 2023, se observa un aumento significativo en el presupuesto aprobado



(26.5), aunque solo se ejecutó el 2.0%. Este incremento en el presupuesto se destinó a actividades más complejas, como la actualización cartográfica precensal para el Censo Agropecuario Nacional y el apoyo al Programa de Censo de Población y Vivienda.

Finalmente, para 2024, el presupuesto aumenta considerablemente a L241.8 millones, pero la ejecución hasta el momento es de solo L0.1 millones, representando el 0.01%. Esto sugiere que las actividades previstas para 2024 aún están en una fase inicial y en condiciones previas para iniciar la ejecución del proyecto.

Comportamiento Inversión Pública
Al 30 de Septiembre (2020-2024)
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas
Cifras en Millones de Lempiras

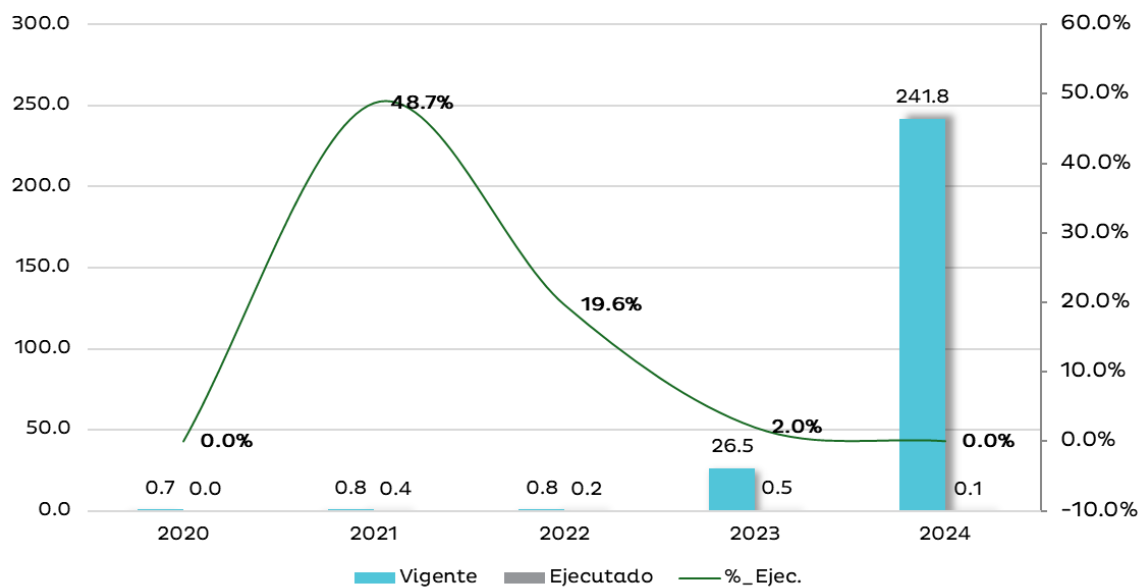

d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el tercer trimestre de 2024 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:



1. Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.

El objetivo principal del censo de población es incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas en Honduras.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	BOLETA	1	1	100%	0	0	0.0%
Levantar el Censo Nacional de Población y Vivienda	CENSO	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Analizar datos censales	INFORME	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Difundir información de la población censada	INFORME	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Evaluación postcensal	EVALUACIÓN	0	0	0.0%	0	0	0.0%

Fuente: INE, al 30 de septiembre de 2024

Cabe resaltar que de acuerdo con la programación de metas físicas el proyecto no presenta avances de ejecución.

Sin embargo, se avanzó con los siguientes procesos:

- Contratación del Personal Técnico Especializado Censal.
- Contratación de Mecanismo de Publicidad.
- Consultoría para Desarrollador Web de Aplicaciones Móviles para Monitoreo de Campo.
- Impresión de Materiales para Empadronamiento.



- Adquisición de Dispositivos Móviles para el Desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV).
- Adquisición de Equipo de Cómputo para el Desarrollo.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional al tercer trimestre de 2024:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)
Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional	5832/BL-HO	US\$50,000,000	L1,245,575,000	17/06/2024-17/12/2027
III Trimestre 2024	978,742,102	144,851,681	0	0.0%
Acumulado 2024	978,742,102	144,851,681	0	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,245,575,000	1,245,575,000	0	0.0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024

Durante el tercer trimestre de 2024, los procesos de adquisiciones avanzaron con la revisión de currículums para varios puestos clave del proyecto, incluyendo:

- Coordinador de la UEP: Revisión de currículums para cubrir la coordinación de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
- Especialista de Adquisiciones: Evaluación de perfiles para asegurar una gestión eficiente de los procesos de compra.
- Especialista Financiero: Búsqueda de un experto financiero para gestionar los recursos y presupuesto del proyecto.
- Especialista de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proyecto: Selección de candidatos para monitorear y evaluar el avance del proyecto.
- Contador de Proyecto: Revisión de currículums para cubrir la contabilidad específica del proyecto.



- Oficial Financiero, Administrativo y Contable: Proceso de selección para gestionar finanzas y administración.
- Vigilancia: Contratación de una persona encargada de la seguridad.
- Personal de Aseo: Contratación de una persona para el mantenimiento y limpieza.
- Motorista: Evaluación de candidatos para transporte y logística del personal y materiales.

d.2. Programas Sociales

El Censo Agropecuario Nacional (CAN-2024) es una operación estadística realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), diseñada para recopilar información actualizada sobre la estructura y producción del sector agropecuario en Honduras. A la fecha, se han realizado importantes avances en el censo agropecuario, incluyendo la contratación y capacitación del personal en campo, que abarca coordinadores, supervisores y enumeradores. Se han definido los temas clave a investigar, como la tenencia de la tierra y la producción ganadera, para obtener una visión integral del sector. Además, se está adquiriendo tecnología y equipo para la captura de datos en tiempo real, y se están imprimiendo materiales necesarios para el empadronamiento. También se están implementando estrategias de divulgación para sensibilizar a los productores y se avanza en el desarrollo de una plataforma web para optimizar el reclutamiento y monitoreo del personal.

e. Gestión de la Inversión

Mediante el Oficio No. DE-INE-426-2024, fechado el 01 de julio de 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) solicita una modificación presupuestaria para realizar traslados entre las estructuras presupuestarias del proyecto, por un valor de L978.7 millones. Esta solicitud tiene como objetivo ejecutar las actividades del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y fortalecer el Sistema Estadístico

Nacional. La respuesta a esta solicitud fue parcial, atendiendo un monto de L144.8 millones, ya que la programación de ejecución del proyecto para el presente ejercicio fiscal contempla la ejecución de dicho monto.

A la fecha se está pendiente la elegibilidad el proyecto, la cual se encuentra en condiciones previas para su primer desembolso. Aunque ya ha sido aprobado y firmado, aún se están finalizando los requisitos administrativos y de elegibilidad, como el registro en el sistema de información financiera del BID y en el Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024

- En vista que el censo está programado para iniciar en julio de 2025, es fundamental acelerar el proceso de Licitación Pública Internacional (LPI) para la adquisición de dispositivos móviles, lo que se considera crítico en esta etapa.
- En cuanto al reclutamiento masivo de personal de campo y apoyo técnico-administrativo del CNPV, se requiere la revisión y aprobación del BID del manual de procedimientos correspondiente.
- Finalmente, para la contratación de empresas rentadoras de vehículos y de la empresa de apoyo tecnológico "Geoanalytics", se plantea presentar justificaciones y propuestas para su contratación directa, garantizando así la fluidez en la ejecución del proyecto.

V. CONCLUSIONES

- El análisis de la ejecución física-financiera del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el tercer trimestre de 2024 revela un nivel de ejecución bajo, con solo el 0.01% de ejecución del presupuesto vigente de L241.8 millones. Cabe mencionar que en septiembre se incorporó los recursos al Proyecto, esto indica que las actividades programadas aún se encuentran en fases iniciales.



- Si bien se han iniciado algunas gestiones para la adquisición de equipos y la contratación de personal técnico, los avances físicos no reflejan un progreso suficiente para cumplir con los plazos establecidos, lo que podría comprometer la calidad de la información estadística y, en consecuencia, el desarrollo del país.

VI. RECOMENDACIONES

- Es recomendable que el INE priorice la finalización de los requisitos administrativos y de elegibilidad necesarios para el primer desembolso del financiamiento. Esto incluye el registro en el sistema de información financiera del BID y en el Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).
- Se recomienda llevar a cabo la contratación rápida y efectiva del personal necesario para la unidad ejecutora, así como del personal de campo que será clave para el éxito del censo. Es fundamental asegurar que los perfiles seleccionados cumplan con las competencias requeridas para la ejecución del proyecto.
- Se recomienda cumplir con los hitos claves en octubre y noviembre de 2024. Además, se debe asegurar la contratación rápida de personal de la unidad ejecutora, personal de campo y la aprobación de los TdR para no retrasar las fases críticas del proyecto en 2025.

Anexo No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		-	978,742,102	978,742,102	-	144,851,681	144,851,681	-	-	0.00%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	5832/BLHO	-	978,742,102	978,742,102	-	144,851,681	144,851,681	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
	Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA		-	978,742,102	978,742,102	-	144,851,681	144,851,681	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
1	Total Inversión Productiva		-	978,742,102	978,742,102	-	144,851,681	144,851,681	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		798,000	-	798,000	1,348,000	95,624,702	96,972,702	26,189	26,189	0.03%	59,425	59,425	0.06%	188,783	188,783	0.19%
	CENSO RED SOLIDARIA		-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
	Total CENSO RED SOLIDARIA		-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
	CONVENIO CONSUCCOOP		-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
	Total CONVENIO CONSUCCOOP		-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
	DIRECCION Y COORDINACION		798,000	-	798,000	798,000	95,624,702	96,422,702	26,189	26,189	0.03%	59,425	59,425	0.06%	188,783	188,783	0.20%
	Total DIRECCION Y COORDINACION		798,000	-	798,000	798,000	95,624,702	96,422,702	26,189	26,189	0.03%	59,425	59,425	0.06%	188,783	188,783	0.20%
	Total Formación Bruta de Capital		798,000	-	798,000	1,348,000	95,624,702	96,972,702	26,189	26,189	0.03%	59,425	59,425	0.06%	188,783	188,783	0.19%
	Total general		798,000	978,742,102	979,540,102	1,348,000	240,476,383	241,824,383	26,189	26,189	0.01%	59,425	59,425	0.02%	188,783	188,783	0.08%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

Anexo No. 2
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional de Estadísticas	002 - Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional	16 - Levantamiento actividades Censo de Población y Vivienda 2024	17 - CENSO	1	0	-	0	0	-
		17 - Levantamiento Censo Agropecuario Nacional 2024	17 - CENSO	1	0	-	0	0	-
		18 - Actividades de los fondos (gestión, auditoría y evaluación)	1125 - ACTO ADMINISTRATIVO	1	0	-	1	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024
