

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

### *Programa de la Red Solidaria (PRS)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024





## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social, de las acciones tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Gobierno actual, en su Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>4,587,477,553</b>
Inversión Productiva	3,781,059,327
Inversión Social	806,418,226
Formación Bruta de Capital	-
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>3,595,061,798</b>
Inversión Productiva	2,787,161,739
Inversión Social	757,763,549
Formación Bruta de Capital	50,136,510
<b>Ejecutado III Trimestre</b>	<b>239,088,246</b>
Inversión Productiva	143,078,654
Inversión Social	94,119,340
Formación Bruta de Capital	1,890,252
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)</b>	<b>6.7%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>569,841,217</b>
Inversión Productiva	368,383,086
Inversión Social	199,219,340
Formación Bruta de Capital	2,238,791
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>15.9%</b>
<b>Comprometido(Devengado + Compro</b>	<b>995,888,389</b>
Inversión Productiva	792,306,127
Inversión Social	199,219,340
Formación Bruta de Capital	4,312,922
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>27.7%</b>

Nota: SIAFI, 30/09/2024

Al tercer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de L3,595.1 millones detallado para la




Inversión Productiva L2,787.2 millones, la Inversión Social L757.8 millones, y la formación Bruta de Capital L50.1 millones, la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de L569.8 millones lo que representa el (15.9%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (7) siete proyectos enfocados en entregas de transferencias monetarias, salud, educación y ambiente, Infraestructura Escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

### **b. Financiamiento de la Inversión Pública**

El presupuesto del Programa de la Red Solidaria está financiado por fondos externos de crédito y donación con el 77.5% provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial y los fondos nacionales del 22.5%.

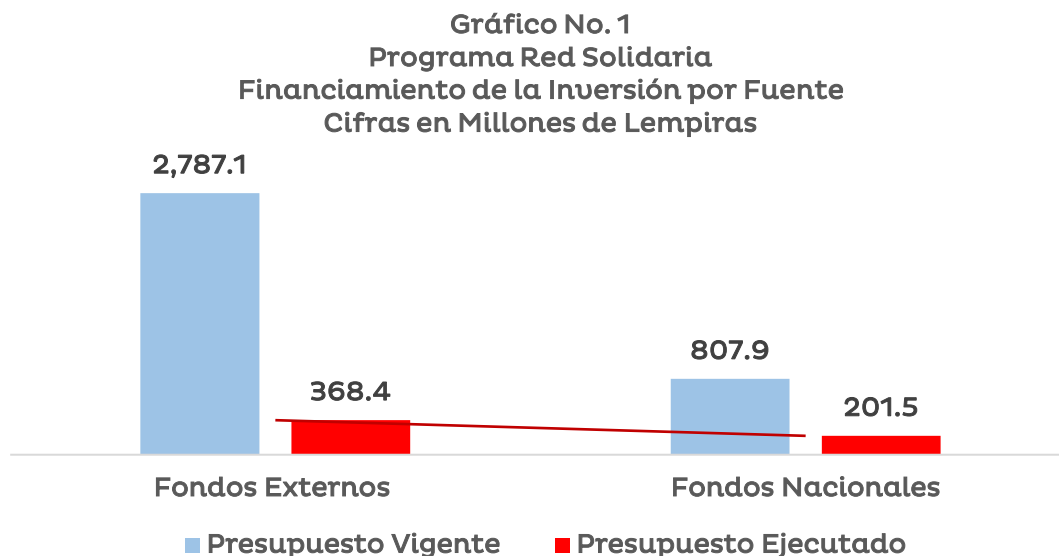


### **c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2024)**

En los años 2023 al 2024 los proyectos de Inversión Pública del Programa de la Red Solidaria han considerado la ejecución de 7 proyectos de inversión, los cuales fueron financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.



Gráfico No. 2  
Comportamiento de la Inversión Pública  
(Programa Red Solidaria)  
Al 30 de Septiembre 2023-2024  
Millones de Lempiras

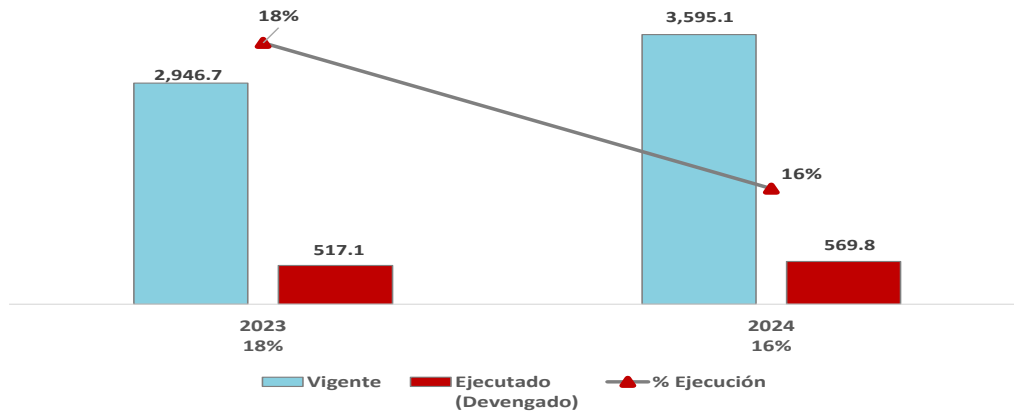

En el Gráfico No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, el pico más alto se registró en el año 2024.

- En el año 2022 a finales se trasladó a la Red Solidaria solamente un proyecto, el resto se encontraba en proceso de emisión de contratos modificatorios por cambio de ejecutor.
- En el año 2023, el Programa de Inversión Pública de la Red Solidaria se conformó con la ejecución de 7 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 99% con recursos de crédito externo y un 1% una donación externa.
- En el año 2024 cuenta un Programa de Inversión Pública de 7 proyectos financiados con fondos externos en su presupuesto, asimismo cuenta con seis ejes de inversión los cuales también se financian con fondos nacionales provenientes del tesoro nacional.
- La Red Solidaria para el presente año 2024, estará incorporando a la cartera de proyectos una donación financiada por el Banco Mundial la cual servirá para levantamiento de información de grupos etarios de infantes en la zona Atlántica del país.

#### d. Principales Proyectos

La inversión en el tercer trimestre de 2024 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)



3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)
4. Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO)
5. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)
6. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).
7. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### 1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)

El Objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes:

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Dotación de Centros de Educación con Equipo tecnológico	Centro Educación Básica	50	0	0%	50	0	0%
Dotación de Centros de Educación con Mobiliario Educativo	Centro Educación Básica	40	0	0%	40	0	0%
Gestores Sociales Contratados mediante financiamiento del BID 5008	Contrato	94	0	0%	30	0	0%
Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas mediante financiamiento BID 5008	Informe	3	0	0%	3	0	0

Fuente: UE-PRS

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se observa que no hay avances al tercer trimestre del año, en vista que las metas programadas para el año estarían cumplidas para el cuarto trimestre de 2024. Sin embargo; la unidad coordinadora ha realizado las siguientes actividades:

- Se cuenta con la continuidad de 94 Gestores Sociales que implementan el programa en territorio, contratación de 4 digitadores para apoyar el tema de liquidaciones de TMC, contratación de un asistente para las entregas de TMC, contratación de un especialista



para el acompañamiento de la estrategia del capital semilla, contratación de los técnicos de acompañamiento a los ejes del PRS, en Protección Social, Salud, Educación, y oportunidades de ingreso.

- Se encuentra en curso el proceso para la compra de mobiliario educativo para 40 centros de educación básica, que incluye mobiliario para maestros y dirección el cual se espera hacer entrega en el IV trimestre. Asimismo, se encuentra en curso el proceso de la adquisición de equipo de cómputo para 40 Centros de Educación Básica.
- Se logró el fortalecimiento de la Unidad de Monitoreo Programático de SEDESOL.  
Se encuentra en ejecución el convenio con INE para el levantamiento de información socioeconómica en las aldeas y sus caseríos en condición de extrema pobreza, del departamento de Lempira, y caseríos de los 17 departamentos restantes que quedaron pendientes de levantamiento en el primer censo realizado por SEDESOL y que están focalizados por el programa de la red solidaria y que están dentro de las 2007 aldeas focalizadas por el programa de la solidaria.
- Se financiaron las consultorías de los consultores que integran la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos, se adquirieron insumos de oficina para la operatividad de UCP.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	US\$.	54,200,000	29/06/2020
		Lempiras	1,350,203,300	13/08/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024	268,450,744	273,502,983	19,330,072	7%
Acumulado 2024	268,450,744	273,502,983	61,854,063	22%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,350,203,300</b>	<b>1,350,203,300</b>	972,486,529	72%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

## 2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)

Objetivo del Programa es mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	hogares	60,000	0	0%	no se programaron entregas	0	0%
Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	Gestores	162	0	0%	en proceso de contratación	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora no presenta avances al tercer trimestre del año, realizando únicamente algunas actividades.

- Se tiene planificado iniciar los operativos de entrega de TMC en el IV trimestre.
- Se realizaron las contrataciones de personal para el fortalecimiento del sistema de información del PRS, así como la contratación de 29 gestores sociales para el fortalecimiento de las intervenciones territoriales y la continuidad de consultorías de apoyo a la estrategia de salvaguardas.
- Se ejecutaron talleres en el Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social (CHEPES), para los gestores sociales para capacitarlos en políticas públicas los cuales fueron regionales para facilitar el acceso.
- financiar la operatividad de UCP, con la contratación de personal de adquisiciones, administración y formulación y seguimiento, se realizaron compras de equipo de cómputo para el fortalecimiento de la unidad.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	US\$.	30,000,000	17/07/2019
		Lempiras	747,345,000	31/12/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024	81,149,117	284,891,882	6,043,388	2.1%
Acumulado 2024	81,149,117	284,891,882	7,600,565	2.7%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>747,345,000</b>	<b>747,345,000</b>	437,882,760	58.6%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00



### 3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema	hogares	113,464	0	0%	no se programaron entregas	0	0%
Contratación de gestores sociales para mejorar la cobertura	Gestores	44	0	0%	en proceso de contratación	0	0%
Actualización de la Base de Datos del SIRBHO, y su inclusión de Urbano	Informe	2	0	0%	en proceso de contratación	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora no presenta avances al tercer trimestre del año, realizando únicamente algunas actividades.

- Se tiene planificado iniciar los operativos de entrega de TMC en el IV trimestre.
- Fortalecimiento del sistema de información del PRS con la contratación de personal (analistas, programadores, desarrolladores de aplicaciones, administradores de bases de datos).
- En proceso la compra de equipo informático y tecnológico para fortalecer el sistema de información del PRS.
- Fortaleciendo a SEDESOL/ODS con consultorías y adquisición de equipos para el fortalecimiento del SIRBHO.

A continuación, véase la ejecución

financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:





Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6918-HN	70,000,000		28/08/2021 31/12/2025
			1,743,805,000	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024	586,437,748	968,804,983	21,228,124	2.2%
Acumulado 2024	586,437,748	968,804,983	41,551,085	4.3%
<b>Acumulado Vida del Proyecto *</b>	<b>1,743,805,000</b>	<b>1,743,805,000</b>	<b>471,344,530</b>	<b>27%</b>

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

#### 4. Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO)

Objetivo: Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Número de hectáreas restauradas bosque privado	hectáreas	6,500	5,725	88%	6,500	5,725	88%
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al CC realizadas y validadas	Informes de Investigación	4	4	100%	4	4	100%
Banco de germoplasma de especies resilientes al CC constituido y operando	Informe	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UCP-PRS

- En la restauración de bosque público a la fecha se han restaurado 34,034.06 hectáreas; cumpliendo con la meta global del proyecto de las 34,000 hectáreas.
- Con el bosque privado se encuentran en proceso de restauración de 5,725 hectáreas, cumpliendo con la meta en un 88% (meta 6,500 hectáreas).
- Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a Financiamiento Climático, Manejo Forestal Sostenible (MFS) y Pago de Servicios



Ambientales (PSA) puesto en marcha, implementación de una plataforma.

- En ejecución la consultoría de Evaluación Económica Ex Post de los principales componentes del Proyecto.
- En ejecución el monitoreo del Indicador Hídrico del Proyecto.
- Indicar que el proyecto se encuentra en proceso de cierre y que la SEFIN emitió opinión técnica para la contratación de personal para dicho cierre, el cual debe ser presentado el informe en tiempo y forma.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$.	25,000,000	07/04/2017
		Lempiras	622,787,500	07/08/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024	75,884,937	119,452,802	31,288,691	26.2%
Acumulado 2024	75,884,937	119,452,802	62,922,976	52.7%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>622,787,500</b>	<b>622,787,500</b>	554,737,822	89.1%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

## 5. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.



Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas al II trimestre 2024**

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	Educando	5,008	1,380	28%	2,500	1,380	55%
Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	35	7	20%	0	0	0%
Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	9	1	11%	0	0	0%
Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	Sistema	1		0%	1	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora presenta avances al tercer trimestre del año, únicamente en una actividad de acuerdo a las metas programadas, sin embargo, presenta avances en algunas actividades.

- Se ha programado la construcción de 15 módulos y la rehabilitación de 9 CEB's. Es de mencionar que actualmente se está llevando a cabo la construcción de 7 módulos escolares y la rehabilitación de 1 CEB's. para el cuarto trimestre se estará llevando a cabo la adjudicación para la construcción de 20 CEB's y la rehabilitación de 7 CEB's y su respectiva supervisión.
- En ejecución la consultoría internacional para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH) y la Plataforma de Inteligencia de Negocios de la SEDUC, la cual presenta un avance físico acumulado del 70%.
- Atención a educandos en la modalidad presencial en el tercer ciclo de educación básica.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Jouen	BID 4449/BL-HO	45,000,000		02/02/2018 03/06/2025
			1,121,017,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2024	234,531,191	275,947,391	38,374,520	13.9%
Acumulado 2024	234,531,191	275,947,391	88,216,479	32%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,121,017,500</b>	<b>1,121,017,500</b>	782,926,283	73.3%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

## 6. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).

Objetivo: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Los principales avances físicos al III Trimestre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales a nivel descentralizado fortalecido	Informe	2	0	0%	0	0	0%
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	3	0	0%	0	0	0%
Capacidades técnicas de la SESAL fortalecidas.	Informe	4	0	0%	1	0	0%

Fuente: UE-PRS

La Contratación de consultoría individual Formación de las Capacidades de Diagnóstico a través de la Telesonografía Obstétrica para proveedores de salud de los servicios de primer nivel de atención en las regiones sanitarias priorizadas: Copán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Intibucá, La Paz y Choluteca, con el fin de mejorar el diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones obstétricas y neonatales.

A continuación se detallan las obras de construcción hospitalarias en ejecución:

- Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán;** de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra, a la fecha las actividades que presentan avances en el periodo: instalaciones previas, demoliciones y movimiento de



tierras; 90%, zapata de cimentación de hormigón armado (52%), viga entre zapatas (21%), foso de ascensor (70%) y losa de cimentación (75%).

2. **Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz;**  
, a la fecha las actividades que presentan avances en: Actividades Previas se ha realizado las actividades de valla informativa de obra (100%), valla publicitaria del proyecto (100%), vallado provisional de obra (100%) y campamento de obra (80%).
3. **Sala de Neonatología del Hospital Santa Teresa de Comayagua,** de a la fecha las actividades que presentan avances en actividades previas: se ha realizado las actividades de valla informativa de obra (100%), valla publicitaria del proyecto (100%), vallado provisional de obra (100%) y campamento de obra (100%).
4. **Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco, Olancho,** las actividades que presentan avances en el periodo: actividades previas, demoliciones y movimiento de tierras; valla informativa de obra (100%), valla publicitaria del proyecto (100%), vallado provisional de obra (100%) y campamento de obra (100%).
5. **Remodelación de la actual unidad de neonatología en el 5to nivel y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to nivel (cuartos de apoyo, lavandería, bodega y oficinas médicas, junto con un aula educacional), del Hospital Escuela,** las actividades que presentan avances en el periodo: actividades previas: valla informativa de obra (50%), valla publicitaria del proyecto (50%), vallado provisional de obra (70%), campamento de obra (95%) y demoliciones (50%) del sexto nivel.

Las obras tienen un período de ejecución de 7 a 12 meses, las cuales estarían finalizando en diciembre 2024 y abril de 2025.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	69,000,000		19/03/2019 10/07/2026
			1,718,893,500	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024	681,701,367	596,717,302	25,996,727	4.4%
Acumulado 2024	681,701,367	596,717,302	94,412,839	15.8%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,718,893,500</b>	<b>1,718,893,500</b>	976,195,606	56.8%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

## 7. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

Objetivo: contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA

Principales Metas Físicas al III trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Hogares en pobreza y extrema pobreza beneficiados con TMC	Hogar	32,621	0	0%	0	0	0%
Levantamiento del Padrón de hogares en aldeas priorizadas por el Eje de Protección Social	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Creación de Plataforma Virtual, para poder realizar pagos en aldeas sin señal telefónica ni energía eléctrica (modalidad de pago Offline de TMC).	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

La entrega de transferencias monetarias condicionadas está programada a realizarse en los meses de noviembre y diciembre de 2024.

Se ejecutaron estudios de factibilidad para pagos alternativos de TMC e identificar modalidades alternativas de pago.

Se realizaron adquisiciones de materiales de oficina para la operatividad de UCP y el pago de consultorías que finalizaron en el presente año.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	BID 5289/BL-HO	US\$.	45,000,000	20/08/2021 02/10/2025
		Lempiras	1,121,017,500	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2024		266,262,375	458,013	0.2%
Acumulado 2024		271,314,375	10,339,688	3.9%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,121,017,500</b>	<b>1,121,017,500</b>	878,939,856	78.4%

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

### d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024



En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos del Programa de la Red Solidaria firmados durante el trimestre.

Se recibieron las ofertas para Construcción de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque (20 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 07 Centros Educativos).

#### **d.2. Programas Sociales**

La inversión de los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria se conforma en seis ejes de inversión tiene un vigente de L757.8 millones y un ejecutado de L199.2 millones para atender diferentes grupos beneficiarios; Eje de Protección Social, Eje de Salud, Eje de Educación, Eje de Fortalecimiento Humano, Eje de Infraestructura y Ambiente, y Eje de

Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta III Trimestre		% de Ejecución Trimestre	% de Ejecución Anual
			Programada	Ejecutada		
Familias en situación de Pobreza y extrema pobreza beneficiadas con Atención-promoción-preención en el primer nivel de salud en las aldeas focalizados de la Red Solidaria, sin discriminación de género, origen étnico predominando el enfoque inclusivo.	Familias	123,803	65,749	65,749	100%	64%
Kits escolares entregados a educandos matriculados en centros educativos departamentales	Educandos	25,000	25,000	25,000	100%	100%
Cajas Rurales financiando emprendimientos productivos con Igualdad y Equidad de Género generando empleos e ingresos para los participantes focalizados	Cajas Rurales	2,357	360	1	100%	15%
Calzado escolar entregado a educandos matriculados en centros educativos departamentales	Educandos	24,500	24,500	24,500	100%	100%

#### **Generación de Oportunidades de Ingreso.**

La ejecución financiera de los programas sociales que presenta el Programa de la Red Solidaria es de L94.1 millones, se ha programado su ejecución para el cuarto trimestre, ya que ha habido retrasos en el campo con los documentos de liquidación de TMC, la ejecución realizada en el presente trimestre se encuentra contemplado en el Eje de Infraestructura Social, Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso y Protección Social.

#### **e. Gestión de la Inversión**

- Revisión, verificación y aprobación de modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.
- Acompañamiento en la ejecución física y financiera a la institución.



- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Solicitudes a los proyectos de las cuotas de compromiso mensual.

#### **f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024**

La baja ejecución presentada por los proyectos ejecutados por el Programa de la Red Solidaria (Protección Social), se debe a problemas de focalización, no se cuenta con una base de datos actualizada de los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas, aprobaciones pendientes por parte del organismo financiador (Banco Mundial y BCIE) a los contratos modificatorios que sufrieron cambios en su estructura, al finalizar del trimestre se cuenta con dicha aprobación.

El programa de la Red Solidaria no presenta ejecución satisfactoria, ni avances de las mismas en sus programaciones para el año 2024, dado que las metas están programadas para el último trimestre del presente año, programaciones que no van de acuerdo con las múltiples necesidades que sufre la población, ya que el Programa debe cumplir con el mandato del Gobierno para lo cual fue creada, mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

#### **g. Conclusiones**

- El Programa de la Red Solidaria al tercer trimestre presenta baja ejecución física y financiera de L569.8 millones lo que representa un 15.9% respecto al presupuesto vigente, por lo que dicha ejecución no es satisfactoria, dado que la ejecución de la Inversión Productiva es únicamente por L368.4 millones misma que está representada por los proyectos y financiados con créditos de los organismos multilaterales.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

#### **h. Recomendaciones**

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias





fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.

- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales a fin de realizar las entregas de los beneficios a la población oportunamente.
- Se insta a los organismos financiadores de estos proyectos a dar prioridad a las gestiones pendientes, a fin de no seguir retrasando la ejecución de los proyectos y brindar un mayor apoyo a las unidades ejecutoras en cuantos a capacitaciones y fortalecimiento institucional.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
11	0415 - Programa de la Red Solidaria		-	3,781,059,327	3,781,059,327	-	2,787,161,739	1,582,260	2,787,161,739	-	143,078,654	143,078,654	5.1%	-	368,383,086	368,383,086	13.2%	-	792,306,127	792,306,127	28.4%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	268,450,744	268,450,744	-	273,502,828	-	273,502,828	-	19,330,072	19,330,072	7.1%	-	61,854,063	61,854,063	22.6%	-	76,382,977	76,382,977	27.9%
	<b>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	<b>268,450,744</b>	<b>268,450,744</b>	-	<b>273,502,828</b>	<b>-</b>	<b>273,502,828</b>	-	<b>19,330,072</b>	<b>19,330,072</b>	<b>7.1%</b>	-	<b>61,854,063</b>	<b>61,854,063</b>	<b>22.6%</b>	-	<b>76,382,977</b>	<b>76,382,977</b>	<b>27.9%</b>
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	-	586,437,748	586,437,748	-	968,804,983	-	968,804,983	-	21,228,124	21,228,124	2.2%	-	41,551,083	41,551,083	4.3%	-	46,128,171	46,128,171	4.8%
	<b>Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>		-	<b>586,437,748</b>	<b>586,437,748</b>	-	<b>968,804,983</b>	<b>-</b>	<b>968,804,983</b>	-	<b>21,228,124</b>	<b>21,228,124</b>	<b>2.2%</b>	-	<b>41,551,083</b>	<b>41,551,083</b>	<b>4.3%</b>	-	<b>46,128,171</b>	<b>46,128,171</b>	<b>4.8%</b>
3	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	75,884,937	75,884,937	-	119,452,802	-	119,452,802	-	31,288,691	31,288,691	26.2%	-	62,922,976	62,922,976	52.7%	-	67,599,508	67,599,508	56.6%
	<b>Total MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>		-	<b>75,884,937</b>	<b>75,884,937</b>	-	<b>119,452,802</b>	<b>-</b>	<b>119,452,802</b>	-	<b>31,288,691</b>	<b>31,288,691</b>	<b>26.2%</b>	-	<b>62,922,976</b>	<b>62,922,976</b>	<b>52.7%</b>	-	<b>67,599,508</b>	<b>67,599,508</b>	<b>56.6%</b>
4	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	234,531,191	234,531,191	-	275,947,391	-	275,947,391	-	38,374,520	38,374,520	13.9%	-	88,216,479	88,216,479	32.0%	-	147,237,842	147,237,842	53.4%
		ATN/OC-18869-HO	-	-	-	-	1,582,260	1,582,260	1,582,260	-	359,119	359,119	22.7%	-	1,485,392	1,485,392	93.9%	-	1,485,530	1,485,530	93.9%
	<b>Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>		-	<b>234,531,191</b>	<b>234,531,191</b>	-	<b>277,529,651</b>	<b>1,582,260</b>	<b>277,529,651</b>	-	<b>38,733,638</b>	<b>38,733,638</b>	<b>14.0%</b>	-	<b>89,701,871</b>	<b>89,701,871</b>	<b>32.3%</b>	-	<b>148,723,372</b>	<b>148,723,372</b>	<b>53.6%</b>
5	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO	-	-	-	-	266,262,291	-	266,262,291	-	458,013	458,013	0.2%	-	10,339,688	10,339,688	3.9%	-	10,501,336	10,501,336	3.9%
	<b>Total PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS</b>		-	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>266,262,291</b>	<b>-</b>	<b>266,262,291</b>	-	<b>458,013</b>	<b>458,013</b>	<b>0.2%</b>	-	<b>10,339,688</b>	<b>10,339,688</b>	<b>3.9%</b>	-	<b>10,501,336</b>	<b>10,501,336</b>	<b>3.9%</b>
6	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	81,149,117	81,149,117	-	284,891,882	-	284,891,882	-	6,043,388	6,043,388	2.1%	-	7,600,565	7,600,565	2.7%	-	14,467,589	14,467,589	5.1%
	<b>Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>		-	<b>81,149,117</b>	<b>81,149,117</b>	-	<b>284,891,882</b>	<b>-</b>	<b>284,891,882</b>	-	<b>6,043,388</b>	<b>6,043,388</b>	<b>2.1%</b>	-	<b>7,600,565</b>	<b>7,600,565</b>	<b>2.7%</b>	-	<b>14,467,589</b>	<b>14,467,589</b>	<b>5.1%</b>
7	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	681,701,367	681,701,367	-	596,717,302	-	596,717,302	-	25,996,727	25,996,727	4.4%	-	94,412,839	94,412,839	15.8%	-	428,503,174	428,503,174	71.8%
	<b>Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>		-	<b>681,701,367</b>	<b>681,701,367</b>	-	<b>596,717,302</b>	<b>-</b>	<b>596,717,302</b>	-	<b>25,996,727</b>	<b>25,996,727</b>	<b>4.4%</b>	-	<b>94,412,839</b>	<b>94,412,839</b>	<b>15.8%</b>	-	<b>428,503,174</b>	<b>428,503,174</b>	<b>71.8%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de la Red Solidaria	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	29 - Hectáreas de Bosque de Pino en terrenos privados, incentivos para el manejo forestal sostenible.	44 - HECTÁREA	3,250	0	-	3,250	0	-
		30 - Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático realizadas y validadas.	1005 - INFORME DE INVESTIGACIÓN	4	0	-	4	0	-
		31 - Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a Financiamiento Climático, Manejo Forestal Sostenible (MFS) y Pago de Servicios Ambientales (PSA) puesto en marcha	472 - PLATAFORMA	1	0	-	1	0	-
		32 - Gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto desarrollada	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-
		33 - Auditoría Externa del Proyecto realizada.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	-	0	0	-
	001 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	75 - Levantamiento del Padron de hogares en aldeas prioritizadas por el Eje de Protección Social a través del financiamiento del BID 5289	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		76 - Creación de Plataforma Virtual, para poder realizar pagos en aldeas sin señal telefonica ni energia electrica (modalidad de pago Offline de TMC).	498 - SISTEMA DE INFORMACION	1	0	-	1	0	-
		77 - Planilla Generada para TMC a poblaciones en pobreza	470 - PLANILLA	1	0	-	0	0	-
	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	88 - Hogares en pobreza y extrema pobreza beneficiados con TMC a través del financiamiento del BID - 5289	406 - HOGAR	32,621	0	-	0	0	-
		15 - Cobertura Tercer Ciclo de Educación Básica ampliada en la zona de influencia del proyecto.	1016 - EDUCANDO	6,000	0	-	1,500	0	-
		16 - Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	1016 - EDUCANDO	5,008	0	-	0	0	-
		17 - Módulos Escolares construidos en la zona de influencia	101 - CENTRO EDUCATIVO	15	0	-	0	0	-
		18 - Docentes Capacitados en pedagogías de aprendizaje activo en la zona de influencia	31 - DOCENTE	120	0	-	0	0	-
		19 - Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	31 - DOCENTE	1,654	0	-	0	0	-
		20 - Licencias de Plataforma adaptativa de matemáticas y español para facilitar el aprendizaje entregadas en la zona de influencia	31 - DOCENTE	5,000	0	-	0	0	-
		21 - Evaluaciones de Rendimiento Académico con muestra municipal realizadas.	38 - EVALUACION	2	0	-	0	0	-
		22 - Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	75 - PORCENTAJE	37	0	-	0	0	-
		23 - Gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto desarrollada	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		35 - Licencias de plataforma adaptativa de matemáticas y español para facilitar el aprendizaje entregadas en la zona de influencia	31 - DOCENTE	20,000	0	-	0	0	-
		39 - Asistencia Técnica especializada para la SEDUC en materia de educación híbrida a través del uso de tecnologías digitales implementada	294 - GRUPO	3	0	-	0	0	-
		40 - Estrategia de comunicación del PNTED implementada	14 - CAMPAÑA	1	0	-	1	0	-
		41 - Auditoría externa del proyecto realizada	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	-	0	0	-
	002 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	17 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza a través del financiamiento BM 6401	559 - AYUDA ECONOMICA	15,183	0	-	0	0	-
		40 - Fortalecimiento de la educación formal alternativa mediante el financiamiento del BM 6401	1016 - EDUCANDO	350	0	-	0	0	-
		41 - Fortalecimiento de las Unidades de Sistema de Información y Comunicaciones del PRS mediante el financiamiento del BM 6401	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-
		42 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social en SEDESOL (ODS) mediante el financiamiento del BM 6401	149 - INFORME	2	0	-	1	0	-

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	003 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	43 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza a través del financiamiento BM 6918	559 - AYUDA ECONOMICA	75,429	0	-	0	0	-
		44 - Fortalecimiento Territorial con Contratación de Gestores Sociales mediante el financiamiento del BM 6918	155 - CONTRATO	50	0	-	0	0	-
		45 - Fortalecimiento de las Unidades de Sistema de Información y Eje de Salud del PRS BM 6918	149 - INFORME	2	0	-	1	0	-
		46 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social en SEDESOL y ODS BM 6918	149 - INFORME	1	0	-	1	0	-
	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	24 - Gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales a nivel descentralizado fortalecido	149 - INFORME	2	0	-	0	0	-
		25 - Construcciones de Obras de UCI en Hospitales Seleccionados realizadas	538 - OBRA	3	0	-	0	0	-
		26 - Mecanismo de comunicación en la red hospitalaria priorizada implementado	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		27 - Capacidades técnicas de la SESAL fortalecidas.	149 - INFORME	4	0	-	0	0	-
	004 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	28 - Gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto desarrollada	149 - INFORME	4	0	-	1	0	-
		47 - Gestores Sociales Contratados mediante financiamiento del BID 5008	155 - CONTRATO	60	0	-	0	0	-
		48 - Centros de Educación Básica Gubernamental dotados con equipo informático y mobiliario educativo mediante financiamiento BID 5008	101 - CENTRO EDUCATIVO	40	0	-	0	0	-
		49 - Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas mediante financiamiento BID 5008	149 - INFORME	3	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024
