

# **Informe de Avance Físico y Financiero**

## **PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025**

### ***Programa de la Red Solidaria (PRS)***

**Tegucigalpa, Honduras**

**Julio, 2025**

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)





## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social, de las acciones tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y acceso a mecanismos de protección social de hogares que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El Gobierno actual, en su Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma preuisional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al segundo trimestre del año 2025, la institución cuenta con un presupuesto vigente de inversión pública de L2,033.4 millones detallado para la Inversión Productiva L1,508.6 millones, la Inversión Social L522.7 millones, y la formación Bruta de Capital L2.2 millones, la ejecución presupuestaria al segundo trimestre asciende a un monto de L344.1 millones, lo que representa el (16.9%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2025  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,394,917,709
Inversión Productiva	1,758,080,135
Inversión Social	636,837,574
Formación Bruta de Capital	
Presupuesto Vigente	2,033,402,675
Inversión Productiva	1,508,574,964
Inversión Social	522,661,250
Formación Bruta de Capital	2,166,461
Ejecutado II Trimestre	344,058,589
Inversión Productiva	164,597,328
Inversión Social	179,188,000
Formación Bruta de Capital	273,261
% Ejecución (Devengado II Trim-2025/Vigente)	16.9%
Ejecutado Anual	623,201,047
Inversión Productiva	226,209,536
Inversión Social	396,718,250
Formación Bruta de Capital	273,261
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	30.6%


Nota: SIAFI, 30/06/2025



Dicha ejecución se lleva a cabo a través de (8) ocho proyectos enfocados en entregas de transferencias monetarias, salud, educación y ambiente, Infraestructura Escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como para la ejecución de programas sociales. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

### **b. Financiamiento de la Inversión Pública**

El presupuesto del Programa de la Red Solidaria está financiado por fondos externos de crédito y donación con el 74.2% provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial y un 25.8% con fondos nacionales.

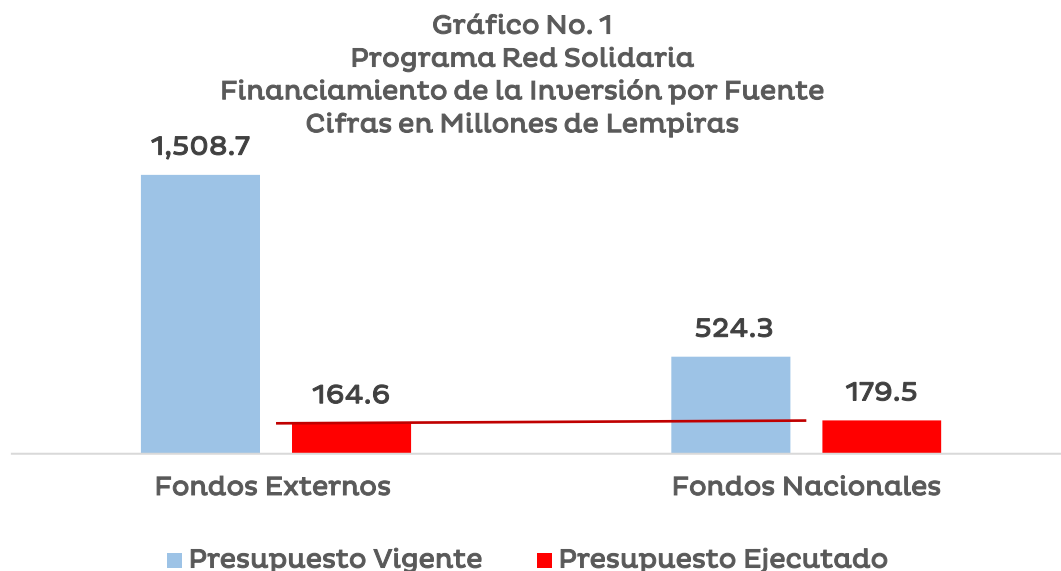


### **c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2022-2025)**

En los años 2022 al 2025 los proyectos de Inversión Pública del Programa de la Red Solidaria han considerado la ejecución de 8 proyectos de inversión, los cuales han sido financiados el 100% con recursos externos de crédito y donación.



Comportamiento Inversión Pública Total  
Al 30 de junio (2022-2025)  
0415 - Programa de la Red Solidaria  
Cifras en millones de Lempiras

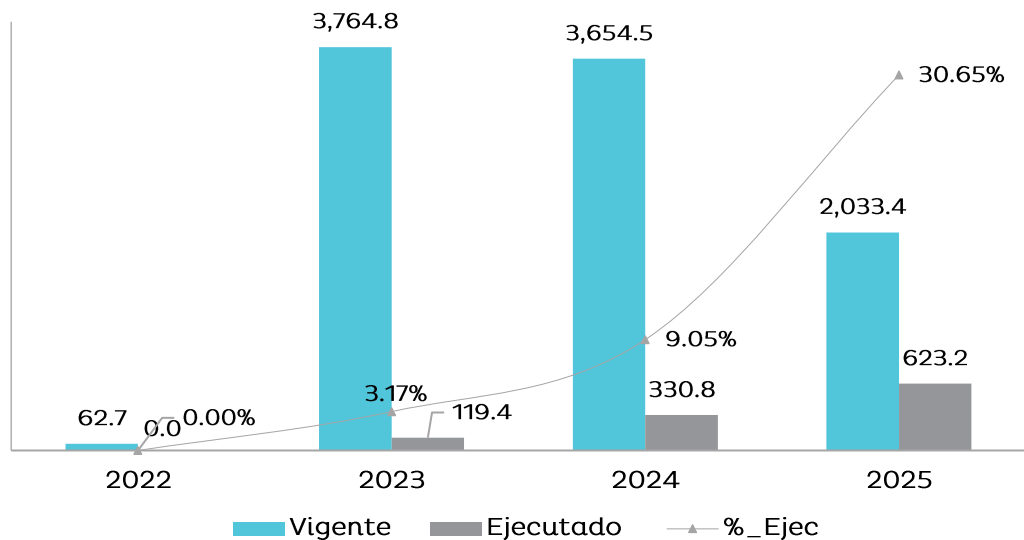

En el Gráfico No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, porcentualmente el pico más alto se registró en el año 2025.

- En el año 2022 se trasladó a la Red Solidaria solamente un proyecto, el resto se encontraba en proceso de emisión de contratos modificatorios por cambio de ejecutor.
- En el año 2023, el Programa de Inversión Pública de la Red Solidaria se conformó con la ejecución de 7 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 99% con recursos de crédito externo y un 1% una donación externa.
- En el año 2024 culmina con un Programa de Inversión Pública de 9 proyectos financiados con fondos externos en su presupuesto, asimismo, cuenta con seis ejes de inversión los cuales se financian con fondos nacionales provenientes del tesoro nacional. Año en que la institución en términos monetarios cuenta con mayores recursos asignados
- Para el año 2025, se cuenta con un Programa de Inversión pública de 8 proyectos financiados con fondos externos de crédito y donación, pero con menor asignación respecto al año 2024.



#### d. Principales Proyectos

La inversión en el segundo trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)
3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)
4. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)
5. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).
6. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO).
7. Programa Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras (BM-TFOC3767).
8. Programa de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con el presupuesto vigente:

#### 1. Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)

El Objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1,000	0	0%	0	0	0%
Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Participantes	650	0	0%	0	0	0%
Instituciones públicas beneficiadas con el financiamiento de crédito externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de políticas públicas de protección social	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS



De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Coordinadora del proyecto, se detallan los avances al segundo trimestre del año, ha realizado las siguientes actividades:

**Componente 1. Programa de la Red Solidaria;** se realizaron diferentes actividades para el mejoramiento del sistema de protección social como los fortalecimientos de SEDUC y SESAL, como parte el paquete de protección social, con asistencias técnicas y capacitaciones al personal institucional, así como la compra de equipos para mejorar la infraestructura informática.

**Subcomponente 1.2 Fortalecimiento Operativo e Institucional;** se siguen financiando los 93 Gestores Sociales para las actividades en territorio, Se fortaleció el PRS, con consultorías Informáticas, Digitadores, reconocimiento de gastos operativos, firmas para la Elaboración de los Planes de Fortalecimiento Institucional del Programa de la Red Solidaria, y se adquirieron los Kits de ESFAM, para mejorar la atención.

**Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo;** Se realizaron actividades de supervisión y monitoreo, para las intervenciones de los incentivos que se entregarán como parte de la estrategia de continuidad de los estudiantes del tercer ciclo.

**Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social;** se fortaleció a la Unidad Técnica Presidencial con la continuidad de las consultorías de apoyo al sistema de protección social, así como el fortalecimiento de SEDESOL con la contratación de consultorías para la regulación y articulación de la protección social.

**Administración, Auditoría y Evaluación;** Se financiaron las consultorías de la Unidad Fiduciaria de UCP para fondos externos.

Es de mencionar que los recursos de este proyecto están destinados a fortalecimiento institucional del Programa de la Red Solidaria, SEDESOL y La UTP.

Para comprometer los recursos la unidad ejecutora propuso una ampliación de plazo por 11 meses, ya que las contrataciones superan la fecha de cierre en octubre de 2025, la unidad ejecutora tiene listos los procesos para poder contratar las ONG's que darán apoyo en los territorios intervenidos por el PRS.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2025:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	US\$.	54,200,000	29/6/2020
		Lempiras	1,419,709,380	13/12/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	146,397,249	168,716,344	14,487,807	9%
Acumulado 2025	146,397,249	168,716,344	30,690,984	18%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,419,709,380</b>	<b>1,419,709,380</b>	1,049,229,386	74%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

## 2. Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)

Objetivo del Programa es mejorar los resultados del componente urbano del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6401.	hogares	37,000	0	0%	18,000	0	0%
Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA - 6401.	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora presenta avances al segundo trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

**Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas;** la entrega de TMC programada para el mes de junio, no se llevó a cabo, por lo que se reprogramaron para el mes de septiembre de 2025, para un total de **37,000 hogares** beneficiarios.



Es de mencionar que la unidad ejecutora ha venido postergando las entregas de TMC desde el mes de mayo de 2025, según indican por el levantamiento de la información en campo que se está realizando.

**Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC;** se siguió financiando las asistencias técnicas para el fortalecimiento de la unidad de sistemas de información de PRS, se adquirió equipo audiovisual para la unidad de comunicaciones, se continúa financiando a 30 gestores sociales para las actividades en territorio, y se realizó una adquisición de equipo para la habilitación de las unidades de atención al participante en territorio.

**Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social;** se financiaron las actividades de contratación de los técnicos para desarrollar el levantamiento del censo urbano en las ciudades de Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa con la contratación de técnicos enumeradores, supervisores de campo, coordinadores de ciudad. Se realizaron adquisiciones de equipo técnico especializado para el ODS, así como la compra de licencias informáticas y el financiamiento de asistencias técnicas de econometrías, y técnicos programadores.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	US\$.	30,000,000	17/07/2019
		Lempiras	785,817,000	30/04/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	73,004,667	87,564,667	18,780,620	21%
Acumulado 2025	73,004,667	87,564,667	22,872,420	26%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>785,817,000</b>	<b>785,817,000</b>	471,694,507	60%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

La baja ejecución financiera del proyecto está relacionada con las entregas de las TMC, dado que las mismas se reprogramaron para el mes septiembre/2025, por lo que en el segundo trimestre no se refleja ejecución financiera en el componente.

Los recursos ejecutados en el trimestre fueron destinados para financiar personal técnico que está realizando el levantamiento de datos en campo, compra de equipo audiovisual para la unidad de comunicaciones, financiamiento de gestores sociales en los territorios y personal de la UCP.



### 3. Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918–HN)

Objetivo: Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II Trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	% Ejecución
				Ejecución			
Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6918	hogares	150,000	0	0%	75,000	0	0%
Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0%	0	0	0%
Levantamiento del censo urbano para incorporación de participantes al programa de TMC IDA 6918	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora presenta avances al segundo trimestre del año, realizando las siguientes actividades:

#### Componente 1. Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.

**Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas;** la entrega de TMC programada para el mes de junio, no se llevó a cabo, por lo que se reprogramaron para el mes de septiembre de 2025, para un total de **150,000 hogares** beneficiarios.

**Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de Entrega de TMC;** se continua con al apoyo al fortalecimiento de la unidad de Infotecnología con las consultorías de analistas programadores, programadores senior. Se asignó gasto operativo para las intervenciones en campo de acompañamiento a los beneficiarios del PRS. En ejecución la contratación de 14 digitadores para la unidad de contraloría de PRS y 2 supervisores de digitadores para las actividades de liquidación de las intervenciones del PRS.

**Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social;** se ejecutó actividades del levantamiento del censo urbano en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, con el reconocimiento de los gastos operativos de movilización



y alimentación de los técnicos enumeradores, dotación de indumentaria. Se fortaleció el data center de ODS, con la compra de servidores de almacenamiento de datos y con la contratación de analistas programadores.

**Componente 3. Gestión del Proyecto;** fortalecimiento de la operatividad de UCP con la contratación de consultorías para la unidad de administración, adquisiciones, formulación y seguimiento.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6918-HN	70,000,000		28/8/2021
		1,833,573,000		30/04/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	343,547,416	381,209,416	24,767,120	6.5%
Acumulado 2025	343,547,416	381,209,416	28,987,243	7.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,833,573,000</b>	<b>1,833,573,000</b>	896,677,251	48.9%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

La baja ejecución financiera del proyecto está relacionada con las entregas de las TMC, dado que las mismas se reprogramaron para el mes septiembre/2025, por lo que en el segundo trimestre no se refleja ejecución financiera en el componente.

#### 4. Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO)

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.



Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educando	7,636	0	0%	0	0	0%
Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	30	3	10%	13	3	23%
Rehabilitación de CEB´s.	Centro Educativo	8	0	0%	0	0	0%
Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	Sistema	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora al segundo trimestre del año no presenta avances físicos en términos de entregables físicos, sin embargo, realizó algunas actividades en los componentes siguientes:

**Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país;** en el marco del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), durante el período se continuó con la implementación de la segunda etapa de tutorías, con la finalidad de implementar el Programa de Aceleración de Aprendizajes, beneficiando un total de 7,636 estudiantes, abarcando 86 escuelas en los Departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Comayagua y Olancho.

En cuanto a infraestructura, se continua con los trabajos de construcción de las Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, referente a los 30 Módulos de Aulas y Rehabilitación de 09 Centros Educativos. Al cierre del período se han recibido tres (3) Centros de Educación Básica (CEB´s) con sus respectivas actas de entrega, diez (10) CEB´s finalizados en cuanto a obra, sin acta de entrega y 17 CEB´s en proceso de avance, los cuales se esperan recibir en el siguiente período.

Durante el mes de julio se espera recibir mobiliario escolar complementario adicional, para suministrar a todos los 50 Centros Educativos.

**Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos;** adquisición de las 5,000 licencias de la plataforma ALEKS para dar continuidad y ampliar el pilotaje de mejora de aprendizajes de matemáticas. Se mantienen vigentes las 20,000 licencias de la Plataforma de Español (Lectoescritura), de la plataforma de Fiction Express, cuya vigencia finalizó el mes de junio.

Para el pilotaje de mejora de clima escolar, se está implementando un programa de formación de habilidades socioemocionales que ayuden en



la prevención de violencia, de embarazo adolescente y la migración irregular. La estrategia de implementación de este programa se basa en los enfoques de habilidades para la vida, en actividades lúdicas y recreativas; y salud mental. La intervención se está realizando en 60 centros educativos, con un aproximado de atención a 3,763 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica, en el Departamento de Francisco Morazán.

Se han realizado los operativos de recolección de información para una evaluación de impacto de las intervenciones de programa de aceleración de aprendizajes con apoyo de tutorías, programa de mejora de clima escolar y el programa de facilitación de aprendizaje por medio de plataformas adaptativas. Se espera recibir los resultados finales de esta consultoría en el mes de agosto 2025.

En el marco de la adenda al Convenio con UPNFM, se ha finalizado recibiendo un informe final que contiene un análisis comparativo de las evaluaciones de español y matemáticas para el año 2022, 2023 y 2024 en los Centros Educativos beneficiados en el Proyecto.

**Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC;** se finalizó el 100% del desarrollo de la consultoría internacional para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH). Actualmente se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaría de Educación (SEDUC) a través de cada uno de los usuarios del sistema y al finalizar este período se logró la producción de una planilla con la totalidad de los docentes de los 18 departamentos del país. Por lo que en el mes de agosto se espera la entrega oficial a la SEDUC.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Jouen	BID 4449/BL-HO	US\$.	45,000,000	02/02/2018 03/12/2025
		Lempiras	1,178,725,500	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	113,003,000	225,082,500	56,067,236	24.9%
Acumulado 2025	113,003,000	225,082,500	85,101,418	37.8%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,178,725,500</b>	<b>1,178,725,500</b>	940,282,007	79.8%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

La ejecución financiera del proyecto Jouen corresponde a pagos de algunas estimaciones de obras de los módulos escolares.

## 5. Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).

Objetivo: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	%	Programación	Ejecución	%
				Ejecución			Ejecución
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	5	0	0%	0	0	0%
Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Expediente	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora al segundo trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

**Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud:** se encuentran en proceso de construcción las 5 obras hospitalarias y durante el periodo de evaluación el proyecto no ha finalizado ninguna de estas, únicamente presenta avances físicos:

- Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente:** Avance/Ejecución Físico: El avance de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra es de 17.65%, el avance financiero se ha realizado el pago de 12 estimaciones (L85,897,792.06).

El avance en tiempo es de 81.7% (518/634), El Tiempo estimado de ejecución 18 meses, siendo la nueva fecha contractual 24 de octubre del 2025.

A continuación, se describen los avances de las actividades: Bloque Obstétrico Neonatal: Instalaciones Previas (90%), Demoliciones y Movimiento de Tierras; (90%), Zapata de Cimentación de Hormigón Armado (87.47%), Viga entre Zapatas (90%), Estructuras (48.64%), Foso de Ascensor (80%) y Losa de Cimentación (80%), Instalaciones Mecánicas (0.11 %) e Instalaciones Sanitarias (4.88%). Instalaciones Provisionales de la Central de Equipo y Esterilización (CEyE) (12.5%).



2. **Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital San Francisco:** El avance de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra es de 80%, durante este periodo se ha realizado el proceso de pago de 5 estimaciones (L10,412,024 monto acumulado), y el avance de obra en tiempo en 95.20% (348/419).

la fecha de terminación del contrato del 10 de mayo del 2025 al 30 de junio del 2025. Adicionalmente se ha sometido una ampliación de tiempo por 20 días ante el BID.

El avance de obra se describe a continuación: Actividades Previas (100%), Demoliciones y Movimiento de Tierras (100%); actividades de Valla Informativa de Obra (100%), Cimentaciones (100%), Estructuras (87.99%), Cubiertas (3%) e Instalaciones Eléctricas (3%). Avance de Obra adicional; OC #1; 100% (384,199.94), OC#2; 97% (-47,383.28) y OC#3 30% (L998, 931.00).

3. **Sala de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Santa Teresa de Comayagua:** Avance/Ejecución Físico: El avance de la obra es de 87%, el avance financiero de cuánto es? se ha realizado el pago de 6 estimaciones (L11,950,2565.36). y el avance de obra en tiempo es de 95.20 % (348/419).

la fecha de terminación del contrato del 10 de mayo del 2025 al 30 de junio del 2025. Adicionalmente se ha sometido una ampliación de tiempo por 20 días ante el BID, periodo que se encuentra en aprobación por parte del organismo financiador.

A continuación, se describe el avance de las actividades: Demolición (94%), Movimiento de tierra (100%), Cimentación (81%), Estructura (96%), Cerramientos y Divisiones (38%), Instalaciones Mecánicas (30%), Revestimientos y Cielos Falsos (19%), Cubiertas (78%), Pisos (75%) e Instalaciones de Mecánicas (26%), Eléctricas (27%) y Gases Medicinales (7%).

Avance Obra adicional de OC1: 100% (-L 2,453,807.45, aprobado por TASH L2-023-2025 y Oficio No.497-UTGP-2025); OC2: 96% (L 1,858,840.83, aprobado por TASH L2- 062-2025 y Oficio No. 1138-UTGP-2025); OC3: pendiente aprobación por un monto de L2,788, 593.42.

4. **Sala de Neonatología y Hogar Materno Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova:** Avance/Ejecución Físico de construcción de la obra es de 90%, el avance financiero se ha realizado el pago de 8 estimaciones (L 20,794,595.80 monto bruto acumulado) y el avance de obra en tiempo es de 95.04 % (383/403).



la fecha de terminación del contrato es el 30 de junio del 2025. Adicionalmente se ha sometido una ampliación de tiempo por 20 días ante el BID pendiente de aprobación por parte del organismo financiador.

A continuación, se describe el avance de las actividades: Demoliciones (95.0%), Movimiento de Tierra (58.0%), Cimentaciones (81.00%), Estructura (73%), Cerramientos y Divisiones (40%), Revestimientos y Cielos Falso (3%), Cubiertas (65%), Aislamiento e Impermeabilización (100%) e Instalaciones Mecánicas (18.0%).

Avance Obra adicional; OC1: 52% (L 625,720.08, aprobado por TASH L4-008-2025 y Oficio No. 282-UTGP-2025); OC2: 85% (L273,189.39, aprobado por TASH L4-093-2025 y Oficio No. 1040-UTGP-2025); OC3: pendiente aprobación por un monto de L1,249,703.91.

- 5. Remodelación de la actual unidad de Neonatología en el 5to piso y Construcción de la unidad de cuidados intensivos del 6to piso en el Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela:** Avance/Ejecución Físico: El avance de acuerdo con el cronograma de construcción de la obra es de 39%, el avance financiero se ha realizado el pago de 9 estimaciones (L18,673,677.68) y el avance de obra en tiempo es de 86.10% (379/440).

La fecha de terminación del contrato es el 30 de agosto del 2025.

A continuación, se describe el avance de las actividades: Fase 1, ejecutado el 25%: Valla Informativa y publicitaria de Obra (100%), Vallado Provisional de Obra (100%), Campamento de Obra (100%), Demolición Muro Interior (100%), Levantado de Carpintería Exterior (100%), Levantado de Cerrajería (100%), Demoliciones (100%), Despeje y Retirada de Mobiliario (100%), Carga/Transporte Botadero (80%), Demolición Pedestal De Concreto Existente del sexto nivel (100%), Actuaciones Previas (88.95%), Demoliciones (90%), Cerramientos y Divisiones (25 %), Repellos (15%), Instalaciones (1.61 %); Fase 2: Estructuras, ejecutado el 44%: Acero en Pilares (95%), Acero en Vigas Mixtas (90%), Pedestal de Concreto Armado (90%).

Se concilió y aprobó la Orden de Cambio (OC+) #3 por Empresa de Supervisión y UTGP-SESAL, con un aumento en monto de L 4,962,172.24 representan el 4.15% con respecto a monto contractual.

Problemática presentada en el Hospital Escuela: Persisten obstáculos con relación al diseño inicial desactualizado y los constantes rediseños, que han generado ajustes imprevistos, causando retrasos y sobrecostos en la obra.



En relación con la consultoría para el Diseño y Supervisión de Obras en los hospitales beneficiarios, el contrato vigente con Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros SLP (TASH) se encuentra en etapa de supervisión activa, con la No Objeción del BID de la Enmienda #6 correspondiente al 27 de junio del 2025.

### Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información

En ejecución las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL y la UE y apoyo con contratación de personal técnico biomédico. En proceso de validación los términos de referencia para la gestión del expediente electrónico y el sistema de información integrado de referencia del Hospital de Occidente; cabe resaltar, que esta actividad fue redefinido su alcance en base a las prioridades de las autoridades de SESAL.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	69,000,000	1,807,379,100	19/3/2019 10/10/2026
		<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b> <b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	402,885,915	402,885,915	42,990,240	11%
Acumulado 2025	402,885,915	402,885,915	51,053,166	13%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,775,880,600</b>	<b>1,775,880,600</b>	1,092,894,656	62%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

La ejecución financiera del proyecto no es satisfactoria, ya que únicamente logró ejecutar un 13% del presupuesto vigente, debido a que la empresa no ha presentado estimaciones para el pago de las obras realizadas.

### 6. Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)

Objetivo: contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA.

Los principales avances físicos al II Trimestre de 2025 son los siguientes:



Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
TMC entregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas focalizadas por el PRS	Hogar	10,500	0	0%	0	0	0%
Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	1	0	0%	0	0	0%
Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289	Hogar	1,000	0	0%	0	0	0%
Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.	Equipo	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: UE-PRS

La unidad ejecutora al segundo trimestre del año presenta avances en las siguientes actividades:

**Componente 1. Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias.** No se realizaron entregas de TMC a los participantes del PRS, mismas que estaban programadas para el mes de junio, las cuales se han reprogramado para el mes de septiembre /2025, se continuó el proceso de contratación de ONG´ s para la entrega de capital semilla, pendientes procesos de licitación para compra de vehículo y equipo de cómputo.

**Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias Condicionadas,** la entrega de TMC programada para el mes de junio no se llevó a cabo. La entrega de TMC ha sido reprogramada para el mes de septiembre de 2025, la meta es 10,500 hogares beneficiarios.

**Subcomponente 1.2 Estrategias Complementarias,** se continuo con el proceso de contratación de la Estrategia Integral para las Aldeas priorizadas/ Implementación de los Equipos Multidisciplinarios, Primera Fase, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de hogares en extrema pobreza ubicados en los territorios focalizados de las aldeas priorizadas por el PRS.

**Subcomponente 1.3. Plataforma de Pago,** se adquirido un vehículo pick-up y se realizaron los pagos de la unidad fiduciaria de UCP.

**Costos de administración, evaluación, análisis y auditoría;** pendiente el pago de la auditoria de los recursos ejecutados.



Se adquirió un vehículo pick-up y se realizaron los pagos de la unidad fiduciaria de UCP.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$.		
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	BID 5289/BL-HO	US\$.	45,000,000	20/8/2021
		Lempiras	1,178,725,500	31/12/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	90,193,862	84,179,370	7,504,304	9%
Acumulado 2025	90,193,862	84,179,370	7,504,304	9%
Acumulado Vida del Proyecto *	<b>1,178,725,500</b>	<b>1,178,725,500</b>	1,067,596,013	91%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

Este proyecto, continúa con el proceso de contratación de ONG´s para ejecutar las actividades de los productos de "Cuídate" y Capital Semilla, no se han podido ejecutar debido a que el proceso de contratación ha llevado más tiempo de lo planificado por la complejidad de este.

## 7. Programa Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida (BM TFOC3767)

Objetivo: mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

Este convenio de donación al segundo trimestre no presenta ejecución financiera.

Comprende tres componentes, los cuales se detallan a continuación:

**Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida,** se están realizando los procesos de contratación para desarrollar las capacitaciones para el personal de Plan Crecer el cual inicia las actividades del proyecto.

Se lanzó el proceso de contratación de la consultoría para adaptación de materiales educativos.

**Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de DIT;** se iniciaron los procesos de contratación del coordinador del Programa de Desarrollo Infantil y la contratación de 8

asistencias técnicas municipales para ir conformando el equipo en territorio del programa.

**Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Diseminación de Conocimientos;** se están iniciando los procesos de contratación de las consultorías de monitoreo y financieras que apoyaran esta operación y la firma auditora.

#### **8. Programa Bono Alivio a Hogares Vulnerables Afectados por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático (BCIE-2282)**

**Objetivo:** Constituirse como un mecanismo de apoyo a los participantes/beneficiarios en sectores vulnerables como una ayuda a la reactivación económica de las familias, con el fin de mejorar su ingreso, calidad de vida y así como incentivar la actividad económica local de los territorios a los cuales está dirigido.

**Componente 1. Atención a grupos vulnerables;** Debido a que el proyecto fue reactivado el 22 de julio de 2024, mediante contrato modificatorio #2.

Se actualizó el manual operativo de la operación con la actualización en las acciones requeridas para la definición de los participantes.

**Componente 2. Gastos de Transacción y Administración;** se trabajó en los procesos de adquisición, la contratación de la firma auditora, en proceso de evaluación.

Es importante mencionar que este proyecto fue reactivado cuando el organismo financiador aprobó el cambio de ejecutor de SEDIS al Programa de la Red Solidaria en el mes de julio 2024, asimismo en el mes de octubre 2024 se aprobó la ampliación de plazo hasta diciembre de 2025.

La ejecución física financiera acumulada que presenta en el Proyecto se realizó en el año 2021, ejecución que se centra en la entrega de bonos de alivio a 45,998 familias beneficiadas, monto ejecutado L339,813,550.

El proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L128,788,621.00, de los cuales se beneficiarán 71,428 hogares vulnerables los cuales recibirán un bono de alivio. La entrega de estos bonos está programada a realizarse en el mes de septiembre de 2025.



#### **d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025**

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos del Programa de la Red Solidaria firmados durante el trimestre.

1. Adquisición de un vehículo Pick Up.
2. Adquisición de equipo informático para la UCP-PRS, UTP y ODS.
3. Las recontrataciones del personal fiduciario y de apoyo a la UTGP.

#### **d.2. Programas Sociales**

La inversión de los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria se conforma en seis ejes de inversión para atender diferentes grupos beneficiarios; Eje de Protección Social, Eje de Salud, Eje de Educación, Eje de Fortalecimiento Humano, Eje de Infraestructura y Ambiente, y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta I Trimestre 2025		% de Ejec.	Meta II Trimestre 2025		% de Ejec.
			Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
Cajas de ahorro y crédito rural que reciben capital productivo con asistencia técnica y seguimiento	caja rural	300,000	250	250	100%	250	3	1%
Participantes recibiendo Transferencias Monetarias Condicionadas entregada a beneficiarios inscritos como facilitadores (as) comunitarios (as) en los consejos comunales (mesas solidarias)	mesas solidarias	22,400	22,400	22,400	100%	5,400	0	0%
Entrega de Kits escolares a educandos matriculados en centros educativos gubernamentales	kit	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0%
Entrega de calzado escolar a educandos matriculados en centros educativos gubernamentales	par de calzado	2,487	2,487	2,487	100%	0	0	0%
Hogares Beneficiarios de TMC de incorporación fondos nacionales	Hogar	36,810	36,810	0	0%	36,810	36,810	100%
Migrantes retornados beneficiados con tarjeta de bono de alimentos de BANASUPRO	Migrantes	50,000	0	0	0%	20,000	13,866	69%

Fuente: Informe Instit. PRS

La ejecución financiera de los programas sociales del Programa de la Red Solidaria, por un monto de L207.1 millones, se detallan algunas metas logradas en el presente trimestre, ejecución que se encuentra

contemplada en los Ejes de Educación, Protección social y Eje de Generación de Oportunidades de Ingreso.

### **Gestión de la Inversión**

- Revisión, verificación y aprobación de modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Solicitudes de cuotas de compromiso mensual a los proyectos ejecutados con fondos externos.
- Realización de gira de campo para supervisión de proyecto en la Zona de Occidente Departamentos de Ocotepeque y Copán.

### **e. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025**

La baja ejecución presentada por los proyectos ejecutados por el Programa de la Red Solidaria (Protección Social), se debe a problemas de focalización, no se cuenta con una base de datos actualizada de los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas.

La construcción de las 5 obras de infraestructura hospitalaria, han presentado demoras en la ejecución de las obras, por diferentes razones: desde condiciones climáticas por lluvias y tormentas, mano de obra escasa en la zona, inconsistencias en el diseño de las obras, entrega tardía de los predios para la construcción, lo que ha significado ordenes de cambio en gestión de aprobación y/o enmiendas a los contratos correspondientes que implica ampliación de plazo para la terminación de estas.

### **f. Conclusiones**

- El Programa de Inversión Pública del Programa la Red Solidaria al segundo trimestre presenta baja ejecución física y financiera de L164.6 millones lo que representa un 11% respecto al presupuesto vigente, ejecución no es satisfactoria. Por lo que debe acelerar la ejecución de la Inversión Productiva representada por los proyectos y programas financiados con créditos de los organismos multilaterales.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas, la finalización de las obras hospitalarias y centros escolares; y otros



beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

- El Programa de la Red Solidaria en el segundo trimestre del año, no ha realizado entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas, las cuales están siendo reprogramadas para el mes de septiembre.

## **g. Recomendaciones**

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollar el proceso de focalización consistente que reúna criterios de vulnerabilidad, ubicación territorial y las características de la población para dirigir los recursos de una manera equitativa.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales a fin de realizar las entregas de los beneficios a la población oportunamente.
- Seguimiento oportuno al proceso de liquidación de las transferencias monetarias condicionadas con el ente pagador BANADESA, como parte de la transparencia y rendición de cuentas en las entregas.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente				Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vlg)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vlg)
	<b>Formación Bruta de Capital</b>					1,278,261	888,200		2,166,461	273,261	-	273,261		273,261	-	273,261	19
	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR				-	-			-	-		-		-		-	-
	<b>Total DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR</b>				-	-			-	-		-		-		-	-
	FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA				-	200,000			200,000	200,000		200,000	-	200,000		200,000	100
	<b>Total FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA</b>				-	200,000			200,000	200,000		200,000	-	200,000		200,000	100
	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO				-	-			-	-		-		-		-	-
	<b>Total FORTALECIMIENTO EDUCATIVO</b>				-	-			-	-		-		-		-	-
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				-	705,000			705,000	-		-		-		-	-
	<b>Total GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>				-	705,000			705,000	-		-		-		-	-
	GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES				-	273,261			273,261	-		-		-		-	-
	<b>Total GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES</b>				-	273,261			273,261	-		-		-		-	-
	Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B	BCIE-2248 TRAMO B			-	-	888,200		888,200	-	-	-		-		-	-
	<b>Total Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B</b>				-	-	888,200		888,200	-	-	-		-		-	-
	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL					100,000			100,000	73,261		73,261	73	73,261		73,261	73
	<b>Total SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>					100,000			100,000	73,261		73,261	73	73,261		73,261	73

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

Anexo No. 2  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025  
Cifras en Lempiras

Institución	Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
				Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
0415.- PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA	Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1,000	0	0%	0	0	0%
		Educandos de Centros de Educación Básica del III Ciclo que reciben mochilas equipadas con libros de texto en las aldeas focalizadas por el PRS	Participantes	650	0	0%	0	0	0%
		Instituciones públicas beneficiadas con el financiamiento de crédito externo BID 5008/BL-HO para el despliegue de políticas públicas de protección social	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN)	Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6401.	hogares	37,000	0	0%	18,000	0	0%
		Levantamiento del censo urbano, para incorporación de participantes al programa de TMC IDA - 6401.	Informe	1	0	0%	0	0	0%
		Estrategia activa para la empleabilidad y habilidades socioemocionales para jóvenes en municipios con focalización vigente del BM	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Financiamiento Adicional del Proyecto de Integración de la Protección Social (BM 6918-HN)	Hogares que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas en zonas focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema IDA-6918	hogares	150,000	0	0%	75,000	0	0%
		Kits promocionales entregados como incentivo a los participantes de PRS a pueblos originarios, sin distinción de género y diversidad (líderes y participantes comunitarios)	Kits	100	0	0%	0	0	0%
		Levantamiento del censo urbano para incorporación de participantes al programa de TMC IDA 6918	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Jouen (BID 4449/BL-HO)	Programa de Aceleración de Aprendizaje en áreas urbanas, segunda etapa de tutorías	Educando	7,636	0	0%	0	0	0%
		Módulos Escolares construidos y equipados	Centro Educativo	30	3	10%	13	3	23%
		Rehabilitación de CEB's.	Centro Educativo	8	0	0%	0	0	0%
		Herramienta Tecnológica (SIATH) para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	Sistema	1	1	100%	1	1	100%
	Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (BID 4619/BL-HO).	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas	Obras	5	0	0%	0	0	0%
		Implementación del expediente electrónico (Hospital de Occidente)	Expediente	1	0	0%	0	0	0%
	Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (BID 5289/BL-HO)	TMC entregadas a hogares en pobreza y extrema pobreza en aldeas focalizadas por el PRS	Hogar	10,500	0	0%	0	0	0%
		Planilla generada de participantes del PRS que reciben TMC BID-5289	Planilla	1	0	0%	0	0	0%
Hogares del PRS que reciben capital semilla BID-5289		Hogar	1,000	0	0%	0	0	0%	
Entrega de equipo tecnológico al ente pagador en el proceso de entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC en territorio BID 5289.		Equipo	1	0	0%	0	0	0%	

Fuente: UCP-UPE-PRS
