



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# **Informe de Avance Físico y Financiero al II Trimestre 2025**

## **PLAN DE INVERSION PÚBLICA**

***Secretaría de Agricultura y  
Ganadería  
(SAG)***

**Tegucigalpa, Honduras**

**Julio, 2025**



## IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios; así como diversificar la oferta de los productos de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agrícola, mediante el fortalecimiento de

la producción agropecuaria y agroindustrial; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y Social. Para lo cual en el 2025 mediante la Inversión Productiva se desarrollan 8 proyectos de inversión, para lo cual se cuenta con un presupuesto aprobado para inversión productiva de L2,297.1 millones con lo cual se tiene programado ejecutar 50 Planes de fortalecimiento organizacional, aprobación de 107 Becas a jóvenes rurales a realizar a través del **proyecto PROINORTE**; 135 Planes de Negocios con enfoque de cadena de valor implementados, 50 Planes de inversión con adopción de tecnologías Climáticamente inteligentes (CI), 400 Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, 5 Planes de manejo de microcuencas implementados bajo el proyecto **PROOCCIDENTE**; 134 Planes de Negocios financiados/Ventana 1 Agricultura en Subsistencia a través del proyecto **COMRURAL II**, 30 Planes de Negocios identificados/Ventana 1 Agricultura en Subsistencia por medio del proyecto **COMRURAL III**. Por otra parte, en los proyectos de seguridad hídrica, se tiene programado la entrega de 4 diseños finales de sistemas integrales de agua segura (SIAS), 4 estudios de evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales, y para el proyecto de Agua Urbana se tiene programada la ejecución física de un 35% en la rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable.

Al segundo trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L 4,446.25 millones; de los cuales L1,735.10 millones corresponden a Inversión productiva; L2,450.00 millones para la Inversión Social para el desarrollo de programas de gran importancia para el país

II Trimestre 2025


Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>4,822,737,910</b>
Inversión Productiva	2,297,071,078
Inversión Social	2,488,088,493
Formación Bruta de Capital	37,578,339
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>4,446,253,016</b>
Inversión Productiva	1,735,102,926
Inversión Social	2,450,000,000
Formación Bruta de Capital	261,150,090
<b>Ejecutado II Trimestre</b>	<b>1,638,475,875</b>
Inversión Productiva	188,475,875
Inversión Social	1,450,000,000
Formación Bruta de Capital	-
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2025/Vigente)</b>	<b>36.9%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>1,711,750,251</b>
Inversión Productiva	261,750,251
Inversión Social	1,450,000,000
Formación Bruta de Capital	-
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>38.5%</b>

Nota: SIAFI, 30/06/2025

como ser el Bono Ganadero, Bono Cafetalero y Bono Tecnológico y L261.15 millones para la formación bruta de capital. La ejecución presupuestaria del trimestre asciende a L1,711.75 millones que representan el 38.5% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

## b. Financiamiento de la Inversión Pública

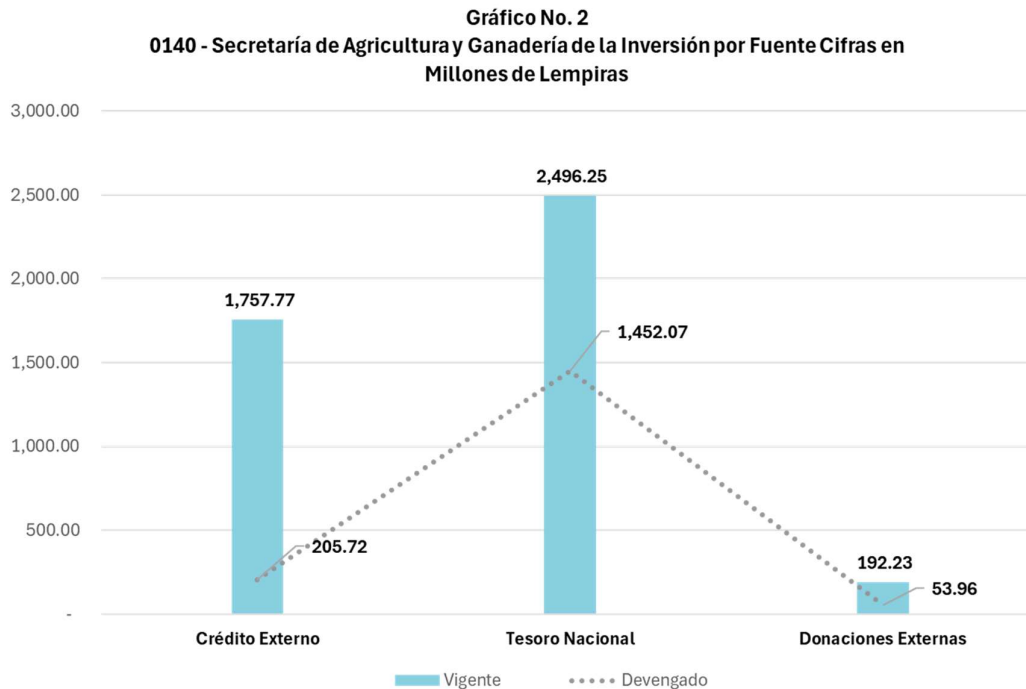


El Presupuesto Vigente de la SAG es financiado en un **56% (L2,496.25 millones)** por Fondos Nacionales (Fuente de Tesoro Nacional, Recursos Propios y Donaciones Internas); **40% (L1,757.77 millones) de Crédito Externo**, proveniente de préstamos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y por organismos varios como ser Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), OPEC, FIDA y ESPAÑA.

El **4% (L192.23 millones)** restante, corresponde a Donaciones Externas, las cuales son financiadas mayormente por el BM.



### c. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2023-2025):

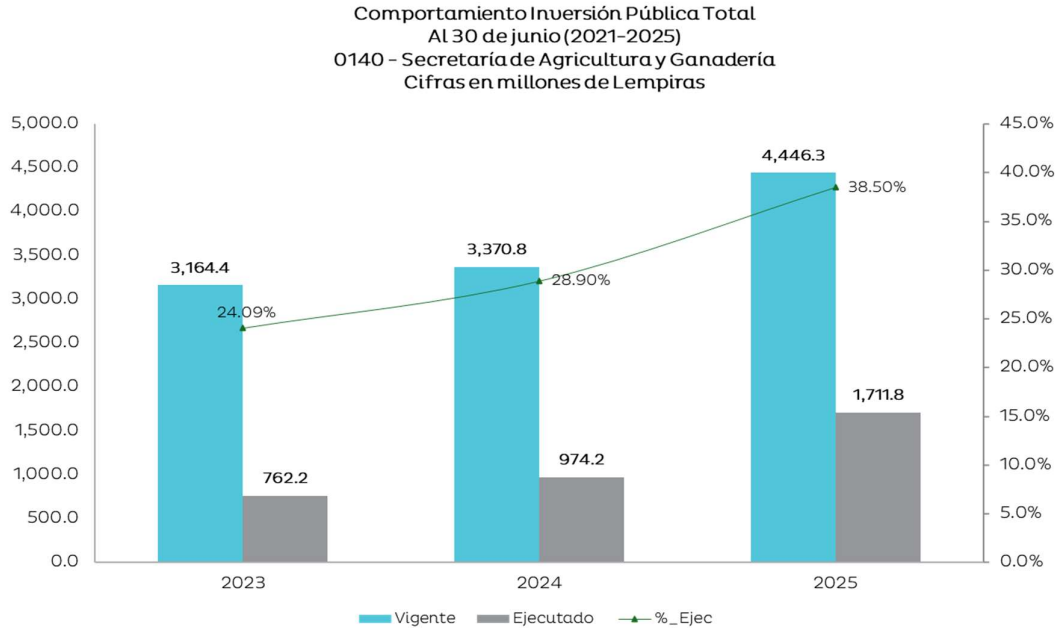

En el periodo 2023-2025, mediante el Programa de Inversiones Pública en el cual se experimentó cambio de organismo ejecutor de INVEST-H a la SAG producto del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, se han realizado acciones para mejorar la operatividad del Sector Agroalimentario para incrementar las inversiones productivas que han sido financiadas por fondos nacionales y fondos externos, se han venido ejecutando diferentes proyectos tales como: 1) Alianza para el corredor seco, 2) Proyecto de Competitividad Rural II, 3) Proyecto De Competitividad Y Desarrollo Sostenible Del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA, 5) Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), 6) Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras PROINORTE, 7) Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, y 8) Proyecto de Competitividad Rural III.

Actualmente y de acuerdo con el análisis comparativo detallado al segundo trimestre de los periodos del 2023-2025, se ha visto que la SAG ha incremento su capacidad de ejecución en relación con los años 2024 y 2025. A pesar de que incrementado su ejecución en el segundo trimestre la SAG aún debe mejorar sus niveles de ejecución, así como mejor la planeación y reprogramación de actividades en momentos claves.

#### d. Principales Proyectos

Al segundo trimestre del 2025 la inversión productiva alcanzó una ejecución del 15.1% respecto al presupuesto vigente, en la cual los proyectos que reportan mayor ejecución presupuestaria respecto a su presupuesto vigente son: Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP) con un 83.9%, Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) 23.1%, Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL III) 21.1% y el Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) con un 10.7% de ejecución. En cuanto el restante número de proyectos poseen ejecuciones presupuestarias que oscilan del 2.8% al 8.4%.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de proyectos:

##### 1. Proyecto Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP)

El proyecto tiene como objetivo contribuir a incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios.

Los principales avances físicos al segundo trimestre de 2025 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025**

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Informe final de auditoria financiera del proyecto PROSASUR aprobados por la SAG y Banco Mundial.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Informe de cierre del Fondo Original Remanente del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	2	2	100%	2	2	100%
Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	5	5	100%	4	3	75%
Asistencia Técnica Brindada a Productoras y Productores de Subsistencia en Buenas Prácticas Agrícolas (Técnicas de Cultivo, Fertilizantes y Medio Ambiente)	Asistencia Técnica	500	500	100%	500	943	189%
Kit de Bienes Productivos (bombas de mochila, semillas y fertilizantes) entregados a los hogares beneficiados.	Kits	600	600	100%	600	600	100%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al segundo trimestre 2025.

En cuanto a la ejecución física, durante el segundo trimestre el proyecto finalizó 24 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), los cuales beneficiaron a 600 hogares. Adicionalmente se realizaron 943 días



clientes de capacitación, duplicando la meta base de 500 días clientes para el 2025, por otra parte, se finalizaron 5,075 obras correspondientes a los Planes de Higiene en el Hogar.

Es importante indicar que el proyecto finalizó la ejecución del Fondo de Donación adicional TFOB6211-HN el 15 de junio 2025, quedando por realizar las acciones correspondientes al cierre financiero y auditorías. En cuanto al convenio de donación Fondo Original TFO17904 finalizó el 31 de diciembre de 2024.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP) al segundo trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Alianza Para el Corredor Seco	Fondo Original USAID Carta de Implementación No.7, No.8 y No. 22, Donación TFO17904 y TFOB6211 de GAFSP (PROSASUR)"	US\$	141,426,942	29/01/2014 15/10/2025
		Lempiras	3,701,097,106	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Deuengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	L13,156,550.00	L63,156,550.00	L43,434,779.54	68.8
Acumulado 2025	L13,156,550.00	L63,156,550.00	L52,993,372.07	83.9
Acumulado Vida del Proyecto */	L3,701,097,106.29	L3,701,097,106.29	L2,270,266,167.79	61.3

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## 2. Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

Los principales avances físicos al segundo trimestre de 2025 son los siguientes:



### Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Beneficiarios que participan en planes de negocio financiados por el proyecto	Productores	3408	0	0%	0	0	0%
Planes de Negocios financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Plan de Negocios	134	0	0%	34	0	0%
03 - Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs).	Cantidad	134	0	0%	34	0	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al segundo trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

Para la ejecución del proyecto y en atención a la circular DGIP-01-2025 de fecha 17 de febrero 2025, la Unidad Ejecutora (UE) del proyecto manifestó que su ejecución presupuestaria 2025 será de L472,892,540.69 por lo que en el transcurso del año será necesario considerar los momentos oportunos para realizar las modificaciones presupuestarias para las incorporaciones que se requieran siempre que la ejecución se vea reflejada de manera positiva.

En cuanto a la ejecución física, la Unidad Ejecutora (UE) del proyecto ha indicado que para el año 2025 se atenderán 3,408 Beneficiarios que participan en planes de negocio financiados por el proyecto, 134 Planes de Negocios (PNs) financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia.

Al respecto, en el segundo trimestre y de acuerdo con lo indicado en el informe de ejecución física y financiera presentado por la SAG, manifiesta que el proyecto COMRURAL II-IDA6448, no cuenta con ejecución física; sin embargo, se encuentran en proceso 2 procesos de adquisiciones importantes como ser la Enmienda de SWISSCONTACT, la cual beneficiará alrededor de 900 productores a través de 36 PNs adicionales y la Encuesta de Nivel de Satisfacción de los beneficiarios por los servicios de asistencia técnica- financiera; procesos de comunicación y consulta sobre los planes de negocio diseñados e implementados y Mecanismo de Quejas y Reclamos, en el marco del proyecto, focalizado en la Ventana 2.

Por otra parte, en cuanto a la ejecución presupuestaria 2025 han indicado que mayormente su ejecución corresponde al gasto operativo del proyecto que incluye líneas de capacitación en las diferentes regionales



del proyecto y seguimiento a las actividades para la implementación del proyecto.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) al segundo trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	04/05/2020 30/06/2026
		Lempiras	1,962,725,625	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	L407,134,799	L222,945,576	L28,480,274	13
Acumulado 2025	L407,134,799	L222,945,576	L57,181,064	26
Acumulado Vida del Proyecto */	L1,962,725,625	L1,962,725,625	L636,399,201	32

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### 3. Proyecto Competitividad Rural (COMRURAL III)

Tiene como objetivo Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible.

Los principales avances físicos al segundo trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	6347	504	8%	504	504	100%
Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	30	0	0%	0	0	0%
Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	15	0	0%	5	5	100%
Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	5	0	0%	0	0	0%
Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	5	0	0%	0	0	0%
Subproyectos agro-costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	30	0	0%	0	0	0%



Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	30	0	0%	0	0	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al segundo trimestre 2025, informe al primer trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

En seguimiento a la circular DGIP-01-2025 la SAG presentó la programación física y financiera a ejecutar en el año 2025; en donde inicialmente el equipo técnico del proyecto indicó que para la gestión 2025 se realizarían 30 Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia, 15 PNs para Ventana 2. Agricultura en Transición, 5 PNs en Ventana 3. Agricultura Comercial, 5 PNs en Ventana 4. Servicios Agro-logísticos, 30 Subproyectos agro-costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica y 30 Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica.

Por lo antes expuesto, al segundo trimestre la UE ha indicado en su informe trimestral que se iniciaron los procesos para las contrataciones de las Firmas Consultoras Implementadoras (FCI) de Ventana 1. Agricultura en Subsistencia y Ventana 4. Servicios Agro-logísticos; así como el proceso de la FCI de Moskitia y la contratación del Programa Mundial de Alimentos (PMA); procesos prioritarios y vitales para el avance y cumplimiento de ejecución física y financiera para el proyecto COMRURAL III.

Ante lo indicado y debido a que aún no se ha contratado las FCI de ventana 1, ventana 4 y la FCI de la Moskitia, la UE ha reprogramado las metas correspondientes para el año 2026 debido a los tiempos que lleva la contratación de las FCI. A pesar de que para el año 2025 ya no se estarán realizando las actividades antes detalladas se indica que en cuanto a la ventana 2 y ventana 3 actualmente se han realizado 3 Comités Directivos (CDs) de los cuales se ha ratificado y aprobado un total de 25 PNs (22 PNs Ventana 2. Agricultura en Transición y 3 PNs Ventana 3. Agricultura Comercial). De estos 25 PNs se han desembolsado 5 PNs los cuales se encuentran en implementación.

En cuanto a la ejecución presupuestaria al segundo trimestre de 2025, la UE ha indicado que mayormente su ejecución corresponde al gasto operativo del proyecto que incluye líneas de capacitación en las diferentes regionales del proyecto y seguimiento a las actividades para la implementación del proyecto.



A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Competitividad Rural (COMRURAL III):

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN	108,500,000		30/12/2022 30/12/2027
			2,839,409,738	
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Deuengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	L185,747,927	L185,747,927	L55,611,802	29.9
Acumulado 2025	L185,747,927	L185,747,927	L57,584,347	31.0
Acumulado Vida del Proyecto */	L2,839,409,738	L2,839,409,738	L59,612,041	2.1

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

#### 4. Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)

El proyecto consiste en Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Avances físicos al segundo trimestre 2025 son los siguientes:

##### Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Número de productores (as) rurales organizados mejoran su productividad y competitividad, incrementando sus ingresos y asegurando su seguridad alimentaria.	PRODUCTOR	6,366	1434	23%	2228	1434	64%
Numero de planes de negocio implementados	PLAN DE NEGOCIO	50	5	10%	25	5	20%
Numero de planes de negocio aprobados	PLAN DE NEGOCIO	50	7	14%	25	7	28%



Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Numero de asistencia técnica brindadas	ASISTENCIA TÉCNICA	50	24	48%	25	24	96%
Evento Intercambio de experiencias (procesos de aprendizaje) desarrollados con organizaciones de productores rurales de las comunidades del Valle de Aguan.	EVENTO	3	0	0%	0	0	0%
Planes de fortalecimiento organizacional implementados por Organizaciones usuarias	PLAN	50	34	68%	17	16	94%
Número de organizaciones usuarias con financiamiento otorgado	ORGANIZACION	50	5	10%	25	5	20%
Numero de campañas de concientización y buenas prácticas diseñadas	CAMPAÑA	9	6	67%	3	6	200%
Servicios financieros innovadores otorgados a Jóvenes y cajas rurales en las comunidades del Valle de Aguan	SERVICIO	5	-	-	-	-	-
Número de becas aprobadas	BECA	96	0	0%	20	0	0%
Número de cajas rurales con financiamiento otorgado	CAJA RURAL	60	0	0%	20	0	0%
Capacitaciones en educación financiera brindadas a productores(as) que integran las cajas rurales	TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0%	-	-	0%
Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos implementados	PLAN	5	0	0%	0		0%
Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos aprobados	PLAN	5	2	40%	3	2	67%
Capacitaciones en el tema ambiental climática brindadas.	TALLERE DE CAPACITACION	1	0	0%	0	0	0%



Principales Metas Físicas, II Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			II Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Número de Organizaciones /comunidades con financiamiento otorgado	ORGANIZACION	5	4	80%	1	4	400%

De acuerdo con lo indicado por la Unidad Ejecutora en su Informe del primer trimestre programó una ejecución Física para el año 2025 de 50 planes de fortalecimiento organizacional implementados por el comité de inversiones, 107 Becas aprobadas a jóvenes rurales, beneficiando al 30% de las mujeres, 135 Planes de Negocios con enfoque de cadena de valor implementados con organizaciones de productores rurales en la Región 2.

Por lo anterior y de acuerdo a lo programado inicialmente, al segundo trimestre la UE en su informe ha indicado que en el trimestre se han tenido avances considerables en identificación 34 organizaciones sumando un total acumulado de 117 organizaciones potenciales para ser beneficiarias del PROINORTE, lo que está permitiendo avanzar en el indicador de familias beneficiarias, realización de seis capacitaciones Educación Alimentaria y Nutricional (Campañas SAN) en el marco de la Seguridad alimentaria con el objeto de realizar la sensibilización y promoción sobre alimentos nutritivos diversos, seguros y saludables, diversidad de la dieta e higiene en mejorar su estado nutricional de los hogares, aprobación de 35 PNs, así como avances relevantes en actividades de caminos rurales, becas, identificación y preparación de planes de fortalecimiento organizacional.

En cuanto a la asignación y ejecución presupuestaria la misma ha incrementado de L82.9 millones a L204,4 millones debido a que la UE indicó que las proyecciones de ejecución incrementara en los próximos meses debido a transferencias de planes de negocio y planes ecosistémicos aprobados por comité, Planes de negocio en proceso de formulación, mismos que serán aprobados y desembolsados en el transcurso del año 2025.

Es importante indicar que al cierre del segundo trimestre la UE proyectaba una ejecución de L56,409,002.3 sin embargo al cierre del trimestre y de acuerdo con el cuadro de ejecución presupuestaria se ejecutó L21,814,310 lo que denota en una ejecución de L34,594,692.12 menos a lo proyectado.



Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	FIDA 2000002595 LOAN No. 13754P	US\$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	1,022,909,108	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2025	L82,980,273	L204,449,717	L13,267,920	6.5
Acumulado 2025	L82,980,273	L204,449,717	L21,814,310	10.7
Acumulado Vida del Proyecto */	L1,022,909,108	L1,022,909,108	L102,006,512	10.0

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

#### d.1 Principales Adquisiciones II Trimestre 2025

A continuación, se detallan los procesos de adquisición realizados en el II Trimestre.

##### Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.

Contratación de: Subproyecto de Rehabilitación de Agua Potable de la Ciudad de la Paz, La Paz. “Especialista en Tecnologías de la Información (TI), Especialista en Adquisiciones.

##### Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Durante el trimestre se han realizado 6 procesos de adquisiciones, los cuales aún se encuentran en etapa de No objeción por parte del organismo para publicación, evaluación técnica, documentos base, evaluación técnica, revisión de TDRS.

##### Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad

Recontratación de especialistas y oficiales de la Unidad Ejecutora.

##### COMRURAL III

proceso de evaluación de expresiones de interés, por subregión para Contratación de Firma Consultora Implementadora V1 y V4. En proceso de No Objeción del BM Firma Consultora para Evaluación de Impacto.

## d.2 Programas Sociales

Actualmente la SAG posee un presupuesto vigente de L2,450.00 millones para el desarrollo tres programas sociales de gran importancia:

**Bono Cafetalero:** Mediante este programa se desarrolla la Fertilización (L350.00 millones), la cual apoya a los pequeños y medianos productores de café en el fortalecimiento de la producción, brindando apoyo en la fertilización de fincas, renovación de áreas, asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades y generación de valor agregado en fincas.

**Bono Ganadero (L368.00 millones):** Se desarrolla con el objetivo de fomentar un incremento sostenible y significativo en la producción de carne y leche por parte de los pequeños y medianos productores ganaderos a nivel nacional, los cuales se lograrán por medio de la ejecución de 4 componentes: 1) Fortalecimiento Inclusivo y Participativo en la Producción de Alimento en Ganado, 2) Componente Fomento a la industrialización de la cadena de procesamiento, 3) Extensión Agrícola y 4) Fomento a las Cadenas Pecuarias.

**Bono Tecnológico Productivo (L1,732.00 millones):** Programa presidencial con orientación en productos de la canasta básica al beneficio de Pequeños Productores de Subsistencia que se encuentran bajo la franja de pobreza y pobreza extrema.

Se indica que la SAG no proporcionó a la DGIP el informe correspondiente a la ejecución de la Inversión Social. Las cifras detalladas fueron generadas del SIAFI al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal vigente.

## e. Gestión de la Inversión

- Autorización de modificaciones presupuestarias de Traslados entre objetos de gasto 2000, 3000, entre categorías de proyectos con ERP.
- Solicitud de proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2025.
- Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
- Acompañamiento constante durante la ejecución de los proyectos.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

## f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025

### Problemáticas:

- Dilatación de los procesos de adquisiciones y contrataciones.
- Procesos de Contratación fracasados.
- Tardanza en la revisión y emisión de Dictámenes Legales por parte de la Dirección de Servicios Legales de la SAG, relacionados con contratos, acuerdos y convenidos que deben formalizarse en el marco del Proyecto.

### Acciones:

- la SAG deberá desarrollar acciones respecto a los procesos de adquisición para que la firma de estos sea más ágil.

## V. Conclusiones

- De acuerdo con lo reportado en los informes de la SAG no ha desarrollado acciones respecto a los procesos de adquisición.
- El tiempo de ejecución de los proyectos se verá afectado por los retrasos en los procesos de contratación y a los declarados fracasados.

## VI. Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- La SAG debe de definir una estrategia para acelerar los procesos correspondientes a adquisiciones y contratación de personal.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# ANEXO

# Anexo Financiero al II Trimestre 2025.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempias

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente				Ejecutado II Trimestre										Ejecutado Anual (Devengado)									
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Fondos Nacionales	11- Tesoro Nacional	12- Recursos Propios	14- Donaciones Internas	Total	Fondos Nacionales	11- Tesoro Nacional	12- Recursos Propios	14- Donaciones Internas	Fondos Externos	21- Crédito Externo	22- Donaciones Externas	23- Apoyo Presupuestario	26- MCRN	27- Aliés de la Deuda - Club de París	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	11- Tesoro Nacional	12- Recursos Propios	14- Donaciones Internas	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
9	Inversión Productiva		30,546,778.0	2,266,524,300.0	2,297,071,078.0	30,546,778.0	30,546,778.0	1,735,102,926.0	1,080,920.4	1,080,920.4	-	-	187,384,954.7	143,321,291.3	44,073,663.4	-	-	-	-	188,475,875.1	10.9	2,066,031.7	2,066,031.7	-	-	259,484,219.5	261,750,251.2	15.1
9	0140- Secretaría de Agricultura y Ganadería		30,546,778.0	2,266,524,300.0	2,297,071,078.0	30,546,778.0	30,546,778.0	1,735,102,926.0	1,080,920.4	1,080,920.4	-	-	187,384,954.7	143,321,291.3	44,073,663.4	-	-	-	-	188,475,875.1	10.9	2,066,031.7	2,066,031.7	-	-	259,484,219.5	261,750,251.2	15.1
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	TF017904 TF086211-HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,098.0	-	-	-	-	-	-	1,443,098.0	-	-	-	-	-	1,443,098.0	-	-
	Total ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)		13,156,550.0	13,156,550.0	13,156,550.0	-	-	63,156,550.0	-	-	-	-	43,484,779.5	43,484,779.5	43,484,779.5	-	-	-	-	43,484,779.5	68.8	-	-	-	-	57,993,372.1	57,993,372.1	83.9
2	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN TF0C1874	62,133,300.0	62,133,300.0	62,133,300.0	-	-	157,083,300.0	-	-	-	-	54,972,918.5	54,972,918.5	54,972,918.5	-	-	-	-	54,972,918.5	35.0	-	-	-	-	56,618,254.0	56,618,254.0	36.1
	Total COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)		323,614,627.0	323,614,627.0	323,614,627.0	-	-	115,578,051.0	-	-	-	-	698,883.9	698,883.9	698,883.9	-	-	-	-	698,883.9	0.6	-	-	-	-	96,092.7	96,092.7	0.8
3	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA-6695-HN	316,773,338.0	316,773,338.0	316,773,338.0	-	-	316,773,338.0	-	-	-	-	55,611,802.4	54,972,918.5	698,883.9	-	-	-	-	55,611,802.4	20.4	-	-	-	-	57,584,246.7	57,584,246.7	21.1
	Total Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		316,773,338.0	316,773,338.0	316,773,338.0	-	-	316,773,338.0	-	-	-	-	55,611,802.4	54,972,918.5	698,883.9	-	-	-	-	55,611,802.4	20.4	-	-	-	-	57,584,246.7	57,584,246.7	21.1
4	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL NORTE CENTRO DE HONDURAS (INNOVASAN)	N/A	50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	-	-	154,980,330.0	-	-	-	-	7,306,328.3	7,306,328.3	7,306,328.3	-	-	-	-	7,306,328.3	4.7	-	-	-	-	13,043,164.8	13,043,164.8	8.4
	Total - FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL NORTE CENTRO DE HONDURAS (INNOVASAN)		50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	-	-	154,980,330.0	-	-	-	-	7,306,328.3	7,306,328.3	7,306,328.3	-	-	-	-	7,306,328.3	4.7	-	-	-	-	13,043,164.8	13,043,164.8	8.4
5	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMARURAL II)	IDA-6448-HN	407,134,799.0	407,134,799.0	407,134,799.0	-	-	247,145,576.0	-	-	-	-	28,480,274.4	28,480,274.4	28,480,274.4	-	-	-	-	28,480,274.4	11.5	-	-	-	-	57,181,063.9	57,181,063.9	23.1
	Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMARURAL II)		407,134,799.0	407,134,799.0	407,134,799.0	-	-	247,145,576.0	-	-	-	-	28,480,274.4	28,480,274.4	28,480,274.4	-	-	-	-	28,480,274.4	11.5	-	-	-	-	57,181,063.9	57,181,063.9	23.1
6	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJA RIESGO (PDBAR)	BOE-2101	690,798.0	169,570,951.0	169,570,951.0	690,798.0	690,798.0	80,690,798.0	-	-	-	-	1,163,968.2	1,163,968.2	1,163,968.2	-	-	-	1,163,968.2	1.4	1,234.5	1,234.5	-	-	2,377,391.2	2,377,391.2	2.8	
	Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJA RIESGO (PDBAR)		690,798.0	169,570,951.0	169,570,951.0	690,798.0	690,798.0	80,690,798.0	-	-	-	-	1,163,968.2	1,163,968.2	1,163,968.2	-	-	-	1,163,968.2	1.4	1,234.5	1,234.5	-	-	2,377,391.2	2,377,391.2	2.8	
7	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN DE OLANO (LOAN No. 13754P)	000002595	15,730,000.0	156,580,465.0	172,310,465.0	15,730,000.0	15,730,000.0	100,762,707.0	1,080,920.4	1,080,920.4	-	-	6,407,869.7	6,407,869.7	6,407,869.7	-	-	-	-	7,483,700.1	7.4	2,064,797.2	2,064,797.2	-	-	13,406,748.0	15,421,565.2	15.4
	Total PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN DE OLANO (LOAN No. 13754P)		15,730,000.0	156,580,465.0	172,310,465.0	15,730,000.0	15,730,000.0	100,762,707.0	1,080,920.4	1,080,920.4	-	-	6,407,869.7	6,407,869.7	6,407,869.7	-	-	-	-	7,483,700.1	7.4	2,064,797.2	2,064,797.2	-	-	13,406,748.0	15,421,565.2	15.4
8	PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	14,125,980.0	395,458,801.0	409,584,781.0	14,125,980.0	14,125,980.0	189,584,781.0	-	-	-	-	5,983,060.3	5,983,060.3	5,983,060.3	-	-	-	-	5,983,060.3	3.2	-	-	-	-	10,782,502.8	10,782,502.8	5.7
	Total PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		14,125,980.0	395,458,801.0	409,584,781.0	14,125,980.0	14,125,980.0	189,584,781.0	-	-	-	-	5,983,060.3	5,983,060.3	5,983,060.3	-	-	-	-	5,983,060.3	3.2	-	-	-	-	10,782,502.8	10,782,502.8	5.7
9	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	491961R-HO 494016R-HO 6971WF-20251-HO ICO-FONPRODE	1,000,000.0	80,250,821.0	81,250,821.0	-	-	169,466,984.0	-	-	-	-	37,949,271.9	37,949,271.9	37,949,271.9	-	-	-	-	37,949,271.9	23.7	-	-	-	-	46,072,865.2	46,072,865.2	28.7
	Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		1,000,000.0	80,250,821.0	81,250,821.0	-	-	169,466,984.0	-	-	-	-	37,949,271.9	37,949,271.9	37,949,271.9	-	-	-	-	37,949,271.9	23.7	-	-	-	-	46,072,865.2	46,072,865.2	28.7
	Total Inversión Social		2,488,088,493.0	2,488,088,493.0	2,488,088,493.0	450,000,000.0	450,000,000.0	2,038,088,493.0	1,450,000,000.0	1,450,000,000.0	-	-	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	-	-	-	-	1,450,000,000.0	59.2	1,450,000,000.0	1,450,000,000.0	-	-	1,000,000,000.0	1,450,000,000.0	59.2
	Total 0140- Secretaría de Agricultura y Ganadería		2,488,088,493.0	2,488,088,493.0	2,488,088,493.0	450,000,000.0	450,000,000.0	2,038,088,493.0	1,450,000,000.0	1,450,000,000.0	-	-	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	-	-	-	-	1,450,000,000.0	59.2	1,450,000,000.0	1,450,000,000.0	-	-	1,000,000,000.0	1,450,000,000.0	59.2
	BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES		350,000,000.0	-	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000.0	100.0	350,000,000.0	350,000,000.0	-	-	350,000,000.0	350,000,000.0	100.0
	Total BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES		350,000,000.0	-	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	350,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000.0	100.0	350,000,000.0	350,000,000.0	-	-	350,000,000.0	350,000,000.0	100.0
	BONO GANADERO		100,000,000.0	-	100,000,000.0	100,000,000.0	100,000,000.0	268,000,000.0	100,000,000.0	100,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.0	27.2	100,000,000.0	100,000,000.0	-	-	100,000,000.0	100,000,000.0	27.2
	Total BONO GANADERO		100,000,000.0	-	100,000,000.0	100,000,000.0	100,000,000.0	268,000,000.0	100,000,000.0	100,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.0	27.2	100,000,000.0	100,000,000.0	-	-	100,000,000.0	100,000,000.0	27.2
	BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		2,000,000,000.0	-	2,000,000,000.0	1,732,000,000.0	1,732,000,000.0	1,732,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	-	-	1,000,000,000.0	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.0	57.7	1,000,000,000.0	-	1,000,000,000.0	-	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	57.7
	Total BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		2,000,000,000.0	-	2,000,000,000.0	1,732,000,000.0	1,732,000,000.0	1,732,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	-	-	1,000,000,000.0	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.0	57.7	1,000,000,000.0	-	1,000,000,000.0	-	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	57.7
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,848,097.0	-	36,848,097.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,848,097.0	-	36,848,097.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VARIOS INVERSIONES SOCIALES		1,240,396.0	-	1,240,396.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total - VARIOS INVERSIONES SOCIALES		1,240,396.0	-	1,240,396.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Anexo Físico al II Trimestre 2025.

**ANEXO No.2**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025**

Institución/Proyecto	Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>								
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	Número de productores (as) rurales organizados mejoran su productividad y competitividad, incrementando sus ingresos y asegurando su seguridad alimentaria.	PRODUCTOR	6366	5361	84.21%	2228	1434	64.36%
	Numero de planes de negocio implementados	PLAN DE NEGOCIO	50	5	10.00%	25	5	20.00%
	Numero de planes de negocio aprobados	PLAN DE NEGOCIO	50	9	18.00%	25	7	28.00%
	Numero de asistencia técnica brindadas	ASISTENCIA TÉCNICA	75	24	32.00%	25	24	96.00%
	Evento Intercambio de experiencias (procesos de aprendizaje) desarrollados con organizaciones de productores y productoras rurales de las comunidades del Valle de Aguan.	EVENTO	3	0	0.00%	0	0	0.00%
	Planes de fortalecimiento organizacional implementados por Organizaciones usuarias	PLAN	50	34	68.00%	17	16	94.12%
	Número de organizaciones usuarias con financiamiento otorgado	ORGANIZACIÓN	50	5	10.00%	25	5	20.00%
	Número de campañas de concientización y buenas prácticas diseñadas	CAMPAÑA	9	6	66.67%	3	6	200.00%
	Servicios financieros innovadores otorgados a jóvenes rurales y cajas rurales en las comunidades del Valle de Aguan	SERVICIO	5	0	0.00%	0	0	0.00%
	Número de becas aprobadas	BECA	96	0	0.00%	20	0	0.00%
	Número de cajas rurales con financiamiento otorgado	CAJA RURAL	60	0	0.00%	20	0	0.00%
	Capacitaciones en educación financiera brindadas a productores(as) que integran las cajas rurales	TALLER DE CAPACITACION	2	0	0.00%	0	0	0.00%
	Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos implementados	PLAN	5	0	0.00%	0	0	0.00%
	Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos aprobados	PLAN	5	2	40.00%	3	2	66.67%
	Capacitaciones en el tema ambiental climática brindadas.	TALLER DE CAPACITACION	1	0	0.00%	0	0	0.00%
	Número de Organizaciones /comunidades con financiamiento otorgado	ORGANIZACIÓN	5	5	100.00%	4	4	100.00%
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	50	30	60.00%	30	30	100.00%
	(PI) Planes de inversión con adopción de INTERMEDIA S 264-PLAN Trimestral tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	0	0.00%	0	0	0.00%
	(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	400	230	57.50%	230	230	100.00%
	(PI) Planes de asistencia técnica por rubro INTERMEDIA N 264-PLAN Trimestral de producción aprobados.	Planes de Asistencia	5	2	40.00%	2	2	100.00%
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	5	0	0.00%	0	0	0.00%
	(PI) Planes de manejo de microcuencia aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	5	0	0.00%	0	0	0.00%
	(PF) Desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores y productoras rurales a través de BANHPROVI	Millones	100	0	0.00%	25	0	0.00%
	(PI) Monto en Lempiras Transferidos	Millones	100	0	0.00%	25	0	0.00%
	(PF) Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.	Porcentaje	50	0	0.00%	25	0	0.00%
	(PI) Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA(La primera Versión completa) evaluado y aprobado	Porcentaje	100	0	0.00%	0	0	0.00%
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Informe Final de Auditoría Financiera del Proyecto PROSASUR aprobados por la SAG	Informe	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Informes finales de cierre del proyecto PROSASUR, aprobado por el organismo financiador y máxima autoridad de la SAG.	Informe	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Informe de cierre del Fondo Original Remanente del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	1	1	100.00%	1	1	100.00%

ANEXO No.2  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>								
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Diseños Finales de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes; La Venta; La Paz; y Curarén.	DISEÑO	4	0	0.00%	2	0	0.00%
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados	ESTUDIO	4	0	0.00%	2	0	0.00%
	Rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua potable de los municipios de Nacaome y San Lorenzo	PORCENTAJE	0.1	0	0.00%	0	0	0.00%
	Instrumentos para la Gestión Integral Recursos Hídricos (GIRH) elaborados en beneficio de la población. (Propuesta de la Política Nacional de GIRH y Propuesta de Reglamento de Aguas Subterráneas).	PROPUESTA TÉCNICA	2	0	0.00%	0	0	0.00%
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado	PORCENTAJE	0.5	0	0.00%	0	0	0.00%
	Talleres participativos de consulta con actores estratégicos	Talleres	3	2	66.67%	2	2	100.00%
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	Productores y productoras organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	6347	504	7.94%	504	504	100.00%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	30	0	0.00%	0	0	0.00%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	15	0	0.00%	5	5	100.00%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	5	0	0.00%	0	0	0.00%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agrológicos	Planes de Negocios	5	0	0.00%	0	0	0.00%
	Subproyectos agrocosteros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	30	0	0.00%	0	0	0.00%
	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	30	0	0.00%	0	0	0.00%
