

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

Registro Nacional de las Personas (RNP)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Registro Nacional de las Personas (RNP) fue creado como un ente Estatal que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte. El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	492,257,452
Inversión Productiva	392,257,452
Formación Bruta de Capital	100,000,000
Presupuesto Vigente	478,322,120
Inversión Productiva	392,257,452
Formación Bruta de Capital	86,064,668
Ejecutado III Trimestre	36,728,757
Inversión Productiva	2,060,383
Formación Bruta de Capital	34,668,374
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	7.7%
Ejecutado Anual	68,398,806
Inversión Productiva	6,286,107
Formación Bruta de Capital	62,112,699
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	14.3%

Nota: SIAFI, 30/09/2025


población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Al III Trimestre de 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de L478.3 millones para la ejecución de un proyecto de inversión productiva L392.3 millones; y L86.1 millones para formación bruta de capital. La ejecución del trimestre ascendió a 7.7%, mientras que el total ejecutado alcanzó el 14.3% del presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

El Registro Nacional de las Personas (RNP) financia su presupuesto principalmente a través de tres fuentes de financiamiento: Tesoro Nacional, Recursos Propios y Crédito Externo. Del presupuesto vigente con el que contó la institución, la fuente principal de financiamiento fue

el Crédito Externo con L392.3 millones, seguido del Tesoro Nacional con L75.6 millones y Recursos Propios por L10.5 millones.

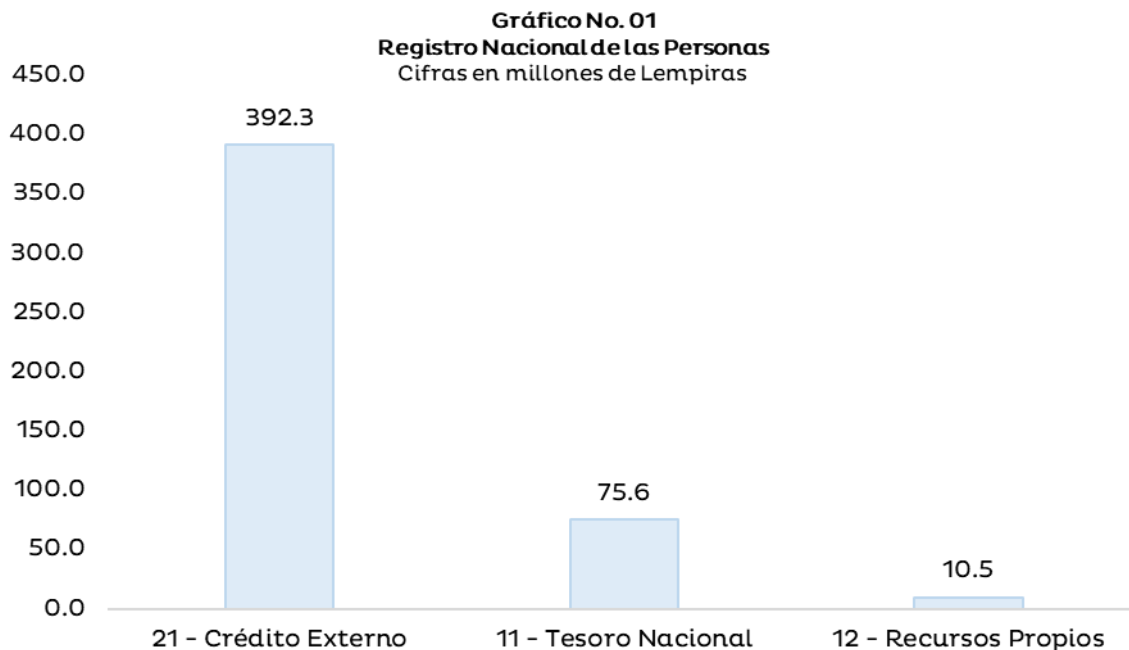

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2021-2025)


A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado del Registro Nacional de las Personas al 30 de septiembre de los años 2021 a 2025:

- En 2021, el presupuesto vigente fue de L914.3 millones, de los cuales se ejecutaron L791.8 millones, logrando una ejecución del 86.6%, uno de los niveles más altos del período.
- Para 2022, el presupuesto disminuyó a L87.1 millones, y la ejecución fue baja, con apenas L7.6 millones, lo que representa solo un 8.7%.
- En 2023, aunque el presupuesto aumentó a L501.5 millones, la ejecución fue elevada, alcanzando L451.5 millones, equivalente al 90.0%, el porcentaje más alto del quinquenio.
- En 2024, el presupuesto asignado fue de L100.2 millones, de los cuales se ejecutaron L58.2 millones, logrando una ejecución del 58.1%.
- Al tercer trimestre de 2025, el presupuesto vigente asciende a L478.3 millones, con una ejecución de L68.4 millones, equivalente al

14.3%, lo que refleja que, al igual que en años anteriores, la ejecución tiende a ser más baja en los primeros trimestres del ejercicio fiscal.

Gráfica No. 2

Comportamiento Inversión Pública Total
 Al 30 de septiembre (2021-2025)
 0180 - Registro Nacional de las Personas
 Cifras en millones de Lempiras

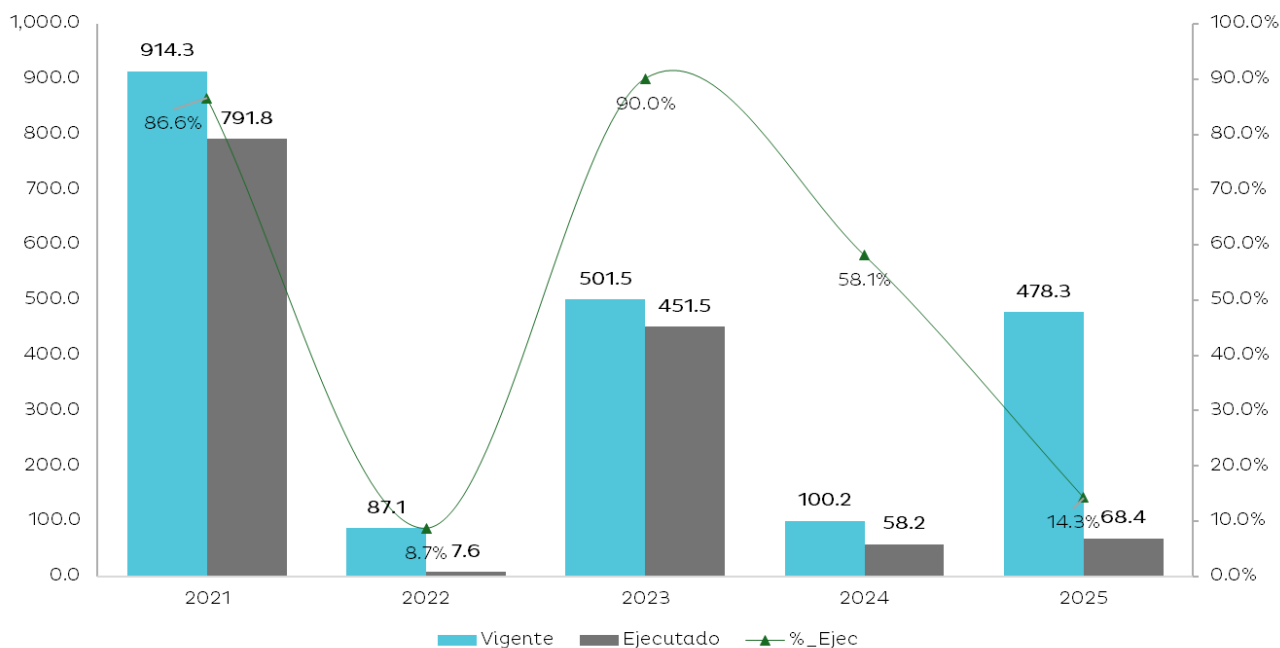

d. Principales Proyectos

La inversión productiva al tercer trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.

El objetivo general es fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de

nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Brigadas móviles de capacitación a parteras y personal por contratar	Porcentaje	100%	35%	35%	50%	35%	70%
Digitalización del formulario de nacido vivo	Porcentaje	100%	80%	80%	15%	15%	100%
Adjudicación de Kits de enrolamiento listos e instalados	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Emisión y entrega del DNI para menores 6-17 años	Porcentaje	100%	5%	5%	5%	5%	100%

Fuente: RNP, al 30 de septiembre de 2025

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras registra un avance físico global de aproximadamente 45%, reflejando progresos relevantes en los principales componentes.

Se alcanzó un 35% de avance en la capacitación de parteras y personal de salud, fortaleciendo el registro oportuno de nacimientos. La digitalización del formulario de nacido vivo avanza en un 10%, con el inicio del desarrollo del software e interoperabilidad institucional.

En identificación infantil, se completó el 100% en la preparación y dotación de kits de enrolamiento, mientras que la emisión del DNI para menores de 6 a 17 años presenta un 5% de ejecución, pendiente de contrataciones especializadas.

Asimismo, se reporta un 80% de avance en el diseño de la nueva arquitectura de sistemas, un 40% en herramientas de indexación de archivos, un 60% en manuales y guías operativas, y un 50% en la estrategia de comunicación institucional.

Pese a los retrasos asociados a procesos administrativos y de coordinación interinstitucional entre el RNP y PNUD, el programa ha establecido bases sólidas para acelerar la ejecución durante el cuarto trimestre de 2025, priorizando el registro digital de nacimientos, el enrolamiento en centros educativos y la emisión del DNI infantil en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras al tercer trimestre de 2025:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.	AF-7471-HN	US\$40,000,000	L1,048,352,000	23/02/2024-26/08/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	392,257,452	392,257,452	2,060,383	0.5%
Acumulado 2025	392,257,452	392,257,452	6,286,107	1.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	L1,048,352,000	L1,048,352,000	455,573,841	43.5%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

La baja ejecución financiera del proyecto se debe principalmente a procesos administrativos y de contratación prolongados, que afectaron el inicio oportuno de algunas actividades clave, especialmente aquellas relacionadas con la digitalización del formulario de nacido vivo, la emisión del DNI infantil y la contratación de servicios tecnológicos especializados.

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2025

Durante el tercer trimestre de 2025, los procesos de adquisiciones para la ejecución del proyecto por componente incluyeron:

- Adquisición, preparación y dotación de kits de enrolamiento a nivel nacional, utilizados para el registro y captura de datos biométricos de menores de edad en centros educativos, alcanzando una cobertura del 100%.
- Contratación de servicios de desarrollo de software para la digitalización del formulario de constancia de nacido vivo, incluyendo las primeras fases de diseño funcional y pruebas de interoperabilidad con la Secretaría de Salud y el RNP.
- Elaboración de la estrategia de comunicación institucional, que comprende campañas informativas sobre registro civil, inclusión y emisión del DNI infantil, junto con materiales gráficos y audiovisuales.
- Diseño de la arquitectura de sistemas e infraestructura tecnológica, como parte de la modernización del ecosistema nacional de registro civil, con participación de firmas consultoras especializadas.
- Contratación de servicios técnicos para la indexación y digitalización de archivos del Registro Nacional de las Personas, orientados a la mejora en la gestión documental y trazabilidad de registros.
- Adquisición de equipos informáticos y periféricos de apoyo a las unidades técnicas y administrativas del proyecto, destinados a fortalecer la capacidad operativa para la implementación de los distintos componentes.

e. Gestión de la Inversión

Durante el tercer trimestre de 2025, las acciones financieras y administrativas se enfocaron en la gestión de adquisiciones y

contrataciones a través del convenio suscrito con el PNUD, utilizando los recursos asignados en el presupuesto vigente.

Sin embargo, la unidad ejecutora ha solicitado la asignación de la cuota compromiso mensual, no obstante, la ejecución financiera no refleja porcentajes significativos a la fecha.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

Durante el tercer trimestre de 2025, el programa enfrentó retrasos en la ejecución física y financiera debido principalmente a procesos administrativos y de contratación prolongados, que afectaron el inicio oportuno de algunas actividades clave.

Asimismo, se identificaron dificultades en la coordinación interinstitucional entre las entidades que intervienen en la interoperabilidad del sistema de registro civil (RNP, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación y Justicia), lo que generó ajustes en los cronogramas de trabajo y postergación en la validación de productos técnicos. En el ámbito operativo, se registraron limitaciones logísticas para la distribución oportuna de equipos y kits de enrolamiento en algunos departamentos, debido a retrasos en los procesos de importación y despacho aduanero.

Frente a estas situaciones, se implementaron las siguientes acciones correctivas:

- Reprogramación de actividades críticas y ajuste del Plan Operativo Anual (POA) para priorizar las metas de mayor impacto.
- Aceleración de procesos de contratación mediante la revisión técnica de términos de referencia y acompañamiento continuo de la UAP-SEFIN y el BID.
- Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, con reuniones técnicas entre el RNP y la Secretaría de Salud para la validación del flujo de interoperabilidad del sistema de registro de nacimientos.

- Optimización de los mecanismos logísticos para garantizar la entrega y puesta en funcionamiento de los kits de enrolamiento en todo el país.

Las acciones anteriormente mencionadas han permitido mantener la ejecución del programa dentro de los parámetros operativos establecidos y sentar las bases para un mayor dinamismo en el cuarto trimestre de 2025, asegurando la continuidad de los procesos de modernización tecnológica y fortalecimiento institucional del sistema de registro civil e identificación nacional.

V. CONCLUSIONES

- Al cierre del tercer trimestre de 2025, la ejecución presupuestaria acumulada alcanzó apenas un 7.7%, reflejando un retraso respecto a lo programado. Esta situación se debe principalmente a procesos administrativos y de contratación en curso, la dependencia de aprobaciones interinstitucionales entre RNP y el PNUD, y la validación técnica de productos estratégicos, como el sistema de registro digital de nacimientos y la emisión del DNI para menores.
- Durante el trimestre el proyecto se enfocó sus esfuerzos en acciones de gestión administrativa y técnica, incluyendo la preparación de procesos de adquisición a través del PNUD, la coordinación con la Secretaría de Salud (SESAL) para la interoperabilidad del registro de nacido vivo, y la planificación de actividades operativas que permitirán acelerar la ejecución en el cuarto trimestre.
- Pese a los retrasos iniciales, se evidencian avances sustantivos en la preparación y dotación de kits de enrolamiento (100%), en la capacitación del personal de salud y parteras (35%), así como en el diseño de la arquitectura de sistemas y manuales operativos, sentando bases técnicas y logísticas sólidas para la siguiente fase de implementación.

VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda fortalecer la ejecución operativa y presupuestaria mediante la aceleración de los procesos de contratación de personal de enrolamiento, servicios tecnológicos y consultorías especializadas, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos humanos y materiales para cumplir las metas programadas.
- Se recomienda **mantener una planificación flexible y orientada a resultados**, que permita ajustar oportunamente las actividades ante eventuales retrasos administrativos, garantizando el avance sostenido del programa y el logro de sus objetivos estratégicos durante el cierre del ejercicio 2025.

Anexo No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
1	Inversión Productiva		-	392,257,452	392,257,452	-	392,257,452	392,257,452	-	2,060,383	2,060,383	0.5%	-	6,286,107	6,286,107	1.6%
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			392,257,452	392,257,452		392,257,452	392,257,452		2,060,383	2,060,383	0.5%		6,286,107	6,286,107	1.6%
1	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras	AF-7471-HN		392,257,452	392,257,452		392,257,452	392,257,452		2,060,383	2,060,383	0.5%		6,286,107	6,286,107	1.6%
	Total Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e I			392,257,452	392,257,452		392,257,452	392,257,452		2,060,383	2,060,383	0.5%		6,286,107	6,286,107	1.6%
	Formación Bruta de Capital		100,000,000	-	100,000,000	86,064,668	-	86,064,668	34,668,374	-	34,668,374	40.3%	62,112,699	-	62,112,699	72.2%
	0180 - Registro Nacional de las Personas		100,000,000		100,000,000	86,064,668		86,064,668	34,668,374		34,668,374	40.3%	62,112,699		62,112,699	72.2%
	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		30,441,332		30,441,332	8,000,000		8,000,000	275,677		275,677	3.4%	275,677		275,677	3.4%
	Total DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		30,441,332		30,441,332	8,000,000		8,000,000	275,677		275,677	3.4%	275,677		275,677	3.4%
	IDENTIFICACION NACIONAL		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total IDENTIFICACION NACIONAL		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		69,558,668		69,558,668	78,064,668		78,064,668	34,392,697		34,392,697	44.1%	61,837,022		61,837,022	79.2%
	Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		69,558,668		69,558,668	78,064,668		78,064,668	34,392,697		34,392,697	44.1%	61,837,022		61,837,022	79.2%
	Total general		100,000,000	392,257,452	492,257,452	86,064,668	392,257,452	478,322,120	34,668,374	2,060,383	36,728,757	7.7%	62,112,699	6,286,107	68,398,806	14.3%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

Anexo No. 2
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Registro Nacional de las Personas	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras	Cobertura del registro de nacidos vivos y reducción del subregistro	Porcentaje	100%	35%	35%	50%	35%	70%
		Digitalización del formulario de constancia de nacido vivo y equipamiento tecnológico para brigadas	Porcentaje	100%	10%	10%	20%	10%	50%
		Enrolamiento de menores de 6-17 años y entrega del DNI	Porcentaje	100%	60%	60%	50%	60%	120%*
		Modernización digital, interoperabilidad, servicios omnicanal y fortalecimiento institucional	Porcentaje	100%	5-60%	—	15-50%	5-60%	33-120%*

Fuente: Unidad Ejecutora, 30/09/2025
