

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

AL III TRIMESTRE 2025

*Instituto Nacional De
Estadísticas (INE)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Instituto Nacional de Estadística (INE), es una entidad gubernamental encargada de coordinar y regular el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Fue fundado en el año 2000, el INE tiene como mandato recolectar, analizar y difundir datos estadísticos confiables que reflejen la realidad nacional,

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	373,264,010
Inversión Productiva	372,466,010
Formación Bruta de Capital	798,000
Presupuesto Vigente	373,766,010
Inversión Productiva	372,466,010
Formación Bruta de Capital	1,300,000
Ejecutado III Trimestre	109,934,744
Inversión Productiva	109,321,070
Formación Bruta de Capital	613,675
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	29.4%
Ejecutado Anual	145,040,111
Inversión Productiva	144,227,526
Formación Bruta de Capital	812,585
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	38.8%

Nota: SIAFI, 30/09/2025


apoyando así la planificación y toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. Entre sus principales objetivos, el INE se enfoca en asegurar la calidad y accesibilidad de las estadísticas oficiales, promover una cultura estadística en la sociedad, optimizar recursos mediante la coordinación de actividades estadísticas y fomentar la capacitación e investigación en esta área.

Al III trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de L373.8 millones para la ejecución de programas y proyectos. La ejecución acumulada fue de L145.0 millones (38.8% del presupuesto vigente), mientras que el nivel de ejecución del trimestre (julio-septiembre) alcanzó L109.9 millones (29.4%), tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) financia sus programas y proyectos principalmente a través de dos fuentes de financiamiento: Recursos Propios y Crédito Externo.

El presupuesto vigente al tercer trimestre 2025 de la institución fue de L373.8 millones, la fuente de Crédito Externo representa la fuente principal de financiamiento con una asignación de L372.5 millones mientras que los Recursos Propios suman L1.3 millones.

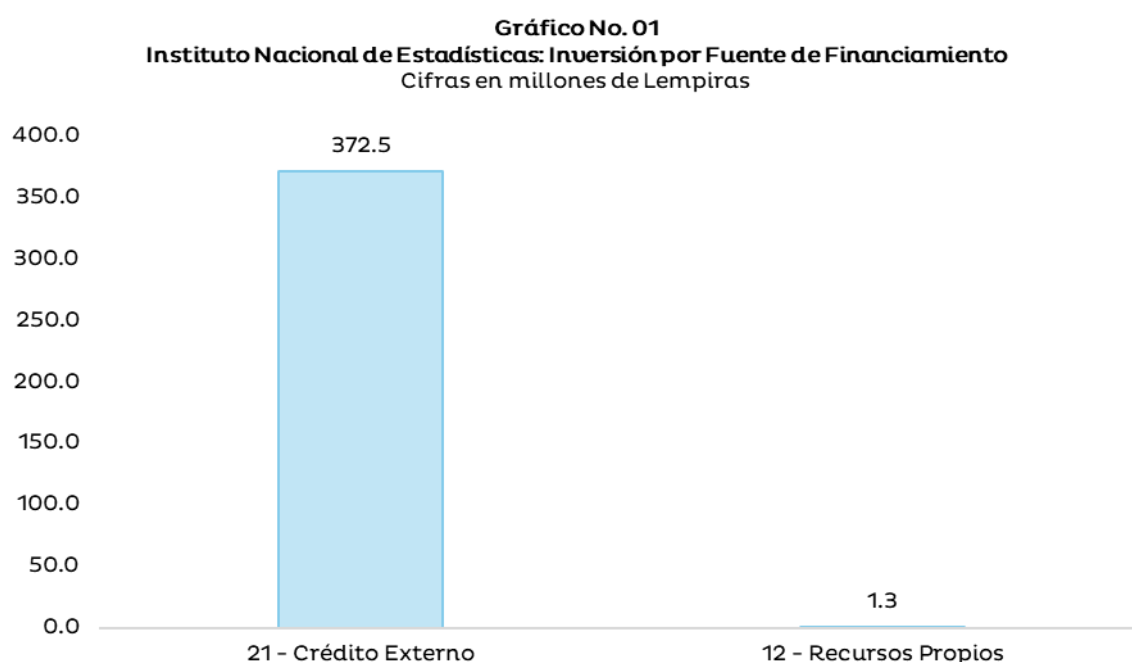

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2021-2025)


A continuación, se analiza el comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado del INE entre 2021 y 2025:

- Entre 2021 y 2023, el INE contó con presupuestos muy limitados (menos de un millón de lempiras anuales), destinados principalmente a actividades técnicas menores y encuestas básicas, lo que resultó en una ejecución baja o prácticamente nula.
- En 2024, el presupuesto tuvo un incremento significativo, alcanzando L241.8 millones principalmente por la preparación del Censo Agropecuario Nacional y el Censo de Población y Vivienda. No obstante, la ejecución fue de apenas el 0.01% del presupuesto.

- Para 2025, el presupuesto vigente asciende a L373.8 millones, representando el pico más alto en relación con los presupuestos asignados del 2021-2024; de los cuales se ha ejecutado L145.0 millones, equivalente al 38.8% al cierre del tercer trimestre.

Gráfico No. 2

Comportamiento Inversión Pública Total
 Al 30 de septiembre (2021-2025)
 0513 - Instituto Nacional de Estadísticas
 Cifras en millones de Lempiras

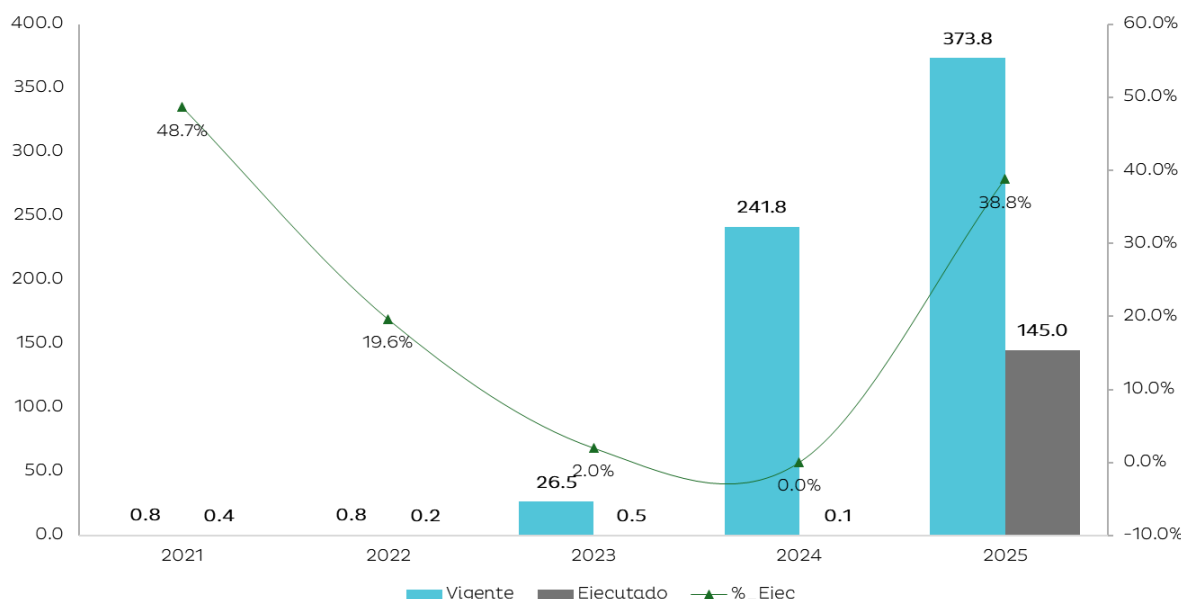

d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el segundo trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.

El objetivo general de esta operación es de incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y

privadas, al cual contribuirán los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad; y (ii) fortalecer la institucionalidad del INE.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Program.	Ejecutada	% Ejec.	Program.	Ejecutada	% Ejec.
Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	BOLETA	1	1	100.00%	1	1	100.00%
Levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda	CENSO	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Prueba piloto experimental realizada	PRUEBA PILOTO	1	1	100.00%	1	1	100.00%
Actualización cartográfica segmentación municipios	MUNICIPIOS	295	295	100.0%	295	295	100.0%
Levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN)	MUNICIPIOS	143	143	100.0%	143	143	100.0%

Fuente: INE, al 30 de septiembre de 2025.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional al segundo trimestre de 2025:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional	5832/BL-HO	US\$50,000,000	L1,310,440,000	17/06/2024-17/12/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	372,466,010	372,466,010	109,321,070	29.4%
Acumulado 2025	372,466,010	372,466,010	144,227,526	38.7%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,310,440,000	1,310,440,000	144,527,694	11.0%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2025

Durante el tercer trimestre de 2025, los procesos de adquisiciones para la ejecución del proyecto por componente incluyeron:

COMPONENTE I: Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)

- Contratación de servicios logísticos y operativos: Se completó la adjudicación y ejecución del servicio de almacenamiento, distribución y recolección de los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) y material censal a nivel nacional, garantizando la cobertura logística durante la fase de levantamiento.
- Adquisición de uniformes y materiales de campo: Se finalizó la compra y entrega de uniformes, mochilas, chalecos y demás insumos de identificación para el personal censal, asegurando su disponibilidad previa al inicio del operativo.
- Servicios de impresión y materiales de apoyo: Se culminó la contratación y entrega de manuales, guías operativas y formularios complementarios para el trabajo de campo del Censo de Población y Vivienda, completando la dotación de material técnico necesario.

COMPONENTE II: Censo Agropecuario Nacional (CAN)

- Suministro de equipos informáticos y accesorios: Se completó la adquisición y entrega de equipos de cómputo y periféricos destinados al procesamiento y validación de la información recolectada, fortaleciendo la capacidad técnica del equipo responsable del análisis de datos.
- Servicios de análisis estadístico y validación de resultados: Se concluyó la contratación y ejecución de la asistencia técnica especializada para el procesamiento y consolidación de la base de datos del Censo Agropecuario Nacional, alcanzando el 100% de avance en los resultados y validaciones estadísticas.

COMPONENTE III: Censo Nacional de Cooperativas y Censo de la Red Solidaria

- Contratación de consultorías y apoyo técnico: Se completaron las consultorías para el procesamiento de información y la elaboración de los informes preliminares del Censo Nacional de Cooperativas, así como la ejecución total del trabajo de campo del Censo de la Red Solidaria, cumpliendo con los objetivos establecidos para el trimestre.

e. Gestión de la Inversión

Durante el tercer trimestre de 2025, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) llevó a cabo importantes gestiones ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las actividades del Proyecto “Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y al Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional”.

- Mediante Oficio DE-INE-772-2025 del 12 de agosto de 2025, el INE gestionó y obtuvo la aprobación de una modificación presupuestaria interna por L16.37 millones con fondos del préstamo BID 5832 BL-HO, permitiendo realizar traslados entre grupos de gasto para financiar asistencia técnica del UNFPA, materiales censales, talleres de socialización, actividades de actualización cartográfica y fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa en Chile.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

Durante el III trimestre de 2025 se identificaron varios desafíos clave para garantizar el cumplimiento de las actividades previas y la adecuada preparación del proyecto:

- Retrasos en los procesos de contratación pública, debido a observaciones técnicas y requerimientos de aclaración por parte de los entes supervisores, lo que ocasionó demoras en la firma de contratos y en el inicio de algunos servicios.
- Limitaciones en la disponibilidad de personal especializado, especialmente en áreas de cartografía, sistemas de información

geográfica y análisis estadístico, lo que impactó la ejecución simultánea de varios censos.

- Dificultades logísticas derivadas del transporte y almacenamiento de materiales censales en zonas de difícil acceso, afectando el cronograma de distribución previsto.
- Demoras en los desembolsos de fondos externos, principalmente en los componentes financiados por organismos internacionales, lo que generó ajustes en los calendarios de ejecución financiera.

Acciones implementadas:

- Se reforzó la coordinación interinstitucional con la SEFIN, el BID y otras entidades involucradas para agilizar la aprobación y desembolso de los recursos financieros.
- Se implementó un plan de reprogramación operativa, priorizando las actividades críticas para garantizar la continuidad de los censos en curso.
- Se realizaron procesos de contratación complementarios para cubrir las necesidades de personal técnico en cartografía y procesamiento estadístico.
- Se establecieron mecanismos de supervisión y control logístico, con el apoyo de los equipos regionales, para mejorar la distribución y resguardo del material censal.
- Se continuó con la actualización de la base cartográfica nacional, y se completaron las fases finales del levantamiento de información del Censo Agropecuario Nacional.

V. CONCLUSIONES

- Al cierre del tercer trimestre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contó con un presupuesto vigente de L373.8 millones, de los cuales la ejecución acumulada alcanzó L145.0 millones (38.8% del presupuesto vigente).
- La ejecución del proyecto continúa condicionada por la dependencia entre procesos secuenciales, como adquisiciones,

convenios y contrataciones. Estas dependencias han generado retrasos en el despliegue de actividades de campo y en la operatividad de los censos, afectando el cumplimiento de metas físicas relevantes, especialmente considerando que la ejecución efectiva del Censo Nacional de Población y Vivienda se reorientará hasta 2026.

- Se registran avances completos en las metas físicas de actualización cartográfica y del Censo Agropecuario Nacional (CAN), alcanzando el 100%), lo que refleja la culminación de estas actividades críticas. No obstante, la falta de cierre oportuno de algunos procesos administrativos, la alta rotación de personal y las dificultades logísticas aún generan retos para la preparación y ejecución de actividades censales adicionales, como la difusión de información y evaluaciones postcensales.

VI. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la coordinación administrativa y financiera del INE para mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria, asegurando que los recursos asignados se utilicen de manera oportuna y conforme a los cronogramas establecidos.
- Agilizar los procesos secuenciales de adquisiciones, convenios y contrataciones mediante la implementación de un sistema de gestión integrada de proyectos, que permita reducir los retrasos y garantizar la continuidad de las actividades técnicas y operativas.
- Consolidar los avances alcanzados en el Censo Agropecuario Nacional y la actualización cartográfica, asegurando el cierre administrativo y técnico de ambas actividades, y aprovechar la experiencia adquirida para fortalecer la planificación y preparación del Censo Nacional de Población y Vivienda previsto para 2026.

Anexo No. 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública – Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
104	Inversión Productiva		-	372,466,010	372,466,010	-	372,466,010	372,466,010	-	109,321,070	109,321,070	29.4%	-	144,227,526	144,227,526	38.7%
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas			372,466,010	372,466,010		372,466,010	372,466,010		109,321,070	109,321,070	29.4%		144,227,526	144,227,526	38.7%
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	5832/BL-HO		372,466,010	372,466,010		372,466,010	372,466,010		109,321,070	109,321,070	29.4%		144,227,526	144,227,526	38.7%
	Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FOR			372,466,010	372,466,010		372,466,010	372,466,010		109,321,070	109,321,070	29.4%		144,227,526	144,227,526	38.7%
	Formación Bruta de Capital		798,000	-	798,000	1,300,000	-	1,300,000	613,675	-	613,675	47.2%	812,585	-	812,585	62.5%
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		798,000	-	798,000	1,300,000	-	1,300,000	613,675	-	613,675	47.2%	812,585	-	812,585	62.5%
	CENSO RED SOLIDARIA		48,000		48,000	50,000		50,000	47,604		47,604	95.2%	47,604		47,604	95.2%
	Total CENSO RED SOLIDARIA		48,000		48,000	50,000		50,000	47,604		47,604	95.2%	47,604		47,604	95.2%
	CONVENIO COSUCOOP		-		-	500,000		500,000	76,067		76,067	15.2%	76,067		76,067	15.2%
	Total CONVENIO COSUCOOP		-		-	500,000		500,000	76,067		76,067	15.2%	76,067		76,067	15.2%
	DIRECCION Y COORDINACION		750,000	-	750,000	257,725	-	257,725	-	-	-	0.0%	198,910	-	198,910	77.2%
	Total DIRECCION Y COORDINACION		750,000	-	750,000	257,725	-	257,725	-	-	-	0.0%	198,910	-	198,910	77.2%
	ONU-MUJERES		-		-	492,275		492,275	490,004		490,004	99.5%	490,004		490,004	99.5%
	Total ONU-MUJERES		-		-	492,275		492,275	490,004		490,004	99.5%	490,004		490,004	99.5%
	Total general		798,000	372,466,010	373,264,010	1,300,000	372,466,010	373,766,010	613,675	109,321,070	109,934,744	29.4%	812,585	144,227,526	145,040,111	38.8%

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2025.

Anexo No. 2
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional	Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	Boleta	1	1	100.0%	1	1	100.0%
		Levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda	Censo	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		Prueba piloto experimental realizada	Prueba Piloto	1	1	100.0%	1	1	100.0%
		Actualización cartográfica segmentación municipios	Municipios	295	295	100.0%	295	295	100.0%
		Levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN)	Municipios	143	143	100.0%	143	143	100.0%
		Análisis de datos censales	Informe	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		Difusión de información de la población censada	Informe	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		Evaluación postcensal	Evaluación	0	0	0.0%	0	0	0.0%

Fuente: Unidad Ejecutora, al 30 de septiembre de 2025.
