

Informe de Avance Físico y Financiero al III Trimestre 2025

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios; así como diversificar la oferta de los productos de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	4,822,737,910
Inversión Productiva	2,297,071,078
Inversión Social	2,488,088,493
Formación Bruta de Capital	37,578,339
Presupuesto Vigente	4,292,447,897
Inversión Productiva	1,633,400,265
Inversión Social	2,450,000,000
Formación Bruta de Capital	209,047,632
Ejecutado III Trimestre	1,374,105,309
Inversión Productiva	384,227,274
Inversión Social	987,500,000
Formación Bruta de Capital	2,378,035
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	32.0%
Ejecutado Anual	3,085,855,560
Inversión Productiva	645,977,526
Inversión Social	2,437,500,000
Formación Bruta de Capital	2,378,035
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	71.9%


Nota: SIAFI, 30/09/2025

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agrícola, mediante el fortalecimiento de la producción agropecuaria y agroindustrial; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y Social. Para lo cual en el 2025 mediante la Inversión Productiva se desarrollan 8 proyectos de inversión, para lo cual se cuenta con un presupuesto aprobado para inversión productiva de L2,297.1 millones con lo cual se están ejecutando 50 Planes de fortalecimiento organizacional, aprobación de 107 Becas a jóvenes rurales a realizar a través del **proyecto PROINORTE**; 135 Planes de Negocios con enfoque de cadena de valor implementados, 50 Planes de inversión con adopción de tecnologías Climáticamente inteligentes (CI), 400 Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, 5 Planes de manejo de microcuencas implementados bajo el proyecto **PROOCCIDENTE**; 134 Planes de Negocios financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia a través del proyecto **COMRURAL II**, 30 Planes de Negocios identificados/Ventana 1 Agricultura en Subsistencia por medio del proyecto **COMRURAL III**. Por su parte, en los proyectos de seguridad hídrica, se tiene programado la entrega de 4 diseños finales de sistemas integrales de agua segura (SIAS), 4 estudios de evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales, y para el proyecto de Agua Urbana se tiene programada la ejecución física de un 35% en la rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable.

Al tercer trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L4,292.45 millones; de los cuales L1,633.40 millones corresponden a Inversión productiva; L2,450.00 millones para la Inversión Social para el desarrollo de programas de gran importancia para el país

como ser el Bono Ganadero, Bono Cafetalero y Bono Tecnológico y L209.05 millones para la formación bruta de capital. La ejecución presupuestaria del trimestre asciende a L1,374.11 millones que representan el 71.9% con relación al presupuesto vigente, la cual se incrementa mayormente debido a la ejecución del 99.5% correspondiente a la Inversión Social tal como se detalla en el Cuadro No.1.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

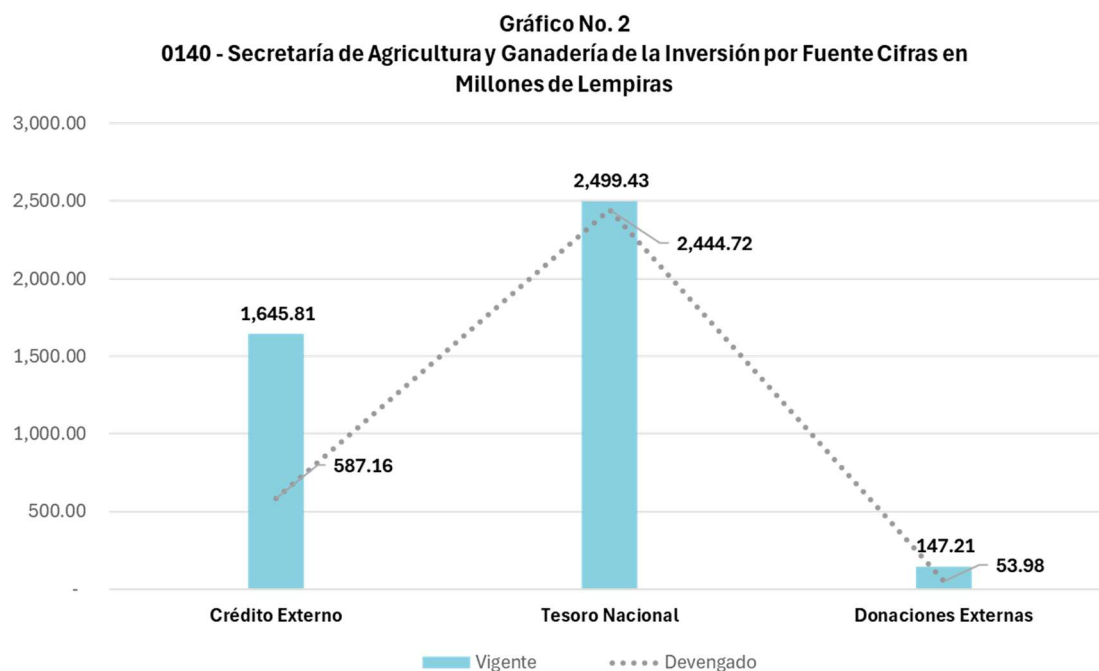

El Presupuesto Vigente de la SAG es financiado en un **58% (L2,499.43 millones)** por Fondos Nacionales (Fuente de Tesoro Nacional, Recursos Propios y Donaciones Internas); **38% (L1,645.81 millones)** de Crédito Externo, proveniente de préstamos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y por organismos varios como ser Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), OPEC, FIDA y ESPAÑA.

El **3% (L147.21 millones)** restante, corresponde a Donaciones Externas, las cuales son financiadas mayormente por el BM.

c. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2023-2025):

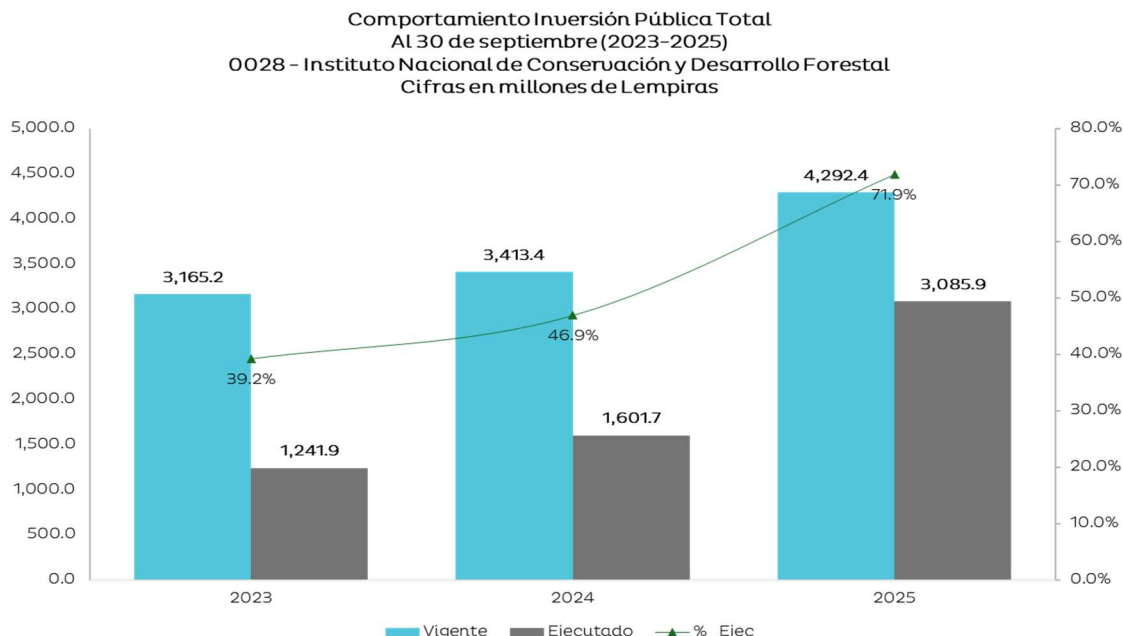

En el periodo 2023-2025, mediante el Programa de Inversiones Públicas en el cual se experimentó cambio de organismo ejecutor de INVEST-H a la SAG producto del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, se han realizado acciones para mejorar la operatividad del Sector Agroalimentario para incrementar las inversiones productivas que han sido financiadas por fondos nacionales y fondos externos, se han venido ejecutando diferentes proyectos tales como: 1) Alianza para el corredor seco, 2) Proyecto de Competitividad Rural II, 3) Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA, 5) Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), 6) Proyecto de Inclusión Económica y Social De Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras PROINORTE, 7) Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, y 8) Proyecto de Competitividad Rural III.

Actualmente y de acuerdo con el análisis comparativo detallado al tercer trimestre de los periodos del 2023-2025, se observa que en el presente año la SAG ha incremento su capacidad de ejecución en relación con los años anteriores. A pesar de dicho incremento la SAG aún debe mejorar sus niveles de ejecución, debido a que el 71.9% de ejecución corresponde mayormente a la ejecución de 99.5% de los recursos asignados a la Inversión Social; no obstante la inversión Productiva debe mejorar la planeación y programación de actividades en momentos claves con el propósito de que los proyectos puedan cumplir con sus metas y objetivos dentro de los plazos establecidos así como la ejecución presupuestaria de acuerdo a sus POA.

d. Principales Proyectos

Al tercer trimestre del 2025 la inversión productiva alcanzó una ejecución del 39.5% respecto al presupuesto vigente, siendo los proyectos que reportan mayor ejecución presupuestaria respecto a su presupuesto vigente el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL III) 60.8%, Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana 42.4%, Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) 34.7%, y el Proyecto Integral De Desarrollo Rural y Productividad 31.3%. En cuanto al resto de proyectos, los mismos poseen ejecuciones presupuestarias que oscilan entre el 16.3% y el 28.1%.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de proyectos:

1. Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL III)

Tiene como objetivo Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible.

Los principales avances físicos al tercer trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	6347	504	8%	20	0	0%
Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	20	14	70%	8	14	175%
Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	30	0	0%	0	0	0%
Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	27	22	81%	22	22	100%
Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	5	5	100%	5	5	100%
Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	5	0	0%	0	0	0%

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	30	0	0%	0	0	0%
Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	30	0	0%	0	0	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al tercer trimestre 2025, informe al primer trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

En seguimiento a la circular DGIP-01-2025 la SAG presentó la programación física y financiera a ejecutar en el año 2025; en la cual inicialmente el equipo técnico del proyecto indicó que para la gestión 2025 se realizarían 30 Planes de Negocios (PNs) identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia, 15 PNs para Ventana 2. Agricultura en Transición, 5 PNs en Ventana 3. Agricultura Comercial, 5 PNs en Ventana 4. Servicios Agro-logísticos, 30 Subproyectos agro-costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica y 30 Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica.

Por lo antes expuesto, y en concordancia con lo indicado al por la Unidad Ejecutora del Proyecto de SAG, al **tercer trimestre** en su informe trimestral indican que se están realizando avances en los procesos de contrataciones de las Firmas Consultoras Implementadoras (FCI) de Ventana 1. Agricultura en Subsistencia y Ventana 4. Servicios Agro-logísticos; las cuales se encuentran en evaluación de expresiones de interés.

Ante lo indicado y debido a que aún no se ha contratado las FCI de ventana 1, ventana 4 y la FCI de la Moskitia, la unidad ejecutora ha reprogramado las metas correspondientes para el año 2026 debido a los tiempos que lleva la contratación de las FCI. A pesar de que al año 2025 no se estarán realizando las actividades antes detalladas, en cuanto a la ventana 2 y ventana 3 actualmente se han realizado 4 Comités Directivos (CDs) de los cuales se ha ratificado y aprobado un total de 32PNs (27 PNs Ventana 2. Agricultura en Transición y 5 PNs Ventana 3. Agricultura Comercial). De estos 14 PNs se han desembolsado y se encuentran en implementación.

En cuanto a la ejecución presupuestaria al tercer trimestre del 2025, la misma fue de 43.1% y del 60.8% acumulada, la cual corresponde a las actividades para la implementación del proyecto, gasto operativo, transferencias realizadas a los planes de negocios que se encuentran en

implementación y a las capacitaciones en las diferentes regionales del proyecto y seguimiento.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Competitividad Rural (COMRURAL III):

Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)		IDA-6917-HN	US\$	108,500,000	30/12/2022 30/12/2027
			Lempiras	2,843,654,800	
	Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución	
III Trimestre 2025	L385,747,927	L325,956,551	L140,465,016	43.1	
Acumulado 2025	L385,747,927	L325,956,551	L198,049,363	60.8	
Acumulado Vida del Proyecto */	L2,843,654,800	L2,843,654,800	L200,077,057	7.0	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

2. Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)

Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

Los principales avances al tercer trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
		Prog.	Eje c.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Planes de Negocios Implementados financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Plan de Negocios	134	126	94%	92	126	137%
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs).	Transferencia Monetaria	-	-	-	L33,498,781.0	L17,297,843.42	52%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al tercer trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

En cuanto a lo detallado en el cuadro de Principales Metas Físicas y de acuerdo con lo expresado por la unidad ejecutora en su Informe Trimestral, las metas para Ventana 2, no se seguirán reportando Transferencias No Reembolsables (TNR's) ya que el proyecto se encuentra en proceso de cierre y en el caso de Ventana 1, se reportará una vez que la FCI SWISSCONTACT finalice procesos de adquisiciones los cuales funciona bajo la modalidad de reembolso.

En atención a la circular DGIP-01-2025, de fecha 17 de febrero del 2025, la Unidad Ejecutora del proyecto manifestó que su ejecución presupuestaria 2025 será de L472,892,540.69 por lo que en el transcurso del año será necesario considerar los momentos oportunos para realizar las modificaciones presupuestarias para las incorporaciones que se requieran siempre que la ejecución se vea reflejada de manera positiva. En cuanto a la ejecución física, la Unidad Ejecutora (UE) del proyecto indicó que para el año 2025 se atenderán 3,408 Beneficiarios que participan en planes de negocio financiados por el proyecto, 134 Planes de Negocios (PNs) financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia.

Al respecto, en el tercer trimestre, de acuerdo con lo indicado en el informe de ejecución física y financiera presentada por la SAG, manifiesta que el proyecto COMRURAL II-IDA6448, no cuenta con ejecución física; manteniendo las actividades del segundo trimestre, correspondiente a procesos de adquisiciones como ser la Enmienda de SWISSCONTACT, la cual beneficiará alrededor de 900 productores a través de 40 PNs adicionales y la Encuesta de Nivel de Satisfacción de los beneficiarios por los servicios de asistencia técnica y financiera; procesos de comunicación y consulta sobre los planes de negocio diseñados e implementados y Mecanismo de Quejas y Reclamos, en el marco del proyecto, focalizado en la Ventana 2; procesos Firma Consultora de Evaluación de Cierre y Consultoría Adopción de Buenas Prácticas Agrícolas Mejoradas 2 meses después de finalizado el PNs.

Por otra parte, la ejecución presupuestaria del 2025 al cierre del III Trimestre alcanzó el 34.71%, la baja ejecución se debe a retrasos en procesos de adquisiciones vinculados al componente II del proyecto, así como retrasos en los procesos de implementación vinculados a la Ventana 1 del Proyecto a través de la Firma Implementadora contratada para tal fin.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) al segundo trimestre 2025:



Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)		IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	04/05/2020 30/06/2026
			Lempiras	1,965,660,000	
	Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución	
III Trimestre 2025	L407,134,799	L247,145,576	L28,610,041	11.6	
Acumulado 2025	L407,134,799	L247,145,576	L85,791,105	34.7	
Acumulado Vida del Proyecto */	L1,965,660,000	L1,965,660,000	L665,009,241	33.8	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

Tiene como objetivo Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH) y el Objetivo Específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Los principales avances físicos al tercer trimestre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	50	0	0%	50	25	50%
(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	74	148%	30	44	147%
(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	400	230	58%	0	0	0%



Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
(PI) Planes de asistencia técnica por rubro de producción aprobados.	Planes de Asistencia	5	2	40%	5	2	40%
(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	5	0	0%	5	2	40%
(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	5	0	0%	0	0	0%
(PF) Desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores rurales a través de BANHPROVI	Millones	100	0	0%	0	0	0%
(PI) Monto en Lempiras Transferidos	Millones	50	91	182%	50	91	182%
(PF) Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.	Porcentaje	50	0	0%	0	0	0%
(PI) Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión completa) evaluado y aprobado	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al tercer trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

En atención a la circular DGIP-01-2025 la SAG presentó la programación física y financiera a ejecutar en el año 2025; de acuerdo con el Informe presentado al Tercer Trimestre en el proyecto se han beneficiado a 81 productores de 25 grupos productivos (Planes de Negocios) en seis (6) departamentos y veinte y tres (23) municipios, que han recibido Tecnologías climáticamente Inteligentes (TCI); además de haber estado recibiendo por un año, asistencia técnica en los temas de producción y mercado, gestión de crédito y nutrición; Por parte de la firma sub implementadora del componente No 1, se formularon 44 planes de inversión que han sido revisados y aprobados por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), 581 productores se han beneficiado de asistencia técnica en producción y mercado, gestión de crédito y nutrición.

Aunado a las actividades físicas realizadas en cuanto al manejo y conservación de microcuencas, se han implementado dos (2) planes de manejo y conservación de las cuencas: MIC-Rio Coalaca Mancomunidad COLOSUCA y MIC-2 Quebrada San Antonio, Mancomunidad MAMSURPAZ.

Adicionalmente también se han realizado actividades administrativas y de implementación relacionadas a la firma del contrato SAG-Firma sub implementadora ACDI-VOCA, con el objetivo de implementar la etapa I-B del Componente 1. Fortalecimiento del Desarrollo Productivo y los fondos en donación para implementar el proyecto y beneficiar de forma directa a más de 4,000 productores de la zona de intervención del proyecto. Elaboración de Términos de Referencia (TdR) para desarrollar una consultoría individual que permita realizar un diagnóstico institucional de las necesidades de la SAG relacionadas a los temas de Monitoreo & Evaluación. Se Prepararon acciones para el cierre de la etapa IA, mediante la cual se consolidará la implementación de 999 tecnologías climáticamente inteligentes y más de 4,000 productores que estarán certificados en los temas brindados en la asistencia técnica integral.

En cuanto a la ejecución presupuestaria según SIAFI, al tercer trimestre 2025 se ejecutó el 31.31% (L162,118,078) respecto al presupuesto vigente de L517,841,947.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 2025:

Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.		BID 4936/BL-HO BID 4940/BL-HO FONPRODE GRT/WE-20251-HO	US\$	91,400,000	21/05/2020 21/07/2027
			Lempiras	2,395,484,320	
	Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución	
III Trimestre 2025	L370,431,660	L517,841,947	L8,123,593	1.6	
Acumulado 2025	L370,431,660	L517,841,947	L162,118,078	31.3	
Acumulado Vida del Proyecto */	L2,395,484,320	L2,395,484,320	L575,375,724	24.0	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1 Principales Adquisiciones III Trimestre 2025

A continuación, se detallan los procesos de adquisición realizados en el III Trimestre.

Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.

Contratación del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Puerto Cortés; Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de La Paz; Subproyectos Obras de Rehabilitación Sistemas de Agua Potable en Choloma en Cortes y Danlí en El Paraíso. LOTE1, Subproyectos Obras de Rehabilitación Sistemas de Agua Potable Choloma, Cortes y Danlí, El Paraíso. LOTE2, Subproyectos Obras de Rehabilitación Sistemas de Agua Potable Choloma, Cortes y Danlí, El Paraíso. LOTE3

Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad.

Firma de contrato Etapa IB con firma sub implementadora y Servicios Eventuales, y en proceso de contratación Remodelación de Oficinas Regionales, Ciudad de La Esperanza. No obstante, 3 procesos fueron declarados fracasados por lo que la unidad ejecutora relanzará los procesos.

COMRURAL III.

Proceso de presentación de expresiones de interés, Firma Consultora de Evaluación de Cierre y Firma Consultora para levantamiento de encuesta de agricultores que continúan practicando una tecnología agrícola mejorada dos meses después de su implementación del PN.

Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.

Contratación de especialistas de la unidad ejecutora, Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional, Especialista en Agua Potable y Saneamiento, Especialista en Gestión Financiera, Especialista en Género e Inclusión Social.

d.2 Programas Sociales

La SAG posee un presupuesto vigente para programas sociales de L2,450.00 millones de los cuales al Tercer Trimestre se ha ejecutado el 99.5% equivalente a L2,437.50 para el desarrollo tres programas sociales de gran importancia:

Bono Cafetalero: Mediante este programa se desarrolla la Fertilización (L350.00 millones), la cual apoya a los pequeños y medianos productores de café en el fortalecimiento de la producción, brindando apoyo en la fertilización de fincas, renovación de áreas, asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades y generación de valor agregado en fincas.

Bono Ganadero (L368.00 millones): Se desarrolla con el objetivo de fomentar un incremento sostenible y significativo en la producción de carne y leche por parte de los pequeños y medianos productores ganaderos a nivel nacional, los cuales se lograrán por medio de la ejecución de 4 componentes: 1) Fortalecimiento Inclusivo y Participativo en la Producción de Alimento en Ganado, 2) Componente Fomento a la industrialización de la cadena de procesamiento, 3) Extensión Agrícola y 4) Fomento a las Cadenas Pecuarias.

Bono Tecnológico Productivo (L1,732.00 millones): Programa presidencial con orientación en productos de la canasta básica al beneficio de Pequeños Productores de Subsistencia que se encuentran bajo la franja de pobreza y pobreza extrema.

Es importante mencionar que la SAG no proporcionó a la DGIP el informe correspondiente a la ejecución de la Inversión Social. Las cifras detalladas fueron generadas del SIAFI al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal vigente.

e. Gestión de la Inversión

- Autorización de modificaciones presupuestarias de Traslados entre objetos de gasto 2000, 3000, entre categorías de proyectos con ERP.
- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
- Acompañamiento constante durante la ejecución de los proyectos.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

Problemáticas:

- Dilatación de los procesos de adquisiciones y contrataciones.
- Procesos de Contratación fracasados.
- Tardanza en la revisión y emisión de Dictámenes Legales por parte de la Dirección de Servicios Legales de la SAG, relacionados con contratos, acuerdos y convenidos que deben formalizarse en el marco del Proyecto.

Acciones:

III Trimestre 2025

- la SAG deberá desarrollar acciones respecto a los procesos de adquisición para que la firma de estos sea más ágil.

V. Conclusiones

- De acuerdo con lo reportado en los informes de la SAG al tercer trimestre no se han desarrollado acciones correctivas a las problemáticas mencionadas debido a que estas se mantienen respecto a lo detallado en los Informes del Primer y Segundo Trimestre del 2025.
- El tiempo de ejecución de los proyectos se verá afectado por los retrasos en los procesos de contratación y a los declarados fracasados.

VI. Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- La SAG debe de definir una estrategia para acelerar los procesos correspondientes a adquisiciones y contratación de personal.
- Los Organismos Financiadores, SEFIN y SAG deben tomar una decisión respecto a los proyectos que presentan avances con mayor ejecución en tiempo y no en presupuesto y cumplimiento de alcances (metas físicas).



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO

Anexo Financiero al III Trimestre 2025.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado						
No. Proyecto	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
104	Inversión Productiva		30,546,778	2,266,524,300	2,297,071,078	30,546,778	1,602,853,487	1,633,400,265	2,771,781	381,455,493	384,227,274	23.5%	4,837,813	641,139,713	645,977,526	39.5%	5,701,813	702,953,147	708,654,959	43.4%
9	0140- Secretaría de Agricultura y Ganadería		30,546,778	2,266,524,300	2,297,071,078	30,546,778	1,602,853,487	1,633,400,265	2,771,781	381,455,493	384,227,274	23.5%	4,837,813	641,139,713	645,977,526	39.5%	5,701,813	702,953,147	708,654,959	43.4%
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	TF017904								7,227	7,227	0.0%	1,450,325	1,450,325	1,450,325	0.0%	1,450,325	1,450,325	1,450,325	0.0%
	TF066211-HN		13,156,550	13,156,550		63,136,550	63,136,550		-	1,328,342	1,328,342	-2.1%	50,221,932	50,221,932	50,221,932	79.5%	50,845,628	50,845,628	50,845,628	80.5%
	Total ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)		13,156,550	13,156,550		63,136,550	63,136,550		-	1,321,115	1,321,115	-2.1%	51,672,257	51,672,257	51,672,257	81.8%	52,295,953	52,295,953	52,295,953	82.8%
	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN	261,933,300	261,933,300		255,378,500	255,378,500		139,123,456	139,123,456	54.5%	195,741,710	195,741,710	76.6%	201,443,961	201,443,961	201,443,961	78.9%		
	TF0C1874		123,814,627	123,814,627		70,578,051	70,578,051		1,341,560	1,341,560	1.9%	2,307,653	2,307,653	3.3%	3,109,170	3,109,170	3,109,170	4.4%		
	Total COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)		385,747,927	385,747,927		325,956,551	325,956,551		140,465,016	140,465,016	43.1%	198,049,363	198,049,363	60.8%	204,553,131	204,553,131	204,553,131	62.8%		
3	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL NORTE CENTRO DE HONDURAS (INNOVASI)	TF0C1874		50,000,000	50,000,000		-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS		50,000,000	50,000,000		-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
4	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA-6696-HN	316,773,339	316,773,339		154,980,330	154,980,330		52,646,872	52,646,872	34.0%	65,690,037	65,690,037	42.4%	74,471,752	74,471,752	74,471,752	48.1%		
	Total Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)		316,773,339	316,773,339		154,980,330	154,980,330		52,646,872	52,646,872	34.0%	65,690,037	65,690,037	42.4%	74,471,752	74,471,752	74,471,752	48.1%		
5	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	407,134,799	407,134,799		247,145,576	247,145,576		28,610,041	28,610,041	11.6%	85,791,105	85,791,105	34.7%	102,688,271	102,688,271	102,688,271	41.5%		
	Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) (Tipo de proyecto: Inversión Pública)		407,134,799	407,134,799		247,145,576	247,145,576		28,610,041	28,610,041	11.6%	85,791,105	85,791,105	34.7%	102,688,271	102,688,271	102,688,271	41.5%		
6	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAO RIEGO (POABRI)	BCIE-2101	690,798	160,570,951	161,261,749	12,248,418	52,827,339	65,075,757	40,999	8,280,608	8,321,607	12.8%	42,233	10,557,999	10,600,232	16.3%	42,233	10,557,999	10,600,232	16.3%
	Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAO RIEGO (POABRI)		690,798	160,570,951	161,261,749	12,248,418	52,827,339	65,075,757	40,999	8,280,608	8,321,607	12.8%	42,233	10,557,999	10,600,232	16.3%	42,233	10,557,999	10,600,232	16.3%
7	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NOROESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	2000002595	15,730,000	156,580,465	172,310,465	15,730,000	85,032,707	100,762,707	2,730,782	10,389,162	13,119,944	13.0%	4,795,579	23,795,930	28,591,509	28.4%	5,659,579	28,367,007	34,026,586	33.8%
	LOAN No. 13754P		10,669,808	10,669,808		83,687,010	83,687,010		15,130,670	16,330,670	19.3%		22,471,415	22,471,415	26.9%		22,546,815	22,546,815	26.9%	
	Total PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES		15,730,000	167,250,273	182,980,273	15,730,000	168,719,717	184,449,717	2,730,782	26,519,832	29,250,614	15.9%	4,795,579	46,269,345	51,064,924	27.7%	5,659,579	50,913,822	56,573,401	30.7%
8	PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	14,125,980	395,458,801	409,584,781	2,568,360	72,245,477	74,811,837	-	10,209,027	10,209,027	13.6%	-	20,991,530	20,991,530	28.1%	-	41,528,594	41,528,594	55.5%
	Total PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		14,125,980	395,458,801	409,584,781	2,568,360	72,245,477	74,811,837	-	10,209,027	10,209,027	13.6%	-	20,991,530	20,991,530	28.1%	-	41,528,594	41,528,594	55.5%
9	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/RL-HO	1,000,000		1,000,000	103,419,300	103,419,300					0.0%				0.0%				0.0%
	4940/RL-HO		80,250,821	80,250,821		155,815,108	155,815,108		24,262,263	24,262,263	15.6%		70,335,128	70,335,128	45.1%		74,160,676	74,160,676	47.6%	
	GR71WE-20251-HO		13,500,000	13,500,000		13,500,000	13,500,000					0.0%				0.0%				0.0%
	ICO-FONPRODE		275,680,839	275,680,839		245,107,639	245,107,639		91,782,950	91,782,950	37.4%		91,782,950	91,782,950	37.4%		91,782,950	91,782,950	37.4%	
	Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		370,431,660	370,431,660		517,841,947	517,841,947		116,045,213	116,045,213	22.4%		162,118,078	162,118,078	31.3%		165,943,626	165,943,626	32.0%	
	Inversión Social		2,488,088,493		2,488,088,493	2,450,000,000	2,450,000,000	987,500,000		987,500,000	40.3%	2,437,500,000	2,437,500,000	99.5%	2,437,500,000	2,437,500,000	99.5%	2,437,500,000	2,437,500,000	99.5%
	0140- Secretaría de Agricultura y Ganadería		2,488,088,493		2,488,088,493	2,450,000,000	2,450,000,000	987,500,000		987,500,000	40.3%	2,437,500,000	2,437,500,000	99.5%	2,437,500,000	2,437,500,000	99.5%	2,437,500,000	2,437,500,000	99.5%
	BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES		388,088,493		388,088,493	350,000,000	350,000,000	-	-	-	0.0%	350,000,000	350,000,000	100.0%	350,000,000	350,000,000	100.0%	350,000,000	350,000,000	100.0%
	Total BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRO		388,088,493		388,088,493	350,000,000	350,000,000	-	-	-	0.0%	350,000,000	350,000,000	100.0%	350,000,000	350,000,000	100.0%	350,000,000	350,000,000	100.0%
	BONO GANADERO		100,000,000		100,000,000	368,000,000	368,000,000	268,000,000		268,000,000	72.8%	368,000,000	368,000,000	100.0%	368,000,000	368,000,000	100.0%	368,000,000	368,000,000	100.0%
	Total BONO GANADERO		100,000,000		100,000,000	368,000,000	368,000,000	268,000,000		268,000,000	72.8%	368,000,000	368,000,000	100.0%	368,000,000	368,000,000	100.0%	368,000,000	368,000,000	100.0%
	BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		2,000,000,000		2,000,000,000	1,732,000,000	1,732,000,000	719,500,000		719,500,000	41.5%	1,719,500,000	1,719,500,000	99.3%	1,719,500,000	1,719,500,000	99.3%	1,719,500,000	1,719,500,000	99.3%
	Total BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		2,000,000,000		2,000,000,000	1,732,000,000	1,732,000,000	719,500,000		719,500,000	41.5%	1,719,500,000	1,719,500,000	99.3%	1,719,500,000	1,719,500,000	99.3%	1,719,500,000	1,719,500,000	99.3%
	Formación Bruta de Capital		10,110,633	27,467,706	37,578,339	18,880,315	190,167,317	209,047,632	2,378,035	-	2,378,035	1.1%	2,378,035	-	2,378,035	1.1%	8,050,845	-	8,050,845	3.9%
	0140- Secretaría de Agricultura y Ganadería		10,110,633	27,467,706	37,578,339	18,880,315	190,167,317	209,047,632	2,378,035	-	2,378,035	1.1%	2,378,035	-	2,378,035	1.1%	8,050,845	-	8,050,845	3.9%
	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA		-	-	-	110,118	110,118		-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
			-	-	-	110,118	110,118		-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA		100,000		100,000	100,000	100,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
	Total DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA		100,000		100,000	100,000	100,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,547,044		4,547,044	5,758,107	5,758,107	2,060,017		2,060,017	35.8%	2,060,017	2,060,017	35.8%	4,778,026	4,778,026	83.0%	4,778,026	4,778,026	83.0%
	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,547,044		4,547,044	5,758,107	5,758,107	2,060,017		2,060,017	35.8%	2,060,017	2,060,017	35.8%	4,778,026	4,778,026	83.0%	4,778,026	4,778,026	83.0%
	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA		337,589		337,589	440,895	440,895	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	32,085	32,085	7.3%	32,085	7.3%
	Total FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA		337,589		337,589	440,895	440,895	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	32,085	32,085	7.3%	32,085	7.3%
	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA		1,775,000		1,775,000	400,000	400,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
			1,775,000		1,775,000	400,000	400,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
	Total FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA		1,775,000		1,775,000	400,000	400,000	-	-	-										

Anexo Físico al III Trimestre 2025.

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025								
Institución/Proyecto	Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería								
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	Productores y productoras organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	6347	504	8%	20	0	0%
	Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negcios	20	14	70%	8	14	175%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	30	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	27	22	81%	22	22	100%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	5	5	100%	5	5	100%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agrológicos	Planes de Negocios	5	0	0%	0	0	0%
	Subproyectos agrocosteros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	30	0	0%	0	0	0%
	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	30	0	0%	0	0	0%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	Planes de Negocios Implimentados financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Plan de Negocios	134	126	94%	92	126	137%
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs).	Transferencia Monetaria	-	-		L 33,498,781.00	L 17,297,843.42	52%
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	Número de productores (as) rurales organizados mejoran su productividad y competitividad, incrementando sus ingresos y asegurando su seguridad alimentaria.	304 PRODUCTOR	6,366	1434	23%	0	0	0%
	Número de planes de negocio implementados	582 PLAN DE NEGOCIO	50	12	24%	25	8	32%
	Número de planes de negocio aprobados	582 PLAN DE NEGOCIO	50	36	72%	25	7	28%
	Número de asistencia técnica brindadas	992 ASISTENCIA TÉCNICA	50	50	100%	50	26	52%
	Evento intercambio de experiencias (procesos de aprendizaje) desarrollados con organizaciones de productores rurales de las comunidades del Valle de Aguan.	39 EVENTO	3	0	0%	0	0	0%
	Planes de fortalecimiento organizacional implementados por Organizaciones usuarias	264 PLAN	50	34	68%	10	0	0%
	Número de organizaciones usuarias con financiamiento otorgado	300 ORGANIZACION	50	12	24%	25	8	32%
	Número de campañas de concientización y buenas prácticas diseñadas	130 CAMPAÑA	9	9	100%	3	3	100%
	Servicios financieros innovadores otorgados a jóvenes y cajas rurales en las comunidades del Valle de Aguan	494 SERVICIO	5	-	-	1.00	-	-
	Número de becas aprobadas	13 BECA	96	0	0%	30	0	0%
	Número de cajas rurales con financiamiento otorgado	288 CAJA RURAL	60	0	0%	20	0	0%
	Capacitaciones en educación financiera brindadas a productores(as) que integran las cajas rurales	1039 TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0%	-	-	0%
	Número de planes de inserción en servicios ecosistémicos implementados	264 PLAN	5	0	0%	0		0%
	Número de planes de inserción en servicios ecosistémicos aprobados	264 PLAN	5	2	40%	2	0	0%
	Capacitaciones en el tema ambiental climática brindadas.	1039 TALLERE DE CAPACITACION	1	0	0%	1	0	0%
	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PI) Planes de inserción con adopción de tecnologías CI (Climáticamente Inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de Inersión	50	0	0%	50	25
(PI) Planes de inserción con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).		Planes de Inersión	50	74	148%	30	44	147%
(PI) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.		Asistencias	400	230	58%	0	0	0%
(PI) Planes de asistencia técnica por rubro de producción aprobados.		Planes de Asistencia	5	2	40%	5	2	40%
(PI) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.		Planes de manejo de microcuencas	5	0	0%	5	2	40%
(PI) Planes de manejo de microcuencana aprobados por el ICJ.		Planes de manejo de microcuencas	5	0	0%	0	0	0%
(PI) Desembolsos para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores rurales a través de BANUSURY.		Milones	100	0	0%	0	0	0%
(PI) Monto en Lempiros Transferidos		Milones	50	91	182%	50	91	182%
(PI) Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.		Porcentaje	50	0	0%	0	0	0%
(PI) Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión completa) evaluado y aprobado		Porcentaje	100	0	0%	0	0	0%

Principales Metas Físicas, III Trimestre-2025								
Institución/Proyecto	Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
0140 – Secretaría de Agricultura y Ganadería								
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Informe Final de Auditoría Finaciera del Proyecto PROSASUR aprobados por la SAG	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Informes finales de cierre del proyecto PROSASUR, aprobado por el organismo financiador y máxima autoridad de la SAG.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Informe de cierre del Fondo Original Remanente del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Diseños Finales de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes; La Venta; La Paz; y Curarén.	DISEÑO	4	0	0%	2	0	0%
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados	ESTUDIO	4	0	0%	2	0	0%
	Rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua potable de los municipios de Nacaome y San Lorenzo	PORCENTAJE	0	0	0%	0	0	0%
	Instrumentos para la Gestión Integral Recursos Hídricos (GIRH) elaborados en beneficio de la población. (Propuesta de la Política Nacional de GIRH y Propuesta de Reglamento de Aguas Subterráneas).	PROPUESTA TECNICA	2	0	0%	0	0	0%
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado	PORCENTAJE	1	0	0%	0	0	0%
	Talleres participativos de consulta con actores estratégicos	Talleres	3	2	67%	2	2	100%
