



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

AL IV TRIMESTRE 2025

*Instituto Nacional De  
Estadísticas (INE)*

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Instituto Nacional de Estadística (INE), es una entidad gubernamental encargada de coordinar y regular el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Fue fundado en el año 2000, el INE tiene como mandato recolectar, analizar y difundir datos estadísticos confiables que reflejen la realidad nacional, apoyando así la planificación y toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. Entre sus principales objetivos, el INE se enfoca en asegurar la calidad y

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>373,264,010</b>
Inversión Productiva	372,466,010
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	798,000
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>261,941,172</b>
Inversión Productiva	260,641,172
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	1,300,000
<b>Ejecutado IV Trimestre</b>	<b>36,191,871</b>
Inversión Productiva	35,726,505
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	465,366
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim- 2024/Vigente)</b>	<b>13.8%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>181,231,981</b>
Inversión Productiva	179,954,031
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	1,277,950
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>69.2%</b>

Nota: SIAFI, 31/12/2025

accesibilidad de las estadísticas oficiales, promover una cultura estadística en la sociedad, optimizar recursos mediante la coordinación de actividades estadísticas y fomentar la capacitación e investigación en esta área.

Al IV trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de L261.9 millones para la ejecución de programas y proyectos. La ejecución acumulada fue de L181.2 millones (69.2% del presupuesto vigente), tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

### b. Financiamiento de la Inversión Pública


El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) financia sus programas y



proyectos principalmente a través de dos fuentes de financiamiento: Recursos Propios y Crédito Externo.

El presupuesto vigente con el que contó la institución fue de L261.9 millones, la fuente de Crédito Externo representa la fuente principal de financiamiento con una asignación de L260.6 millones mientras que los Recursos Propios suman L1.3 millones.

**Gráfico No. 01**  
**Instituto Nacional de Estadísticas: Inversión por Fuente de Financiamiento**  
Cifras en millones de Lempiras

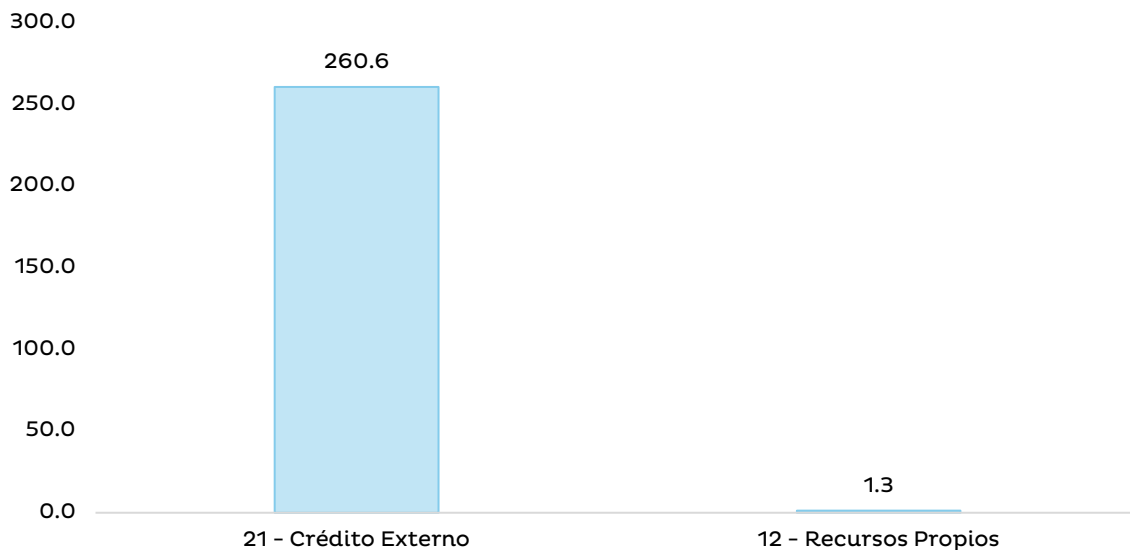

### **c. Comportamiento de la Ejecución al IV trimestre (2021-2025)**

A continuación, se analiza el comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado del INE entre 2021 y 2025:


- Entre 2021 y 2022, el INE contó con presupuestos muy limitados (L0.8 millones anuales), destinados principalmente a actividades técnicas menores, lo que se reflejó en niveles de ejecución bajos, especialmente en 2022, donde solo se ejecutó L0.2 millones.
- En 2023, el presupuesto vigente se incrementó a L26.5 millones; sin embargo, la ejecución alcanzó únicamente L11.1 millones, evidenciando limitaciones en la capacidad de ejecución durante el período.



- En 2024, el presupuesto tuvo un aumento significativo, alcanzando L241.8 millones, asociado principalmente a la preparación de censos nacionales estratégicos. No obstante, la ejecución fue mínima (L0.9 millones), lo que representa un porcentaje muy bajo respecto al presupuesto vigente.
- Para 2025, el presupuesto vigente ascendió a L261.9 millones, de los cuales se han ejecutado L181.2 millones, reflejando una mejora sustancial en la ejecución presupuestaria en comparación con años anteriores.

En el marco del esfuerzo del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, que ha promovido una ejecución histórica de inversión pública y políticas orientadas al desarrollo social y económico, bajo este liderazgo se logró que todos los proyectos censales y precensales del INE se completaran al 100%, en el caso del Censo de Población y Vivienda se completaron las actualizaciones cartográficas a nivel nacional, la ejecución operativa de campo se reorientó hacia agosto-septiembre de 2026, demostrando un avance significativo en planificación del mismo.

**Gráfico No. 2**  
Comportamiento Inversión Pública Total  
Al 31 de diciembre (2021-2025)  
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas  
Cifras en millones de Lempiras

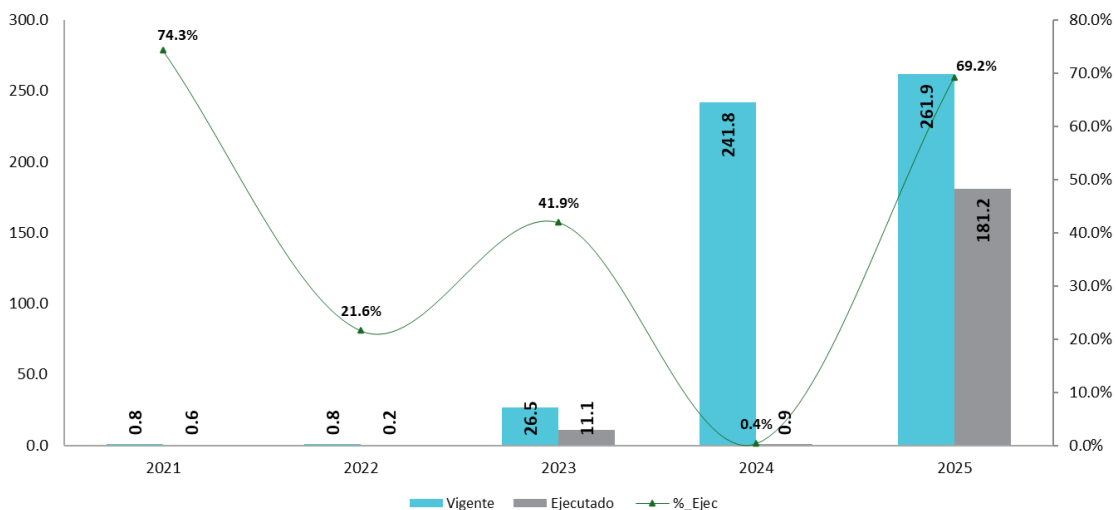



#### d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el cuarto trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

#### 1. Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.

El objetivo general de esta operación es de incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas, al cual contribuirán los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad; y (ii) fortalecer la institucionalidad del INE. Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

**Cuadro No. 2**  
**Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025**

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			IV trimestre de 2025		
		Program.	Ejecutada	% Ejec.	Program.	Ejecutada	% Ejec.
Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	BOLETA	1	1	100.00%	1	1	100.00%
Levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda	CENSO	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Prueba piloto experimental realizada	PRUEBA PILOTO	1	1	100.00%	1	1	100.00%
Actualización cartográfica segmentación municipios	MUNICIPIOS	298	298	100.00%	298	298	100.00%
Levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN)	MUNICIPIOS	143	128	89.5%	143	128	89.5%
Análisis de datos censales	INFORME	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Difusión de información de la población censada	INFORME	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Evaluación postcensal	EVALUACIÓN	0	0	0.00%	0	0	0.00%

**Fuente:** INE, al 31 de diciembre de 2025.



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional al cuarto trimestre de 2025:

**Cuadro No. 3**  
**Ejecución Histórica del Proyecto**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional	5832/BL-HO	US\$50,000,000	L1,317,195,000	17/06/2024-17/12/2027
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV trimestre 2025	372,466,010	260,641,172	35,726,504.6	13.7%
Acumulado 2025	372,466,010	260,641,172	179,954,030.6	69.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,317,195,000	1,317,195,000	180,254,198.9	13.7%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.3439 por US\$1.00

#### **d.1. Principales Adquisiciones IV trimestre 2025**

Durante el cuarto trimestre de 2025, los procesos de adquisiciones en ejecución por componente incluyeron:

#### **COMPONENTE I: Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)**

- Adquisición de Dispositivos Móviles de Captura (DMC): Se ejecutó la adquisición de tabletas para la captura digital de la boleta censal a nivel nacional, fortaleciendo el uso de tecnologías para el levantamiento de información del CNPV.
- Equipo de campo y protección personal: Se dotó al personal censal del equipamiento e insumos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operatividad durante el trabajo de campo.
- Vehículos para el operativo censal: Se incorporó una flota 13 de vehículos para apoyar la logística del levantamiento de información



en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y de difícil acceso.

- Renta de vehículos: Se contrató el servicio de alquiler de 74 unidades vehiculares para asegurar la cobertura logística del operativo censal y las actividades precensales.
- Seguro vehicular: Se garantizó la cobertura de seguro para los vehículos asignados al CNPV, resguardando los activos institucionales durante la ejecución del proyecto.
- Carnés de identificación: Se elaboraron carnés de identificación para el personal censal, fortaleciendo los mecanismos de control, seguridad y reconocimiento institucional.
- Comunicación estratégica: Se desarrollaron acciones de comunicación estratégica, incluyendo materiales de campaña y lineamientos de imagen institucional, con el objetivo de promover la participación ciudadana en el CNPV.
- Contratación de personal y apoyo administrativo: Se completó la contratación del personal técnico, administrativo y fiduciario, así como servicios de apoyo logístico y alquiler de oficinas para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).
- Reclutamiento masivo y convenio con BANADESA: Se implementó el manual de reclutamiento masivo y el convenio interinstitucional con BANADESA, permitiendo la transferencia de recursos para la contratación de personal temporal requerido para el precenso y el “barrido” de la cartografía.

#### **e. Gestión de la Inversión**

Durante el cuarto trimestre de 2025, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) llevó a cabo importantes gestiones ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las



actividades del Proyecto “Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y al Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional”.

- Mediante el Oficio DE-INE-1054-2025, de fecha 13 de noviembre de 2025, el INE solicitó a la SEFIN la aprobación de una modificación presupuestaria interna por L300,000.00, con fondos del préstamo BID No. 5832 BL-HO. Esta modificación consistió en el traslado de recursos entre programa y al proyecto, dentro de la misma institución, sin afectar el techo presupuestario global. El dictamen fue favorable y permitió realizar traslados internos entre diferentes grupos de gasto de gasto corriente, para garantizar la ejecución de actividades precensales, la contratación de personal, remodelación de la oficina principal del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda.

#### **f. Problemática y Acciones Durante el IV trimestre-2025**

Durante el IV trimestre de 2025 se identificaron varios desafíos clave para garantizar el cumplimiento de las actividades previas y la adecuada preparación del proyecto:

- Durante el IV trimestre de 2025, la ejecución del proyecto enfrentó desafíos asociados principalmente a la reprogramación del operativo censal, derivada de ajustes técnicos y metodológicos acordados entre el INE, asesores internacionales y organismos cooperantes. Esta reprogramación implicó la postergación de actividades clave hacia 2026, lo que limitó la ejecución de ciertos recursos programados para el período. Adicionalmente, se presentaron restricciones en los tiempos administrativos, así como la necesidad de realizar adecuaciones presupuestarias internas para garantizar la correcta alineación entre la planificación operativa y la disponibilidad financiera.
- Ante esta situación, el INE realizó gestiones oportunas ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para efectuar modificaciones



presupuestarias internas que permitieran optimizar el uso de los recursos disponibles, sin afectar el techo presupuestario institucional. Asimismo, se priorizó la ejecución de actividades precensales, la contratación de personal técnico y administrativo, la adquisición de bienes y servicios estratégicos y el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Como medida de disciplina fiscal, se procedió a la cesión de espacio presupuestario no ejecutable, asegurando un uso eficiente de los recursos públicos y sentando las bases para una mayor ejecución física y financiera en el siguiente período.



## V. CONCLUSIONES

- Al IV trimestre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró una ejecución física y financiera significativa, alcanzando un 69.2% de ejecución acumulada del presupuesto vigente, lo que evidencia una mejora sustancial en la capacidad de ejecución respecto a los años anteriores, especialmente en comparación con el período 2021–2024.
- El análisis histórico muestra que, pese a contar con presupuestos limitados entre 2021 y 2023, y una baja ejecución en 2024 debido a la naturaleza preparatoria de los procesos censales, en 2025 se consolidaron las condiciones técnicas, administrativas y financieras necesarias para avanzar de manera sostenida en la ejecución del principal proyecto de inversión pública del INE.
- El Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional concentró la mayor parte de la inversión pública, logrando el cumplimiento del 100% de las metas físicas programadas relacionadas con la actualización cartográfica, instrumentos censales, prueba piloto y levantamiento del Censo Agropecuario Nacional, sentando las bases técnicas para el operativo censal de campo.

## VI. RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo la planificación operativa y financiera, asegurando que la programación presupuestaria esté alineada con los cronogramas técnicos del proyecto, a fin de maximizar la ejecución física y financiera en los períodos siguientes.
- Priorizar la ejecución oportuna de los recursos reprogramados para 2026, especialmente aquellos vinculados al levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda, garantizando la disponibilidad de insumos, personal y logística previamente adquiridos.



- Reforzar los mecanismos de seguimiento y control interno, con énfasis en la ejecución del gasto y el cumplimiento de metas físicas, para reducir riesgos de subejecución y mejorar la trazabilidad de los recursos de inversión pública.
- Mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y los organismos cooperantes, a fin de facilitar ajustes oportunos y asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto durante su vida útil.

## Anexo No.1

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	I. Inversión Productiva		-	372,466,010.0	372,466,010.0	-	260,641,172.0	260,641,172.0	-	35,726,504.6	35,726,504.6	13.7%	-	179,954,030.6	179,954,030.6	69.0%
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		-	372,466,010.0	372,466,010.0	-	260,641,172.0	260,641,172.0	-	35,726,504.6	35,726,504.6	13.7%	-	179,954,030.6	179,954,030.6	69.0%
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	5832/BL-HO	-	372,466,010.0	372,466,010.0	-	260,641,172.0	260,641,172.0	-	35,726,504.6	35,726,504.6	13.7%	-	179,954,030.6	179,954,030.6	69.0%
	Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA		-	372,466,010.0	372,466,010.0	-	260,641,172.0	260,641,172.0	-	35,726,504.6	35,726,504.6	13.7%	-	179,954,030.6	179,954,030.6	69.0%
	III. Formación Bruta de Capital		798,000.0	-	798,000.0	1,300,000.0	-	1,300,000.0	465,365.9	-	465,365.9	35.8%	-	1,300,000.0	1,277,950.4	98.3%
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		798,000.0	-	798,000.0	1,300,000.0	-	1,300,000.0	465,365.9	-	465,365.9	35.8%	-	1,300,000.0	1,277,950.4	98.3%
	CENSO RED SOLIDARIA		-	-	-	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	0.0%	-	50,000.0	47,604.3	95.2%
	Total CENSO RED SOLIDARIA		-	-	-	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	0.0%	-	50,000.0	47,604.3	95.2%
	CONVENIO COSUCOOP		-	-	-	541,433.0	-	541,433.0	465,365.9	-	465,365.9	86.0%	-	541,433.0	541,432.7	100.0%
	Total CONVENIO COSUCOOP		-	-	-	541,433.0	-	541,433.0	465,365.9	-	465,365.9	86.0%	-	541,433.0	541,432.7	100.0%
	DIRECCION Y COORDINACION		798,000.0	-	798,000.0	216,292.0	-	216,292.0	-	-	-	0.0%	-	216,292.0	198,910.0	92.0%
	Total DIRECCION Y COORDINACION		798,000.0	-	798,000.0	216,292.0	-	216,292.0	-	-	-	0.0%	-	216,292.0	198,910.0	92.0%
	ONU-MUJERES		-	-	-	492,275.0	-	492,275.0	-	-	-	0.0%	-	492,275.0	490,003.5	99.5%
	Total ONU-MUJERES		-	-	-	492,275.0	-	492,275.0	-	-	-	0.0%	-	492,275.0	490,003.5	99.5%
	Total general		798,000.0	372,466,010.0	373,264,010.0	1,300,000.0	260,641,172.0	261,941,172.0	465,365.9	35,726,504.6	36,191,870.5	13.8%	-	181,254,030.6	181,231,981.0	69.2%

Fuente: SIAFI, 31/12/2025

Anexo No.2  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0513 - Instituto Nacional de Estadísticas</b>								
PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	BOLETA	1	1	100%	1	1	100%
	Levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda	CENSO	0	0	0%	0	0	0%
	Prueba piloto experimental realizada	PRUEBA PILOTO	1	1	100%	1	1	100%
	Actualización cartográfica segmentación municipios	MUNICIPIOS	298	298	100%	298	298	100%
	Levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN)	MUNICIPIOS	143	128	90%	143	128	90%
	Análisis de datos censales	INFORME	0	0	0%	0	0	0%
	Difusión de información de la población censada	INFORME	0	0	0%	0	0	0%
	Evaluación postcensal	EVALUACIÓN	0	0	0%	0	0	0%

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Proyectos
