



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) tiene como fin primordial la gestión del conocimiento para contribuir a desarrollar el sector agrícola nacional.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el apartado 4.3 (Educación), se resalta la importancia de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Al cuarto trimestre del año 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente **L132.2 millones**, financiado exclusivamente con Fondos Nacionales; detallado en **L62.4 millones** para Inversión productiva **L1.9 millones** para inversión social y **L67.9 millones** para formación bruta capital. con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de **L66.4 millones** de lo cual **L11.0 millones corresponden** a la Inversión Productiva, **L1.6 millones** a la Inversión Social y **53.8 millones** a la Formación Bruta de Capital, lo cual en su conjunto representa el **50.2%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2025

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	108,187,585.0
Inversión Productiva	50,000,000.0
Formación Bruta de Capital	58,187,585.0
Presupuesto Vigente	132,240,748.0
Inversión Productiva	62,356,334.0
Inversión Social	1,949,200.0
Formación Bruta de Capital	67,935,214.0
Ejecutado IV Trimestre	66,373,106.6
Inversión Productiva	11,033,786.0
Inversión Social	1,587,474.2
Formación Bruta de Capital	53,751,846.4
% Ejecución (Devengado IV Trim-2024/Vigente)	50.2%
Ejecutado Anual	76,955,331.1
Inversión Productiva	11,033,786.0
Inversión Social	1,949,199.2
Formación Bruta de Capital	63,972,345.9
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	58.2%

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Dicha ejecución se llevó a cabo a través del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho (PROFORCEPS) y Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, la inversión Social se utilizó los recursos para el desarrollo de investigaciones agropecuarias y veterinarias y la formación bruta de capital los recursos financieros se ejecutaron en los centros regionales de la UNAG en gastos operativos. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos nacionales; expresado en términos monetarios un monto de **L132.2 millones**, Dicha inversión es financiada por Fondos del Tesoro General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2023-2025):

En los años comprendidos entre el 2023 -2025, la UNAG únicamente ha considerado la ejecución de dos Proyectos, Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho (PROFORCEPS) y Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro". El comportamiento de ejecución del proyecto se muestra a continuación:

La Gráfica No. 1 presenta la ejecución porcentual comparativa al 31 de diciembre de los años 2023 al 2025. En ella se observa una disminución progresiva en los niveles de ejecución. En el año 2023 se

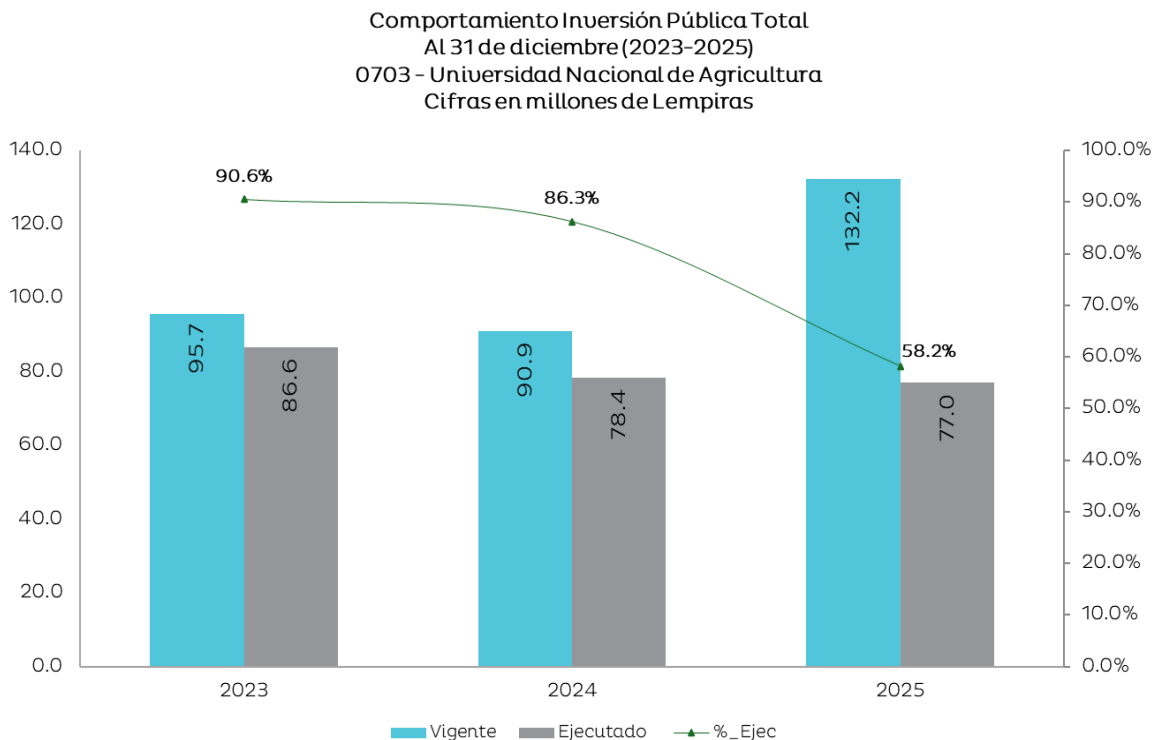

reportó la mayor inversión, por un monto de L 86.6 millones, de los cuales se ejecutó el 90.6 %. Para el año 2024, la baja ejecución se debió, en parte, a procesos internos de la institución y a cambios de autoridades. En el año 2025 se evidencia una leve disminución en la ejecución, atribuida a retrasos en los procedimientos internos y externos de la institución.

d. Principales Proyectos

Al cuarto trimestre del año 2025, la unidad ejecutora del proyecto PROFORCEPS reporta los siguientes avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, (PROFORCEPS):

El Decreto Legislativo N°030-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de abril de 2022, establece la incorporación de fondos por un total de L75,000,000.00 para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Educativas, Productivas y Sociales (PROFORCEPS)" en la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV- Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV-Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Estudio y Diseño de un sistema de riego: Obra toma y pre filtrado, sistema de conducción, distribución	Diseño	1	1	100%	1	1	100%
Autobús para el transporte de estudiantes y personal.	Autobús	2	2	0%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

El cuadro anterior denota la ejecución en las actividades correspondientes al estudio y diseño del sistema de riego, así como en la adquisición de dos autobuses. El proyecto avanzó en los procesos de adjudicación conforme a la Ley de Contratación del Estado, permitiendo el cumplimiento de las metas físicas y la obtención de los entregables previstos para el cierre del proyecto.

Con el proyecto, se beneficiarán a 2,913 personas, entre alumnos(a) y docentes en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho y municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de la referencia al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura	BCH-25001-1	US\$	0	21/9/2022-
		Lempiras	L75,000,000.00	31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025		12,356,334.00	11,033,786.01	89.3%
Acumulado 2025		12,356,334.00	11,033,786.01	89.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	75,000,000.00	75,000,000.00	73,677,451.51	98.2%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

2. Proyecto Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro":

El proyecto pretende incrementar la oportunidad de estudio a muchas jóvenes provenientes de todo el territorio nacional, principalmente aquellas que por situaciones económicas no tienen oportunidad de ingresar a las diferentes ofertas de estudio presentadas por las otras instituciones del nivel de educación superior del país, esto se pretende lograr mediante la construcción de un edificio de tres niveles que albergará 756 estudiantes mujeres, los cuales se distribuirán en 126 habitaciones con capacidad para seis personas cada una. Cada habitación posee su módulo de baño completo en su interior.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV- Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV-Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción de un Edificio	Edificio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

Es importante mencionar que en el proceso de licitación para la construcción del Edificio Residencial para Mujeres H, se publicó el aviso correspondiente para la participación de los diferentes oferentes; sin embargo, no fue posible adjudicar el contrato debido a que las ofertas presentadas contenían vicios. Tras el análisis realizado por el área legal de la UNAG, se determinó que no procedía la adjudicación, por lo que la licitación fue declarada fracasada.

La población beneficiará a 968 estudiantes mujeres Internas del Campus Universitario que residen en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de la referencia al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Proyecto Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro":	25920-1	US\$	0	1/2/2025
		Lempiras	L159,226,249.81	1/2/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0%
Acumulado 2025	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto **	L159,226,249.81	L159,226,249.81	0	0%

d. 1.Principales Adquisiciones al IV Trimestre 2025

- Consultoría de estudio y diseño de un proyecto de riego.
- Construcción del laboratorio de topografía agrícola.
- Equipamiento del laboratorio de ingeniería agrícola.
- Adquisición de un autobús para transporte de los estudiantes y docentes.
- Licitación Pública Construcción de un Edificio.

d. 2.Programa Sociales

Referente al presupuesto asignado (**L1.9 millones**) se ejecutó la totalidad de este presentando los siguientes resultados:

- Capacitación de personal
- Equipamiento
- Infraestructura

Del presupuesto vigente de Formación Bruta Capital **de L67.9 millones** se logró ejecutar **L63.9 millones** que representan el 95% de cumplimiento para:

- Acondicionamiento de instalaciones
- Adquisición de equipos.
- Laboratorios

e. Gestión de la Inversión

- Espacio Fiscal para incorporación presupuestaria.
- Modificaciones presupuestarias para incorporar los recursos para las actividades del proyecto.
- Seguimiento a los avances físicos y financiero del proyecto juntamente con la DGIP, DGP y la UNAG.
- Actualización de proyecciones mensuales de ejecución.

f. Problemática y Acciones durante el IV Trimestre-2025

- Algunos procesos de licitación de obras y servicios fueron declarados desiertos debido a la falta de participación de oferentes; en respuesta, se implementaron medidas para optimizar y acelerar dichos procesos, con el objetivo de adjudicarlos durante el IV trimestre de 2025 y lograr, en su mayoría, el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

V. Conclusiones

- El análisis de la ejecución presupuestaria evidencia una disminución progresiva en los niveles de ejecución durante el período 2023–2025, influenciada principalmente por factores administrativos, procesos internos y cambios de autoridades institucionales.
- A pesar de las limitaciones presentadas, se logró avanzar en actividades clave del proyecto, tales como el estudio y diseño del sistema de riego, así como la adquisición de bienes estratégicos, contribuyendo al cumplimiento parcial de las metas físicas establecidas.
- Los procesos de contratación enfrentaron dificultades, incluyendo licitaciones declaradas desiertas o fracasadas, ya sea por la falta de oferentes o por inconsistencias en las ofertas presentadas, lo que impactó en los plazos de ejecución.
-

VI. Recomendaciones

- Fortalecer la planificación y programación de los procesos de contratación, incorporando estudios de mercado previos que permitan identificar oportunamente la disponibilidad de oferentes y ajustar las bases de licitación a las condiciones reales del mercado, a fin de reducir la probabilidad de procesos desiertos o fracasados.
- Simplificar y optimizar los procedimientos administrativos internos, estableciendo cronogramas más realistas y mecanismos de seguimiento permanente, que permitan agilizar la ejecución presupuestaria y minimizar retrasos derivados de trámites internos o cambios de autoridades.

- Implementar estrategias de difusión y socialización de los procesos de licitación, especialmente en obras y servicios especializados, con el objetivo de ampliar la participación de potenciales oferentes y fomentar una mayor concurrencia en los procesos de contratación.
- Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del personal responsable de la gestión del proyecto, mediante capacitaciones periódicas en normativa de contratación pública, formulación de términos de referencia y gestión presupuestaria.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado IV Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		50,000,000.0	50,000,000.0	62,356,334.0	62,356,334.0	11,033,786.0	11,033,786.0	17.7	11,033,786.0	11,033,786.0	17.7
1	Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, departamento de	FN-25920-1	50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	-	-	-	-	-	-
	Total Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial pa		50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	-	-	-	-	-	-
2	Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	BCH 25001-1	-	-	12,356,334.0	12,356,334.0	11,033,786.0	11,033,786.0	89.3	11,033,786.0	11,033,786.0	89.3
	Total Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productiva		-	-	12,356,334.0	12,356,334.0	11,033,786.0	11,033,786.0	89.3	11,033,786.0	11,033,786.0	89.3
	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		-	-	1,949,200.0	1,949,200.0	1,587,474.2	1,587,474.2	81.4	-	1,949,199.2	100.0
	CENTRO REGIONAL COMAYAGUA		-	-	290,000.0	290,000.0	183,500.0	183,500.0	63.3	-	290,000.0	100.0
	Total CENTRO REGIONAL COMAYAGUA		-	-	290,000.0	290,000.0	183,500.0	183,500.0	63.3	-	290,000.0	100.0
	CENTRO REGIONAL TOMALÁ		-	-	500,000.0	500,000.0	244,775.0	244,775.0	49.0	-	500,000.0	100.0
	Total CENTRO REGIONAL TOMALÁ		-	-	500,000.0	500,000.0	244,775.0	244,775.0	49.0	-	500,000.0	100.0
	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA		-	-	1,159,200.0	1,159,200.0	1,159,199.2	1,159,199.2	100.0	-	1,159,199.2	100.0
	Total DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA		-	-	1,159,200.0	1,159,200.0	1,159,199.2	1,159,199.2	100.0	-	1,159,199.2	100.0
	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		58,187,585.0	58,187,585.0	67,935,214.0	67,935,214.0	53,751,846.4	53,751,846.4	79.1	-	63,972,345.9	94.2
	COORDINACIÓN DE RECTORÍA		110,150.0	110,150.0	4,408,652.0	4,408,652.0	152,749.5	152,749.5	3.5	-	587,599.5	13.3
	Total COORDINACIÓN DE RECTORÍA		110,150.0	110,150.0	4,408,652.0	4,408,652.0	152,749.5	152,749.5	3.5	-	587,599.5	13.3
	COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES		35,026,953.0	35,026,953.0	46,783,409.0	46,783,409.0	41,749,919.3	41,749,919.3	89.2	-	46,783,404.5	100.0
	Total COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES		35,026,953.0	35,026,953.0	46,783,409.0	46,783,409.0	41,749,919.3	41,749,919.3	89.2	-	46,783,404.5	100.0
	COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL		500,000.0	500,000.0	14,939,423.0	14,939,423.0	10,355,295.4	10,355,295.4	69.3	-	14,797,612.5	99.1
	Total COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL		500,000.0	500,000.0	14,939,423.0	14,939,423.0	10,355,295.4	10,355,295.4	69.3	-	14,797,612.5	99.1
	GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		-	-	1,712,650.0	1,712,650.0	1,493,882.2	1,493,882.2	87.2	-	1,712,649.4	100.0
	Total GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		-	-	1,712,650.0	1,712,650.0	1,493,882.2	1,493,882.2	87.2	-	1,712,649.4	100.0
	SEDE REGIONAL MISTRUCK		6,000,000.0	6,000,000.0	91,080.0	91,080.0	-	-	-	-	91,080.0	100.0
	Total SEDE REGIONAL MISTRUCK		6,000,000.0	6,000,000.0	91,080.0	91,080.0	-	-	-	-	91,080.0	100.0
	ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL		32,196.0	32,196.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL		32,196.0	32,196.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA		471,000.0	471,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA		471,000.0	471,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	CENTRO REGIONAL COMAYAGUA		6,360,000.0	6,360,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA		6,360,000.0	6,360,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	CENTRO REGIONAL TOMALÁ		6,000,000.0	6,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CENTRO REGIONAL TOMALÁ		6,000,000.0	6,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		913,000.0	913,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		913,000.0	913,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	COORDINACIÓN HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO		217,584.0	217,584.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL COORDINACIÓN HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO		217,584.0	217,584.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA		100,000.0	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA		100,000.0	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	DOCENCIA EN INTERNADO		931,505.0	931,505.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOCENCIA EN INTERNADO		931,505.0	931,505.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		1,230,000.0	1,230,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		1,230,000.0	1,230,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VEGETAL		116,000.0	116,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VEGETAL		116,000.0	116,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS BIOLÓGICOS		174,197.0	174,197.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SERVICIOS BIOLÓGICOS		174,197.0	174,197.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD		5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD		5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO No 2

Principales Metas Físicas, IV- Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV-Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Estudio y Diseño de un sistema de riego: Obra toma y pre filtrado, sistema de conducción, distribución	Diseño	1	1	100%	1	1	100%
Autobús para el transporte de estudiantes y personal.	Autobús	2	2	0%	2	2	100%
Construcción de un Edificio	Edificio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2026
