



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero al IV Trimestre 2025

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios; así como diversificar la oferta de los productos de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agrícola, mediante el fortalecimiento de la producción agropecuaria y agroindustrial; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y Social; para lo cual en el 2025 mediante la Inversión Productiva se desarrollan 8 proyectos de inversión, contando con un presupuesto aprobado para inversión productiva de L2,297.1 millones para la ejecución de 50 Planes de fortalecimiento organizacional, aprobación de 107 Becas a jóvenes rurales a realizar a través del **proyecto PROINORTE**; 135 Planes de Negocios con enfoque de cadena de valor implementados, 50 Planes de inversión con adopción de tecnologías Climáticamente inteligentes (CI), 400 Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, 5 Planes de manejo de microcuencas implementados bajo el proyecto **PROOCCIDENTE**; 134 Planes de Negocios financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia a través del proyecto **COMRURAL II**, 30 Planes de Negocios identificados/Ventana 1 Agricultura en Subsistencia por medio del proyecto **COMRURAL III**. Por su parte, en los proyectos de seguridad hídrica, se programó la entrega de 4 diseños finales de sistemas integrales de agua segura (SIAS), 4 estudios de evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales, mientras que para el proyecto de Agua Urbana se tiene programada la ejecución física de un 35% en la rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable.

Al cuarto trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L4,228.66 millones; de los cuales L1,608.13 millones corresponden a Inversión productiva; L2,450.00 millones para la Inversión


Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	4,822,737,910.0
Inversión Productiva	2,297,071,078.0
Inversión Social	2,488,088,493.0
Formación Bruta de Capital	37,578,339.0
Presupuesto Vigente	4,228,661,550.0
Inversión Productiva	1,608,125,463.0
Inversión Social	2,450,000,000.0
Formación Bruta de Capital	170,536,087.0
Ejecutado IV Trimestre	423,727,450.0
Inversión Productiva	399,059,081.0
Inversión Social	12,500,000.0
Formación Bruta de Capital	12,168,369.0
% Ejecución (Devengado IV Trim-2024/Vigente)	10.0%
Ejecutado Anual	3,509,583,010.1
Inversión Productiva	1,045,036,606.6
Inversión Social	2,450,000,000.0
Formación Bruta de Capital	14,546,403.5
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	83.0%

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Social para el desarrollo de programas de gran importancia para el país como ser el Bono Ganadero, Bono Cafetalero y Bono Tecnológico y L170.65 millones para la formación bruta de capital. La ejecución presupuestaria al trimestre asciende a L423.73 millones que representan el 10.0% con relación al presupuesto vigente. En cuanto a la ejecución presupuestaria anual fue de L3,509.58 millones, equivalentes al 83.0% respecto al presupuesto vigente.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

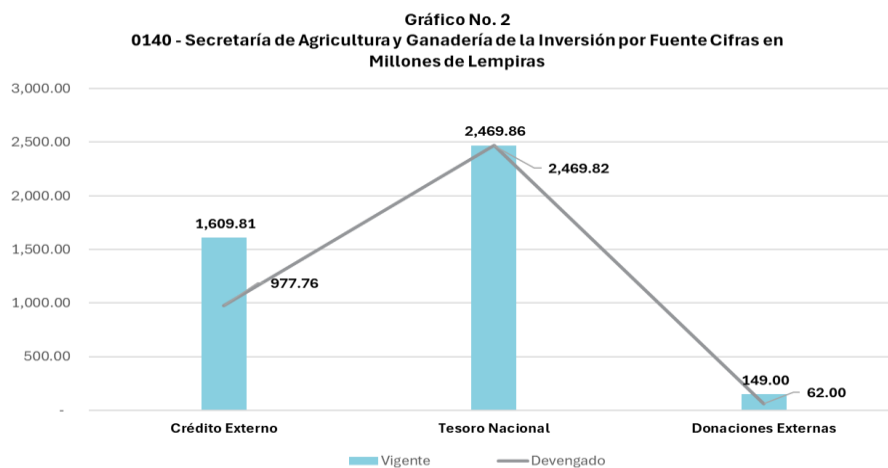

El Presupuesto Vigente de la SAG es financiado en un **58% (L2,469.86 millones)** por Fondos Nacionales (Tesoro Nacional, Recursos Propios y Donaciones Internas); **38% (L1,609.81 millones)** de **Crédito Externo**, proveniente de préstamos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos como ser Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), OPEC, FIDA y ESPAÑA.

El **4% (L149.00 millones)** restante, corresponde a Donaciones Externas, las cuales son financiadas mayormente por el BM.

c. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2023-2025):

d. Principales Proyectos

Al cuarto trimestre del 2025 la inversión productiva alcanzó una ejecución del 64.5% respecto al presupuesto vigente, siendo los proyectos que reportan mayor ejecución presupuestaria respecto a su presupuesto vigente el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL III) 67%, Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana 70%, Proyecto Integrando la Innovación

para la Competitividad Rural (COMRURAL II) 67%, PROINORTE 67% y el Proyecto Integral De Desarrollo Rural y Productividad 63%.

A continuación, se detallan los avances físicos, presupuestarios y financieros de proyectos:

1. Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL III)

Tiene como objetivo Contribuir al acceso de los mercados, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la generación de puestos de trabajo en apoyo de los beneficiarios de cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas y responder de manera efectiva ante una Crisis o Emergencia Elegible.

Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Prog.	Eje c.	% Ejec .	Pro g.	Eje c.	% Ejec .
Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	6347	591	9%	87	87	100%
Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	20	16	80%	2	2	100%
Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	30	0	0%	0	0	0%
Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	27	27	100%	5	5	100%
Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	5	5	100%	0	0	0%
Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	5	0	0%	0	0	0%
Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	30	0	0%	0	0	0%
Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	30	0	0%	0	0	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al cuarto trimestre 2025, informe al primer trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI

Los principales avances físicos al cuarto trimestre del 2025 son los siguientes:

Al cuarto trimestre en su informe trimestral la SAG indica que se realizaron acciones de seguimiento técnico y administrativo, ajustes presupuestarios
IV Trimestre 2025

internos y reprogramaciones formales conforme a la normativa del Banco Mundial. Paralelamente, se desarrollaron actividades clave como la implementación de dos planes de negocio beneficiando a 87 productores, el desembolso de dos Transferencias No Reembolsables (TNRs) por L8.0 millones, la realización de 43 talleres de capacitación y el avance del Componente II mediante la entrega de 29 documentos técnicos institucionales, asegurando así la continuidad operativa y el fortalecimiento institucional del proyecto pese a las limitaciones enfrentadas.

El proyecto ComRural III enfrentó diversas problemáticas vinculadas principalmente a retrasos en la contratación de las Firmas Consultoras Implementadoras (FCI) para las Ventanas 1 y 4, así como para la intervención en la Moskitia, lo que impidió la ejecución de varios indicadores y obligó a reprogramar productos hacia el primer trimestre de 2026. Estos atrasos, derivados de procesos de No Objeción ante el Banco Mundial y del riguroso método de selección basado en calidad y costo, limitaron la implementación de planes de negocio en agricultura de subsistencia, servicios agro-logísticos y proyectos agro-costeros.

En cuanto a la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del 2025, la misma fue de 6.7% durante el trimestre de estudio y del 67.5% de forma acumulada, la cual correspondió a las actividades para la implementación del proyecto, gasto operativo, transferencias realizadas a los planes de negocios que se encuentran en implementación y a las capacitaciones en las diferentes regionales del proyecto y seguimiento.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Competitividad Rural (COMRURAL III):

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN	US\$	108,500,000	30/12/2022 30/12/2027	
		Lempiras	2,858,322,915		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2025		L385,747,927	L325,956,551	L21,855,291	6.7
Acumulado 2025		L385,747,927	L325,956,551	L219,904,653	67.5
Acumulado Vida del Proyecto */		L2,858,322,915	L2,858,322,915	L221,932,348	7.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

2. Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)

IV Trimestre 2025



Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

Los principales avances físicos al cuarto trimestre del 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Planes de Negocios Implementados financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Plan de Negocios	134	126	94%	8	0	0%
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs).	CANTIDAD	134	41	31%	50	41	82%
Talleres de capacitación brindados a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Talleres de Capacitación	75	11	15%	30	11	37%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al cuarto trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

De acuerdo con lo indicado en el informe de ejecución física y financiera presentada por la SAG, el proyecto COMRURAL II-IDA6448, ha continuado con la implementación de los Planes de Negocio de las Organizaciones de Productores en Ventana 2 y ventana 1. Para el IV trimestre, se proporcionó seguimiento a procesos importantes como ser la Enmienda al contrato para la implementación de la ventana 1 con la Firma Consultora Implementadora SWISSCONTACT que permitirá ampliar el alcance beneficiando a 901 beneficiarios a través de 41 Planes de Negocio adicionales para alcanzar un total de 4,261 beneficiarios en 167 planes de negocio; Encuesta de Nivel de Satisfacción de los beneficiarios por los servicios de asistencia técnica-financiera; procesos de comunicación y consulta sobre los planes de negocio diseñados e implementados y Mecanismo de Quejas y Reclamos, en el marco del proyecto, focalizado en la Ventana 2; Consultoría de Firma Consultora de Evaluación de Cierre y Consultoría de Adopción de Buenas Prácticas Agrícolas Mejoradas 2 meses después de finalizado los Planes de Negocio, así como las adquisiciones en el componente 2 de las instituciones beneficiarias.

Adicionalmente se implementaron 41 Planes de Negocio en la Ventana 1; para Ventana 2 se reportó una reducción, de beneficiarios de 7,468 a 7,049, debido a la renuncia de 6 OPRs lo que significó una disminución pasando de 75 Planes de Negocio a 68 Planes de Negocio. Asimismo, la UE manifiesta en su informe Trimestral, que para Ventana 2 ya no se seguirá reportando TNRs debido a que el proyecto se encuentra en proceso de cierre y en el caso de Ventana 1, se reportará una vez que SWISSCONTACT finalice procesos de adquisiciones los cuales funciona bajo la modalidad de reembolso.

Por otra parte, la ejecución presupuestaria al cierre del IV Trimestre del 2025 alcanzó el 32.6% de cumplimiento, la baja ejecución se debe a retrasos en procesos de adquisiciones vinculados al componente II del proyecto, así como retrasos en los procesos de implementación vinculados a la Ventana 1 del Proyecto a través de la Firma Implementadora contratada para tal fin.

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	
		Lempiras	1,975,799,250	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Deuengado	% Ejecución
IV Trimestre 2025	L407,134,799	L247,145,576	L80,624,926	32.6
Acumulado 2025	L407,134,799	L247,145,576	L166,416,031	67.3
Acumulado Vida del Proyecto */	L1,975,799,250	L1,975,799,250	L745,634,167	37.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

Tiene como objetivo Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH) y el Objetivo Específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Los principales avances físicos al cuarto trimestre del 2025 son los siguientes:



Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	50	44	88%	19	19	100%
(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	55	110%	25	25	100%
(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	400	400	100%	200	200	100%
(PI) Planes de asistencia técnica por rubro de producción aprobados.	Planes de Asistencia	5	3	60%	-	-	-
(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	5	3	60%	-	-	-
(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	5	5	100%	-	-	-
(PF) Desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores rurales a través de BANHPROVI	Millones	100	12.5	13%	-	12.5	-
(PI) Monto en Lempiras Transferidos	Millones	50	91	182%	-	-	-
(PF) Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.	Porcentaje	50	0	0%	-	-	-
(PI) Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión completa) evaluado y aprobado	Porcentaje	100	0	0%	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al cuarto trimestre 2025 e Informe de ejecución física generado de SIAFI.

De acuerdo con el Informe presentado al Cuarto Trimestre, en el proyecto se han beneficiado a 487 productores atendidos de 19 grupos productivos en seis (6) departamentos, dotando de tecnologías climáticamente inteligentes (TCI); Adicionalmente se cerró la etapa 1A, en donde se beneficiaron 1,002 productores con tecnologías climáticamente inteligentes y más de 4,000 productores que estarán certificados en los temas brindados en la asistencia técnica integral. Asimismo, dio inicio la etapa 1B donde se formularon y aprobaron 25 planes de inversión que serán implementados en la etapa IB.

En total durante 2025, se elaboraron y aprobaron 134 planes de inversión, de los cuales 128 corresponden a grupos productivos, 3 planes de inversión aprobados corresponden a MiPymes y 3 planes de inversión aprobados corresponden a Emprendimientos con Jóvenes.

Aunado a las actividades físicas realizadas en cuanto al manejo y conservación de microcuencas, se han realizado intervenciones en cinco microcuencas, atendiendo actividades priorizadas de los perfiles de inversión que forman parte de los planes de manejo de microcuencas, brindando asistencia técnica y dotando a las oficinas de la Unidad Municipal A de las mancomunidades con equipo.

Adicionalmente también se han aprobado por parte de la Dirección Ejecutiva de SAG la nueva estrategia de aceleramiento para colocación de los fondos de préstamos y garantías; en la parte operativa del componente se ha beneficiado a 64 productores que han adquirido préstamos del producto financiero del componente No 2. A la fecha, más de L12.5 millones han sido desembolsados por las intermediarias financieras a través de BANHPROVI.

En el Componente No 3, se evalúan las Hojas de Vida de consultores para realizar la consultoría de diagnóstico institucional de las necesidades de SAG relacionadas a los temas de monitoreo y evaluación, para desarrollo de la primera fase del diseño Sistema de monitoreo y evaluación de la SAG.

En cuanto a la ejecución presupuestaria según SIAFI a continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 2025, en donde al cuarto trimestre 2025 se ejecutó el 32.0% (L165,815,298) respecto al presupuesto vigente de L517,841,947.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.	BID 4936/BL-HO BID 4940/BL-HO FONPRODE GRT/WE-20251-HO	91,400,000	2,407,840,686	21/05/2020 21/07/2027
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2025	370,431,660	517,841,947	165,815,298	32.0
Acumulado 2025	370,431,660	517,841,947	327,933,376	63.3
Acumulado Vida del Proyecto */	2,407,840,686	2,407,840,686	741,191,022	30.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



4. Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)

El proyecto consiste en Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Avances físicos al cuarto trimestre 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Número de productores (as) rurales organizados mejoran su productividad y competitividad, incrementando sus ingresos y asegurando su seguridad alimentaria.	PRODUCTOR	6366	1434	23%	1,273.00	-	-
Numero de planes de negocio implementados	PLAN DE NEGOCIO	50	41	82%	29.00	29.00	1.00
Numero de planes de negocio aprobados	PLAN DE NEGOCIO	50	62	124%	29.00	29.00	1.00
Numero de asistencia técnica brindadas	ASISTENCIA TÉCNICA	50	61	122%	11.00	11.00	1.00
Euento Intercambio de experiencias (procesos de aprendizaje) desarrollados con organizaciones de productores rurales de las comunidades del Valle de Aguan.	EVENTO	3	1	33%	3.00	1.00	0.33
Planes de fortalecimiento organizacional implementados por Organizaciones usuarias	PLAN	50	34	68%	5.00	-	-
Número de organizaciones usuarias con financiamiento otorgado	ORGANIZACION	50	41	82%	29.00	29.00	1.00
Numero de campañas de concientización y buenas prácticas diseñadas	CAMPAÑA	9	9	100%	3.00	-	-
Servicios financieros innovadores otorgados a Jóvenes y cajas rurales en las comunidades del Valle de Aguan	SERVICIO	5	-	0%	-	-	-
Número de becas aprobadas	BECA	96	11	11%	46.00	11.00	0.24
Número de cajas rurales con financiamiento otorgado	CAJA RURAL	60	0	0%	20.00	-	-



Principales Metas Físicas, IV Trimestre-2025

Meta física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV Trimestre 2025		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Capacitaciones en educación financiera brindadas a productores(as) que integran las cajas rurales	TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0%	1.00	-	-
Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos implementados	PLAN	5	2	40%	-	-	-
Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos aprobados	PLAN	5	2	40%	-	-	-
Capacitaciones en el tema ambiental climática brindadas.	TALLERE DE CAPACITACION	1	1	100%	-	-	-
Número de Organizaciones /comunidades con financiamiento otorgado	ORGANIZACION	5	5	100%	-	-	-

Al cuarto trimestre la unidad ejecutora en su informe de cierre anual ha indicado que en el trimestre se han desembolsado a 29 Planes de Negocios, siendo beneficiadas misma cantidad de Organizaciones usuarias, dentro de las cuales hay 1,138 personas (626 Hombres y 512 mujeres, dentro de los mismos hay 244 jóvenes y 34 personas indígenas), adicionalmente se ha logrado dar asistencia por medio de los prestadores de asistencia técnica a 11 organizaciones usuarias, también se han identificado las organizaciones que tendrán un Plan de Fortalecimiento Organizaciones (PFO), mismas que están en proceso de formulación por parte de la empresa, estos planes tiene que ser revisados por el comité técnico de revisión, y pasar a las instancias correspondientes para su aprobación y posterior implementación.

Es importante indicar que al cierre del cuarto trimestre se ejecutaron L21,814,310 lo que denota en una ejecución de L34,594,692.12 menos a lo proyectado por la Unidad ejecutora.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	FIDA 2000002595 LOAN No. 13754P	US\$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	1,029,722,659	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2025	409,584,781	173,903,783	65,619,432	37.7



Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Acumulado 2025	409,584,781	173,903,783	116,684,356		67.1
Acumulado Vida del Proyecto */	1,029,722,659	1,029,722,659	196,876,558		19.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1 Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025

Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.

Se encuentran en proceso de publicación y evaluación para contratación del Coordinador UAP, Especialista Legal, Especialista en Adquisiciones, Especialista de Comunicaciones, equipo de cómputo, equipo de laboratorio. Por otra parte, se emitieron ordenes de inicio para las obras en Puerto Cortés, Choloma Lote I y Lote II, Danlí Lote III.

COMRURAL II

Se realizó la firmar para 41 acuerdos tripartitos con SWISSCONTACT, adicionalmente se encuentra en proceso de evaluación de expresiones de interés los procesos de Consultoría Evaluación de Cierre, Consultoría Encuesta Post-Cierre tecnológica.

Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.

Contratación de 4 consultores para ESEIRAS/PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social), Contratación del Especialista en Hidro meteorología, Contratación de Especialista Legal UAP, y la Adquisición de baterías de respaldo para Radar Banda-S.

d.2 Programas Sociales

La SAG posee un presupuesto vigente para programas sociales de L2,450.00 millones de los cuales al cuarto Trimestre ejecutó el 99.5% equivalente a L2,437.50 para el desarrollo tres programas sociales de gran importancia:

Bono Cafetalero: Mediante este programa se desarrolló la Fertilización, apoyando a los pequeños y medianos productores de café en el fortalecimiento de la producción, brindando apoyo en la fertilización de fincas, renovación de áreas, asistencia técnica, fortalecimiento de las capacidades y generación de valor agregado en fincas. Se beneficiaron a 187,528 productores de café, se realizó la entrega de 300 secadoras, 3,000 kits fitosanitarios, 41,200 asistencias técnicas.

Bono Ganadero: Se desarrolla con el objetivo de fomentar un incremento sostenible y significativo en la producción de carne y leche por parte de los pequeños y medianos productores ganaderos a nivel nacional por medio de la ejecución de 4 componentes: 1) Fortalecimiento Inclusivo y Participativo en la Producción de Alimento en Ganado, 2) Componente Fomento a la industrialización de la cadena de procesamiento, 3) Extensión Agrícola y 4) Fomento a las Cadenas Pecuarias. Se logró atender 51,901 familias, instalación de 750 cercas eléctricas, 188,200kg de pasto que representan 94,100 manzanas de pasto.

Bono Tecnológico Productivo: Programa presidencial con orientación en productos de la canasta básica al beneficio de Pequeños Productores de Subsistencia que se encuentran bajo la franja de pobreza y pobreza extrema realizando la entrega de 1,411,728.00 bonos para primera y postrera.

Es importante mencionar que la SAG no proporcionó a la DGIP el informe correspondiente a la ejecución de la Inversión Social. La información de los logros se obtuvo de lo publicado por la SAG en su página web; mientras que Las cifras presupuestarias, fueron generadas del SIAFI al cierre del cuarto trimestre del 2025 sin que el ejercicio fiscal se encuentre totalmente cerrado por lo que los datos expresados en este informe podrían modificarse.

e. Gestión de la Inversión

- Autorización de modificaciones presupuestarias de Traslados entre objetos de gasto 2000, 3000, entre categorías de proyectos con ERP.
- Actualización de la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (octubre - diciembre) en seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025.
- Seguimiento físico y financiero a proyectos.
- Acompañamiento constante durante la ejecución de los proyectos.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

f. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025

Problemáticas:

- Dilatación de los procesos de adquisiciones y contrataciones.
- Procesos de Contratación fracasados.
- Tardanza en la revisión y emisión de Dictámenes Legales por parte de la Dirección de Servicios Legales de la SAG, relacionados con

contratos, acuerdos y convenidos que deben formalizarse en el marco del Proyecto.

Acciones:

- la SAG deberá desarrollar acciones respecto a los procesos de adquisición para que la firma de estos sea más ágil.

V. Conclusiones

- De acuerdo con lo reportado en los informes de la SAG al cuarto trimestre no se han desarrollado acciones correctivas a las problemáticas mencionadas ya que se ha observado que las limitantes a la ejecución se mantienen respecto a lo detallado en los Informes del Primer, Segundo Trimestre y Tercer Trimestre del 2025 a pesar de la mejora en la ejecución del cuarto trimestre.
- El tiempo de ejecución de los proyectos se verá afectado por los retrasos en los procesos de contratación y a los declarados fracasados.

VI. Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- La SAG debe de definir una estrategia para acelerar los procesos correspondientes a adquisiciones y contratación de personal.
- Los Organismos Financiadores, SEFIN y SAG deben tomar una decisión respecto a los proyectos que presentan avances con mayor ejecución en tiempo y no en presupuesto y cumplimiento de alcances (metas físicas).



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO

Anexo Financiero al IV Trimestre 2025.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
108	I. Inversión Productiva		30,546,778.0	2,266,524,300.0	2,297,071,078.0	5,271,976.0	1,602,853,487.0	1,608,125,463.0	434,155.0	398,624,926.0	399,059,081.0	24.8	5,271,967.7	1,039,764,638.9	1,045,036,606.6	65.0
9	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		30,546,778.0	2,266,524,300.0	2,297,071,078.0	5,271,976.0	1,602,853,487.0	1,608,125,463.0	434,155.0	398,624,926.0	399,059,081.0	24.8	5,271,967.7	1,039,764,638.9	1,045,036,606.6	65.0
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	TF017904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,324.5	1,450,324.5	-
		TF086211-HN	-	13,156,550.0	13,156,550.0	-	63,136,550.0	63,136,550.0	-	446,096.3	446,096.3	0.7	-	50,668,028.7	50,668,028.7	80.3
	Total ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)		-	13,156,550.0	13,156,550.0	-	63,136,550.0	63,136,550.0	-	446,096.3	446,096.3	0.7	-	52,118,353.2	52,118,353.2	82.5
2	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN	-	62,133,300.0	62,133,300.0	-	255,378,500.0	255,378,500.0	-	14,278,899.2	14,278,899.2	5.6	-	210,020,609.2	210,020,609.2	82.2
		TF0C1874	-	323,614,627.0	323,614,627.0	-	70,578,051.0	70,578,051.0	-	7,576,391.6	7,576,391.6	10.7	-	9,884,044.2	9,884,044.2	14.0
	Total COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)		-	385,747,927.0	385,747,927.0	-	325,956,551.0	325,956,551.0	-	21,855,290.7	21,855,290.7	6.7	-	219,904,653.4	219,904,653.4	67.5
3	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	-	316,773,339.0	316,773,339.0	-	154,980,330.0	154,980,330.0	-	42,600,743.1	42,600,743.1	27.5	-	108,290,779.9	108,290,779.9	69.9
	Total Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		-	316,773,339.0	316,773,339.0	-	154,980,330.0	154,980,330.0	-	42,600,743.1	42,600,743.1	27.5	-	108,290,779.9	108,290,779.9	69.9
4	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	-	407,134,799.0	407,134,799.0	-	247,145,576.0	247,145,576.0	-	80,624,926.1	80,624,926.1	32.6	-	166,416,030.8	166,416,030.8	67.3
	Tipo de proyecto: Inversión Pública		-	407,134,799.0	407,134,799.0	-	247,145,576.0	247,145,576.0	-	80,624,926.1	80,624,926.1	32.6	-	166,416,030.8	166,416,030.8	67.3
	Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo		-	407,134,799.0	407,134,799.0	-	247,145,576.0	247,145,576.0	-	80,624,926.1	80,624,926.1	32.6	-	166,416,030.8	166,416,030.8	67.3
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	690,798.0	160,570,951.0	161,261,749.0	87,910.0	52,827,339.0	52,915,249.0	45,676.0	4,220,234.3	4,265,910.2	8.1	87,909.2	14,778,233.3	14,866,142.5	28.1
	Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)		690,798.0	160,570,951.0	161,261,749.0	87,910.0	52,827,339.0	52,915,249.0	45,676.0	4,220,234.3	4,265,910.2	8.1	87,909.2	14,778,233.3	14,866,142.5	28.1
6	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	2000002595	15,730,000.0	156,580,465.0	172,310,465.0	5,184,066.0	94,032,707.0	99,216,773.0	388,479.0	27,911,482.9	28,299,961.9	28.5	5,184,058.5	51,707,412.9	56,891,471.4	57.3
		LOAN No. 13754P	-	10,669,808.0	10,669,808.0	-	74,687,010.0	74,687,010.0	-	37,319,469.6	37,319,469.6	50.0	-	59,792,884.5	59,792,884.5	80.1
	Total PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)		15,730,000.0	167,250,273.0	182,980,273.0	5,184,066.0	168,719,717.0	173,903,783.0	388,479.0	65,230,952.5	65,619,431.6	37.7	5,184,058.5	111,500,297.3	116,684,355.8	67.1
7	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	14,125,980.0	395,458,801.0	409,584,781.0	-	72,245,477.0	72,245,477.0	-	17,831,384.9	17,831,384.9	24.7	-	38,822,915.0	38,822,915.0	53.7
	Total PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		14,125,980.0	395,458,801.0	409,584,781.0	-	72,245,477.0	72,245,477.0	-	17,831,384.9	17,831,384.9	24.7	-	38,822,915.0	38,822,915.0	53.7
8	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO	-	1,000,000.0	1,000,000.0	-	103,419,200.0	103,419,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-
		4940/BL-HO	-	80,250,821.0	80,250,821.0	-	264,300,108.0	264,300,108.0	-	165,815,298.0	165,815,298.0	62.7	-	236,150,425.9	236,150,425.9	89.3
		GRT/WE-20251-HO	-	13,500,000.0	13,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICO-FONPRODE	-	275,680,839.0	275,680,839.0	-	136,622,639.0	136,622,639.0	-	-	-	-	-	91,782,950.0	91,782,950.0	67.2
	Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		-	370,431,660.0	370,431,660.0	-	517,841,947.0	517,841,947.0	-	165,815,298.0	165,815,298.0	32.0	-	327,933,375.9	327,933,375.9	63.3
9	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD D LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL NORTE CENTRO DE HONDURAS (INNOVASAN)		-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD D LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL NORTE CENTRO DE HONDURAS (INNOVASAN)		-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Inversión Social		2,488,088,493.0	-	2,488,088,493.0	2,450,000,000.0	-	2,450,000,000.0	12,500,000.0	-	12,500,000.0	0.5	2,450,000,000.0	-	2,450,000,000.0	100.0
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		2,488,088,493.0	-	2,488,088,493.0	2,450,000,000.0	-	2,450,000,000.0	12,500,000.0	-	12,500,000.0	0.5	2,450,000,000.0	-	2,450,000,000.0	100.0
	BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES		350,000,000.0	-	350,000,000.0	350,000,000.0	-	350,000,000.0	-	-	-	-	350,000,000.0	-	350,000,000.0	100.0
	Total BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES		350,000,000.0	-	350,000,000.0	350,000,000.0	-	350,000,000.0	-	-	-	-	350,000,000.0	-	350,000,000.0	100.0
	BONO GANADERO		100,000,000.0	-	100,000,000.0	368,000,000.0	-	368,000,000.0	-	-	-	-	368,000,000.0	-	368,000,000.0	100.0
	Total BONO GANADERO		100,000,000.0	-	100,000,000.0	368,000,000.0	-	368,000,000.0	-	-	-	-	368,000,000.0	-	368,000,000.0	100.0
	BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		2,000,000,000.0	-	2,000,000,000.0	1,732,000,000.0	-	1,732,000,000.0	12,500,000.0	-	12,500,000.0	0.7	-	1,732,000,000.0	1,732,000,000.0	100.0
	Total BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO		2,000,000,000.0	-	2,000,000,000.0	1,732,000,000.0	-	1,732,000,000.0	12,500,000.0	-	12,500,000.0	0.7	-	1,732,000,000.0	1,732,000,000.0	100.0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,848,097.0	-	36,848,097.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,848,097.0	-	36,848,097.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		1,240,396.0	-	1,240,396.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total OTRAS INVERSIONES SOCIALES		1,240,396.0	-	1,240,396.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
	III. Formación Bruta de Capital		32,515,839.0	5,062,500.0	37,578,339.0	14,586,413.0	155,949,674.0	170,536,087.0	12,168,369.0	-	12,168,369.0	7.1	14,546,403.5	-	14,546,403.5	8.5
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		32,515,839.0	5,062,500.0	37,578,339.0	14,586,413.0	155,949,674.0	170,536,087.0	12,168,369.0	-	12,168,369.0	7.1	14,546,403.5	-	14,546,403.5	8.5
	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA		300,000.0	-	300,000.0	74,377.0	-	74,377.0	74,376.3	-	74,376.3	100.0	74,376.3	-	74,376.3	100.0
	Total DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA		300,000.0	-	300,000.0	74,377.0	-	74,377.0	74,376.3	-	74,376.3	100.0	74,376.3	-	74,376.3	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION		900,000.0	-	900,000.0	5,037,676.0	-	5,037,676.0	2,977,656.0	-	2,977,656.0	59.1	5,037,672.9	-	5,037,672.9	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION		900,000.0	-	900,000.0	5,037,676.0	-	5,037,676.0	2,977,656.0	-	2,977,656.0	59.1	5,037,672.9	-	5,037,672.9	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		-	-	-	-	1,140,110.0	1,140,110.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		-	-	-	-	1,140,110.0	1,140,110.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA		2,370,000.0	-	2,370,000.0	440,886.0	-	440,886.0	400,885.0	-	400,885.0	90.9	400,885.0	-	400,885.0	90.9
	Total FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA		2,370,000.0	-	2,370,000.0	440,886.0	-	440,886.0	400,885.0	-	400,885.0	90.9	400,885.0	-	400,885.0	90.9
	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA		-	-	-	100,000.0	-	100,000.0	100,000.0	-	100,000.0	100.0	100,000.0	-	100,000.0	100.0
	Total FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA		-	-	-	100,000.0	-	100,000.0	100,000.0	-	100,000.0	100.0	100,000.0	-	100,000.0	100.0
	GESTION DE AREAS PARA RIEGO		10,273,000.0	-	10,273,000.0	653,210.0	-	653,210.0	653,209.3	-	653,209.3	100.0	653,209.3	-	653,209.3	100.0
	Total GESTION DE AREAS PARA RIEGO		10,273,000.0	-	10,273,000.0	653,210.0	-	653,210.0	653,209.3	-	653,209.3	100.0	653,209.3	-	653,209.3	100.0
	INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		-	-	-	976,248.0	-	976,248.0	976,246.9	-	976,246.9	100.0	976,246.9	-	976,246.9	100.0
	Total INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		-	-	-	976,248.0	-	976,248.0	976,246.9	-	976,246.9	100.0	976,246.9	-	976,246.9	100.0
	INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (CAN)		-	-	-	995,135.0	-	995,135.0	995,135.0	-	995,135.0	100.0	995,135.0	-	995,135.0	100.0
	Total INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		-	-	-	995,135.0	-	995,135.0	995,135.0	-	995,135.0	100.0	995,135.0	-	995,135.0	100.0
	MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA		2,050,000.0	-	2,050,000.0	3,592,476.0	48,232.0	3,640,708.0	3,592,474.7	-	3,592,474.7	98.7	3,592,474.7	-	3,592,474.7	98.7
	Total MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA		2,050,000.0	-	2,050,000.0	3,592,476.0	48,232.0	3,640,708.0	3,592,474.7	-	3,592,474.7	98.7	3,592,474.7	-	3,592,474.7	98.7
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		5,327,399.0	5,062,500.0	10,389,899.0	869,787.0	154,761,332.0	155,631,119.0	551,768.4	-	551,768.4	0.4	869,786.0	-	869,786.0	0.6
	Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		5,327,399.0	5,062,500.0	10,389,899.0	869,787.0	154,761,332.0	155,631,119.0	551,768.4	-	551,768.4	0.4	869,786.0	-	869,786.0	0.6
	UNIDAD DE MODERNIZACION (UNIRAGRO)		-	-	-	1,846,618.0	-	1,846,618.0	1,846,617.5	-	1,846,617.5	100.0	1,846,617.5	-	1,846,617.5	100.0
	Total UNIDAD DE MODERNIZACION (UNIRAGRO)		-	-	-	1,846,618.0	-	1,846,618.0	1,846,617.5	-	1,846,617.5	100.0	1,846,617.5	-	1,846,617.5	100.0
	UNIDAD FINANCIERA SAG (FINAGRO)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total UNIDAD FINANCIERA SAG (FINAGRO)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COORDINACION DE REGIONALES		300,000.0	-	300,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL COORDINACION DE REGIONALES		300,000.0	-	300,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,007,250.0	-	5,007,250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		5,007,250.0	-	5,007,250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		1,250,000.0	-	1,250,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		1,250,000.0	-	1,250,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS		1,500,000.0	-	1,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS		1,500,000.0	-	1,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOMENTO A LA ACUICULTURA		1,785,446.0	-	1,785,446.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOMENTO A LA ACUICULTURA		1,785,446.0	-	1,785,446.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO		50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO		50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA		496,744.0	-	496,744.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA		496,744.0	-	496,744.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION		200,000.0	-	200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION		200,000.0	-	200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE AUDITORIA		456,000.0	-	456,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SERVICIOS DE AUDITORIA		456,000.0	-	456,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL		200,000.0	-	200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL		200,000.0	-	200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO		50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO		50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total general		2,551,151,110.0	2,271,586,800.0	4,822,737,910.0	2,469,858,389.0	1,758,803,161.0	4,228,661,550.0	25,102,524.0	398,624,926.0	423,727,450.0	10.0	2,469,818,371.2	1,039,764,638.9	3,509,583,010.1	83.0

Fuente: SIAFI, 31/12/2025

Anexo Físico al IV Trimestre 2025.

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Físicas	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Informe Final de Auditoría Financiera del Proyecto PROSASUR aprobados por la SAG	Informe	1	1	100%	0	0	100%
	Informes finales de cierre del proyecto PROSASUR, aprobado por el organismo financiador y máxima autoridad de la SAG.	Informe	1	1	100%	0	0	100%
	Informe de cierre del Fondo Original Remanente del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	1	1	100%	0	0	100%
	Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	1	1	100%	0	0	100%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	6347	591	9%	87	87	100%
	Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	20	16	80%	2	2	100%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	30	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición	Planes de Negocios	27	27	100%	5	5	100%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	5	5	100%	0	0	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	5	0	0%	0	0	0%
	Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	30	0	0%	0	0	0%
	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	30	0	0%	0	0	0%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	Planes de Negocios implementados financiados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Plan de Negocios	134	126	94%	8	0	0%
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs).	CANTIDAD	134	41	31%	50	41	82%
	Talleres de capacitación brindados a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Talleres de Capacitación	75	11	15%	30	11	37%
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	50	44	88%	19	19	100%
	(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	55	110%	25	25	100%
	(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	400	400	100%	200	200	100%
	(PI) Planes de asistencia técnica por rubro de producción aprobados.	Planes de Asistencia	5	3	60%	-	-	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	5	3	60%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuencas aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	5	5	100%	-	-	-
	(PF) Desembolso para créditos inclusivos y garantías otorgados a productores rurales a través de BANHPROVI	Millones	100	12.5	13%	-	12.5	-
	(PI) Monto en Lempiras Transferidos	Millones	50	91	182%	-	-	-
	(PF) Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.	Porcentaje	50	0	0%	-	-	-
(PI) Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión completa) evaluado y aprobado	Porcentaje	100	0	0%	-	-	-	



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Número de productores (as) rurales organizados mejoran su productividad y competitividad, incrementando sus ingresos y asegurando su seguridad alimentaria.	PRODUCTOR	6366	1434	23%	1,273.00	-	-
	Numero de planes de negocio implementados	PLAN DE NEGOCIO	50	41	82%	29.00	29.00	1.00
	Numero de planes de negocio aprobados	PLAN DE NEGOCIO	50	62	124%	29.00	29.00	1.00
	Numero de asistencia técnica brindadas	ASISTENCIA TÉCNICA	50	61	122%	11.00	11.00	1.00
	Evento Intercambio de experiencias (procesos de aprendizaje) desarrolladas con organizaciones de productores rurales de las comunidades del Valle de Aguan.	EVENTO	3	1	33%	3.00	1.00	0.33
	Planes de fortalecimiento organizacional implementados por Organizaciones usuarias	PLAN	50	34	68%	5.00	-	-
	Número de organizaciones usuarias con financiamiento otorgado	ORGANIZACION	50	41	82%	29.00	29.00	1.00
	Numero de campañas de concientización y buenas prácticas diseñadas	CAMPAÑA	9	9	100%	3.00	-	-
	Servicios financieros innovadores otorgados a Jóvenes y cajas rurales en las comunidades del Valle de Aguan.	SERVICIO	5	-	0%	-	-	-
	Número de becas aprobadas	BECA	96	11	11%	46.00	11.00	0.24
	Número de cajas rurales con financiamiento otorgado	CAJA RURAL	60	0	0%	20.00	-	-
	Capacitaciones en educación financiera brindadas a productores(as) que integran las cajas rurales	TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0%	1.00	-	-
	Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos implementados	PLAN	5	2	40%	-	-	-
Numero de planes de inversión en servicios ecosistémicos aprobados	PLAN	5	2	40%	-	-	-	
Capacitaciones en el tema ambiental climática brindadas.	TALLERE DE CAPACITACION	1	1	100%	-	-	-	
Número de Organizaciones /comunidades con financiamiento otorgado	ORGANIZACION	5	5	100%	-	-	-	
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Diseños Finales de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes; La Venta; La Paz; y Curarén.	DISEÑO	4	0	0%	2.00	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados	ESTUDIO	4	0	0%	2.00	-	-
	Rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua potable de los municipios de Nacaome y San Lorenzo	PORCENTAJE	0.1	0	0%	-	-	-
	Instrumentos para la Gestión Integral Recursos Hídricos (GIRH) elaborados en beneficio de la población. (Propuesta de la Política Nacional de GIRH y Propuesta de Reglamento de Aguas Subterráneas).	PROPUESTA TÉCNICA	2	0	0%	-	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado	PORCENTAJE	0.5	0	0%	-	-	-
	Talleres participativos de consulta con actores estratégicos	Talleres	3	2	67%	2.00	2.00	1.00
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	04 - Informes de supervisión de ejecución de los proyectos rehabilitados.	149 - INFORME	18	0	0%	8.00	-	-
	05 - Contrato firmado con empresas ejecutora.	155 - CONTRATO	8	0	0%	2.00	-	-
	06 - Plan de Asistencia Técnica aprobado.	264 - PLAN	1	0	0%	-	-	-
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	02 - Diagnósticos situacionales de las organizaciones de productores(as) elaborados	29 - DIAGNOSTICO	4	0	0%	2.00	-	-
	02 - Fichas de visitas a productores(as) firmadas.	993 - FICHA	10	0	0%	4.00	-	-
	02 - Líneas de tuberías instaladas.	53 - KILÓMETRO	10	0	0%	4.00	-	-
	02 - Plan de Capacitación en buenas prácticas agrícolas y ambientales.	264 - PLAN	1	0	0%	-	-	-
	03 - Socialización de plan de ordenamiento de los Recursos Naturales del Rio Selguapa y medidas de control ambiental con las Asociaciones de Regantes y las UMAs en los municipios priorizados..	1037 - TALLER DE SOCIALIZACION	9	0	0%	-	-	-
	04 - Plan de socialización de medidas ambientales y social elaborado con guion metodológico.	264 - PLAN	2	0	0%	-	-	-

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos y SIAFI
