



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

# Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

---

**Informe No. 0140-001-2026**

Tegucigalpa, Abril 2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Contenido

Contenido .....	2
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	4
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA .....	5
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) 6	6
D. PRINCIPALES PROYECTOS .....	7
D.1. Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana .....	7
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 .....	7
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 .....	8
D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	9
D.2. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) .9	
D 2.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	9
D 2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	11
D 2.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	11
D.3. Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente).....	11
D 3.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	11
D 3.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 .....	14
D 3.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	14
D.4. Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE).....	14
D 4.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	15
D 4.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	18
D 4.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	18
D.5. Proyecto De Seguridad Hídrica En El Corredor Seco De Honduras.....	18
D 5.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	18
D 5.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	21
D 5.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026.....	21
D.6. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).....	21
D 6.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	21
D 6.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	22



# SECRETARÍA DE FINANZAS



E.	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN .....	22
F.	PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026 .....	23
G.	CONCLUSIONES .....	23
H.	RECOMENDACIONES .....	23
ANEXO 1 .....		24
ANEXO 2 .....		25



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

### A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios; así como diversificar la oferta de los productos de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agroindustrial, mediante el fortalecimiento de la producción y productividad, garantías

de seguridad alimentaria e impulso a la competitividad y el financiamiento; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y la Inversión de Formación Bruta de Capital. Para lo cual en el 2026 mediante la Inversión Productiva se desarrollan 8 proyectos de inversión, que cuentan con un presupuesto aprobado para inversión productiva de L973,523,819.0 con lo cual se tiene programado la implementación de 555 planes de Negocio que apoyarán necesidades agroalimentarias en todo el país (COMRURAL II y III), ejecución de 10 Sub-Proyectos agro-costeros. 272 hectáreas con sistemas de riego por goteo instalado y funcionando (PDABR). Implementación de 120 Becas, 40 Cajas rurales con financiamiento otorgado y ejecución de 68 Planes de Negocios (PROINORTE). Con el proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad se implementarán 43 planes de Inversión, 300 asistencias técnicas en tecnologías climáticamente Inteligentes para productores organizados, 10 planes de manejo de microcuencas. 21 estudios y diagnósticos para inversiones en infraestructura (INNOVASAN).

Al primer trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L973,523,819, de los cuales L966,135,782.0 corresponden a Inversión productiva; L7,388,037.0 a la Formación Bruta de Capital para el desarrollo de programas de gran importancia como ser el Programa Del Sistema De Información Agroalimentaria (SISAGRO), Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Programa Nacional De Desarrollo Pesquero Y Acuícola (PROPECSA) y Programa Nacional De Fomento A La Agricultura IRRIGADA (PRONAGRI). La ejecución presupuestaria del trimestre asciende a L108,579,573.1 que representan el 11.2% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

Cuadro No. 01

**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026**  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>973,523,819.0</b>
Inversión Productiva	966,135,782.0
Formación Bruta de Capital	7,388,037.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>973,523,819.0</b>
Inversión Productiva	966,135,782.0
Formación Bruta de Capital	7,388,037.0
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>108,579,573.1</b>
Inversión Productiva	108,579,573.1
Formación Bruta de Capital	0.0
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>11.2%</b>
<b>Compromiso Aprobado</b>	<b>140,754,016.2</b>
Inversión Productiva	140,265,553.7
Formación Bruta de Capital	488,462.5
<b>% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente)</b>	<b>14.5%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2026



## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 1  
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería  
Financiamiento de la Inversión por Fuente Cifras en Millones de Lempiras

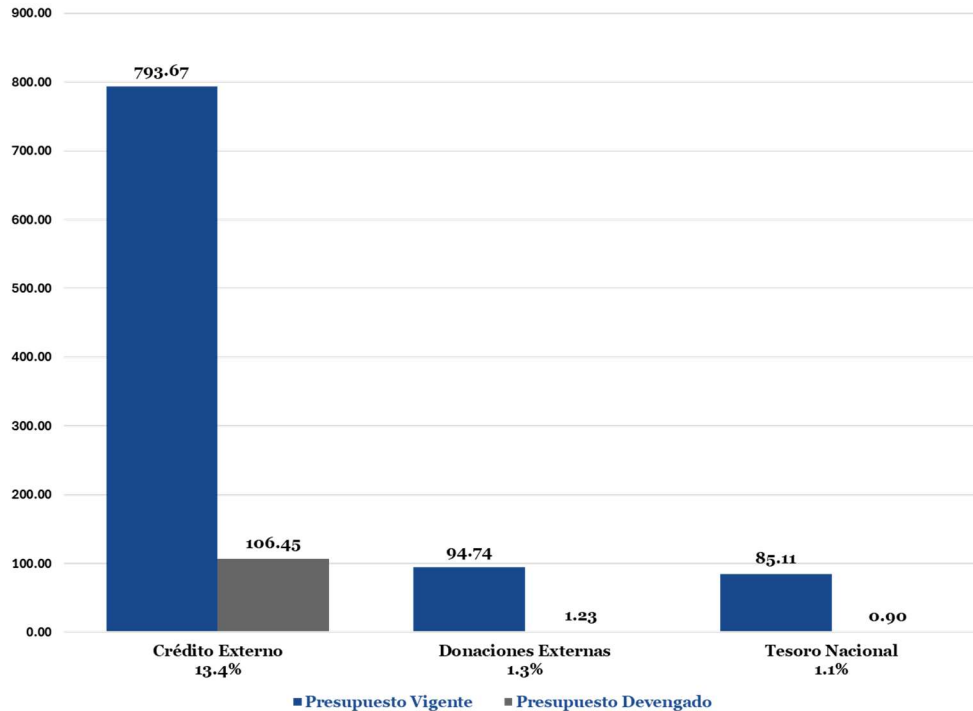

Fuente: SIAFI al 30/04/2026

En función al Gráfico No. 1, el Presupuesto Vigente de la SAG es financiado en un **8.7%** (L85,114,327.00) por recursos de Fondos Nacionales (Fuente de Tesoro Nacional, Recursos Propios), **81.5%** (L793,667,228.00) Fuente de Crédito Externo proveniente de préstamos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y por organismos varios como ser Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), OPEC, FIDA y ESPAÑA y un **9.7%** (L94,742,264.00) del presupuesto vigente restante, corresponde a Donaciones Externas, las cuales son financiadas mayormente por el BM.




# SECRETARÍA DE FINANZAS



## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

**Comportamiento Inversión Pública Total  
Al 31 de marzo (2022-2026)  
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería  
Cifras en millones de Lempiras**

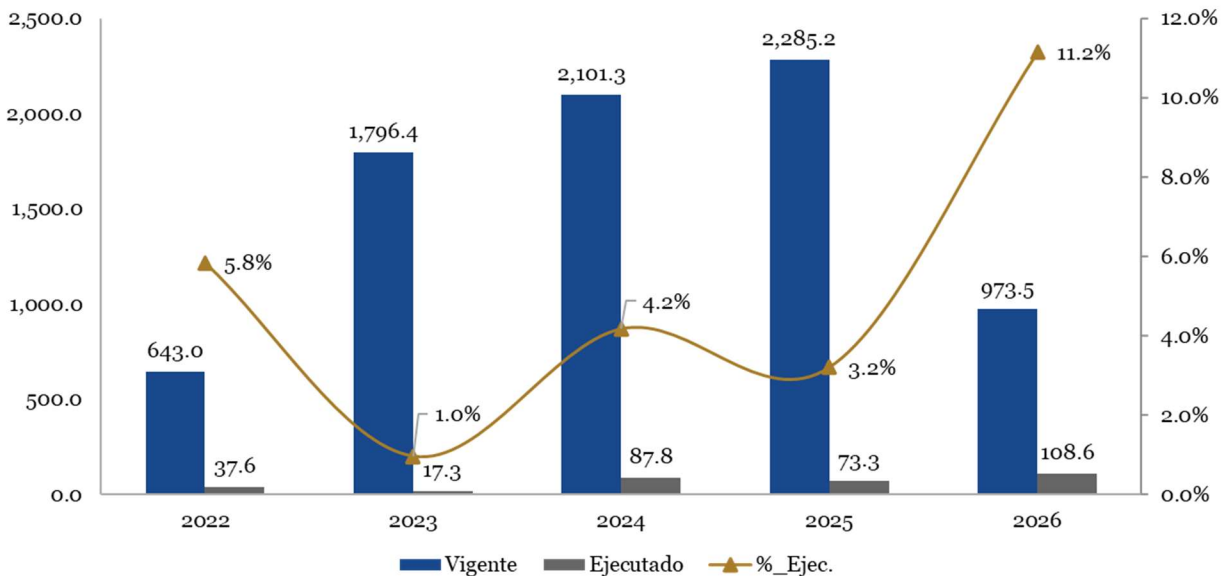

Fuente: SIAFI al 30/04/2026

En el periodo 2022-2026, la Inversiones Productiva de SAG experimentó cambio de organismo ejecutor de INVEST-H a la SAG producto del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, se han realizado acciones para mejorar la operatividad del Sector Agroalimentario para incrementar las inversiones productivas que han sido financiadas por fondos nacionales y fondos externos, en donde se han venido ejecutando diferentes proyectos tales como: 1) Alianza para el corredor seco, 2) Proyecto de Competitividad Rural II, 3) Proyecto De Competitividad Y Desarrollo Sostenible Del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA, 5) Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), 6) Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras PROINORTE, 7) Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, y 8) Proyecto de Competitividad Rural III y 9) el Proyecto de INNOVASAN.

Actualmente y de acuerdo con el análisis comparativo detallado al primer trimestre de los periodos del 2022-2026, la inversión Pública de SAG mantuvo una ejecución promedio del 3.55%. Respecto al periodo de 2022 a 2025 se observa una baja en la ejecución debido a lentos procesos de contratación, rotación de personal y falta de planeación y reprogramación de actividades en momentos claves. En relación al periodo 2026, al primer trimestre generó una ejecución del 11.2%, lo que denota en un incremento significativo de ejecución en comparación a 2022-2025. Esto debido a que mayormente los proyectos de Inversión Productiva cuentan ya con una mejor etapa



# SECRETARÍA DE FINANZAS



de implementación debido a que han ingresado a una fase de ejecución e implementación física, con ello se esperaría que esto dinamice en mayor medida la ejecución del presupuesto vigente.

## D. PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de proyectos:

### D.1. Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

Tiene como objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos, ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del COVID-19.

El Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana en el año 2026, ingresa a una fase decisiva de su ciclo de vida. Luego de un período prolongado concentrado en actividades preparatorias de carácter técnico, legal e institucional, el primer trimestre del 2026 marca un punto de inflexión hacia la ejecución efectiva. Este período se caracteriza por el inicio real de las obras civiles, la activación plena de la supervisión, la consolidación del fortalecimiento institucional del ente regulador y el inicio formal de la asistencia técnica a los prestadores de servicios, configurando la transición del proyecto desde la planificación hacia la materialización de resultados.

#### D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

En términos de avance físico, al cierre del primer trimestre del 2026 la Unidad Ejecutora del proyecto reporta ejecución en los subproyectos de obras civiles de Puerto Cortés, Choloma y Danlí con avances físicos entre 1.48 % y 1.81 %. Si bien estos porcentajes son reducidos, resultan coherentes con la etapa temprana de ejecución, en la cual han predominado actividades habilitantes como la aprobación de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), la validación de seguros y garantías, la movilización inicial a campo y la preparación de las primeras estimaciones de obra. Asimismo, el subproyecto de La Paz cuenta con orden de inicio emitida a finales del trimestre, mientras que Juticalpa y Siguatepeque permanecen en fase preconstructiva, con Plan de Inversión de Rehabilitación de Rápido Impacto (PIRRI) aprobados o en control de calidad.

En este contexto, el proyecto ha evolucionado desde una situación inicial sin sistemas en rehabilitación a cuatro sistemas con obras iniciadas o formalmente habilitadas, con supervisión activa en la totalidad de los contratos en ejecución. Paralelamente, se han activado instrumentos clave del diseño original, como los PIRRI, los procesos de equipamiento y micromedición y la asistencia técnica especializada, lo que representa un avance cualitativo sustantivo.

En cuanto al fortalecimiento institucional del ERSAPS, al cierre del trimestre se cuenta con nueve prestadores urbanos monitoreados y nueve Programas de Control de Calidad del Agua aprobados, así como con el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) en marcha, superando ampliamente la línea base de control regulatorio.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>								
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	1%	1.3%	-	1%	-
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Líneas de Impulsión, Distribución y Conexiones Domiciliarias del Sistema de Agua Potable de potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote I)	Porcentaje	0	2%	-	-	2%	-
	Subproyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en Centros de Producción y Tratamiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote II)	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Proyecto de Rehabilitación de Sistema Urbano de Obras de Agua Potable de La Paz, La Paz	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Tanques, Líneas, y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Danlí, El Paraíso (Lote III)	Porcentaje	-	-	-	-	-	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	2.00	17%	3.00	2.00	67%
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-
	Nuevos prestadores de servicios (municipalidad) de agua potable implementados en cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto/Informe al I Trimestre 2026

### D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US\$	46,500,000	07/06/2021 30/07/2027
		Lempiras	1,277,731,650	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	119,639,594	119,639,594	5,731,115	4.8
Acumulado 2026	119,639,594	119,639,594	5,731,115	4.8
Acumulado Vida del Proyecto */	1,277,731,650	1,277,731,650	162,410,492	12.7

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ***D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026***

- Proceso de Especialista en Adquisiciones, fracaso y se están revisando nuevamente los términos de referencia para volver a lanzar el proceso.
- Especialista Legal proceso declarado fracasado y se están revisando nuevamente los términos de referencia para volver a lanzar el proceso.
- Se canceló el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto que se tenía en curso y se realizó una contratación directa, la cual cuenta con No Objeción del Banco y se encuentra en análisis legal de la UGP para la opinión legal del contrato.

## **D.2. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)**

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

De acuerdo con el informe presentado por la Unidad Ejecutora del Proyecto ComRural II, al primer trimestre de 2026 evidencia que el proyecto se encuentra en una fase de cierre, orientada a la consolidación de resultados, el aseguramiento de los impactos alcanzados y el fortalecimiento de la sostenibilidad institucional lograda durante su ejecución. Esta etapa se desarrolla en un contexto de ajuste estructural, formalizado mediante la Tercera Enmienda al Convenio de Financiamiento, aprobada por el Banco Mundial el 20 de marzo de 2026, que contempla la ampliación de la fecha de cierre hasta el 31 de agosto de 2026 y la desobligación de US\$ 7,500,266.44 del crédito, en función del avance efectivo del proyecto y la priorización de actividades finales. Esta orientación responde a una decisión de gestión estratégica, enfocada en preservar la calidad del cierre para asegurar la trazabilidad de los resultados y promover el uso eficiente de los recursos remanentes.

En este marco, la ejecución del trimestre se concentró en gastos operativos, procesos de cierre técnico, administrativo y financiero, validación de productos y la culminación de inversiones estratégicas, alineadas al alcance ajustado del proyecto y al nuevo Marco de Resultados.

### ***D 2.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026***

En términos de avances físicos, de acuerdo con lo indicado por la Unidad Ejecutora, proporcionaron un seguimiento intensivo al cierre de 167 Planes de Negocio de la Ventana 1 y 66 Planes de Negocio de la Ventana 2, con el objetivo de garantizar la documentación, liquidación y validación técnica y financiera de las inversiones ejecutadas. Asimismo, se avanzó en la elaboración de 31 informes de cierre de Organizaciones de Productores Rurales.

En materia de fortalecimiento institucional, se observaron los avances más significativos del período de análisis, destacando el 45% de avance en la construcción del edificio de SENASA y la



# SECRETARÍA DE FINANZAS



rehabilitación de seis cámaras de enfriamiento de la DICTA/SAG, inversiones alineadas con los indicadores de la línea base y el Objetivo de Desarrollo del Proyecto.

Finalmente, se identificaron limitaciones administrativas y procedimentales, propias de la fase de cierre, relacionadas con la baja ejecución financiera, retrasos en reembolsos, validación de informes y contratación de consultorías estratégicas. En donde para atenderlas, se implementaron acciones de mitigación orientadas a agilizar reembolsos, priorizar validaciones, aceleración de procesos de contratación e integrar de forma analítica los enfoques transversales, asegurando un cierre ordenado, transparente y oportuno dentro del plazo aprobado.

## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa - ción	Ejecu- - ción	% Ejec	Program a- ción	Ejecu- - ción	% Ejec
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Primer Trimestre 2026.

Al mes de marzo la unidad ejecutora ha manifestado la no programación de metas físicas. Debido a no contar con presupuesto de inversión pública aprobado por el congreso nacional, operando de manera temporal bajo un presupuesto prorrogado correspondiente al ejercicio fiscal 2025. \*Adicionalmente señalaron que, para el trimestre, en relación con los informes de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, se tiene un total de 31 Planes de Negocio, informes adicionales que actualmente se encuentran como borrador, en proceso de validación por parte de los Especialistas del proyecto para su posterior aprobación. Los cuáles serán reportados en el II trimestre 2026.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D 2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$
		Lempiras	1,167,811,929	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	86,690,133	86,690,133	6,618,776	7.6
Acumulado 2026	86,690,133	86,690,133	6,618,776	7.6
Acumulado Vida del Proyecto */	1,167,811,929	1,167,811,929	752,252,943	64.4

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## D 2.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Contratación de Firma Consultora de Evaluación de Cierre la cual se encuentra en proceso de revisión de propuesta técnica y económica. Contratación de Firma Consultora para levantamiento de encuesta de agricultores que continúan practicando una tecnología agrícola mejorada dos meses después de su implementación del Planes de Negocio. En proceso de revisión de propuesta técnica y económica.

## D.3. Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente)

Tiene como objetivo Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH) y el Objetivo Específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

### D 3.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

De acuerdo con lo indicado por la Unidad Ejecutora, durante el primer trimestre de 2026, la ejecución de ProOccidente se priorizaron actividades de carácter técnico y administrativo, las cuales constituyen la base indispensable para asegurar una ejecución efectiva de los productos y el logro de los resultados previstos en los trimestres subsiguientes del año.

En cuanto a los avances realizados, el Componente de Fortalecimiento del Desarrollo Productivo concentró sus esfuerzos en la consolidación técnica e institucional del proceso de implementación. Se dio seguimiento y validación a los informes Anual y del IV Trimestre 2025 presentados por la firma subimplementadora, se realizaron giras de verificación en campo para la emisión de dictámenes técnicos y se revisaron y fortalecieron los procedimientos del Comité de Planes de Inversión. Asimismo, se efectuó la revisión técnica de tres perfiles de microcuencas y se elaboraron



# SECRETARÍA DE FINANZAS



dictámenes de aprobación para 37 planes de inversión de grupos productivos y 28 planes de inversión de MIPYMES. Si bien estos avances aún no se reflejan como ejecución física del POA 2026, representan progresos concretos frente a la línea base del proyecto, y garantizan una implementación posterior ordenada, sustentada en criterios claros de elegibilidad, calidad técnica y sostenibilidad.

Por su parte, el Componente de Financiamiento Rural evidenció una de las principales áreas de ajuste estratégico del proyecto. Durante el trimestre se identificaron limitaciones estructurales asociadas al diseño original del componente, las cuales incidieron en una colocación más lenta de los recursos financieros. En respuesta, se desarrollaron reuniones técnicas sostenidas con BANHPROVI orientadas a la revisión y ajuste de los productos financieros y del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP).

En relación con el Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la SAG, el avance del trimestre se ubicó conforme a la fase inicial prevista en el diseño del proyecto. Se activó la comisión evaluadora correspondiente, se avanzó en la gestión de la “No Objeción” para la contratación del consultor responsable del diagnóstico institucional, y se mantuvo coordinación interinstitucional con las nuevas autoridades. Estos avances, aunque aún no se traducen en productos medibles, resultan fundamentales para el fortalecimiento institucional y la posterior implementación del sistema de M&E.

A nivel de Gestión, Administración y Soporte, se mantuvo una ejecución continua y acorde a la planificación, asegurando la operatividad del proyecto. Durante el trimestre se dio seguimiento a los pagos a la firma subimplementadora, se avanzó en los procesos de adquisición de equipo informático y mobiliario, se impulsaron las contrataciones de personal clave, se gestionó la auditoría financiera 2025, se atendieron las reparaciones de la oficina regional y se realizaron gestiones administrativas orientadas al primer desembolso de los fondos WE-FI.

En lo relativo a la problemática y los retrasos, el trimestre evidenció principalmente la ausencia de metas físicas trimestrales, la lentitud estructural del Componente 2, los tiempos administrativos asociados a procesos de contratación y de obtención de “No Objeción”, así como la presión derivada del horizonte de cierre del proyecto previsto para abril de 2027. Estos factores generan riesgos de acumulación de metas y de subejecución presupuestaria si no se implementan medidas oportunas. Frente a este escenario, el proyecto adoptó acciones de mitigación claras y proactivas, entre las que se destacan la formulación de una propuesta de reestructuración de componentes, el análisis conjunto con la UEP, UAP, SEFIN, BID y FONPRODE, la revisión estratégica del Componente 2 y la evaluación de una posible ampliación del plazo de ejecución de entre 8 y 15 meses, con el objetivo de alinear metas, recursos y tiempos disponibles a un escenario realista de ejecución e impacto.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente)	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	-	0%	-	-	-
	(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	-	0%	-	-	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuencas aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	-	0%	-	-	-
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Primer Trimestre 2026.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D 3.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.	BID 4936/BL-HO	91,400,000		21/05/2020 21/07/2027
	BID 4940/BL-HO FONPRODE GRT/WE- 20251-HO		2,352,398,360	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	149,967,933	149,967,933	23,088,638	15.4
Acumulado 2026	149,967,933	149,967,933	23,088,638	15.4
Acumulado Vida del Proyecto */	2,511,498,340	2,511,498,340	764,279,660	30.4

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## D 3.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

- Proceso para Contratación firma sub implementadora Etapa II.
- Proceso para Contratación de firma auditora
- Publicación de términos de referencia para Contratación de Oficial Financiero.
- Contratación de Oficial en Comunicaciones
- Proceso de Adquisición de equipo informático
- Proceso de Adquisición de mobiliario de oficina
- En proceso de contratación para la Remodelación de Oficinas Regionales, Ciudad de La Esperanza.
- En gestión de No Objeción el Proceso de Contratación de Consultor para el Diagnostico Institucional Para el Sistema de M&E
- recepción de información solicitada a firmas que expresiones de interés para Contratación del Sub implementador del Subcomponente 1.4 Fortalecimiento de Servicios del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Productos 1.8 y 1.9

## D.4. Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)

El proyecto consiste en Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



La Unidad ejecutora ha manifestado que, durante el primer trimestre del año 2026, el Proyecto desarrolló sus actividades en un entorno institucional condicionado por un proceso de transición gubernamental que incidió directamente en la aprobación y liberación del presupuesto. Esta situación generó una paralización operativa durante los meses de enero y febrero, limitando la ejecución financiera y la implementación de actividades programadas en ese período. No obstante, el proyecto logró reactivar su funcionamiento en el mes de marzo, concentrando en este lapso los principales desembolsos y acciones operativas, lo cual evidencia una capacidad institucional de respuesta y adaptación ante restricciones externas que no son atribuibles a la gestión propia del proyecto.

A pesar de este contexto adverso, el desempeño general del proyecto puede considerarse satisfactorio desde una perspectiva técnica. Por lo que, al cierre del trimestre, se alcanzó una ejecución financiera de L25.25 millones, equivalente al 20.22% del presupuesto anual aprobado, lo cual resulta consistente con un trimestre en el que únicamente se contó con disponibilidad real de recursos en uno de sus tres meses. Este nivel de ejecución refleja no solo la capacidad de absorción del proyecto, sino también una eficiencia operativa en la reactivación de procesos administrativos y financieros una vez superadas las limitaciones iniciales.

## ***D 4.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026***

En términos de avances físicos, el proyecto presenta resultados significativos, particularmente en los indicadores de cobertura e inclusión social, reportando atención acumulada de 5,361 beneficiarios, manteniendo los parámetros de inclusión establecidos en el diseño del proyecto, con una importante participación de mujeres, jóvenes y población indígena. Permitiendo la consolidación del proyecto de una base sólida de intervención en territorio y ha avanzado de manera sustantiva en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo social.

Respecto al cumplimiento a nivel de componentes el análisis evidencia que el mayor dinamismo se concentró en el componente de Desarrollo Productivo y Resiliencia, el cual constituye el eje central del proyecto. Este componente absorbió más del 75% de los recursos ejecutados durante el trimestre, orientados principalmente a la aprobación e implementación de Planes de Negocio. En este sentido, se lograron aprobar 33 planes de negocio por parte del Comité de Aprobación de Inversiones, lo que representa más de la mitad de la meta anual, y se realizaron desembolsos efectivos a 15 planes, evidenciando un avance concreto en la implementación de inversiones productivas en las organizaciones beneficiarias. Este comportamiento no solo refleja una adecuada priorización estratégica, sino también una mejora en los tiempos de revisión técnica y legal, lo que fortalece la eficiencia del modelo de intervención del proyecto.

Por su parte, el componente de Alianzas Comerciales, Fortalecimiento Organizacional e Innovación mostró avances principalmente en términos cualitativos, enfocados en la preparación y fortalecimiento de las organizaciones usuarias. Entre las actividades realizadas se incluyen la socialización de los Planes de Fortalecimiento Organizacional, la asesoría legal para la actualización de estructuras organizativas y el acompañamiento en procesos administrativos como la obtención del PIN SIAFI. Si bien estos avances no se reflejan con la misma intensidad en la ejecución financiera, constituyen condiciones idóneas fundamentales para la implementación efectiva de inversiones en fases posteriores del proyecto.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



En cuanto al componente de Administración y Gestión del Proyecto, se observa un desempeño acorde con lo esperado, con una ejecución proporcional al avance general del proyecto. Se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y seguimiento, incluyendo la actualización del sistema SAGSE y la carga de información histórica, lo que permite mejorar la trazabilidad y la gestión de la información.

## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
Proyecto Inclusión Económica Social Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresariedad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad alimentaria.	Beneficiarios	6750	-	-	-	-	-
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores.	Planes	40	12.00	30%	-	12.00	
	Organizaciones de productores de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	-	-	-	-	-
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-
	Productores promovidos en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	-	-	-	-	-
	"Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores rurales							



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
	para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño."	Plan	60	12	20%	-	12.00	
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	33	55%	-	33.00	
	"Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios. "	Capacitaciones	735	75	10%	75.00	75.00	100%
	"Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto "	Plan	6	-	-	-	-	-
	Campañs de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores rurales en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño.	Capacitación	9	-	-	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Primer Trimestre 2026.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D 4.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	FIDA 2000002595 LOAN No. 13754P	US\$ 39,087,574
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	124,843,732	124,843,732	25,216,748	20.2
Acumulado 2026	124,843,732	124,843,732	25,216,748	20.2
Acumulado Vida del Proyecto */	1,074,052,267	1,074,052,267	222,093,306	20.7

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## D 4.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Desde la perspectiva de adquisiciones, se identifican varios procesos clave en diferentes etapas del ciclo de contratación, los cuales son determinantes para el desarrollo futuro del proyecto. Entre estos destacan la contratación para la formulación e implementación de los Planes de Fortalecimiento Organizacional, los diagnósticos territoriales que se encuentran en ejecución, y los procesos relacionados con la rehabilitación de caminos y obras menores, los cuales se encuentran en fase de ajuste de documentos para ser contratados en septiembre 2026.

### D.5. Proyecto De Seguridad Hídrica En El Corredor Seco De Honduras

El Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del recurso hídrico en áreas priorizadas, beneficiando a una población estimada de 167,100 habitantes.

## D 5.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Durante el primer trimestre de 2026, según lo reportado por la Unidad Ejecutora, no se registran avances físicos en obras civiles, situación que responde a la secuencia normal del ciclo de inversión, donde la ejecución de infraestructura está condicionada a la finalización de diseños, la aprobación de estudios ambientales y sociales, la regularización de predios y la culminación de los procesos de contratación, así como la definición de modelos de gestión sostenible para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable las cuales contribuyen a consolidar el marco institucional y normativo necesario para la sostenibilidad de las inversiones del Proyecto.

En este contexto, se alcanzaron logros relevantes, destacando la finalización de los diseños de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), lo que reduce significativamente el riesgo de ajustes



# SECRETARÍA DE FINANZAS



en fase constructiva. Asimismo, se formalizaron los contratos para la elaboración de estudios ambientales y sociales, fortaleciendo el cumplimiento de los estándares del Banco Mundial.

En materia de contratación, se evidencian avances significativos, con los procesos activos para las plantas de tratamiento de agua potable, particularmente la de Nacaome y una preparación avanzada en otros componentes como la red hidroclimatológica, el radar meteorológico y los viveros. De manera complementaria, se registran avances en la regularización de predios y en la coordinación interinstitucional, incluyendo la formalización del convenio tripartito para la Actualización de Diseños existentes de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Curarén, el cual constituye un instrumento clave para la implementación territorial.

En el ámbito institucional, se ha fortalecido la gobernanza del recurso hídrico mediante el desarrollo de instrumentos estratégicos, así como la incorporación de enfoques de género, inclusión social y salvaguardas ambientales.

No obstante, persisten desafíos relevantes, entre los que destacan la ausencia de ejecución física de obras, el inicio retrasado de los estudios ambientales y la complejidad de los procesos de legalización de predios, definición y aprobación de modelos de sostenibilidad los cuales son factores que podrían generar desfases en la ejecución de los distintos subproyectos. En este sentido, el proyecto se encuentra en una etapa crítica de transición hacia la ejecución, por lo que resulta necesario implementar un arranque escalonado de obras, priorizar aquellos subproyectos con mayor grado de madurez y fortalecer el seguimiento a los procesos críticos, con el fin de asegurar una ejecución progresiva, eficiente y orientada a resultados en los próximos trimestres.

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
Proyecto De Seguridad Hídrica En El Corredor Seco De Honduras	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado.	Porcentaje	1	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	-	-	-
	Diseños finales de SIAS La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Informe	2	-	-	-	-	-
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidro climática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de SIAS en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curaren actualizados.	Estudio	4	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de construcción de los SIAS de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D 5.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	IDA-6680-HN	65,500,000		1/4/2021
			1,799,815,550	31/3/2028
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	103,919,661	103,919,661	10,243,238	9.9
Acumulado 2026	103,919,661	103,919,661	10,243,238	9.9
Acumulado Vida del Proyecto	1,799,815,550	1,799,815,550	86,526,415	4.8
*/				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## D 5.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Durante el trimestre no se suscribieron contratos, únicamente se registra la enmienda No.3 contrato de servicios de consultoría No. SBCC-F-BM-PSEHI-SAG-22025 denominado (SIAS) en Manazapa, La Venta, La Paz y Curarén”, que incluye ampliación de monto, tiempo y alcance.

### D.6. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Contribuirá a la reducción de pobreza y pobreza. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales, así como la reducción de la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa.

La Unidad ejecutora ha indicado en su informe presentado que, durante el I Trimestre de 2026, el proyecto presenta un desempeño caracterizado por avances físicos concentrados en productos intermedios, sin que aún se materialicen resultados finales en términos de hectáreas incorporadas o rehabilitadas bajo riego.

### D 6.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Respecto a la ejecución física en el componente de infraestructura, se evidencia un progreso en la instalación de tuberías, alcanzando 0.9 km de los 1.4 km programados (64%) en el proyecto Joya de Ramos (Lamaní), así como 0.7 km de 0.9 km programados (78%) en el sistema de San Sebastián, lo que refleja una ejecución moderada, aunque por debajo de lo planificado. Al respecto la baja ejecución física en campo se manifiesta a en el ámbito técnico, que el principal obstáculo fue la presencia de **material rocoso durante las excavaciones** en los proyectos Joya de Ramos (Lamaní) y San Sebastián, lo cual no había sido previsto con suficiente precisión en la planificación inicial. Esta situación obligó a los contratistas a incorporar **maquinaria**



# SECRETARÍA DE FINANZAS



**especializada para la remoción de roca**, lo que implicó dedicar más tiempo a actividades preparatorias y reducir el avance efectivo en la instalación de tuberías. Como resultado, durante el mes de marzo el progreso fue significativamente menor al esperado, afectando el cumplimiento de las metas trimestrales establecidas.

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa-ción	Ejecución	% Ejec	Programa-ción	Ejecución	% Ejec
Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a agua para riego en parcelas de los productores.	Hectarea	50	-	0%	-	-	
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	36.5	0.90	2%	1.40	0.90	64%
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectarea	272	-	0%	-	-	
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	1.2	0.70	58%	0.90	0.70	78%

## D 6.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE 2101	US\$	40,066,895	13/12/2014
		Lempiras	1,100,962,144	30/11/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	72,101,212	72,101,212	4,660,415	6.5
Acumulado 2026	72,101,212	72,101,212	4,660,415	6.5
Acumulado Vida del Proyecto	1,100,962,144	1,100,962,144	923,202,939	83.9

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre 2026 se realizaron misiones por parte del Banco Mundial para los Proyectos de COMRURAL II y COMRURAL III, se realizaron dictámenes técnicos de ampliación de tiempo para COMRURAL II y des obligación de fondos para el Proyecto de COMRURAL II. Por



# SECRETARÍA DE FINANZAS



otra parte, se realizó Dictamen de Transferencia entre Componentes para el Proyecto PROINORTE.

## **F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026**

De manera general y de acuerdo con lo indicado en los informes presentados por los diferentes proyectos ejecutados por SAG, se mantiene la problemática relacionada a dilatación de los procesos de Adquisiciones, procesos de Contratación fracasados, Tardanza en la revisión y emisión de Dictámenes Legales por parte de la Dirección de Servicios Legales de la SAG.

## **G. CONCLUSIONES**

- Los proyectos ejecutados por SAG se encuentran en una etapa de implementación (Ejecución Física) en donde han superado en cierta medida procesos esenciales de contratación. Sin embargo, aún persisten problemas a lo interno de la institución que pueden retrasar procesos pendientes de contrataciones necesarios para que los proyectos entre en un 100% en la etapa de implementación y puedan dar cumplimiento a los objetivos de cada uno de los proyectos.
- Ha pesar de que se han realizado contrataciones esenciales el tiempo de ejecución de los proyectos se verá afectado por los retrasos en los procesos y a los declarados fracasados asimismo los proyectos se deberán de adaptar a los tiempos de finalización de cada proyecto.

## **H. RECOMENDACIONES**

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- Se deben de generar planes de acción en conjunto con la SEFIN-SAG y Organismos Financiadores en donde se identifiquen las actividades Hitos y cuellos de botella que gatillaran la ejecución de los proyectos.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO 1

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026**  
Cifras en Lempias

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado				
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Compromiso (Comp./Vig.)	
<b>8</b>	<b>1. Inversión Productiva</b>		<b>77,726,290</b>	<b>888,409,492</b>	<b>966,135,782</b>	<b>77,726,290</b>	<b>888,409,492</b>	<b>966,135,782</b>	<b>897,000</b>	<b>107,682,573</b>	<b>108,579,573</b>	<b>11.2%</b>	<b>1,612,000</b>	<b>138,653,554</b>	<b>140,265,554</b>	<b>14.5%</b>	
<b>8</b>	<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>		<b>77,726,290</b>	<b>888,409,492</b>	<b>966,135,782</b>	<b>77,726,290</b>	<b>888,409,492</b>	<b>966,135,782</b>	<b>897,000</b>	<b>107,682,573</b>	<b>108,579,573</b>	<b>11.2%</b>	<b>1,612,000</b>	<b>138,653,554</b>	<b>140,265,554</b>	<b>14.5%</b>	
1	COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)	IDA-6917-HN		168,217,503	168,217,503		168,217,503	168,217,503		31,792,388	31,792,388	18.9%		34,460,924	34,460,924	20.5%	
		TfOCi874		60,456,014	60,456,014		60,456,014	60,456,014		1,228,255	1,228,255	2.0%		2,244,850	2,244,850	3.7%	
	<b>Total COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)</b>			<b>228,673,517</b>	<b>228,673,517</b>		<b>228,673,517</b>	<b>228,673,517</b>		<b>33,020,643</b>	<b>33,020,643</b>	<b>14.4%</b>		<b>36,705,774</b>	<b>36,705,774</b>	<b>16.1%</b>	
2	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN		119,639,594	119,639,594		119,639,594	119,639,594		5,731,115	5,731,115	4.8%		22,530,827	22,530,827	18.8%	
	<b>Total Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>			<b>119,639,594</b>	<b>119,639,594</b>		<b>119,639,594</b>	<b>119,639,594</b>		<b>5,731,115</b>	<b>5,731,115</b>	<b>4.8%</b>		<b>22,530,827</b>	<b>22,530,827</b>	<b>18.8%</b>	
3	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN		86,690,133	86,690,133		86,690,133	86,690,133		6,618,776	6,618,776	7.6%		6,918,198	6,918,198	8.0%	
	<b>Total Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)</b>	<b>Tipo de proyecto: Inversión Pública</b>		<b>86,690,133</b>	<b>86,690,133</b>		<b>86,690,133</b>	<b>86,690,133</b>		<b>6,618,776</b>	<b>6,618,776</b>	<b>7.6%</b>		<b>6,918,198</b>	<b>6,918,198</b>	<b>8.0%</b>	
4	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101		38,459,090	38,459,090		38,459,090	38,459,090		4,660,415	4,660,415	6.5%		4,660,415	4,660,415	6.5%	
	<b>Total PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)</b>			<b>38,459,090</b>	<b>38,459,090</b>		<b>38,459,090</b>	<b>38,459,090</b>		<b>4,660,415</b>	<b>4,660,415</b>	<b>6.5%</b>		<b>4,660,415</b>	<b>4,660,415</b>	<b>6.5%</b>	
5	Proyecto de fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios (INNOVASAN) en 21 municipios de la región norte central de Honduras	BRAM No.2000005029		26,800,000	26,800,000		26,800,000	26,800,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
		GAFSP INNOVASAN		16,200,000	16,200,000		16,200,000	16,200,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
		PBAS No.2000005030		13,800,000	23,500,000		13,800,000	23,500,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
	<b>Total Proyecto de fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agr</b>		<b>13,800,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>80,300,000</b>	<b>13,800,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>80,300,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	
6	PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)	2000002595		19,705,500	70,861,814	90,567,314	19,705,500	70,861,814	90,567,314	897,000	8,535,861	9,432,861	10.4%	1,612,000	13,927,259	15,539,259	17.2%
		LOAN No. 13754P		34,276,418	34,276,418	34,276,418	34,276,418	34,276,418	34,276,418	15,783,887	15,783,887	46.0%		15,783,887	15,783,887	46.0%	
	<b>Total PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES</b>		<b>19,705,500</b>	<b>105,138,232</b>	<b>124,843,732</b>	<b>19,705,500</b>	<b>105,138,232</b>	<b>124,843,732</b>	<b>897,000</b>	<b>24,319,748</b>	<b>25,216,748</b>	<b>20.2%</b>	<b>1,612,000</b>	<b>29,711,146</b>	<b>31,323,146</b>	<b>25.1%</b>	
7	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN		5,761,700	98,157,961	103,919,661	5,761,700	98,157,961	103,919,661	-	10,243,238	10,243,238	9.9%		14,351,024	14,351,024	13.8%
	<b>Total PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS</b>		<b>5,761,700</b>	<b>98,157,961</b>	<b>103,919,661</b>	<b>5,761,700</b>	<b>98,157,961</b>	<b>103,919,661</b>	<b>-</b>	<b>10,243,238</b>	<b>10,243,238</b>	<b>9.9%</b>	<b>-</b>	<b>14,351,024</b>	<b>14,351,024</b>	<b>13.8%</b>	
8	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO		3,275,000	3,275,000	3,275,000	3,275,000	3,275,000	3,275,000	-	-	0.0%		-	-	0.0%	
		4940/BL-HO		40,010,236	40,010,236	40,010,236	40,010,236	40,010,236	40,010,236	23,088,638	23,088,638	57.7%		23,776,171	23,776,171	59.4%	
		GRT/WE-20251-HO		18,086,250	18,086,250	18,086,250	18,086,250	18,086,250	18,086,250	-	-	0.0%		-	-	0.0%	
		ICO-FONPRODE		88,596,447	88,596,447	88,596,447	88,596,447	88,596,447	88,596,447	-	-	0.0%		-	-	0.0%	
	<b>Total PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD</b>			<b>149,967,933</b>	<b>149,967,933</b>	<b>149,967,933</b>	<b>149,967,933</b>	<b>149,967,933</b>	<b>149,967,933</b>	<b>23,088,638</b>	<b>23,088,638</b>	<b>15.4%</b>		<b>23,776,171</b>	<b>23,776,171</b>	<b>15.9%</b>	
<b>5</b>	<b>2. Formación Bruta de Capital Fijo</b>		<b>7,388,037</b>	<b>-</b>	<b>7,388,037</b>	<b>7,388,037</b>	<b>-</b>	<b>7,388,037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>488,463</b>	<b>-</b>	<b>488,463</b>	<b>6.6%</b>	
<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>			<b>7,388,037</b>	<b>-</b>	<b>7,388,037</b>	<b>7,388,037</b>	<b>-</b>	<b>7,388,037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>488,463</b>	<b>-</b>	<b>488,463</b>	<b>6.6%</b>	
1	ACTIVIDADES CENTRALES			850,000	850,000		850,000	850,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
	<b>Total ACTIVIDADES CENTRALES</b>			<b>850,000</b>	<b>850,000</b>		<b>850,000</b>	<b>850,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	
2	PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (SISAGRO)			3,292,044	3,292,044		3,292,044	3,292,044		-	-	0.0%		488,463	488,463	14.8%	
	<b>Total PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (SISAGRO)</b>			<b>3,292,044</b>	<b>3,292,044</b>		<b>3,292,044</b>	<b>3,292,044</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>488,463</b>	<b>488,463</b>	<b>14.8%</b>	
3	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)			500,000	500,000		500,000	500,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
	<b>Total PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)</b>			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	
4	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)			939,993	939,993		939,993	939,993		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
	<b>Total PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)</b>			<b>939,993</b>	<b>939,993</b>		<b>939,993</b>	<b>939,993</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	
5	PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)			1,806,000	1,806,000		1,806,000	1,806,000		-	-	0.0%		-	-	0.0%	
	<b>Total PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)</b>			<b>1,806,000</b>	<b>1,806,000</b>		<b>1,806,000</b>	<b>1,806,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	
	<b>Total general</b>		<b>85,114,327</b>	<b>888,409,492</b>	<b>973,523,819</b>	<b>85,114,327</b>	<b>888,409,492</b>	<b>973,523,819</b>	<b>897,000</b>	<b>107,682,573</b>	<b>108,579,573</b>	<b>11.2%</b>	<b>2,100,463</b>	<b>138,653,554</b>	<b>140,754,016</b>	<b>14.5%</b>	

Nota: SIAFI, 30/04/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 2

### ANEXO No.2

#### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>								
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	1%	1.3%	-	1%	-
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Líneas de Impulsión, Distribución y Conexiones Domiciliarias del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote I)	Porcentaje	0	2%	-	-	2%	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Subproyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en Centros de Producción y Tratamiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote II)	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Proyecto de Rehabilitación de Sistema Urbano de Obras de Agua Potable de La Paz, La Paz	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Tanques, Líneas, y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Danlí, El Paraíso (Lote III)	Porcentaje	-	-	-	-	-	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	2.00	17%	3.00	2.00	67%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO No.2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-
	Nuevos prestadores de servicios (municipalidad) de agua potable implementados en cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	-	0%	-	-	-
	(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	-	0%	-	-	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuencas aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	-	0%	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresarialidad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad alimentaria.	Beneficiarios	6750	-	-	-	-	-
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores y productoras.	Planes	40	12.00	30%	-	12.00	
	Organizaciones de productores de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-
	Productores promovidos en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	-	-	-	-	-
	Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño.	Plan	60	12	20%	-	12.00	
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	33	55%	-	33.00	
	Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios.	Cpacitaciones	735	75	10%	75.00	75.00	100%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO No.2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto	Plan	6	-	-	-	-	-
	Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores rurales en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño.	Capacitación	9	-	-	-	-	-
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO No.2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamientode Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado.	Porcentaje	1	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	-	-	-
	Diseños finales de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Informe	2	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidroclimática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curaren actualizados.	Estudio	4	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	-	-	-
PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a aguapara riego en parcelas de los productores.	Hectarea	50	-	0%	-	-	



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	36.5	0.90	2%	1.40	0.90	64%
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectarea	272	-	0%	-	-	
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	1.2	0.70	58%	0.90	0.70	78%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III)	Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	0	4	0%	0	4	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	0	4	0%	0	4	0%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO No.2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	0	0	0%	0	0	0%
	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	0	0	0%	0	0	0%
