



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Registro Nacional de las Personas (RNP)

Informe No. 0180-001-2026

Tegucigalpa, Abril 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN.....	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) ...	4
D. PRINCIPALES PROYECTOS.....	5
D.1 Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.	6
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026	6
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026	8
D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026.....	8
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	8
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026	9
G. CONCLUSIONES.....	9
H. RECOMENDACIONES.....	10
ANEXO 1	11
ANEXO 2.....	12



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) es la institución responsable de registrar los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Asimismo, tiene a su cargo la identificación de la población hondureña y la emisión del Documento Nacional de Identificación (DNI) para todos los ciudadanos del país.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la institución contó con un presupuesto aprobado de L282.0 millones y un presupuesto vigente de L422.2 millones para la ejecución de proyectos de inversión pública, distribuidos entre inversión productiva y formación bruta de capital. Del presupuesto vigente, se ejecutaron L9.9 millones, equivalente a una ejecución de 2.3%.

Del monto ejecutado, L2.0 millones corresponden a inversión productiva y L7.8 millones a formación bruta de capital, evidenciando una mayor concentración del gasto en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional. En cuanto al compromiso presupuestario, este alcanzó igualmente L9.9 millones, representando el 2.3% del presupuesto vigente, conforme a la información presentada en el Cuadro No. 01.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) financia sus programas y proyectos principalmente a través de dos fuentes de financiamiento: Tesoro Nacional y Crédito Externo. Del presupuesto vigente con el que cuenta la institución al primer trimestre de 2026, la principal fuente de financiamiento es el Tesoro Nacional con L236.4 millones, seguido del Crédito Externo con L185.9 millones, evidenciando una estructura de financiamiento orientada tanto al fortalecimiento institucional como a la ejecución de proyectos estratégicos de inversión pública.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026 Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	282,039,186.0
Inversión Productiva	185,860,518.0
Formación Bruta de Capital	96,178,668.0
Presupuesto Vigente	422,242,518.0
Inversión Productiva	185,860,518.0
Formación Bruta de Capital	236,382,000.0
Ejecutado Anual	9,852,700.6
Inversión Productiva	2,042,645.1
Formación Bruta de Capital	7,810,055.5
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	2.3%
Compromiso Aprobado	9,852,700.6
Inversión Productiva	2,042,645.1
Formación Bruta de Capital	7,810,055.5
% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente)	2.3%

Nota: SIAFI, 31/03/2026



Gráfico No. 01 Registro Nacional de las Personas: Inversión por Fuente de Financiamiento

Cifras en millones de Lempiras

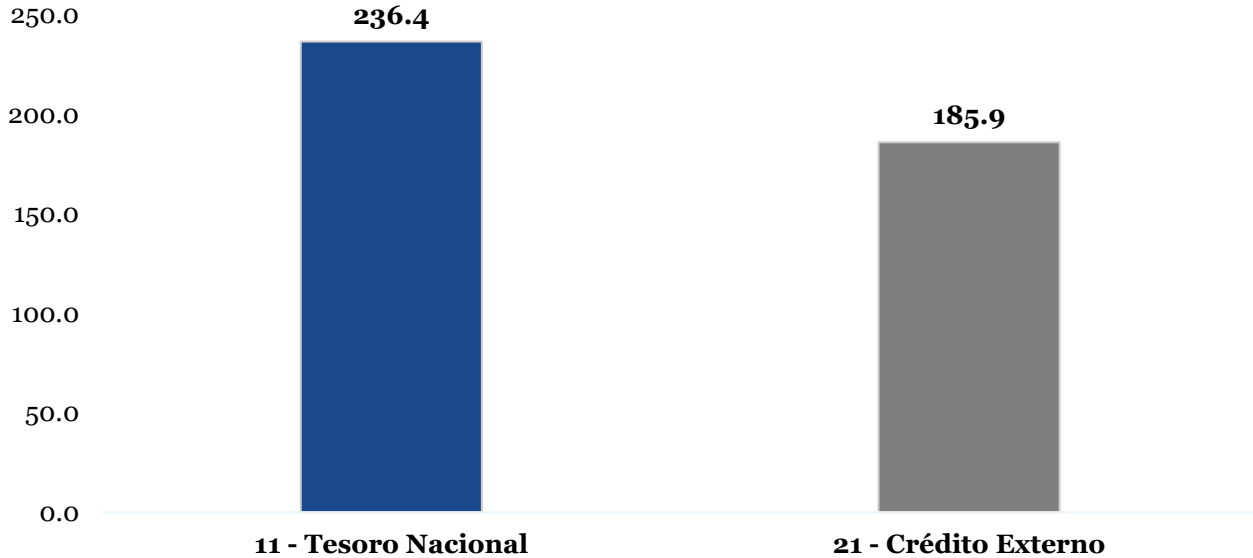

Fuente: SIAFI

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado de las inversiones del Registro Nacional de las Personas (RNP) al cierre del primer trimestre de los años 2022 a 2026:

- En 2022, el presupuesto vigente asciende a L87.0 millones, de los cuales se ejecutan L0.3 millones, alcanzando una ejecución de 0.3%. Este comportamiento refleja un bajo nivel de ejecución asociado principalmente a actividades de cierre y compromisos administrativos vinculados a proyectos anteriores.
- Para 2023, el presupuesto vigente se incrementa significativamente a L500.0 millones que correspondía al Proyecto “Identificate”; sin embargo, únicamente se ejecutan L0.1 millones, equivalente a 0.0%, evidenciando retrasos en la implementación operativa y financiera de los proyectos programados.
- En 2024, el presupuesto vigente se sitúa en L100.0 millones, registrándose una ejecución de L10.0 millones, equivalente al 10.0%. Estos recursos continúan relacionados con actividades complementarias y procesos derivados del Proyecto “Identificate”, mostrando una mejora relativa en la capacidad de ejecución institucional respecto a los años previos.




SECRETARÍA DE FINANZAS



- Al primer trimestre de 2025, el presupuesto vigente asciende a L467.8 millones y la ejecución alcanza L8.8 millones, equivalente a 1.9%, reflejando un bajo nivel de avance financiero en relación con los recursos programados, condicionado por procesos administrativos, contractuales y cronogramas de ejecución física vinculados a las intervenciones institucionales en materia de identificación ciudadana.
- Al primer trimestre de 2026, el presupuesto vigente se ubica en L422.2 millones, con una ejecución de L9.9 millones, equivalente a 2.3%. Aunque el nivel de ejecución continúa siendo moderado, se observa una ligera mejora respecto al mismo comportamiento registrado en 2025, evidenciando avances iniciales en la implementación de las actividades y proyectos institucionales.

Gráfico No. 02
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de marzo (2022-2026)
0180 - Registro Nacional de las Personas
Cifras en millones de Lempiras

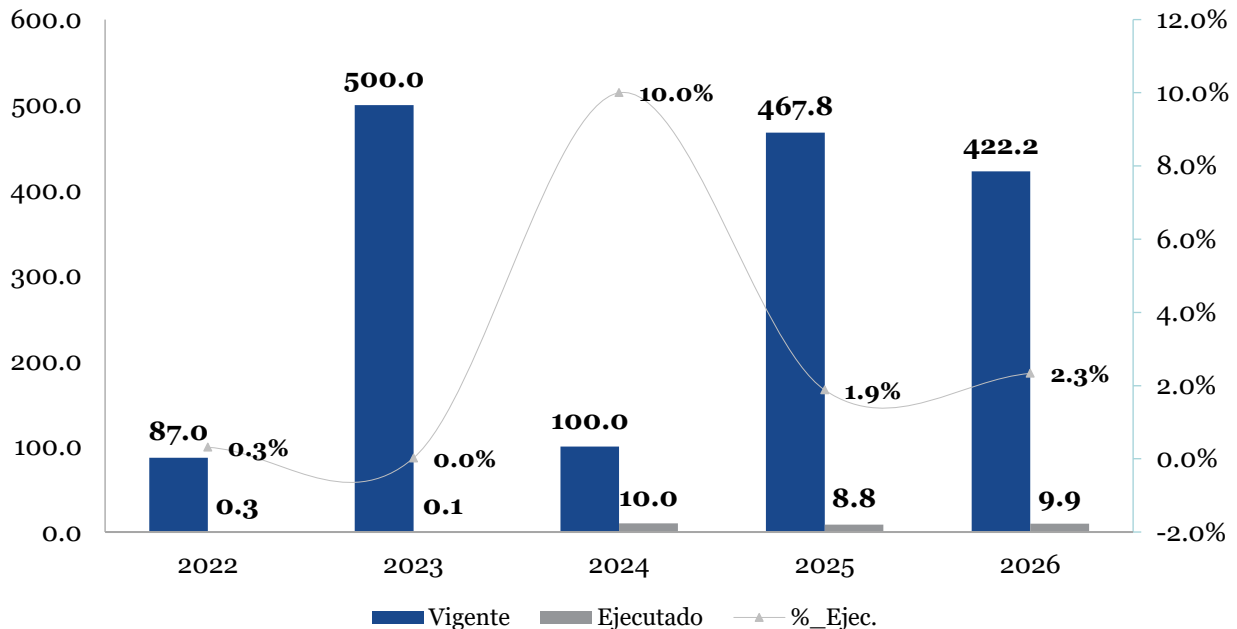

Fuente: SIAFI

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva al primer trimestre de 2026 se concentra en el siguiente proyecto:



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1 Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.

El objetivo fundamental del proyecto es garantizar que toda persona cuente oportunamente con su registro de nacimiento desde la primera infancia y, en el caso de la población mayor de edad, con su documento nacional de identificación, priorizando especialmente a la población entre 0 y 17 años en este proyecto. Lo anterior busca asegurar el acceso efectivo a derechos fundamentales como educación, salud, protección social y demás servicios públicos y privados, contribuyendo a reducir los niveles de exclusión social, fortalecer la inclusión ciudadana y promover mayores condiciones de equidad y desarrollo humano en el país.

D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, el proyecto registra avances financieros por L7.8 millones, lo que refleja el inicio de la ejecución de actividades programadas para el presente ejercicio fiscal. En cuanto a los avances físicos, estos corresponden principalmente a la planificación operativa, coordinación interinstitucional y desarrollo de acciones preparatorias orientadas a la implementación de las actividades contempladas en el proyecto, sentando las bases para su ejecución en los siguientes trimestres del año.

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Program.	Ejecución	% Ejec	Program.	Ejecución	% Ejec
0180 - Registro Nacional de las Personas								
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados.	Persona	1,500,000.00	-	0%	1,500,000.00	-	0%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	Centro Municipal	205	-	0%	205	-	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	Persona	1,500.00	-	0%	1,500.00	-	0%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	Estrategia	1.00	-	0%	1.00	-	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.



Resumen de principales actividades realizadas en el trimestre

Componente 1: Mejora de la cobertura del registro civil e identificación de menores.

Durante el trimestre se fortaleció la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud (SESAL) para reactivar la implementación del sistema automatizado de registro de nacidos vivos y avanzar en su interoperabilidad con el Registro Nacional de las Personas (RNP). Se avanzó significativamente en la indexación de niñas, niños y adolescentes en el Sistema de Identificación Nacional (SIN), alcanzando un 85% de avance, y se realizaron ajustes técnicos para integrar el 15% restante de registros con información incompleta.

Asimismo, se elaboraron manuales de capacitación para personal de campo (enroladores, supervisores y coordinadores), los cuales serán incorporados a una plataforma digital de formación del RNP. Se definió la estrategia de comunicación institucional, contemplando la contratación de personal interno. En el ámbito logístico, se avanzó en la selección de personal de campo y en la contratación de servicios clave (vehículos, combustible e indumentaria) para el futuro proceso de enrolamiento de NNA programado para junio de 2026. Adicionalmente, se inició el desarrollo de una aplicación móvil y una herramienta con código QR para el reporte ciudadano de casos de subregistro.

Componente 2: Modernización de los servicios de registro civil e identificación digital. Se priorizó la elaboración de un diagnóstico institucional integral orientado a identificar brechas tecnológicas, operativas y de gobernanza. Se recibieron productos de una consultoría financiada por el Banco Mundial, incluyendo Términos de Referencia para la transformación digital del RNP.

Se realizaron revisiones técnicas de los mecanismos de verificación y autenticación del SIN, así como el análisis del modelo conceptual de firma biométrica. En paralelo, se definió el modelo del Bus de Interoperabilidad y se identificaron instituciones clave para el intercambio de información, manteniendo coordinación técnica con SESAL.

También se elaboró una propuesta del mecanismo de quejas y reclamos (PQRS), actualmente en proceso de validación interna. Se desarrollaron especificaciones técnicas para la adquisición de kioscos de autoservicio y mobiliario, y se recibieron bienes tecnológicos destinados a la modernización de centros de atención.

Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del RNP. Se realizó un diagnóstico institucional en materia legal, operativa y de gobernanza, en coordinación con la Secretaría General y la Asesoría Legal del RNP. Se gestionó la contratación de un especialista en ciberseguridad para el diseño del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

Asimismo, se inició el diagnóstico para la elaboración de términos de referencia sobre protocolos de protección de datos personales, con ejecución prevista para diciembre de 2026. En materia de capacitación, se definieron acciones para fortalecer el programa institucional, incluyendo la actualización de la plataforma virtual, adquisición de equipos para laboratorios y fortalecimiento del personal técnico.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Varias iniciativas estratégicas, como la estrategia de gestión del cambio, la estrategia de ciberseguridad y el diseño del SOC, fueron reprogramadas para el segundo semestre de 2026, en función de los resultados del diagnóstico institucional.

D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras al primer trimestre de 2026:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	AF-7471-HN	US\$	\$40,000,000	23/02/2024-26/08/2027
		Lempiras	L1,067,836,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	185,860,518	185,860,518	2,042,645	1.1%
Acumulado Vida del Proyecto*	1,067,836,000	1,067,836,000	781,082,299.7	73.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

No se registraron adquisiciones durante el I Trimestre 2026 en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el I Trimestre de 2026, la gestión de la inversión del Registro Nacional de las Personas (RNP) se orientó a consolidar las condiciones técnicas, operativas, administrativas y fiduciarias necesarias para acelerar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras (Convenio de Préstamo IDA 7471-HN).

- Se desarrollaron reuniones técnicas y mesas de trabajo con la Secretaría de Salud (SESAL), orientadas a reactivar y fortalecer los acuerdos necesarios para la automatización del registro de nacidos vivos y el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad entre ambas instituciones.
- Se realizaron reuniones técnicas y de seguimiento con representantes del Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), orientadas a revisar el avance del Proyecto, dar seguimiento a la ejecución financiera y operativa, validar prioridades de implementación y coordinar acciones relacionadas con adquisiciones, planificación y cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de Préstamo IDA 7471-HN.



F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

Durante el I Trimestre de 2026 se identificaron situaciones que han incidido en el ritmo de ejecución del proyecto, principalmente asociadas a condiciones externas, dependencias técnicas y requerimientos de coordinación interinstitucional. En respuesta, la Unidad Implementadora de Proyectos del RNP impulsó acciones correctivas y de mitigación orientadas a asegurar la continuidad y aceleración de la inversión en los siguientes períodos.

- Rearticulación interinstitucional con SESAL. Los cambios de autoridades requirieron retomar acuerdos y rutas de trabajo para la implementación del sistema automatizado de registro de nacidos vivos. Acción: reactivación de mesas técnicas, validación de mecanismos de interoperabilidad y definición de lineamientos para la continuidad del proceso durante 2026.
- Inicio gradual del enrolamiento masivo de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). La ejecución en campo depende de la disponibilidad de personal, logística, capacitación y materiales. Acción: contratación de servicios para selección de personal, aseguramiento logístico (vehículos, combustible e indumentaria) y desarrollo de capacitaciones virtuales para reducir riesgos operativos.
- Necesidad de evidencia para focalizar la reducción del subregistro. Se requiere identificar territorialmente los casos para optimizar el despliegue de brigadas. Acción: desarrollo de herramientas tecnológicas para reporte y trazabilidad (aplicación móvil y lector de código QR) y preparación del inicio de brigadas en campo durante el segundo semestre de 2026.
- Dependencia de diagnóstico institucional para productos estratégicos. Varias intervenciones (transformación digital, omnicanalidad, ciberseguridad, protocolos de datos y gobernanza) requieren insumos del diagnóstico para asegurar coherencia técnica. Acción: avance del levantamiento de información AS-IS/TO-BE, integración de términos de referencia y reprogramación de consultorías clave para su ejecución con base técnica robusta.
- Procesos de adquisición en ajustes técnicos. Algunos procesos previamente publicados no fueron adjudicados y requirieron revisión de especificaciones. Acción: actualización de especificaciones técnicas (kioscos y mobiliario) para alinear requerimientos institucionales y mejorar la probabilidad de contratación exitosa.

G. CONCLUSIONES

- Al cierre del I trimestre de 2026, el RNP presenta una ejecución de apenas 2.3% del presupuesto vigente, lo que evidencia un inicio lento en la ejecución de la inversión pública, asociado principalmente a actividades preparatorias, procesos de planificación y ajustes técnicos.
- El avance físico del proyecto se concentró en acciones de planificación, diagnósticos, coordinación interinstitucional y desarrollo de herramientas técnicas, sin reportarse metas físicas ejecutadas en el trimestre, lo que refleja que la fase operativa aún no ha iniciado de forma masiva.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- El ritmo de ejecución ha estado condicionado por factores como cambios de autoridades en instituciones clave (SESAL), necesidad de diagnósticos previos para definir intervenciones estratégicas, y ajustes en procesos de adquisiciones, lo que ha generado reprogramaciones en varias actividades.
- A pesar del bajo nivel de ejecución financiera, se registran avances relevantes en la estructuración del proyecto, incluyendo el desarrollo de herramientas tecnológicas, manuales de capacitación, diseño de interoperabilidad, y definición de modelos de atención e identificación.

H. RECOMENDACIONES

- Es necesario pasar de la fase preparatoria a la ejecución en campo, priorizando el inicio de actividades de enrolamiento, equipamiento y despliegue territorial para mejorar el nivel de ejecución física y financiera.
- Se recomienda consolidar acuerdos vinculantes y mecanismos de seguimiento operativo que reduzcan la dependencia de cambios administrativos y aseguren la continuidad del sistema de registro de nacidos vivos y la interoperabilidad.
- Dado que varios componentes estratégicos dependen de estos insumos, se recomienda acelerar la entrega y validación de diagnósticos institucionales para evitar retrasos en la implementación de la transformación digital y ciberseguridad.
- Se sugiere revisar de forma integral las especificaciones técnicas y los procesos de compra, a fin de asegurar su viabilidad y adjudicación oportuna, evitando retrasos que impacten la ejecución del proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	1. Inversión Productiva		-	185,860,518	185,860,518	-	185,860,518	185,860,518	-	2,042,645	2,042,645	1.1%
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			185,860,518	185,860,518		185,860,518	185,860,518		2,042,645	2,042,645	1.1%
1	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras	AF-7471-HN		185,860,518	185,860,518		185,860,518	185,860,518		2,042,645	2,042,645	1.1%
	Total Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil			185,860,518	185,860,518		185,860,518	185,860,518		2,042,645	2,042,645	1.1%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		96,178,668	-	96,178,668	236,382,000	-	236,382,000	7,810,055	-	7,810,055	3.3%
	0180 - Registro Nacional de las Personas		96,178,668		96,178,668	236,382,000		236,382,000	7,810,055		7,810,055	3.3%
	ACTIVIDADES CENTRALES		96,178,668		96,178,668	236,382,000		236,382,000	7,810,055		7,810,055	3.3%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		96,178,668		96,178,668	236,382,000		236,382,000	7,810,055		7,810,055	3.3%
	Total general		96,178,668	185,860,518	282,039,186	236,382,000	185,860,518	422,242,518	7,810,055	2,042,645	9,852,701	2.3%

Nota: SIAFI, 31/03/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Nombre del Proyecto	Global			Meta Acumulada		Ejecución 2026					% Ejec.	
	Meta (ENTREGABLES)	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre						
						I	II	III	IV	Total		
0180 - Registro Nacional de las Personas												
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras	Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados	PERSONA	1,500,000.00	-	0%	0.00					-	0%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	CENTRO	205.00	-	0%	0.00					-	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	PERSONA	1,500.00	266.00	18%	0.00					-	18%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	ESTRATEGIA	1.00	-	0%	0.00					-	0%

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 31 de marzo de 2026
