


1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto Fortalecimiento Del Ecosistema Nacional De Registros Civil E Identificacion En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0180 - Registro Nacional De Las Personas				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	AF-7471-HN				
Monto Total de Financiamiento USD:	39,844,770.17				
Monto Financiamiento L:	1,063,692,000.00				
Plazo de Ejecución:	36 meses	Fecha de Inicio	19/08/2024	Fecha de Fin	26/08/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959				

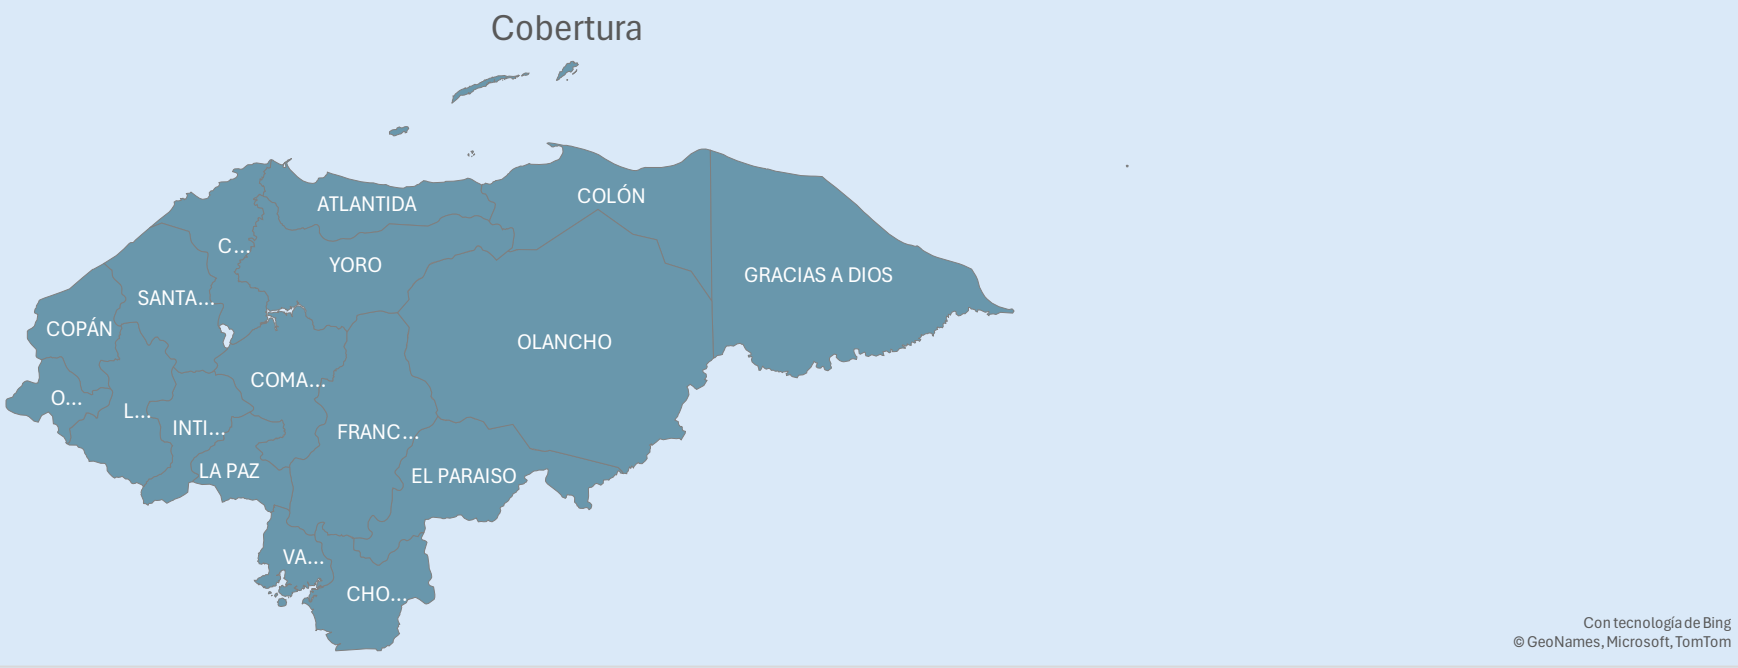

2. Objetivo Estratégico

Fortalecer el ecosistema nacional de registro civil e identificación de Honduras, mejorando el proceso de registro de nacimientos e identificación de menores, y facilitando el acceso de las personas a servicios públicos y privados.

3. Cobertura

Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibucá, Islas De La Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olanchito, Santa Bárbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Tocoa, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Yucarán, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios del Proyecto

834,162.00

Mujeres

868,057.00

Hombres

1,702,219.0


Total

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2464 - MEJORA DE LA COBERTURA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE MENORES	557,497,004.91	-	0.00	557,497,004.91
2466 - MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIGITAL	219,363,524.78	-	0.00	219,363,524.78
2467 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL RNP	199,697,608.41	-	0.00	199,697,608.41
2638 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	87,133,861.90	-	0.00	87,133,861.90
TOTAL	1,063,692,000.00	0.00	0.00	1,063,692,000.00

Area visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)

Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

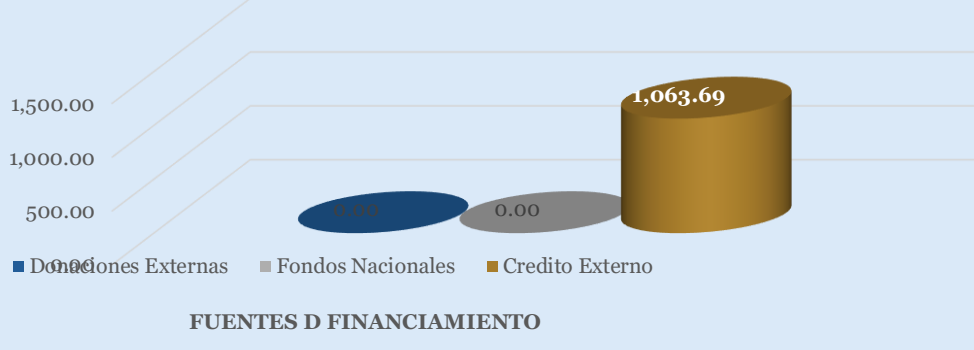

Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	40,000,000.00
Desembolsado Acumulado	30,000,000.00
Disponible:	10,000,000.00
% Desembolso:	75%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	185,860,518.00	-	-	185,860,518.00
Presupuesto Vigente:	185,860,518.00	-	-	185,860,518.00
Ejecutado al 31/03/2026	2,042,645.12	-	-	2,042,645.12
% Ejecución al 31/03/2026	1%			1.1%

Area Visual Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)

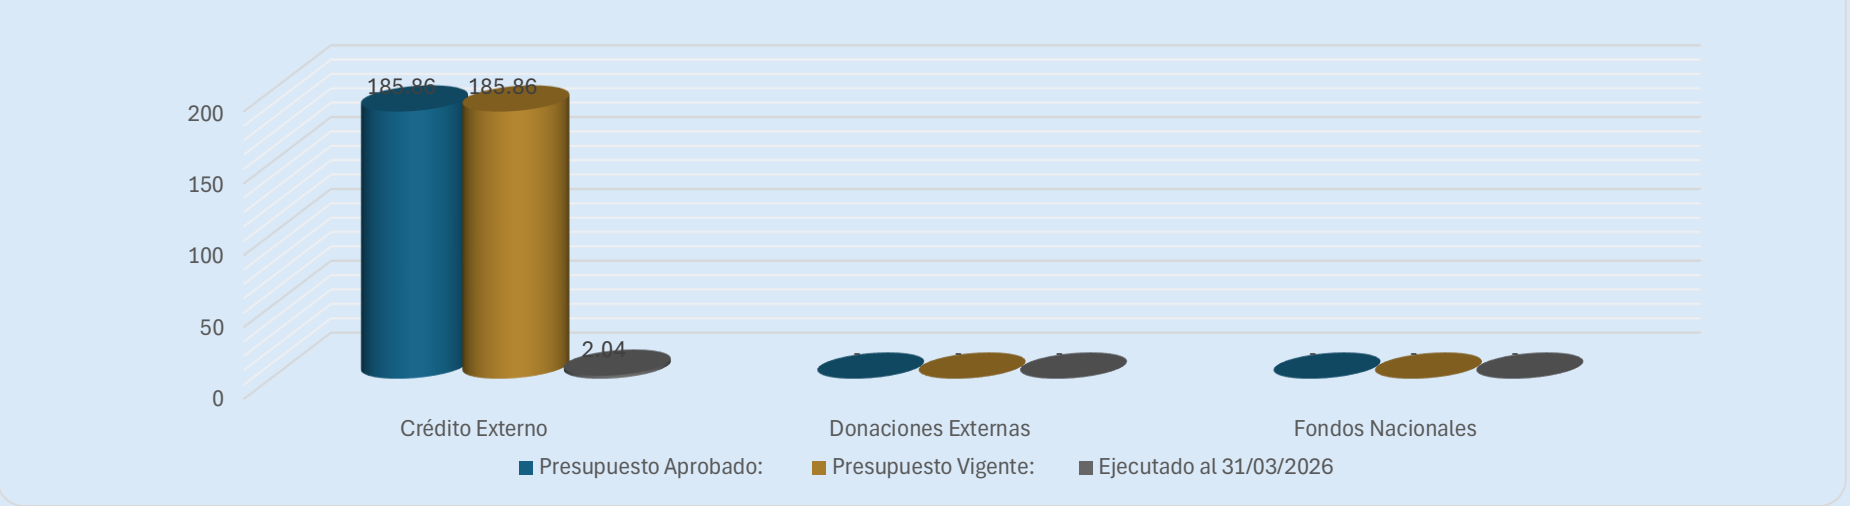


#iVALOR!

7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donacione s Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	449,287,736.00	-	-	449,287,736.00	449,287,734.15	-	-	449,287,734.15	100.00%
2025	392,257,452.00	-	-	392,257,452.00	329,751,920.43	-	-	329,751,920.43	84.07%
2026	185,860,518.00	-	-	185,860,518.00	2,042,645.12	-	-	2,042,645.12	1.10%
TOTAL	1,027,405,706.00	-	-	1,027,405,706.00	781,082,299.70	-	-	781,082,299.70	76%

Area visual presupuesto vigente historico Millones de Lempiras

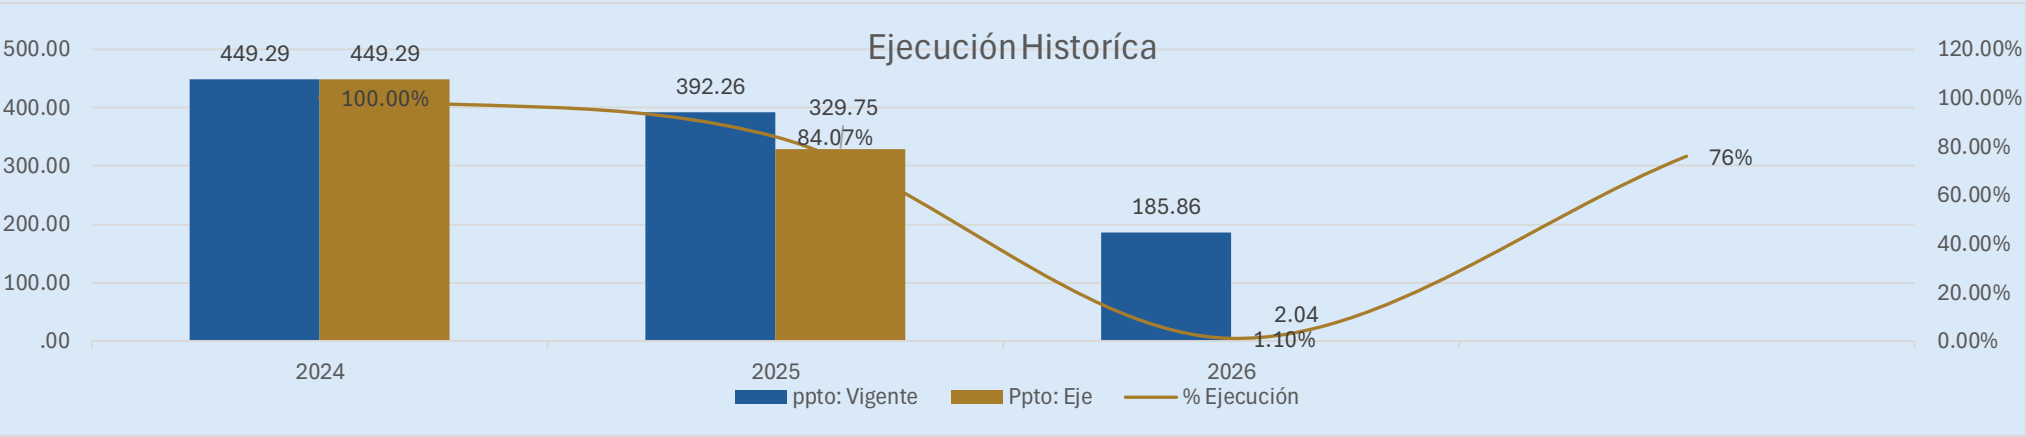

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
4	0	0	4	0	0.02%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto Fortalecimiento Del Ecosistema Nacional De Registros Civil E Identificacion En Honduras																	
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026				Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																	
Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados	PERSONA	1,500,000.00	0	0%	0.00	0.00	0.00	1500000.00	1,500,000.00	0.00				0.00	0%	(1500000.00)	● CON RETRASO
Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	CENTRO	205.00	0	0%	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00				0.00	0%	(205.00)	● CON RETRASO
Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	PERSONA	1,500.00	266	18%	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00				0.00	0%	(650.00)	● CON RETRASO
Estrategia de Ciberseguridad elaborada	ESTRATEGIA	1.00	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00				0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO
TOTAL / PROMEDIO		1501706.00	266.00	0.02%	0.00	0.00	855.00	1500001.00	1500856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1500856.00)	

Situacion Actual

Durante el I Trimestre de 2026, la gestión de la inversión del Registro Nacional de las Personas (RNP) se orientó a consolidar las condiciones técnicas, operativas, administrativas y fiduciarias necesarias para acelerar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras (Convenio

Principales Riesgos Identificados

Rearticulación interinstitucional con SESAL. Los cambios de autoridades requirieron retomar acuerdos y rutas de trabajo para la implementación del sistema automatizado de registro de nacidos vivos.

Inicio gradual del enrolamiento masivo de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). La ejecución en campo depende de la disponibilidad de personal, logística, capacitación y materiales.

Necesidad de evidencia para focalizar la reducción del subregistro. Se requiere identificar territorialmente los casos para optimizar el despliegue de brigadas.

Dependencia de diagnóstico institucional para productos estratégicos. Varias intervenciones (transformación digital, omnicanalidad, ciberseguridad, protocolos de datos y gobernanza) requieren insumos del diagnóstico para asegurar coherencia técnica

Procesos de adquisición en ajustes técnicos. Algunos procesos previamente publicados no fueron adjudicados y requirieron revisión de especificaciones

Acciones Recomendadas

Reactivación de mesas técnicas, validación de mecanismos de interoperabilidad y definición de lineamientos para la continuidad del proceso durante 2026.

Contratación de servicios para selección de personal, aseguramiento logístico (vehículos, combustible e indumentaria) y desarrollo de capacitaciones virtuales para reducir riesgos operativos.

Desarrollo de herramientas tecnológicas para reporte y trazabilidad (aplicación móvil y lector de código QR) y preparación del inicio de brigadas en campo durante el segundo semestre de 2026.

Avance del levantamiento de información AS-IS/TO-BE, integración de términos de referencia y reprogramación de consultorías clave para su ejecución con base técnica robusta.

Actualización de especificaciones técnicas (kioscos y mobiliario) para alinear requerimientos institucionales y mejorar la probabilidad de contratación exitosa.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere decisiones inmediatas, para acelerar la ejecución financiera y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.
