



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa de la Red Solidaria (PRS)

Informe No. 0415-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido.....	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN.....	4
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	4
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	6
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026).....	7
D. PRINCIPALES PROYECTOS.....	8
D.1 APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO.....	8
D.1.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	9
D.1.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026.....	10
D.1.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....	10
D.2 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	11
D.2.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	12
D.2.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026.....	13
D.3 FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	14
D.3.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	14
D.3.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026.....	15
D.3.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....	15
D.4 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA EN HONDURAS.....	15
D.4.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	16
D.4.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026.....	16
D.4.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....	17
D.5 PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO/ BIP 24510 – Contrato de Préstamo BCIE 2282.....	18
D.6 PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL / BIP 23593 – Préstamo BID 4619-BL-HO.....	18
D.6.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	21
D.6.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026.....	21



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.7 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN.....	21
D.7.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026	22
D.7.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	22
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN.....	23
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	23
G. CONCLUSIONES	25
H. RECOMENDACIONES.....	26
ANEXO 1	27
ANEXO 2.....	28



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 como un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema mediante la ejecución de programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, focalizadas a través de los sistemas de información social y las herramientas técnicas disponibles del Estado.

Asimismo, el PRS contempló el diseño, estructuración, ejecución, administración y supervisión de proyectos productivos y sociales, incluyendo programas de becas dirigidos a jóvenes de educación primaria, media y universitaria, con el propósito de fortalecer las oportunidades de desarrollo e inclusión social de la población beneficiaria; designando que los proyectos que se encontraban bajo la responsabilidad de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), se ejecutarán a través del Programade Red Solidaria.

Además, mediante Decreto PCM-08-2022 se detallan los objetivos y actividades que el programa realizaría, así como sus lineamientos y funciones.

El 25 de febrero de 2026 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-04-2026, mediante el cual se suprime el Programa de la Red Solidaria, junto con otras entidades del Estado. Dicho decreto faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), en representación del Gobierno de la República de Honduras, para realizar las gestiones administrativas y legales necesarias ante los organismos financieros internacionales, con el propósito de formalizar el cambio de Unidad u Organismo Ejecutor de los recursos disponibles de la cartera de financiamiento vigente, trasladando dicha responsabilidad del Programa de la Red Solidaria a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de los programas y proyectos vigentes, el Decreto establece que las instituciones suprimidas mantendrán temporalmente su condición de organismos ejecutores, debiendo continuar con las actividades operativas y administrativas hasta que la

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	640,364,921
Inversión Productiva	622,860,221
Formación Bruta de Capital	17,504,700
Presupuesto Vigente	525,075,432
Inversión Productiva	525,075,432
Formación Bruta de Capital	0
Ejecutado II Trimestre	75,000,217
Inversión Productiva	75,000,217
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	14.3%
Ejecutado Anual	80,151,629
Inversión Productiva	80,151,629
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	15.3%
Compromiso Aprobado	153,870,867
Inversión Productiva	153,870,867
Formación Bruta de Capital	0
% Compromiso (Compromiso II Trim- 2026/Vigente)	29.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



transferencia de los programas y proyectos se realice de manera ordenada, eficiente y conforme a derecho. Para ello, se dispone un período máximo de transición de seis (6) meses a partir de la entrada en vigor del Decreto, respetando los objetivos, alcances y condiciones establecidos en los convenios, contratos de crédito y donaciones internacionales.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2026 se emitió el Decreto Ejecutivo No. PCM-14-2026, cuyo Artículo 20 regula el régimen transitorio del Programa de la Red Solidaria. Esta disposición establece que, durante el período de transición de seis (6) meses, el Programa únicamente podrá realizar las actuaciones estrictamente indispensables para la ejecución y cierre de proyectos financiados con recursos externos, el cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas, la presentación de información y reportes requeridos por los organismos financiadores, así como la transferencia progresiva, ordenada y documentada de funciones, expedientes, recursos, personal, bienes y obligaciones hacia SEDESOL. Finalizado dicho período, todas las funciones sustantivas y operativas serán asumidas por esta Secretaría.

En el segundo trimestre del 2026, el Programa de la Red Solidaria (PRS) contó con un presupuesto aprobado para la inversión pública de L640.4 millones; el presupuesto vigente al 30 de junio de 2026 para la inversión pública es de L525.1 millones del cual el 100% corresponde a inversión productiva y tomando en cuenta la supresión ya no tiene asignado presupuesto para la formación bruta de capital fijo. La ejecución presupuestaria en el segundo trimestre en cifras asciende a L75.0 millones representando el 14.3% del Presupuesto Vigente; además, la ejecución presupuestaria total al 30 de junio de 2026 asciende a L80.2 millones lo cual representa 15.3% sobre el presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

La ejecución productiva se realizó mediante seis proyectos de inversión pública tales como:

1. Apoyo al Sistema Integral de Protección Social
2. El Proyecto de Integración de la Protección Social
3. Adicional al Proyecto de Integración financiados;
4. Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático
5. Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras
6. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven;
7. Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal



SECRETARÍA DE FINANZAS




B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Al segundo trimestre de 2026, el financiamiento de la inversión del Programa de la Red Solidaria proviene principalmente de Crédito Externo (Fuente 21), que representa el 92.1% del presupuesto vigente, equivalente a L483.7 millones, de los cuales se han ejecutado L77.3 millones.

Por su parte, las Donaciones Externas (Fuente 22) constituyen el 7.9% del presupuesto vigente, con una asignación de L41.4 millones y una ejecución de L2.8 millones. No se registran recursos asignados ni ejecutados con Fondos Nacionales (Fuente 11).

Esta estructura evidencia una alta dependencia del financiamiento externo para la ejecución de la inversión pública del Programa durante el período analizado.).

Gráfico No. 01
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA:
Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

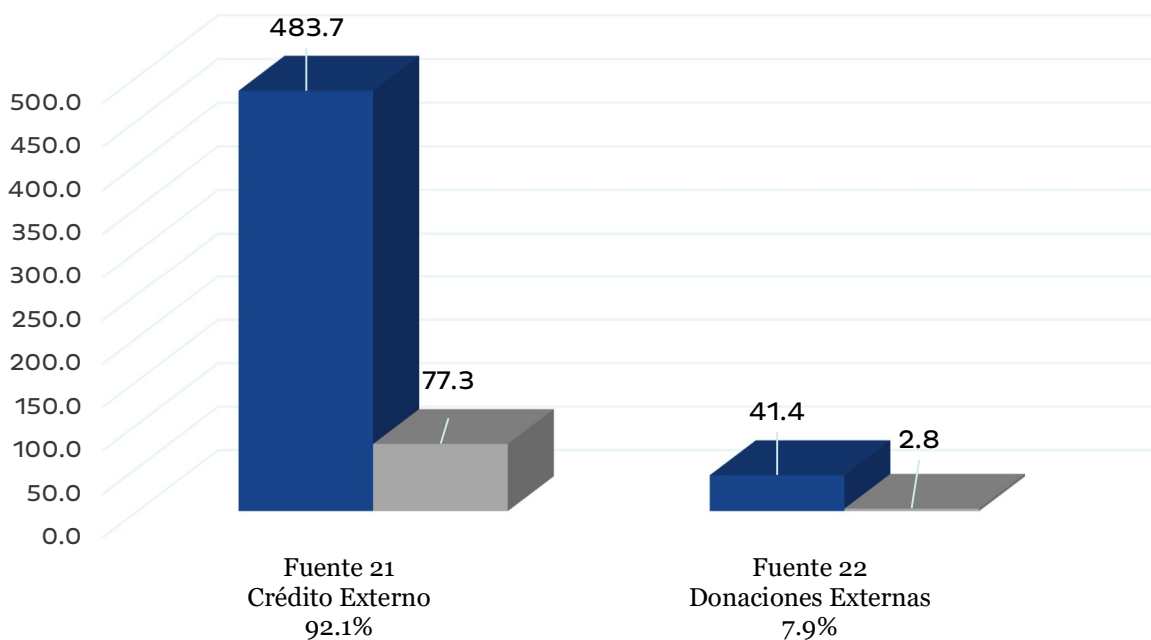

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS




C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

En el Gráfico No.02 se muestra la ejecución de la inversión pública del Programa de la Red Solidaria al 30 de junio muestra una tendencia de mejora en la capacidad de ejecución entre 2023 y 2025. En 2022 no se registró ejecución presupuestaria, mientras que en 2023 se ejecutaron L131.4 millones, equivalentes al 4.4% del presupuesto vigente; mientras que en 2024 la ejecución aumentó a L243.3 millones (8.7%), y en 2025 alcanzó su mejor desempeño, con L290.0 millones, representando el 19.2% del presupuesto vigente.

Al 30 de junio de 2026, el presupuesto vigente asciende a L525.1 millones, con una ejecución de L80.2 millones (15.3%), porcentaje que, aunque inferior al registrado en el mismo período de 2025, refleja un nivel de ejecución superior al observado en 2023 y 2024, considerando además el contexto de transición institucional, los contratos que trascienden periodo de Gobierno que se encuentran pendiente de aprobación por el Congreso Nacional y los ajustes administrativos derivados del cambio de organismo ejecutor.

Gráfico No. 02
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0415 - Programa de la Red Solidaria
Cifras en millones de Lempiras

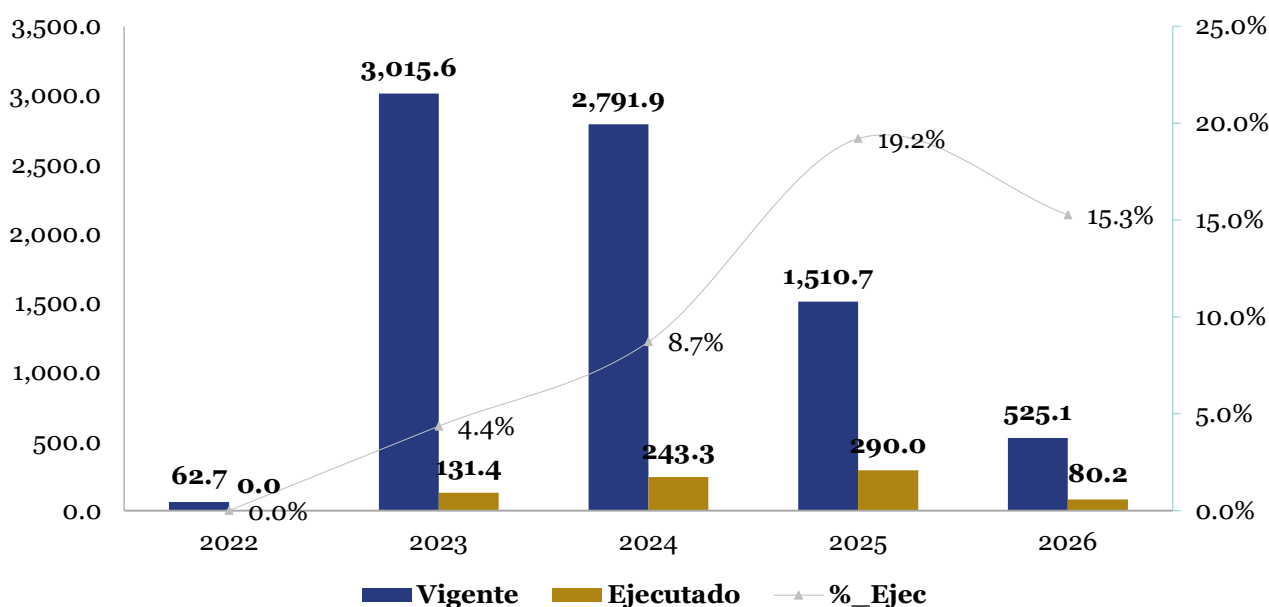

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



D. PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de la Red Solidaria (PRS), presenta en su presupuesto vigente siete proyectos de inversión pública, todos ejecutados con fondos externos (crédito y donación).

1. Apoyo al Sistema Integral de Protección Social financiado con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 5008/BL-HO;
2. El Proyecto de Integración de la Protección Social 6401-HN
3. Adicional al Proyecto de Integración financiados con crédito externo del Banco Mundial (BM);
4. Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático, financiado mediante contrato de préstamo BCIE 2282, suscrito con el Banco Interamericano de Integración Económica.
5. Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras, financiado mediante una donación del Banco Mundial;
6. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven; financiado por el BID
7. Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal (BID)

A continuación, se presentan sus avances, metas físicas y financieras, así como los principales procesos de adquisición, con base en la información reportada por la Unidad Ejecutora del PRS y de acuerdo con el presupuesto vigente:

D.1 APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iv) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza.

Este proyecto dio inicio en 2020, al cual se le otorgó ampliación de plazo al 30 de septiembre de 2026 como nueva fecha de Plazo de Último Desembolso y el 31 de diciembre de 2026 como culminación del cierre con la presentación de Informe Final Auditado; sin embargo, es importante mencionar que la Unidad Ejecutora debe considerar las fechas límites otorgadas mediante el Decreto Ejecutivo 14-2026 en su artículo 20, para realizar las gestiones pertinentes para poder contar con el cierre técnico y financiero del Programa, en el marco del cierre del Programa Red Solidaria al 25 de noviembre de 2026.

El proyecto es co-ejecutado con la Secretaría de Salud y de los cuatro componentes el Programa de la Red Solidaria ejecuta tres de ellos:

- Componente 1. Transferencias monetarias Condicionadas



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Componente 2. Fortalecimiento Operativo e Institucional del Organismo Ejecutor
- Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social

Debido a que el presupuesto fue aprobado hasta el mes de abril del presente año, la ejecución de las actividades programadas se ha visto retrasada, afectando el cumplimiento oportuno de los productos previstos.

Actualmente, se encuentran en proceso las gestiones administrativas y presupuestarias relacionadas con la ratificación, por parte del Congreso Nacional, de los contratos suscritos con las organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales brindarán asistencia técnica a los participantes mediante procesos de capacitación, formulación de planes de inversión y otras actividades contempladas en el proyecto.

Durante el trimestre se registró ejecución financiera correspondiente al pago de los servicios de internet por L6,647,262.51, al apoyo para el proceso de transición y continuidad operativa de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), al pago al IHER por L4,181,809.73, y a las actividades del componente de Administración, Auditoría y Evaluación por un monto de L4,999,864.33.

D.1.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Durante este segundo trimestre se ejecutó L15.8 millones, a la fecha de emisión del presente informe aún está pendiente la aprobación de contratos que trascienden período de Gobierno por parte del Congreso Nacional. Los principales avances físicos programados al 30 de junio 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	%	Progra- mación	Ejecución	%
					Ejecución			Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BL-HoO	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1000	0	0%	0	0	N/A
	Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.	Reporte	1	0	0%	0	0	N/A
	Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Contrato	1	1	100%	1	1	100%
	Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	1	0	0%	0	0	N/A

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Apoyo Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	BID 5008/BL-HO	US\$	54,200,000	13/8/2020
		Lempiras	1,448,131,860	24/09/2026 31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	61,067,896	61,067,896	15,828,936.6	25.9%
Acumulado 2026	61,067,896	61,067,896	17,674,674.0	28.9%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,448,131,860	1,448,131,860.0	1,242,873,467.1	85.8%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00

D.1.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Se firmó el contrato N° 095/PRS/BID/5008/2026 para evaluación del Programa de la operación BID 5289/BL-HO que es financiada con los recursos de la Operación BID 5008/BL-HO.

La Unidad ejecutora presenta la siguiente información sobre las adquisiciones en el segundo trimestre:

#	Número de contrato	Descripción	Monto L
1	071/PRS/BID/5008/2026	Coordinador General de la UCP	397,500.00
2	076/PRS/BID/5008/2026	Contratación de tres (3) Técnicos de Apoyo y Seguimiento de Auditorías	95,000.00
3	077/PRS/BID/5008/2026	Contratación de tres (3) Técnicos de Apoyo y Seguimiento de Auditorías	95,000.00
4	078/PRS/BID/5008/2026	Contratación de tres (3) Técnicos de Apoyo y Seguimiento de Auditorías	95,000.00
5	079/PRS/BID/5008/2026	Programador Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático	200,000.00
6	080/PRS/BID/5008/2026	Coordinador de Desarrollo de Software para SIREs	237,500.00
7	081/PRS/BID/5008/2026	Desarrollador de Aplicativos para el PRS	100,000.00
8	082/PRS/BID/5008/2026	Técnico en Infotecnología	112,500.00
9	083/PRS/BID/5008/2026	Técnico en Infotecnología	112,500.00
10	084/PRS/BID/5008/2026	Base de Datos del SIREs	112,500.00
11	085/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00



SECRETARÍA DE FINANZAS



#	Número de contrato	Descripción	Monto L
12	086/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
13	087/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
14	088/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
15	089/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
16	090/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
17	091/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
18	092/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
19	093/PRS/BID/5008/2026	DIGITADOR	78,750.00
20	094/PRS/BID/5008/2026	"Contratación de Servicios de un Conductor Ejecutivo para vehículos de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/PRS.	30,000.00
21	095/PRS/BID/5008/2026	Evaluación Final del Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus, del préstamo BID 5289/BL-HO	1,060,000.00
			3,356,250.00

D.2 PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL/ BM IDA -6401-HN

El objetivo del proyecto es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres. El proyecto inició el 28 de octubre de 2019 y presenta fecha de cierre de ejecución al 31 de diciembre de 2025; el organismo financiador (Banco Mundial) le otorgó una ampliación de plazo para el cierre financiero al 30 de junio de 2026, mediante oficio de fecha 24 de abril, 2026. El proyecto pretende alcanzar su objetivo a través de la ejecución de tres componentes:

- **Componente 1.** Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada.
 - Subcomponente 1.1 Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas
- **Componente 2.** Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social.
 - Subcomponente 2.1 Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC
 - Subcomponente 2.2 Fortalecimiento institucional para la integración del sistema de protección social
- **Componente 3.** Gestión del Proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.2.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

La Unidad Ejecutora al 30 de junio a culminado la ejecución física y además ha culminado el cierre financiero del Proyecto y solamente tiene pendiente la presentación de informes y /o liquidaciones correspondientes; por lo tanto, en el siguiente cuadro se detallan la meta física planteada para el año 2026, el cual muestra que aún no se ha cumplido la ejecución, puesto que está programada para entregarse en el tercer trimestre, puesto que corresponde a l informe final sobre encuesta de percepción de beneficiario:

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn	Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes.	Informe	1	0	0%	0	0	N/A
	Informe de cierre para pago de comisiones bancarias operación 6401/HN111100 %	Informe	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026

Además, reporta que, en este trimestre se realizó el pago de la comisión bancaria al ente pagador Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) correspondiente a las Transferencias Monetarias realizadas el año 2025 y el pago de la auditoría externa.

Considerando que, el proyecto ya ha culminado su ejecución física, se presenta a continuación la lista de Entregables y metas cumplidas al cierre del proyecto, según datos presentados por la Unidad Ejecutora:

Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025
1. Beneficiarios rurales de TMC que se encuentran en los dos quintiles inferiores de la distribución del ingreso (porcentaje)	Porcentaje	57.3	73.1	128%
2. Beneficiarios del programa de la red de protección social (número)	Número de Beneficiarios	1,540,058	961,339	62%
2.1 Beneficiarios del programa de la red de protección social (urbano) (número)	Número de Beneficiarios	186,946	183,629	98%
2.2 Beneficiarios del programa de la red de protección social (rural) (número)	Número de Beneficiarios	1,353,113	777,710	57%
2.3 Beneficiarios del programa de la red de protección social (mujeres) (número)	Número de Beneficiarios	809,075	508,899	63%
2.4 Beneficiarios del programa de la red de protección social - mujeres (urbano) (número)	Número de Beneficiarios	107,677	105,766	98%



SECRETARÍA DE FINANZAS



Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025
2.5 Beneficiarios del programa de la red de protección social - mujeres (rural) (número)	Número de Beneficiarios	701,398	403,133	57%
3. Retención escolar de 6° grado a 7° grado para niñas y niños de hogares beneficiarios de TMC en zonas rurales (porcentaje)	Porcentaje	91%	43.8	4803%
3.1 Retención escolar de 6° grado a 7° grado para niñas de hogares beneficiarios de TMC en zonas rurales (porcentaje)	Porcentaje	92.8	44.5	48%
3.2 Retención escolar de 6° grado a 7° grado para niños de hogares beneficiarios de TMC en zonas rurales (porcentaje)	Porcentaje	89.7	43.1	48%
4. Retención escolar de 9.º a 10.º grado de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares beneficiarios de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en áreas rurales (porcentaje).	Porcentaje	45.1	50.2	111%
4.1 Retención escolar de 9º grado a 10º grado para jóvenes mujeres de hogares beneficiarios de TMC en zonas rurales (porcentaje)	Porcentaje	46.4	51.6	111%
4.2 Retención escolar de 9º grado a 10º grado para jóvenes varones de hogares beneficiarios de TMC en zonas rurales (porcentaje)	Porcentaje	43.9	48.7	111%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

D.2.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	BM IDA-6401-HN	US\$	30,000,000	17/9/2019
		Lempiras	801,549,000	Cierre Financiero 30/06/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	7,736,344	7,736,344	3,111,030.1	40.21%
Acumulado 2026	7,736,344	7,736,344	3,111,030.1	40.21%
Acumulado Vida del Proyecto *	801,549,000	1,214,604,770	703,063,552	87.71%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.3 FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL/ BM IDA-6918-HN

El Proyecto tiene como objetivo mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres. Este proyecto dio inicio en octubre de 2021 y al igual que el proyecto anterior es financiado por Banco Mundial, presenta fecha de cierre de ejecución del proyecto el 31 de diciembre de 2025 y cierre financiero el 30 de junio del presente año.

El proyecto presenta la siguiente formulación de componentes en el SNIPH¹:

- **Componente 1.** Financiamiento de Transferencias Monetarias Condicionadas.
- **Componente 2.** Estrategia de Transición Integrada del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas
- **Componente 3.** Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.
- **Componente 4.** Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social
- **Componente 5.** Gestión del Proyecto.

D.3.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

El proyecto durante el periodo evaluado ha realizado acciones referentes al cierre técnico, administrativo y financiero, a fin de presentar los informes y /o liquidaciones correspondientes oportunamente y la programación de avances físicos al 30 de junio de 2026 es la siguiente:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social/ 6918-Hn	Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS	Kits o paquetes entregados	2143	0	100%	0	0	N/A

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026

¹ Sistema Nacional de Inversiones Públicas



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.3.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	BM IDA-6918-HN	US\$	70,000,000	2/10/2021
		Lempiras	1,870,281,000	Cierre Financiero 30/06/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	18,973,250	18,973,250	13,149,816	69.31%
Acumulado 2026	18,973,250	18,973,250	14,159,234	74.63%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,870,281,000	2,685,996,322	1,588,860,724	59.15%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00

La Ejecución presupuestaria corresponde a gestiones de pago de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

D.3.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Con recursos del proyecto FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL financiado por el Banco Mundial (6918-HN), no se prevé llevar a cabo obras y/o supervisión de estas.

D.4 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA EN HONDURAS/ BM -TFOC3767

El Objetivo del Proyecto es mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

El proyecto inició el 01 de julio de 2024 y presenta fecha de cierre el 30 de junio de 2027 y comprende tres componentes:

- Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida
- Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de DIT
- Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Diseminación de Conocimientos



SECRETARÍA DE FINANZAS



Sin embargo, al proyecto se le ha autorizado cambio de cabecera, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 013-2026, por lo que se prorrogó al 31 de diciembre de 2026 el plazo para realizar la transición de cambio de organismo ejecutor del proyecto, siendo la nueva cabecera y unidad ejecutora la Secretaría de Salud.

Durante el periodo reportado, se tiene en proceso la adquisición de Pañalera para mujeres embarazadas de las comunidades de Atlántida, y se espera la apertura del presupuesto 2026, para la emisión de la orden de compra para su adquisición; además, se han realizado las actividades de definición de los establecimientos de salud que serán beneficiados por el proyecto, así como la elaboración de las especificaciones técnicas de los materiales requeridos para el equipamiento de las bebetecas.

D.4.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Los principales avances físicos de la programación al 30 de junio de 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
PPrograma De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras (TFOC 3767)	Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF oC3767	Kits entregados	500	0	0%	0	0	N/A
	Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida.	Obra	2	0	0%	0	0	N/A

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026

Considerando el Decreto PCM 013-2026, la Secretaría de Salud como nuevo organismo ejecutor quedará encargada a partir de la suscripción de las modificaciones al contrato de financiamiento. El Decreto también indica que deberá realizarse el traspaso de archivos físicos y digitales, suministros y bienes materiales, los bienes muebles e inmuebles y cualquier otra que sea necesaria para realizar todas aquellas operaciones que permitan el traspaso de atribuciones y competencia de los programas y proyectos, así como su cierre en los casos que corresponda.

D.4.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa de Desarrollo Infantil:



SECRETARÍA DE FINANZAS



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras	BM -TFOC3767	US\$	2,759,789	1/7/2024
		Lempiras	73,736,870	30/6/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	41,357,923	41,357,923	2,532,882.6	6.12%
Acumulado 2026	41,357,923	41,357,923	2,838,597.5	6.86%
Acumulado Vida del Proyecto *	73,736,870	73,736,870	2,951,228.5	4.00%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00

D.4.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Con recursos de la operación TFOC3767, no se prevé llevar a cabo obras y/o supervisión de estas, para el presente ejercicio fiscal. Las contrataciones realizadas están en función de la conformación de la Unidad Ejecutora como Especialistas en Adquisiciones, Financiero, Monitoreo y en Salvaguardas.

A continuación, se presenta la información que brindó la Unidad Ejecutora del Proyecto sobre las adquisiciones realizadas durante el periodo del segundo trimestre:

#	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO L
1	CONTRATO 068/PRS/TFOC3767/2026	Adquisición de Insumos Médicos para Apoyo al Proyecto del Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras	L483,297.10
2	CONTRATO 069/PRS/TFOC3767/2026	Equipo Médico Apoyo al Proyecto del Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras,	L158,407.90
3	CONTRATO 070/PRS/TFOC3767/2026	740 pañaleras	L1,628,518.00
4	CONTRATO 072/PRS/TFOC3767/2026	Asistente Técnico Municipal	L210,000.00
5	CONTRATO 073/PRS/TFOC3767/2026	Asistente Técnico Municipal	L210,000.00
6	CONTRATO 074/PRS/TFOC3767/2026	Asistente Técnico Municipal	L210,000.00
7	CONTRATO 075/PRS/TFOC3767/2026	Asistente Técnico Municipal	L210,000.00



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.5 PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO/ BIP 24510 – Contrato de Préstamo BCIE 2282

El Proyecto tiene como objetivo: (i) apoyar el mantenimiento de niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por la pandemia de la COVID-19 y por los huracanes ETA e IOTA durante el período de recuperación; y (ii) preservar el capital humano de la población impactada por la crisis sanitaria.

El proyecto inició el 12 de noviembre de 2021 y, como resultado de las ampliaciones de plazo autorizadas por la Secretaría de Finanzas y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), su fecha de cierre fue establecida para el 24 de agosto de 2026.

Actualmente, el proyecto ha concluido su ejecución física y únicamente se encuentra pendiente el pago de la consultoría de auditoría externa. Dicho pago se ha retrasado debido a las gestiones que se han venido realizando para actualizar el registro de exoneración de la institución y del proyecto. Durante el presente trimestre se tenía programado efectuar el pago de la auditoría; sin embargo, no fue posible realizarlo, ya que la incorporación presupuestaria se efectuó hasta el 29 de junio del presente año. Asimismo, se continúa gestionando la renovación de la exoneración del impuesto correspondiente, a fin de completar el proceso de pago de la consultoría.

D.6 PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL / BIP 23593 – Préstamo BID 4619-BL-HO

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los municipios con mayores niveles de pobreza del país y en los hospitales priorizados, mediante el fortalecimiento de la calidad, la gestión y la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

El proyecto inició el 10 de julio de 2019 y tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2026. No obstante, debe considerarse lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 14-2026, el cual fija el 25 de noviembre de 2026 como fecha límite para la ejecución de actividades a través del Programa de la Red Solidaria, en el marco del proceso de supresión de dicho programa.

A continuación, se presentan los avances por componentes reportados por la Unidad Ejecutora del Proyecto:

- **Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales, priorizado a municipios con incidencia de muertes materno-neonatales.**
Las actividades de este componente se desarrollaron y completaron en el 2024.

- **Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud**

AVANCE DE EJECUCION DE OBRAS CONSTRUCCIÓN

A continuación, se presenta los avances físicos y financieros del cuarto trimestre de las 5 obras hospitalarias:



SECRETARÍA DE FINANZAS



- En ejecución la sala neonatal del Hospital Escuela de Tegucigalpa tiene un avance físico de obras del 97%, un avance financiero de 75.4% y una inversión aproximada de L131,405,034.27; cabe resaltar, que se ha definido el alcance final de esta obra, excluyendo la actividad de reforzamiento de 12 columnas del nivel 2 del Hospital.
- Se recibió la notificación por parte del banco de gastos no elegibles al contrato PRS-4619-104-2023 suscrito para la construcción del Hospital de Occidente, debido principalmente a que la obra está inconclusa y fue abandonada por el contratista; en este vía, conjuntamente con SESAL se ha gestionado la identificación de gastos compensables realizado por el gobierno en los hospitales intervenidos por el programa, lográndose identificar la compra de equipo médico con fondos nacionales para los 4 hospitales antes mencionados.
- En ejecución la consultoría de acompañamiento del abogado especialista en contratos FIDIC, en el proceso de reclamación de las fianzas por incumplimiento del contratista y el anticipo no amortizado, en el marco del contrato cancelado PRS-4619-104-2023.
-

- **Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información**

Se realizaron los pagos finales de las consultorías de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: el biomédico y el prestador de servicios ambientales.

- **Componente IV: Administración y Evaluación del programa**

En ejecución las consultorías para la operatividad del programa.

- Se presentó el informe de auditoría 2025 en el mes de abril 2026, el cual recibió la respectiva no objeción del BID al mismo.
- En el marco del Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2026 y el Decreto Ejecutivo No. 14-2026 se ha iniciado el proceso de cierre del programa en Red Solidaria, ya que se ha recibido por parte del Banco la ampliación del plazo del último desembolso por 4 meses (al 10 de noviembre 2026).
- Considerando lo anterior se presenta el detalle del avance de los entregables del proyecto con su ejecución al 31 de diciembre de 2025 y que no se programaron avances para el presente año:

Entregables		Meta Global		
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025
Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	Beneficiarios	425,045	425,045	100%
Equipos de Salud Familiar (ESFAM) conformados en municipios priorizados	Equipo	20	20	100%



SECRETARÍA DE FINANZAS



Entregables		Meta Global		
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025
Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Convenios de Gestión Hospitalarias	8	8	100%
Convenios de Gestión a Hospitales para atención de la emergencia de COVID-19	Convenios de Gestión Hospitalarias COVID	8	8	100%
Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Convenios de Comités de Apoyo	6	6	100%
Hospitales con modelo de gestión y costeo fortalecido	Hospitales	6	6	100%
Bloque obstétrico Neonatal Hospital Occidente construido	Hospitales con bloque obstétrico	1	0	0%
Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	Unidades de Cuidados Intensivos	1	1	100%
Mecanismo de comunicación para el sistema de referencia en hospital occidente implementado.	Hospitales	1	0	0%
Diseño, estudio de reinversión y supervisión de las Obras elaborados	Estudios Realizados	3	2	67%
Regiones sanitarias fortalecidas	Regiones Sanitarias	6	6	100%
Expediente electrónico y Sistema de Información en hospitales implementado	Hospital	1	0	0%
Departamento de Hospitales fortalecido en gestión de procesos y de gestores descentralizados hospitalarios.	Consultorías	5	5	100%
Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos en el modelo de gestión descentralizado	Consultorías	9	17	189%
Plan Maestro de Inversión Hospitalario en Honduras elaborado	Documento	1	0	0%
Evaluación de Línea Base y Evaluación Operativa elaborado	Evaluación	1	0	0%
Estudio Ramos elaborado	Estudio	1	1	100%
Evaluación del Desempeño final del programa elaborado	Evaluación	1	0	0%
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Unidades de Cuidados Intensivos	4	3	75%



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.6.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Unidades de Cuidados Intensivos	0.1	0	0%	0	0	N/A

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026

D.6.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de Mejora de la Calidad y Gestión de los servicios de salud Materno-Neonatal:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	10/7/2019
		Lempiras	1,843,562,700	31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	353,661,321	353,661,321	30,146,491.1	8.52%
Acumulado 2026	353,661,321	353,661,321	32,137,033.2	9.09%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,843,562,700	1,843,562,700	1,274,953,093.3	69.16%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00

D.7 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN / BID 4449/BL-HO

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Entre los avances físicos por componente se encuentran:



SECRETARÍA DE FINANZAS



- **Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país**
 - En el Componente 1, correspondiente al Producto 1.2, se concluyó satisfactoriamente la construcción de los 18 Centros de Educación Básica (CEB) programados para 2026, gracias al seguimiento permanente realizado por el contratista, la supervisión, el BID y la UAP.
 - No obstante, la recepción definitiva de las obras continúa pendiente debido a retrasos en la regularización de contratos, pagos, la transición gubernamental y la aprobación del presupuesto e incorporación presupuestaria. Actualmente, los contratos ya fueron ratificados por el Congreso Nacional y solo restan los procedimientos administrativos y las inspecciones finales para formalizar la recepción de las obras, ejecutadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.
- **Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**
 - En el Componente 2 se realizaron actividades orientadas al cierre de los subcomponentes, incluyendo la sistematización de indicadores, la integración de la documentación de respaldo y cierre, así como la revisión final de las consultorías de impacto y de evaluación final.
 - Asimismo, se consolidó la reportería de la matriz de resultados, que comprende los indicadores de desarrollo, impacto y productos por componente, respaldada con información e informes oficiales del SACE, la SEDUC y otras instituciones participantes.

D.7.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados.	Obra	18	18	100%	18	18	100%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026

D.7.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

En la siguiente tabla se observa la ejecución presupuestaria y financiera ejecutada durante la vida del proyecto y la programada y ejecutada en el presente ejercicio fiscal.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	5/2/2018
		Lempiras	1,202,323,500	24/8/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	30,037,698	30,037,698	10,231,060.5	34.06%
Acumulado 2026	30,037,698	30,037,698	10,231,060.5	34.06%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,202,323,500	1,202,323,500.0	1,108,310,803.6	92.18%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US\$1.00

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre, se atendieron las solicitudes de cuota, la revisión del informe trimestral al primer trimestre 2026, se atendieron solicitudes de ampliaciones de plazo a proyectos y además se realizaron gestiones para actualizar la herramienta informática del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) con los cambios realizados en la programación de los proyectos que ejecuta el Programa de la Red Solidaria.

Así mismo se participó en reuniones de seguimiento de manera semanal con los diferentes proyectos de la PRS en seguimiento al proceso de transición hacia SEDESOL y cierre de los proyectos.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

La problemática identificada por la Unidad Ejecutora se presenta en la siguiente tabla:

Préstamo	Problemática	Acciones
BID 5008	Falta de un Plan de apoyo a la sostenibilidad del programa dificulta el cumplimiento de las metas programadas y la continuidad de los servicios ampliados	Concertar acuerdos sobre el financiamiento y metodologías para asegurar la continuación de los servicios ampliados mediante el Plan de Apoyo a la Sostenibilidad establecido en el contrato de préstamo.
	Desfases en la implementación de los contratos con la ONGs dificulta la intervención del Programa en territorio	El programa está apuntando a la contratación de Gestores sociales que apoyen en territorio, mientras se cuenta con la publicación de los contratos de las



SECRETARÍA DE FINANZAS



Préstamo	Problemática	Acciones
		ONG en la Gaceta, al ser ratificados por el Congreso Nacional.
BM 6401 BM 6918	Ambos proyectos han llegado a la fecha de cierre por lo que es necesario que presenten a la Secretaría de Finanzas los informes necesarios para gestionar el cierre en los sistemas.	La SEFIN ha solicitado la información requerida para el cierre en el SNIPH conforme a las disposiciones generales del presupuesto y a lo dispuesto en las Normas Técnicas de Inversión Pública vigentes.
TFOC3767 BM	El cambio de gobierno, y la transición a SEDESOL ha detenido las actividades operativas, y financieras por la no aprobación del presupuesto 2026. Además, se presenta el reto de realizar la transición del proyecto a la SESAL	Continuar con el seguimiento y coordinar la reunión con las Unidades Ejecutoras (PRS - SESAL) a fin de lograr la transición adecuada y eficiente
El Proyecto Materno – Neonatal	- La aprobación tardía del Presupuesto General 2026 ocasionó retrasos en el pago de las estimaciones de obras de infraestructura ya finalizadas, afectando la ejecución financiera del proyecto. - La ratificación de dos contratos que trascendieron el período de gobierno, correspondientes a la construcción de la Sala Neonatal del Hospital Escuela y a la supervisión de las obras, continúa pendiente, lo que ha retrasado el pago de entregables asociados. - El cambio en la delegación de firmas ante el organismo financiador generó demoras en la gestión de no objeciones del BID para procesos de contratación, adendas contractuales, actualización del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y la presentación de informes de avance, entre otros. - La obra de la Sala Neonatal del Hospital Escuela concluirá de forma parcial debido a limitaciones de tiempo y a la insuficiencia del plazo del último desembolso para ejecutar las obras restantes. En consecuencia, no se realizará el reforzamiento de 12 columnas del nivel 2, lo que, según la firma supervisora, podría incrementar la vulnerabilidad estructural del edificio.	A continuación, algunas acciones puntuales a realizar: Agilizar la gestión de pagos pendientes en coordinación con la Secretaría de Finanzas. Gestionar la pronta ratificación de los contratos pendientes. Concluir la actualización de firmas autorizadas y priorizar las gestiones de no objeción ante el BID. Definir una estrategia para ejecutar las obras pendientes o asegurar su financiamiento y continuidad una vez finalizado el proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



G. CONCLUSIONES

- El Programa de la Red Solidaria mantiene la ejecución de siete proyectos financiados con organismos multilaterales; sin embargo, la aprobación tardía del Presupuesto General 2026, los procesos de transición institucional y la supresión del PRS han incidido en el ritmo de ejecución física y financiera de varios proyectos.
- Los proyectos de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN y 6918-HN) concluyeron su ejecución física y financiera, encontrándose en la etapa de cierre administrativo y presentación de informes finales.
- El Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO) presenta una ejecución financiera limitada durante el período, debido principalmente a retrasos administrativos y a la ratificación de contratos con organizaciones ejecutoras.
- El Proyecto de Desarrollo Infantil Temprano registra un bajo nivel de ejecución, condicionado por la transición de la unidad ejecutora hacia la Secretaría de Salud y por retrasos en la aprobación del presupuesto.
- El Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables concluyó su ejecución física, quedando únicamente pendiente el pago de la auditoría externa y el cierre financiero del proyecto.
- El Proyecto de Salud Materno-Neonatal presenta avances importantes en infraestructura hospitalaria; no obstante, persisten riesgos asociados a la ejecución parcial de la obra del Hospital Escuela, así como retrasos administrativos que afectan su ejecución financiera.
- El Proyecto Joven alcanzó la culminación de las obras de los 18 Centros de Educación Básica programados; sin embargo, continúa pendiente la recepción definitiva de las obras y la conclusión de los procesos administrativos de cierre.
- Considerando el cierre del Programa de la Red Solidaria establecido para 2026, resulta prioritario fortalecer las acciones de coordinación interinstitucional para garantizar el cierre técnico, financiero y administrativo de los proyectos dentro de los plazos establecidos por los organismos financiadores y la normativa nacional.
- El Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus financiado por el BID mediante contrato No.5289/BL-HO se encuentra pendiente de realizar el cierre financiero y presentación de informes al organismo financiador y a la SEFIN; por lo que es necesario que realizar las gestiones necesarias en las diferentes instancias, a fin de cumplir con los compromisos hacia el BID, hacia el mismo Estado y los entes contralores.



SECRETARÍA DE FINANZAS



H. RECOMENDACIONES

Se comparten las siguientes recomendaciones tomando en cuenta la información que antecede y la gestión de proyectos Fortalecer la gobernanza de la transición institucional, definiendo roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre PRS, SEDESOL, SEFIN y organismos financiadores.

1. Priorizar las actividades críticas de los proyectos que se encuentran en fase de cierre, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos por los organismos financiadores y la normativa nacional, en especial la gestión de la exoneración fiscal del proyecto financiado con el Contrato BCIE 2282.
2. Fortalecer el seguimiento a los planes de acción de cada proyecto mediante reuniones periódicas de control, con énfasis en la atención oportuna de riesgos, retrasos y actividades críticas.
3. Agilizar las gestiones administrativas y financieras pendientes, particularmente las relacionadas con ratificaciones de contratos, pagos, no objeciones y procesos de cierre técnico y financiero.
4. Implementar un plan de transición y cierre que defina responsables, cronogramas y productos esperados para garantizar la continuidad de las acciones y el adecuado traspaso de los proyectos a las instituciones competentes.
5. Mantener actualizada la información física y financiera de los proyectos en los sistemas oficiales, asegurando la consistencia entre la programación, la ejecución y los informes de seguimiento.
6. Fortalecer la coordinación entre la Unidad Ejecutora, la Secretaría de Finanzas, los organismos financiadores y las instituciones receptoras, a fin de reducir tiempos de respuesta y facilitar la toma de decisiones.
7. Documentar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas derivadas de la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la formulación y gestión de futuras intervenciones de inversión pública.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado II Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)			Compromiso Aprobado		
			Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva														
7	0415 - Programa de la Red Solidaria		622,860,221	622,860,221	525,075,432	525,075,432	75,000,217	75,000,217	14.3%	80,151,629	80,151,629	15.3%	153,870,867	153,870,867	29.3%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	61,067,896	61,067,896	61,067,896	61,067,896	15,828,937	15,828,937	25.9%	17,674,674	17,674,674	28.9%	20,385,033	20,385,033	33.4%
	Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		61,067,896	61,067,896	61,067,896	61,067,896	15,828,937	15,828,937	25.9%	17,674,674	17,674,674	28.9%	20,385,033	20,385,033	33.4%
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	18,973,250	18,973,250	18,973,250	18,973,250	13,149,816	13,149,816	69.3%	14,159,234	14,159,234	74.6%	14,224,350	14,224,350	75.0%
	Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		18,973,250	18,973,250	18,973,250	18,973,250	13,149,816	13,149,816	69.3%	14,159,234	14,159,234	74.6%	14,224,350	14,224,350	75.0%
3	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	30,037,698	30,037,698	30,037,698	30,037,698	10,231,061	10,231,061	34.1%	10,231,061	10,231,061	34.1%	10,979,892	10,979,892	36.6%
	Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		30,037,698	30,037,698	30,037,698	30,037,698	10,231,061	10,231,061	34.1%	10,231,061	10,231,061	34.1%	10,979,892	10,979,892	36.6%
4	PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	BCIE-2282	110,025,789	110,025,789	12,241,000	12,241,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		110,025,789	110,025,789	12,241,000	12,241,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
5	Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras	TFOC3767	41,357,923	41,357,923	41,357,923	41,357,923	2,532,883	2,532,883	6.1%	2,838,598	2,838,598	6.9%	3,571,717	3,571,717	8.6%
	Total Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras		41,357,923	41,357,923	41,357,923	41,357,923	2,532,883	2,532,883	6.1%	2,838,598	2,838,598	6.9%	3,571,717	3,571,717	8.6%
6	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	7,736,344	7,736,344	7,736,344	7,736,344	3,111,030	3,111,030	40.2%	3,111,030	3,111,030	40.2%	3,111,030	3,111,030	40.2%
	Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		7,736,344	7,736,344	7,736,344	7,736,344	3,111,030	3,111,030	40.2%	3,111,030	3,111,030	40.2%	3,111,030	3,111,030	40.2%
7	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	353,661,321	353,661,321	353,661,321	353,661,321	30,146,491	30,146,491	8.5%	32,137,033	32,137,033	9.1%	101,598,844	101,598,844	28.7%
	Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		353,661,321	353,661,321	353,661,321	353,661,321	30,146,491	30,146,491	8.5%	32,137,033	32,137,033	9.1%	101,598,844	101,598,844	28.7%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo														
	0415 - Programa de la Red Solidaria		17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	ACTIVIDADES CENTRALES		17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total general		640,364,921	640,364,921	525,075,432	525,075,432	75,000,217	75,000,217	14.3%	80,151,629	80,151,629	15.3%	153,870,867	153,870,867	29.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	%	Progra- mación	Ejecución	%
					Ejecución			Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BL-Ho O	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1000	0	0%	0	0	N/A
	Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.	Reporte	1	0	0%	0	0	N/A
	Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Contrato	1	0	0%	1	1	100%
	Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	1	0	0%	0	0	N/A
Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn	Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes.	Informe	1	0	0%	0	0	N/A
	Informe de cierre para pago de comisiones bancarias operación 6401/HN 1 1 1 100%	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social/ 6918-Hn	Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS	Kits o paquetes entregados	2143	0	100%	0	0	N/A



SECRETARÍA
DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecución	%	Progra- mación	Ejecución	%
					Ejecución			Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlántida En Honduras (TFOC 3767)	Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF oC3767	Kits entregados	500	0	0%	0	0	N/A
	Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida.	Obra	2	0	0%	0	0	N/A
Proyecto De Mejora De La Gestión Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Unidades de Cuidados Intensivos	0.1	0	0%	0	0	N/A
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados.	Obra	18	18	100%	18	18	100%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto al 30 de junio de 2026
