



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
**Instituto Nacional
de Estadística
(INE)**

Informe No. 0513-002-2026

Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) ..	5
D. PRINCIPALES PROYECTOS	7
D.1 Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. / BID 5832/BL-HO	7
E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL II TRIMESTRE 2026.....	10
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	12
G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	12
H. CONCLUSIONES	13
I. RECOMENDACIONES	14
ANEXO 1	15
ANEXO 2	16



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras, creado mediante Decreto No. 86-2000 y adscrito a la Secretaría de Estado de la Presidencia (SEP), constituye la entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional (SEN), con la responsabilidad de coordinar y regular la producción, recolección, análisis y publicación de las operaciones estadísticas oficiales del país, provenientes de censos, encuestas y registros administrativos recopilados a través del SEN, los cuales sirven como referentes fundamentales para los distintos tomadores de decisiones del ámbito público y privado. En congruencia con este mandato, su visión es consolidarse como el referente nacional e internacional en la generación y gestión de estadísticas oportunas y confiables, que contribuyan directamente al fortalecimiento y creación de políticas públicas efectivas, encaminadas al bienestar de la sociedad.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	515,529,840
Inversión Productiva	510,408,559
Formación Bruta de Capital	5,121,281
Presupuesto Vigente	515,529,840
Inversión Productiva	510,408,559
Formación Bruta de Capital	5,121,281
Ejecutado II Trimestre	19,743,622
Inversión Productiva	18,887,897
Formación Bruta de Capital	855,725
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	3.8%
Ejecutado Anual	22,391,945
Inversión Productiva	21,533,211
Formación Bruta de Capital	858,734
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	4.3%
Compromiso Aprobado	62,136,183
Inversión Productiva	61,277,449
Formación Bruta de Capital	858,734
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	12.1%

Nota: SIAFI, 30/06/2026

Para dar cumplimiento a este cometido, el INE desarrolla cinco objetivos generales que estructuran su labor estratégica:

1. Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de estadísticas confiable y oportunas necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado del país;
2. Establece la normatividad necesaria para integrar y racionalizar las actividades estadísticas oficiales, coordinando acciones entre productores y usuarios de las estadísticas y de actividades conexas, a fin de optimizar el uso de los recursos;
3. Establecer la programación para las actividades de diseño, recopilación, procesamiento, análisis, difusión y publicación de la información de la estadística oficial del país, obtenida mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos;



SECRETARÍA DE FINANZAS




4. Promover el interés por las actividades estadísticas en todos los sectores de la población y sus autoridades, para crear una cultura estadística, a fin de lograr una activa participación y permanente, colaboración fortaleciendo al Sistema Estadístico Nacional (SEN), y
5. Promover la capacitación y la investigación.

Durante 2026 se ha priorizado el inicio del XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), considerado una herramienta estratégica para generar información estadística actualizada, precisa y desagregada sobre la población, las viviendas y sus condiciones socioeconómicas. Sus resultados constituirán un insumo esencial para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como para la planificación del desarrollo nacional y la toma de decisiones basada en evidencia.

Para la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), la información generada por el CNPV es fundamental para identificar brechas territoriales, priorizar proyectos de inversión pública, construir líneas base, monitorear indicadores y estimar necesidades de infraestructura. Asimismo, fortalece la evaluación de programas y la rendición de cuentas.

Tomando en consideración que el último censo se realizó en 2013, la información sociodemográfica disponible se encuentra desactualizada, lo que limita la adecuada focalización de la inversión pública, incrementa la incertidumbre en la estimación de necesidades y reduce la eficiencia en la asignación de recursos. En este contexto, la ejecución del nuevo CNPV constituye no solo un mandato legal, sino una condición indispensable para orientar el presupuesto nacional y maximizar el impacto social de la inversión pública.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

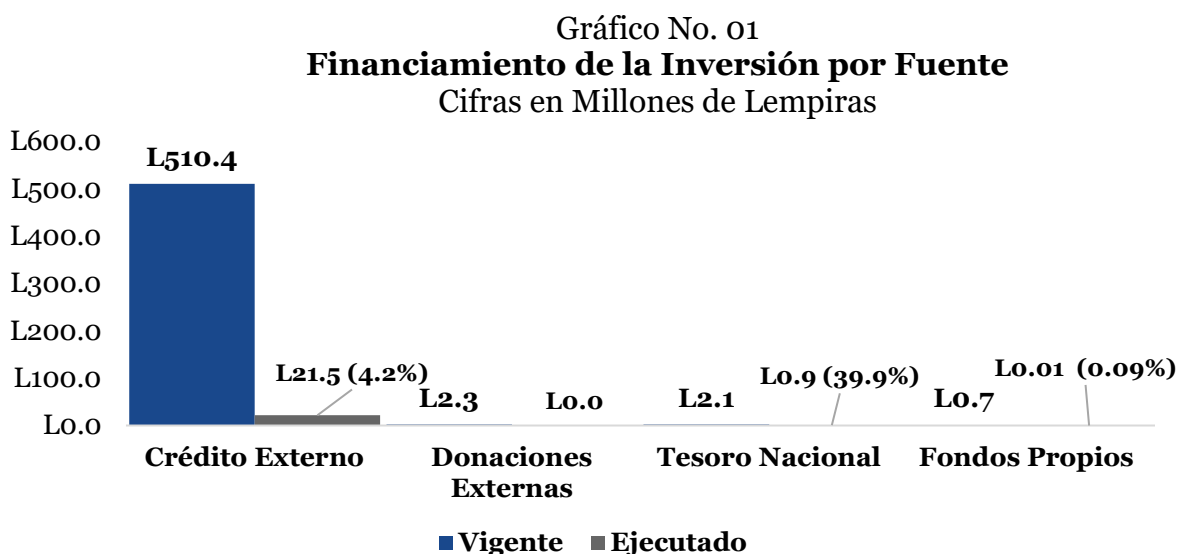

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



Al segundo trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L515.5 millones**, detallado para la Inversión productiva **L 510.4 millones** y la formación bruta de capital **L 5.1 millones**; la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2026 fue por un monto de **L 22.4 millones**, lo que representa el **4.3%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


De igual forma, del presupuesto vigente (L515.5 millones) de la institución, **el 99 %** (L510.4 millones) corresponde a un único crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 5832/BL-HO) destinado íntegramente al Censo Nacional de Población y Vivienda. Esto evidencia que la actividad institucional del INE se encuentra prácticamente monopolizada por el operativo censal, siendo este su único proyecto en ejecución. El resto del presupuesto vigente se distribuye entre Tesoro Nacional con L2.1 millones, Recursos Propios con L0.7 millones y Donaciones Externas con L2.3 millones. Ver Gráfico No. 01.

La ejecución de Formación Bruta de Capital Fijo de **L0.9 millones** corresponde al programa de Producciones Estadísticas a fin de desarrollar operaciones estadísticas en los ámbitos socioeconómico y demográfico, mediante censos, encuestas y registros administrativos institucionales, el programa proveerá al país de agregados estadísticos oficiales con altos estándares de calidad y oportunidad, elementos fundamentales para apoyar a los tomadores de decisiones.

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

Gráfico No. 2

Comportamiento Inversión Pública Total Al 30 de junio (2022-2026) 0513 - Instituto Nacional de Estadísticas Cifras en millones de Lempiras

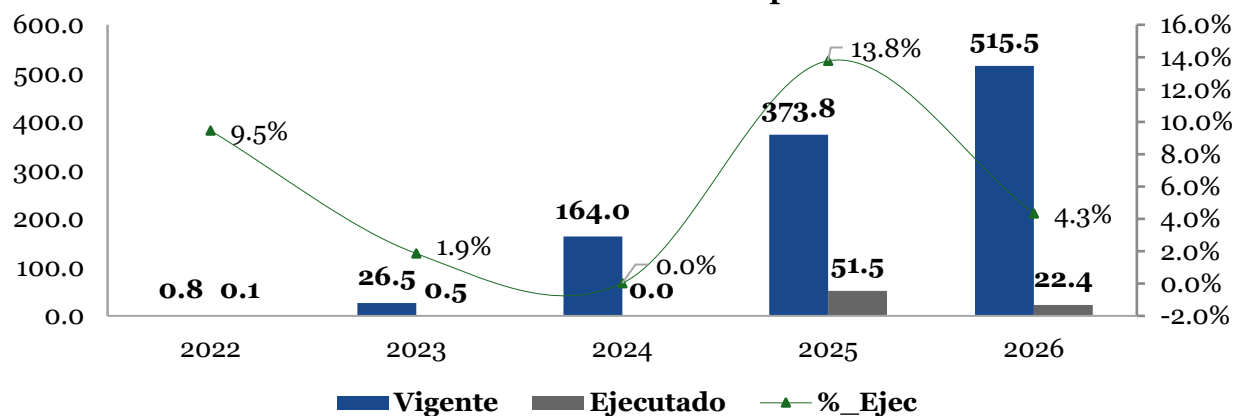

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



La Gráfica No. 2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los años 2022 al 2026, que para el año 2026 cuenta con un presupuesto vigente mayor a los años anteriores (L515.5 millones); sin embargo, a diferencia del año anterior, la ejecución presupuestaria del INE al segundo trimestre de 2026 es de apenas L22.4 millones (4.3%), debido principalmente a que el proyecto se encuentra en la etapa de preparación del operativo censal, teniendo previsto iniciar en el mes de agosto de 2026.

2022: Durante este año, al corte del segundo trimestre, el INE contaba con un presupuesto vigente de L0.8 millones y ejecutó L0.1 millones (9.5 %), correspondiente a actividades de mantenimiento del SEN y gastos administrativos menores, sin incidencia en proyectos de inversión.

2023: El presupuesto aumentó a L26.5 millones, pero la ejecución fue de apenas L0.5 millones (1.9 %). Este comportamiento refleja que la institución inició las gestiones preparatorias del censo (diseño metodológico, acercamientos con el BID, aprobación de la Nota de Prioridad y suscripción del financiamiento).

2024: A pesar de que el presupuesto vigente ascendió a L164.0 millones, la ejecución fue del 0.0% (L0.0 millones), atribuible a retrasos en la entrada en vigor de los fondos del crédito externo, procesos de no objeción del BID, ajustes internos en los planes de adquisiciones y cambios en las prioridades institucionales durante el arranque del año, lo que paralizó por completo la capacidad de gasto del INE en ese semestre.

2025: La ejecución presupuestaria alcanzó los L51.5 millones, equivalentes al 13.8% del presupuesto vigente (L373.8 millones). Con esto, el INE logró activar los procesos de contratación tecnológica, actualización cartográfica y realización de pruebas piloto, recuperando el ritmo de inversión y sentando las bases técnicas para el operativo censal.

2026 (presupuesto máximo, ejecución rezagada): Durante el año 2026, el INE presenta su presupuesto vigente más alto de la historia (L515.5 millones), pero su ejecución al segundo trimestre es de apenas el 4.3 %, equivalente a L22.4 millones. El INE muestra una ejecución rezagada que obedece a la complejidad inherente a los procesos de adquisición de bienes y servicios especializados para el censo (equipos electrónicos, logística masiva, contratación de personal temporal, entre otros). Para el próximo semestre, el INE deberá priorizar el aceleramiento de los desembolsos y la ejecución física, con el propósito de garantizar que el CNPV 2026 se realice en los plazos establecidos y no se comprometa la generación de la línea base poblacional que requiere la inversión pública nacional. El saldo pendiente de L493.1 millones deberá ser ejecutado en un ritmo mucho más dinámico para evitar que el censo sufra retrasos en sus fases críticas de levantamiento de campo.



D. PRINCIPALES PROYECTOS

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el INE cuenta con un único proyecto de inversión productiva el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, con código BIP 25298.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

D.1 Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. / BID 5832/BL-HO

D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

El objetivo general del programa es incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas del Gobierno de Honduras. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad; y (ii) fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el seguimiento al Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el proyecto registra un avance acumulado del **44%**, evidenciado por el cumplimiento de los siguientes hitos principales cumplidos:

1. Actualización Cartográfica
2. Censo Piloto Experimental en Orica, FM
3. Boleta Censal socializada y lista
4. Dispositivos Móviles adquiridos (16,200 tabletas)
5. Indumentaria Censal adquirida
6. Manual de Reclutamiento Masivo aprobado

A continuación, se describen el estado de actividades clave del CNPV y su porcentaje de cumplimiento, según lo reportado por la Unidad Ejecutora del mismo:

Actividad clave	% Cumplimiento	Estado
Boleta censal	100%	Finalizada
Manual de Reclutamiento Masivo	100%	Finalizado y en ejecución
Actualización Cartográfica	100%	Revisada y Finalizada
Censo Piloto Experimental en Orica, FM	100%	Finalizado
Dispositivos Móviles adquiridos (16,200 tabletas)	100%	Entregados



SECRETARÍA DE FINANZAS



Actividad clave	% Cumplimiento	Estado
Indumentaria Censal adquirida	100%	Revisada y en proceso de entrega con diseño de logos nuevos del INE
Carnés de identificación	80%	Empresa contratada y tiempo de entrega
Campana de Comunicación	60%	En proceso de contratación
Compra de Insumos y Materiales necesarios para la logística de transporte y campo del CNPV	100%	Proveedores contratados y tiempo de entrega
Alquiler de Vehículos para CNPV	100%	En ejecución
Contratación de servicios de infraestructura tecnológica en nube, implementación, administración, soporte y monitoreo de la plataforma censal basada en CSWEB/CSPRO	100%	En ejecución
Servicio de Transporte de Insumos y logística del CNPV	80%	En proceso de contratación

Fuente: INE

Si bien se han cumplido los hitos relevantes y se ha avanzado en actividades clave en el presente año, el programa enfrenta desafíos grandes como la contratación masiva de todo el personal de campo (censistas y supervisores) y el levantamiento censal propiamente dicho, el cual se ejecutará en un período de 60 días entre agosto y octubre de 2026, lo que exige un aceleramiento significativo de los desembolsos y de la logística operativa.

Para mitigar estos riesgos, la Unidad Ejecutora, ha implementado acciones correctivas como la mejora del sistema de pago a través de la banca privada y la capacitación departamental en temas administrativos y contractuales. Adicionalmente, se encuentran en gestión dos solicitudes de incorporación presupuestaria ante la Secretaría de Finanzas: una por L430.6 millones para cubrir actividades previstas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 2026, y otra por L154 millones destinada al segundo pago de estipendios del personal censal, lo que evidencia la necesidad de un flujo de caja oportuno para garantizar la continuidad del operativo.

Desde la perspectiva de la SEFIN-DGIP, este avance, aunque todavía incipiente en términos financieros, coloca al INE en una fase de preparación operativa intensiva que demandará un acompañamiento estrecho en la programación presupuestaria y en el monitoreo de la ejecución física y financiera, a fin de asegurar que el censo se realice en los plazos establecidos y que los datos resultantes, insumo esencial para la focalización territorial y la actualización de líneas base, estén disponibles para la planificación de la inversión pública nacional.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
Finalizado el Censo Nacional de Población y Vivienda de la Republica de Honduras	Censo	1	0	0%	0	0	0%
Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	Campaña	0.5	0	0%	0	0	0%
Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	1	0	0%	0	0	0%
Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	Estudios	1	0	0%	0	0	0%
Estrategia de ciberseguridad desarrollada	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

Evaluación Financiera II trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	BID 5832/BL-HO	Dólares	50,000,000.00	29/02/2024
		Lempiras	1,335,915,000.00	- 29/02/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	510,408,559.00	510,408,559.00	19,743,621.87	3.8%
Acumulado 2026	510,408,559.00	510,408,559.00	22,391,944.87	4.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,335,915,000.00	1,335,915,000.00	201,549,953.17	15.0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



SECRETARÍA DE FINANZAS



E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL II TRIMESTRE 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, el INE reportó varias adquisiciones realizadas en el marco del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. A continuación, se detallan las más relevantes:

No.	Tipo de Contrato	Proceso de Licitación	No. de Contrato	Firma de Contrato	Adjudicatario	Monto del Contrato	Estado
1	Servicio de consultoría: Servicio integral de plataforma tecnológica para el reclutamiento y selección del personal de campo del proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	Selección Directa	INE-CNPV-SD-13-2026	30/4/2026	Lynor Consulting, S.A. de C.V.	\$99,789.00	En Ejecución
2	Servicios distintos de Consultoría: Contratación de Servicio de Re Etiquetado de Equipo de Campo y Protección Personal para uso en el levantamiento del Censo de Población y Vivienda (CNPV)	Contratación Directa	INE-CNPV-SNC-5-2026	4/5/2026	Industria Textil Lamysef by Laurel, S.A. de C.V.	L 2,808,300.00	En Ejecución
3	Servicios distintos de Consultoría: Póliza de seguro para los vehículos del Programa del Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	Contratación Directa	INE-CNPV-SNC-6-2026	13/5/2026	Seguros Continental	L 305,135.56	En Ejecución
4	Servicio de consultoría (Individual): Evaluación Intermedia del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	3CV (Competencia Abierta)	INE-CNPV-3CV-13A-2026	8/6/2026	María Teresa Vásquez Salgado	\$35,000.00	En Ejecución



SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Tipo de Contrato	Proceso de Licitación	No. de Contrato	Firma de Contrato	Adjudicatario	Monto del Contrato	Estado
5	Bienes: Adquisición de Estantes Metálicos para el almacenamiento en Bodega de los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) y Fuentes de Poder para el Censo Nacional de Población y Vivienda	Comparación de Precios (Invitación Abierta)	INE-CNPV-B-2-2026	18/6/2026	Industrias Panavisión, S.A de C.V.	L 192,375.00	Finalizado
6	Servicios distintos de Consultoría: Contratación de servicios de infraestructura tecnológica en nube, implementación, administración, soporte y monitoreo de la plataforma censal basada en CSWEB/CSPRO para el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	Comparación de Precios (Invitación Abierta)	INE-CNPV-SNC-8-2026	19/6/2026	Sistemas Telemáticos (SISTEL)	L 3,778,900.00	En Ejecución
7	Bienes: Diseño, diagramación e impresión de boletas censales, banners, backdrops y sticker de vivienda censada	Comparación de Precios (Invitación Abierta)	INE-CNPV-B-3-2026	22/6/2026	Publicaciones Gráficas, S. de R.L.	L 4,141,811.90	En Ejecución
8	Servicios de Consultoría: Auditoría de Estados Financieros de Propósito Especial del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	INE-CNPV-SCC-1-2026	22/6/2026	Ernst & Young Honduras, S. de R.L.	\$165,031.00	En Ejecución

Fuente: INE



F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En el marco del seguimiento a la cartera de Proyectos de Inversión Pública (PIP) ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el trimestre se realizaron diversas acciones orientadas a garantizar la fluidez operativa, financiera y normativa de los proyectos en ejecución. A continuación, se detallan los principales hitos de gestión de la inversión correspondientes al período:

- Se dictaminaron cuatro (4) modificaciones presupuestarias que afectaron proyectos de inversión pública con el propósito de realizar traslados dentro del mismo proyecto.
- Se sostuvieron reuniones técnicas con personal de la unidad ejecutora del INE para revisar la proyección de ejecución y los requerimientos de espacio presupuestario para cubrir actividades operativas previstas en el presente año para el Censo Nacional de Población y Vivienda.
- Participación en reunión informativa en atención de consultas de la consultoría a cargo de la Evaluación Intermedia del préstamo BID 5832/BL-HO (Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda).
- Se brindó acompañamiento técnico activo en el proceso de Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública Plurianual para el ejercicio fiscal 2027 - 2030.
- Seguimiento a los acuerdos de la revisión de cartera realizada del 5 al 7 de mayo con el BID y con participación del INE.

G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, el INE continuó impulsando la ejecución del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional; sin embargo, el desarrollo del proyecto enfrentó limitaciones de carácter técnico, administrativo, financiero y de contratación que incidieron en el cumplimiento de la programación física y financiera. Entre las principales problemáticas identificadas destacan las siguientes:

- **Baja ejecución financiera y desfase entre la programación y el devengado:**
 - ✓ **Problemática:** El Programa (5832/BL-HO) registró una ejecución financiera del 4.2% sobre un presupuesto vigente de L510.4 millones, mientras que el avance físico del PEP alcanzó el 44%. La ejecución acumulada del préstamo solo representó el 15% (USD 7.5 millones de USD 50.0 millones), evidenciando una brecha entre actividades programadas y recursos disponibles.
 - ✓ **Acciones:** La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) La UEP fortaleció el seguimiento financiero y gestionó ante la Secretaría de Finanzas dos solicitudes de incorporación presupuestaria para financiar actividades del segundo semestre y garantizar el pago de estipendios del personal censal.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- **Complejidad y lentitud en los procesos de adquisición de bienes y servicios especializados:**
 - ✓ **Problemática:** La contratación de bienes, servicios tecnológicos, consultorías y logística sufrió retrasos por la complejidad de los procesos de selección y los trámites de no objeción del BID, postergando actividades críticas y concentrando la ejecución en el segundo semestre.
 - ✓ **Acciones:** La UEP reforzó la gestión de adquisiciones con personal especializado, cronogramas de seguimiento con la DGIP y la Dirección General de Crédito Público, e implementó mejoras administrativas, contractuales y de pago para agilizar la ejecución.
- **Transición gubernamental y adecuación institucional:**
 - ✓ **Problemática:** El cambio de gobierno en enero de 2026 generó incertidumbre sobre la continuidad administrativa, especialmente en la ratificación del personal clave de la UEP y la adaptación a nuevas autoridades de la Secretaría de Estado de la Presidencia, lo que ralentizó decisiones estratégicas.
 - ✓ **Acciones:** Se coordinó con las nuevas autoridades del INE y la Secretaría de Estado de la Presidencia para asegurar la continuidad del programa.
- **Desafíos en la planificación operativa y logística del levantamiento censal:**
 - ✓ **Problemática:** El operativo censal (agosto-octubre 2026) implica contratar, capacitar y desplegar aproximadamente 16,200 censistas y supervisores, además de distribuir equipos e insumos a nivel nacional en un plazo reducido.
 - ✓ **Acciones:** El INE implementó el Manual de Reclutamiento Masivo, activó la plataforma tecnológica para contratación de campo, inició la campaña de sensibilización censal y realizó adquisiciones logísticas, previniendo completar contratación y capacitación en julio.

H. CONCLUSIONES

- El presupuesto vigente de inversión pública del INE asciende a L515.5 millones, de los cuales el 99% corresponde al Crédito Externo BID 5832/BL-HO destinado al CNPV. La ejecución financiera al segundo trimestre alcanza L22.4 millones (4.3%), un avance modesto que refleja la fase inicial del proyecto y la complejidad de los procesos de adquisición y contratación, pero que también enciende señales de alerta sobre la necesidad de acelerar los desembolsos para el segundo semestre.
- Al cierre del segundo trimestre, el INE consolidó los hitos preparatorios del CNPV 2026 con un 44% de avance físico, destacando la actualización cartográfica, censo piloto, adquisición de tabletas e indumentaria, y aprobación del manual de reclutamiento.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Se gestionaron dos solicitudes de incorporación presupuestaria ante la Secretaría de Finanzas por L584.6 millones (L430.6 millones para actividades PEP y L154 millones para estipendios), evidenciando la necesidad de flujo de caja oportuno para la continuidad del operativo y el pago al personal de campo.
- Desde la perspectiva de la DGIP, el INE está en una fase de preparación operativa intensiva que requerirá acompañamiento cercano en programación presupuestaria, monitoreo físico-financiero y gestión de incorporaciones presupuestarias para asegurar el censo en los plazos establecidos y la disponibilidad de datos para la focalización territorial y actualización de líneas base.
- El CNPV 2026 es un mandato legal (Decreto No. 86-2000) y una condición habilitante para contar con información demográfica, social y económica actualizada que permita una asignación más equitativa y eficiente de recursos públicos, reduciendo riesgos de sub o sobre focalización y mejorando la efectividad de las políticas públicas.

I. RECOMENDACIONES

Con el propósito de fortalecer la gestión de la inversión pública del INE, superar las limitaciones enfrentadas durante el segundo trimestre de 2026 y asegurar el cumplimiento de las metas físicas y financieras del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, se formulan las siguientes recomendaciones:

- El INE proyecta ejecutar un saldo de L1,073.5 millones de crédito externo para el CNPV entre julio y diciembre de 2026. Se recomienda implementar un plan de aceleramiento de pagos, priorizando contratación masiva de personal, servicios logísticos y estipendios, para evitar que el rezago financiero comprometa el levantamiento censal (agosto-octubre 2026).
- La solicitud de incorporación presupuestaria por L154 millones para el segundo pago de estipendios debe ser priorizada por la Secretaría de Finanzas, dado que el flujo de caja para censistas y supervisores es crítico para su motivación y permanencia. Se recomienda dar seguimiento cercano y coordinar con la Dirección General de Presupuesto y Crédito Público para su pronta resolución.
- Se recomienda evaluar la necesidad de reforzar aún más los equipos de adquisiciones, gestión financiera y monitoreo para atender la complejidad y volumen de contrataciones del levantamiento y la etapa postcensal.
- La DGIP debe establecer un mecanismo de seguimiento mensual o quincenal (agosto-octubre) que compare avances físicos del PEP con desembolsos financieros, identifique desviaciones y permita acciones correctivas tempranas, incluyendo indicadores de contratación, capacitación, despliegue y recolección de datos.
- Es indispensable que el INE, con acompañamiento de la SEFIN, inicie la planificación de la etapa postcensal (procesamiento, análisis, difusión y evaluación) y del fortalecimiento institucional del SEN, ejecutando oportunamente los recursos del Componente 3 y aprovechando la información censal para actualizar marcos muestrales y generar estadísticas continuas.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2026

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	1. Inversión Productiva		-	510,408,559	510,408,559	-	510,408,559	510,408,559	-	18,887,897	18,887,897	3.7%	-	21,533,211	21,533,211	24.8%
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas			510,408,559	510,408,559		510,408,559	510,408,559		18,887,897	18,887,897	3.7%		21,533,211	21,533,211	4.2%
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	5832/BL-HO		510,408,559	510,408,559		510,408,559	510,408,559		18,887,897	18,887,897	3.7%		21,533,211	21,533,211	4.2%
	Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA			510,408,559	510,408,559		510,408,559	510,408,559		18,887,897	18,887,897	3.7%		21,533,211	21,533,211	4.2%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		2,839,281	2,282,000	5,121,281	2,839,281	2,282,000	5,121,281	855,725	-	855,725	16.7%	858,734	-	858,734	16.8%
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		2,839,281	2,282,000	5,121,281	2,839,281	2,282,000	5,121,281	855,725	-	855,725	16.7%	858,734	-	858,734	16.8%
	PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS		2,839,281	2,282,000	5,121,281	2,839,281	2,282,000	5,121,281	855,725	-	855,725	16.7%	858,734	-	858,734	16.8%
	Total PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS		2,839,281	2,282,000	5,121,281	2,839,281	2,282,000	5,121,281	855,725	-	855,725	16.7%	858,734	-	858,734	16.8%
	Total general		2,839,281	512,690,559	515,529,840	2,839,281	512,690,559	515,529,840	855,725	18,887,897	19,743,622	3.8%	858,734	21,533,211	22,391,945	4.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

EJECUCIÓN FÍSICA AL 30 DE JUNIO DE 2026

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	Entregable Principal en NP: Finalizado el Censo Nacional de Población y Vivienda de la Republica de Honduras	Censo	1	0	0%	0	0	0%
	Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	Campaña	0.5	0	0%	0	0	0%
	Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	1	0	0%	0	0	0%
	Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	Estudios	1	0	0%	0	0	0%
	Estrategia de ciberseguridad desarrollada	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%

Nota: INE, al 30 de junio de 2026
