



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
Secretaría de Ciencia
Innovación y Tecnología
(SENACIT)

Informe No. 00515-002-2026
Tegucigalpa, julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) 4	
D. PRINCIPALES PROYECTOS	5
D.1 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente:.....	5
1. "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras".	5
El proyecto de IHCIETI No tuvo actividades físicas ejecutadas durante este período:	5
Las metas programadas para 2026 son los siguientes:	5
D.1.1. Evaluación Financiera al II trimestre 2026	6
D.1.2. Principales Adquisiciones al II trimestre 2026	6
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	7
G. CONCLUSIONES	8
H. RECOMENDACIONES	8
ANEXO 1	9



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) despliega esfuerzos significativos en respaldo a la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Honduras. Sus actividades abarcan diversas áreas estratégicas; en segundo lugar, se destaca su labor en la armonización de relaciones, actuando como facilitador en la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector privado. Esta sinergia es clave para impulsar iniciativas conjuntas que beneficien el desarrollo científico y tecnológico del país.

Además, el IHCIETI se involucra activamente en la mejora de políticas y programas relacionados con la ciencia y la tecnología, contribuyendo de manera directa al diseño e implementación de marcos normativos que estimulan la innovación y el progreso en estos campos. Asimismo, enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades humanas, promoviendo la formación y el fortalecimiento de competencias en el capital humano hondureño para enfrentar los retos y oportunidades del entorno tecnológico actual y futuro.

Al II trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de L73.4 millones, de los cuales L73.1 millones corresponden a inversión productiva y L 0.3 millones en formación bruta de capital, al II trimestre no se muestra ejecución del presupuesto asignado.

En el marco del PCM 04-2026, artículo 17, y en estricta aplicación de lo establecido en el artículo 98 reformado de la Ley General de la Administración Pública, se dispone la intervención de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tal sentido, la Comisión Interventora será integrada mediante Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República, en el cual se establecerán los plazos de vigencia de la intervención, así como los términos para la presentación de los informes correspondientes, ejerciendo para todos los efectos las atribuciones contenidas en el citado artículo 98. En consecuencia, durante el período informado no fue posible registrar avances físicos ni financieros en la ejecución del proyecto.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	73,406,231
Inversión Productiva	73,106,231
Formación Bruta de Capital	300,000
Presupuesto Vigente	73,406,231
Inversión Productiva	73,106,231
Formación Bruta de Capital	300,000
Ejecutado II Trimestre	0
Inversión Productiva	0
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	0.0%
Ejecutado Anual	0
Inversión Productiva	0
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	0.0%
Compromiso Aprobado	0
Inversión Productiva	0
Formación Bruta de Capital	0
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	0.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

De acuerdo con el financiamiento el presupuesto total de la institución; este es financiado el 100% con fondos del Tesoro Nacional, evidenciando que el 99% del presupuesto está destinado a la Inversión Productiva, lo que refleja una clara prioridad institucional y respecto a la Formación Bruta de Capital representa el 1% del presupuesto, sin embargo, no se ha ejecutado el presupuesto asignado.


C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

El comportamiento histórico de la ejecución al II trimestre (2022-2026) evidencia que, si bien la institución ha contado con asignaciones presupuestarias variables para inversión, la materialización del gasto durante el segundo trimestre ha sido limitada y, en algunos años, nula. Este patrón sugiere una estacionalidad marcada de la ejecución (concentración en trimestres posteriores) y/o restricciones operativas al inicio de cada ejercicio fiscal, lo que incide en el ritmo de avance físico-financiero y en la capacidad de alcanzar metas anuales con oportunidad.

De acuerdo con el gráfico, la brecha entre el presupuesto vigente y el monto ejecutado al II trimestre se mantiene amplia a lo largo del período, reflejando una baja absorción temprana de recursos. En términos de gestión, esta diferencia representa recursos programados que no se convierten en bienes, obras o servicios durante el segundo corte del año, incrementando la presión para ejecutar en los trimestres siguientes y elevando el riesgo de subejecución o de una ejecución acelerada que afecte la calidad y el control.

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2022 y 2026, basado en los montos vigentes y ejecutados:

Gráfico 2
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0515 - Instituto Hondureño

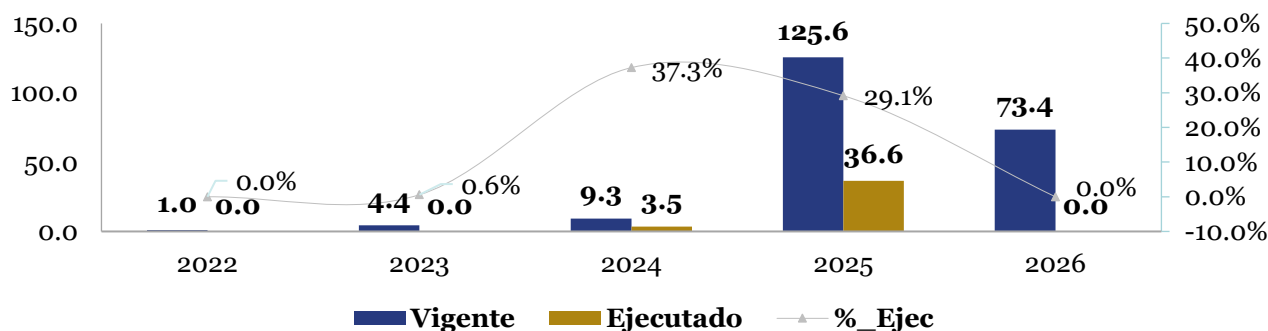

Fuente: SIAFI



D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente:

1. "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras”.

El proyecto de IHCIETI No tuvo actividades físicas ejecutadas durante este período:

Las metas programadas para 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Capacitación de 540 personas en Ciencia Innovación y Tecnología	Personas	378	0	0%			0%
Planta Purificadora de Agua (botellones de Agua)	Galones	3,740	0	0%			0%
Elaboración de suministros de Bioseguridad Alcohol, Cloro, jabón Asisitín	Galones	3,231	0	0%			0%
Elaborado y entregado 150 prótesis de miembro superior y 5 prótesis de miembro inferior	Prótesis	75	0	0%			0%
Georreferenciando y reforestando 100 hectáreas de bosque a través de los drones	Hectáreas	50	0	0%			0%
Adquiridos entregados y 600 equipos tecnológicos ensamblados	Equipo	104	0	0%			0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

La ausencia de avances físicos y financieros durante el II trimestre de 2026 obedece a limitaciones institucionales que impidieron la ejecución de actividades, contrataciones y procesos de adquisición.”



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.1. Evaluación Financiera al II trimestre 2026

Evaluación Financiera II trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras	FN-25706-1	\$ 230,163,200	L 198,343,787	20/09/2024 20/09/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II trimestre 2026	73,106,231.00	73,106,231.00	0.0	0%
Acumulado 2026	73,106,231.00	73,106,231.00	0.0	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	198,343,787	198,343,787	114,413,065	91.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D.1.2. Principales Adquisiciones al II trimestre 2026

Durante el II trimestre de 2026 no se registraron adquisiciones en el proyecto, ya que no se realizaron procesos de consultoría, compras menores, licitaciones privadas, licitaciones públicas ni concursos, para el siguiente trimestre se tiene planificado adjudicación de procesos los cuales de detallan a continuación (en etapa de publicación):

- Consultoría de capacitación en tecnología Blockchain
- Servicios de consultoría de monitoreo y evaluación en gestión de proyectos
- Adquisición de drones, equipo y accesorios para uso de IHCIETI
- Adquisición de licencias para uso de IHCIETI
- Adquisición de equipos y suministros para elaboración de prótesis de miembro superior e inferior
- Adquisición de equipo y suministro de fijadores externos
- Adquisición de plataforma para virtualización de cursos STEM en el IHCIETI
- Adquisición de repositorio para el observatorio nacional de ciencia, tecnología e innovación del IHCIETI
- Adquisición de equipo y suministro de realidad virtual, robótica, impresión 3d para el centro nacional de laboratorios y talleres de ciencia y tecnología de IHCIETI
- Consultoría: principio y fundamento de IA



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Consultoría Especializada en Ciencia de Datos
- Georreferencia mediante vehículos aéreos drones y capacitación con certificación y licenciamiento de personal técnico.
- Diseño de políticas de acceso a la información y evaluación de mejores prácticas para el departamento de INFOTEC
- Adquisición del equipamiento para laboratorios y talleres (realidad virtual, domótica, micro soldadura) ubicados en las instalaciones de SENACIT/IHCIETI
- Consultoría Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de Suelos en Áreas de Reforestación mediante Tecnologías de Drones y Georreferenciación.
- Capacitación en Realidad Virtual Aplicada al Desarrollo de Experiencias Interactivas e Inmersivas.
- Consultoría de proyecto audiovisuales orientados a Stem.1.

Fuente Unidad Ejecutora

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Gestiones de ampliación de plazo otorgada mediante oficio DGIP-PROG-120-2026 por un periodo de 3 meses hasta el 31 de diciembre 2026.

Durante el II trimestre de 2026, el proyecto no contó con personal plenamente habilitado para su ejecución operativa, en virtud de las limitaciones administrativas, presupuestarias e institucionales que incidieron en el desarrollo normal de las actividades programadas.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

Durante el II trimestre de 2026, la ejecución del proyecto se vio afectada por factores administrativos y financieros que limitaron el desarrollo de las actividades programadas en el POA. A continuación, se detallan las principales problemáticas identificadas y las acciones de mitigación y gestión realizadas durante el período.

Problemáticas identificadas

- Limitaciones institucionales para la coordinación y seguimiento, asociadas a cambios/ausencia temporal de autoridad superior y a la necesidad de fortalecer la gestión interna.



G. CONCLUSIONES

- Durante el II trimestre de 2026 no se registró ejecución física ni avance en procesos de compras, contrataciones o consultorías, principalmente por la falta de asignación y disponibilidad presupuestaria.
- Persisten limitaciones institucionales y logísticas (autoridad, coordinación y disponibilidad de espacio físico) que deben atenderse para asegurar la ejecución eficiente de los componentes del proyecto.
- A pesar de la no ejecución, se realizaron acciones técnicas y administrativas de preparación (revisión del POA y levantamiento de requerimientos) que facilitan la reactivación en los trimestres siguientes.

H. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la coordinación interna y los mecanismos de seguimiento (reuniones periódicas, matriz de control e indicadores), para reducir riesgos de retraso y mejorar la rendición de cuentas.
- Preparar con anticipación los términos de referencia, especificaciones técnicas y documentación de soporte, de manera que al contar con fondos y se inicien de inmediato los procesos de adquisición y contratación.
- Agilizar la ejecución y preparación del cierre del proyecto



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos	Total General	Total Fondos	Total Fondos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos	Total Fondos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos	Total Fondos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
81	1. Inversión Productiva		73,106,231	-	73,106,231	73,106,231	-	73,106,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		73,106,231		73,106,231	73,106,231		73,106,231	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRADOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE HONDURAS	FN-25706-1	73,106,231		73,106,231	73,106,231		73,106,231	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI		73,106,231		73,106,231	73,106,231		73,106,231	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		300,000		300,000	300,000		300,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		300,000		300,000	300,000		300,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		300,000		300,000	300,000		300,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total general		73,406,231	-	73,406,231	73,406,231	-	73,406,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0515- Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCITI)								
Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCITI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras	Capacitación de 540 personas en Ciencia Innovación y Tecnología	Personas	378	0	0%			0%
	Planta Purificadora de Agua (botellones de Agua)	Galones	3,740	0	0%			0%
	Elaboración de suministros de Bioseguridad Alcohol, Cloro, jabón Asisitín	Galones	3,231	0	0%			0%
				0	0%			
	Elaborado y entregado 150 prótesis de miembro superior y 5 prótesis de miembro inferior	Prótesis	75	0	0%			0%
	Georreferenciando y reforestando 100 hectáreas de bosque a través de los drones	Hectáreas	50	0	0%			0%
	Adquiridos entregados y 600 equipos tecnológicos ensamblados	Equipo	104	0	0%			0%

Nota: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de junio de 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS

