



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Informe No. 0028-002-2026

Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)	5
D. PRINCIPALES PROYECTOS	6
D.1 Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en Agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE":.....	6
D.1.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	6
D.1.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	8
D.1.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026	8
D.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	8
D.2.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026	9
D.2.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	10
D.2.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026	10
D.3 Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH):.....	11
D.3.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026	11
D.3.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	12
D.3.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026	12
E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	12
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	13
G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	13
H. CONCLUSIONES	14
I. RECOMENDACIONES	14
ANEXO 1	16
ANEXO 2.....	17



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), tiene como misión ser la institución responsable de la administración y manejo de los recursos forestales, las áreas protegidas y la vida silvestre, mediante la aplicación de instrumentos normativos y reguladores para su protección, restauración, aprovechamiento, fomento y conservación, en beneficio de la población hondureña.

El Plan de Gobierno “*Juntos vamos a estar bien* (2026-2030)”, en el marco de las Acciones Prioritarias para la Política Agroalimentaria enfocado en “*Fortalecer la Adaptación al Cambio Climático*” mediante la implementación de prácticas de agricultura sostenible y resiliente al clima (manejo de suelos, uso eficiente del agua); Desarrollo de sistemas de alerta temprana y respuesta rápida ante fenómenos climáticos extremos; y Promover la investigación y el desarrollo de cultivos adaptados a nuevas condiciones climáticas.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	201,580,620
Inversión Productiva	195,280,620
Formación Bruta de Capital	6,300,000
Presupuesto Vigente	201,580,620
Inversión Productiva	195,280,620
Formación Bruta de Capital	6,300,000
Ejecutado II Trimestre	5,925,155
Inversión Productiva	5,430,988
Formación Bruta de Capital	494,167
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	2.9%
Ejecutado Anual	46,528,002
Inversión Productiva	46,033,835
Formación Bruta de Capital	494,167
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	23.1%
Compromiso Aprobado	48,947,877
Inversión Productiva	46,033,835
Formación Bruta de Capital	2,914,043
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	24.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026

Respecto a la **Inversión Pública** para el año 2026, el ICF cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L201.6 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Proyectos de Inversión Pública (Inversión Productiva) y Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

Al término del segundo trimestre, el presupuesto vigente total se mantiene en L201.6 millones, de los cuales las asignaciones para la **Formación Bruta de Capital** (Bienes Capitalizables) se identifican en las actividades centrales relacionadas con aplicaciones informáticas y equipo de computación. Dicha inversión se registra en L6.3 millones y de lo cual se ejecutó el 7.8%;



SECRETARÍA DE FINANZAS




equivalente a L0.5 millones a nivel de devengado y 46.3% (L2.9 millones) registrados en compromisos al término del trimestre.

En consecuencia, la **Inversión Productiva** contó con una asignación vigente de L195.3 millones, para la ejecución de 3 proyectos de inversión pública, de los cuales se destaca la prioridad en el manejo de áreas protegidas, aseguramiento de la legalidad en sitios operativos de producción de madera y la reforestación y conservación de suelos en varias regiones del país. Al segundo trimestre del año 2026 se reportó una ejecución de L46.0 millones (23.6%) a nivel de devengado y comprometido, con relación al presupuesto vigente asignado.

En su conjunto la inversión pública para la SESAL registró una ejecución presupuestaria de L46.5 millones (23.1%) a nivel de devengado y 24.3% (L48.9 millones) a nivel de compromisos en relación con el Presupuesto Vigente asignado, principalmente con orientación al **Sector Recursos Forestal y Ambiente**. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El **75.7%** de la Inversión Pública del ICF, se financia con recursos provenientes de Fondos Nacionales (Tesoro Nacional) que corresponden a la contraparte nacional del aporte del Gobierno Alemán (KFW) y financiamiento para la Rehabilitación y reforestación tecnificada de fincas de café; el restante **24.3%** corresponde a **Donaciones Externas** del Gobierno Alemán (KFW) y la Unión Europea (CEE), mismos que se representan en el Gráfico No. 01.

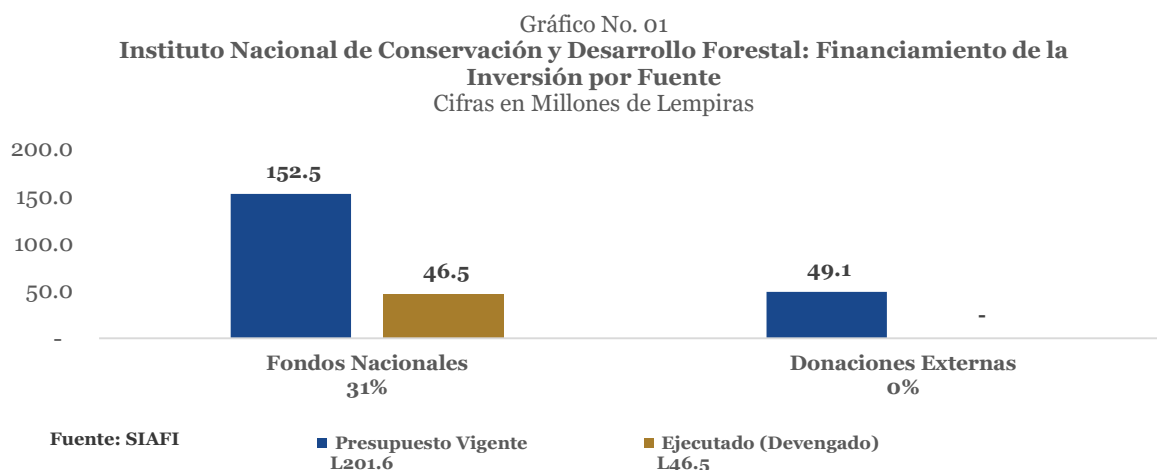



SECRETARÍA DE FINANZAS




C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

En el período comprendido del 2022 al 2026, la Inversión Pública del ICF ha considerado la ejecución de 4 Proyectos de Inversión y diferentes asignaciones en formación bruta de capital (gasto de capital); las cuales se han financiado en 47.1% con recursos nacionales y 52.9% con recursos de donaciones externas.

En dicho período, el ICF ha contado con asignaciones presupuestarias por un total de L816.4 millones; reflejando un promedio de ejecución en **27.8%** (L227.1 millones) al Segundo trimestre de cada año.

Gráfica No.02
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
Cifras en millones de Lempiras

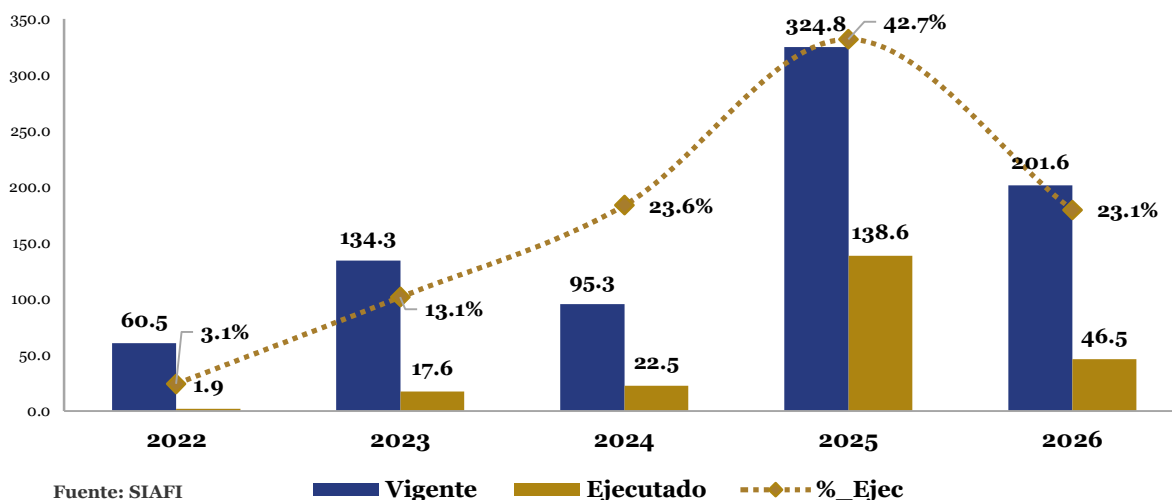

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa con corte al 30 de junio de los últimos cinco años; en donde el año 2025 destaca su mayor asignación y mejor ejecución considerando el cuarto año de un período de gobierno con orientación principalmente a la categorización de programas sociales (incluyendo la Formación Bruta de Capital) dentro de la Inversión Pública.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva para el año 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

1	Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en Agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751
2	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984
3	Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino	NDICI LA/2021/043-250

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

D.1 Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE":

El proyecto tiene como propósito reforestar y conservar los suelos en varias regiones cafetaleras en el país mediante la rehabilitación de fincas de café y la implementación de prácticas agrícolas regenerativas, el acceso a tecnologías avanzadas, la capacitación y asistencia técnica continua de los productores, la integración de sistemas agroforestales que mejoran la resiliencia climática, y promuevan la conservación ambiental.

D.1.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Sistemas Agroforestales en proceso de establecimiento en fincas de café, que permitan generar condiciones de adaptación al cambio climático e incidencia positiva en los modelos de producción	Hectáreas	5,000	3,650	73%	1,257	1,257	100%



SECRETARÍA DE FINANZAS



Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
cafetaleros comunitarios							
Eventos de capacitación desarrollados con los productores, en temas orientados a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, considerando el enfoque de cambio climático, género y la inclusión de los pueblos indígenas y afrohondureños	Eventos	42	21	50%	21	21	100%
Plantas producidas en vivero con uso de envases biodegradables y equipo automatizado	Plántula	15,000,000	12,551,936	84%	12,551,936	12,551,936	100%

Fuente: ICF al 30/06/2026

Nota: ICF indicó no contar con planificación de metas en el POA-Presupuesto al segundo trimestre para el Proyecto “Agrobosque”.

Para el segundo trimestre del 2026, se reporta el desarrollo de las siguientes actividades:

- Componente I – Identificación, diagnóstico y establecimiento:
 - ✓ Culminación del proceso de identificación de áreas a ser beneficiadas por el proyecto, de acuerdo con los criterios de elegibilidad previamente establecidos.
 - ✓ Se desarrolló en campo el levantamiento de polígonos, diagnósticos prediales y la georreferenciación de las áreas seleccionadas, identificando 3,650 hectáreas aptas para implementación a nivel nacional en el marco del subcomponente Equipo técnico de los Sistemas Agro Forestales (SAF).
- Componente II – Megaviveros y proyección de producción:
 - ✓ Las principales actividades se orientaron a la producción de 15 millones de plantas, entre plantas de café y especies forestales.
 - ✓ Al cierre del segundo trimestre, se contabilizan 12,551,936 plantas establecidas en camas de crecimiento (plantas de café y plantas forestales), etapa previa a su



SECRETARÍA DE FINANZAS



condición de plantas listas para entrega, incluyendo la ejecución permanente de actividades fitosanitarias para garantizar su calidad y desarrollo.

- ✓ Por lo tanto, para este trimestre aún no hay reportes de avances de plantas listas para la entrega.
- Componente III – Gestión del conocimiento:
 - Se realizaron 21 eventos de capacitación con los productores en temas orientados a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, considerando el enfoque de cambio climático, género e inclusión de los pueblos indígenas y afro hondureños.

D.1.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Proyecto Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE" registrada al segundo trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en Agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751 DI-25751	Lempiras	460,167,702	01/08/2024 01/08/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	141,476,477	141,476,477	4,778,365	3.4%
Acumulado 2026	141,476,477	141,476,477	44,732,004	31.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	460,167,702	460,167,702	355,335,046	77.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

D.1.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Al término del segundo trimestre no se reportan adquisiciones para el Proyecto.

D.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)

Mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegida de ecosistemas marino-costeros, mediante el diagnóstico de capacidades y planificación de Áreas Protegidas; establecer medidas de conservación y manejo de los recursos naturales en las Áreas Protegidas, y mediante el fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.2.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
		Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
Protocolos ambientales y sociales socializados y aplicados en campo	Protocolo	4	2	50%	0	0	0%
Talleres técnicos (género, conservación y ordenamiento participativo)	Taller	10	5	50%	0	0	0%
Mecanismo de sugerencias y reclamos implementado	Mecanismo	1	0.5	50%	0	0	0%
Planes de acción para fortalecimiento de áreas protegidas – Grupo B	Plan	10	9	90%	5	5	100%

Fuente: ICF al 30/06/2026

Al segundo trimestre, se reporta avances para la implementación del Proyecto LifeWeb:

- Aprobación de cinco (5) Planes de Acción de Medidas Ambientales y Sociales (PAAS) correspondientes a las áreas protegidas del “Grupo B”: Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto (ASIDE), Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos (LARECOTURH), Parque Nacional Nombre de Dios (LARECOTURH), Parque Nacional Punta Izopo (MOCAPH) y Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández (MOCAPH).
- Formalización de contratos de administración para las organizaciones implementadoras, fortaleciendo el marco institucional para la ejecución de las acciones previstas en las áreas protegidas priorizadas: AMATELA (Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela), UNACIFOR (Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla), MOCAPH (Refugio de Vida Silvestre Texiguat), LARECOTURH (Parque Nacional Nombre de Dios y Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos) y ASIDE (Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto).
- Las áreas protegidas del “Grupo A” continuaron implementando acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de los recursos naturales, la conservación de ecosistemas y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el marco del Proyecto LifeWeb.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- En materia de conservación y restauración se realizaron avances en la gestión para la declaratoria y protección de microcuencas, implementación de planes de acción para su manejo y fortalecimiento institucional de las juntas administradoras de agua.
- Se fortalecieron las acciones de control, vigilancia y protección de las áreas protegidas mediante patrullajes terrestres y marino-costeros, coordinación interinstitucional para la prevención y atención de delitos ambientales, actualización e implementación de planes de protección forestal, organización y capacitación de cuadrillas comunitarias para la prevención y combate de incendios forestales, así como el uso de herramientas de monitoreo para la detección temprana de amenazas ambientales.
- Así mismo, se impulsaron mecanismos de participación ciudadana, comunicación comunitaria y alternativas productivas sostenibles que contribuyen a reducir la presión sobre los recursos naturales y fortalecer la participación de las comunidades en la gestión de las áreas protegidas.

D.2.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) registrada al segundo trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	Euro	11,000,000	15/01/2021 14/01/2027
		US\$	12,514,150	
		Lempiras	334,356,814	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	49,109,852	49,109,852	652,623	1.3%
Acumulado 2026	49,109,852	49,109,852	1,301,831	2.7%
Acumulado Vida del Proyecto *	334,356,814	334,356,814	179,266,679	53.6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

D.2.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Al término del segundo trimestre no se reportan adquisiciones para el Proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.3 Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH):

Mejorar la Gobernanza Forestal mediante la implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) aplicación las leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT), por sus siglas en ingles; contribuyendo a la estabilidad económica de las comunidades rurales provocando el declive de la migración climática y medioambiental a largo plazo.

D.3.1 Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
		Progra- mación	Ejecución	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecución
Guías metodológicas, censos y tablas técnicas elaboradas y validadas	Documento	1	1	100 %	0	0	0%
Informes técnicos de avance elaborados	Informe	2	2	100 %	1	1	100%
Comités interinstitucionales AVA-FLEGT conformados y operando	Comité	1	1	100 %	0	0	0%
Sistema informático de trazabilidad desarrollado	Sistema	1	0.5	50 %	0	0	0%
Implementación piloto del sistema en campo	Piloto	1	0	0 %	0	0	0%

Fuente: ICF al 30/06/2026

Al segundo trimestre, se reportan avances para la implementación del Proyecto SALH:

- Se realizaron actividades enfocadas en verificar la legalidad de los actores forestales, incluyendo inspecciones a Planes de manejo, operativos anuales e industrias primarias y secundarias, así como la implementación de una estrategia contra la tala ilegal mediante operativos de control y atención a denuncias.
- Se realizaron 7 inspecciones para aprovechamiento del Plan de Manejo y Protección Forestal (PMPF) y Plan Operativo Anual (POA), auditorías técnicas y administrativas, y reuniones preoperacionales, entre otras acciones, mientras que actividades como el monitoreo en puestos de control y evaluaciones de regeneración natural alcanzaron 6 ejecuciones en el trimestre.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- El puesto de control del desvío de Los Jobos operó exclusivamente en abril, registrando 333 mediciones que totalizaron 343,379.00 m³ de madera, 411,737.00 toneladas de biomasa, 193 cargas y 183,000.00 libras de astilla, evidenciando un despliegue integral de monitoreo y control forestal en la provincia.

D.3.2 Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH) registrada al segundo trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH)	NDICI LA/2021/043-250	Euro	1,425,789	28/06/2023 28/01/2028
		US\$	1,622,049	
		Lempiras	43,338,388	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	27,701,845	27,701,845	-	0.0%
Acumulado 2026	27,701,845	27,701,845	-	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	43,338,388	43,338,388	25,931,572	59.8%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

D.3.3 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

Al término del segundo trimestre no se reportan adquisiciones para el Proyecto.

E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

Al segundo trimestre, el ICF cuenta con L6.3 millones asignados en Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables); de los cuales al término del trimestre registró ejecución de L0.5 millones (7.8%) a nivel de devengado y 46.3% es decir L2.9 millones en comprometido con relación al presupuesto vigente asignado.

Bajo este esquema, se identifican las actividades centrales relacionadas con aplicaciones informáticas y equipo de computación.



SECRETARÍA DE FINANZAS



F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de ICF a fin de apoyar en la gestión de ejecución de los proyectos.
- Actualización mensual de la Proyección de Ejecución 2026 del Programa de Inversión Pública.

G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

Proyecto	Problema	Acción
AGROBOSQUE	Inaccesibilidad a líneas presupuestarias: La SEFIN no ha proporcionado los recursos para implementar las acciones y actividades predefinidas en la planificación operativa anual. Por lo anterior, se depende de la voluntad financiera del socio implementador (BECAMO – UNECAFEH), quienes han estado financiando actividades prioritarias.	Realizar las acciones perentorias ante SEFIN para lograr la accesibilidad a los recursos financieros presupuestados e iniciar eficientemente la ejecución de acciones prioritarias.
	Atrasos en la presentación de resultados de identificación de finca debido a la falta de logística y atrasos por falta de comunicación por parte de los socios UNECAFEH e IHCAFE en la agilización de reuniones entre los equipos técnicos y la identificación de fincas en conjunto.	Realización de diversas reuniones con los líderes de los socios, UNECAFE e IHCAFE para agilizar la movilización de su equipo técnico, así como presentación de las instrucciones claras para la selección de los beneficiarios.
	Las plantas están listas en los megaviveros, por lo tanto, es necesario, establecer una estrategia para el establecimiento de los SAF, con planes estratégicos de distribución de plantas, centros de acopio accesibles, productores listos para la recepción de las plantas, y con sitios preparados para la restauración activa.	Elaborar e implementar una estrategia de establecimiento de los SAF, con un plan de distribución de plantas e implementación de acciones de restauración activa involucrando a todos los actores y beneficiarios.
	Disponibilidad limitada de material vegetativo para la producción de plantas, esto condiciona el inicio de las intervenciones en las áreas priorizadas al no haber disponibilidad de plantas	Agilizar procesos de adquisición de semillas forestales priorizadas para asegurar disponibilidad de plantas a través de compras o recolección de semillas en campo.
LIFEWEB	Falta de contratación de personal clave como ser el contador del proyecto	Agilizar la contratación de un contador para el proyecto que facilite la consolidación de toda la ejecución financiera de las áreas B y demás procesos relacionados.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Proyecto	Problema	Acción
SALH	Debido a la ausencia de Coordinador del Proyecto, no había registro de firmas para hacer pagos y realizar acciones administrativas.	Ya ha sido nombrado el nuevo coordinador de anticipos del proyecto, para dar continuidad a las acciones y gestiones requeridas.

Fuente: ICF, 30/06/2026

H. CONCLUSIONES

- Al término del segundo trimestre del 2026, la ejecución reportada por ICF a nivel de devengado se registra en 23.1% (L46.5 millones); de los cuales la Inversión Productiva reporta L46.0 millones (22.8%) y el 0.2% (Lo.5 millón) para la Formación Bruta de Capital; ambas en relación con el Presupuesto Vigente asignado; ello denota la tendencia en ejecución menor al segundo trimestre del año anterior considerando las asignaciones en su conjunto para la Inversión Pública del ICF.
- Con respecto a los procesos relacionados con contrataciones y adquisiciones, al término del segundo trimestre no se reportan acciones para ninguno de los proyectos en ejecución, lo que podría repercutir en el mediano plazo en desfases de cumplimiento del alcance y mayores plazos de ejecución.
- A pesar de reportar actividades relacionadas al cumplimiento de los planes de manejo y operatividad institucional; El Proyecto SALH no registró ejecución presupuestaria (o regularización del gasto) en el período de evaluación.

I. RECOMENDACIONES

En base en los resultados del seguimiento al segundo trimestre del 2026, se mantienen las recomendaciones orientadas a fortalecer la ejecución de los proyectos de inversión pública durante el resto del ejercicio fiscal:

- Fortalecer la planificación operativa y la programación trimestral, asegurando que las metas físicas 2026 incorporen actividades ejecutables desde etapas tempranas del ejercicio, alineadas con los criterios de registro y validación establecidos en la Nota de Prioridad de cada proyecto.
- Acelerar la regularización y fortalecimiento de las estructuras de gestión de proyectos, priorizando la dotación, contratación y nombramiento del personal clave en las unidades responsables, con el fin de restablecer la capacidad operativa y el acompañamiento técnico y administrativo necesario para la ejecución física efectiva.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento, monitoreo y reporte, asegurando la disponibilidad oportuna de insumos técnicos, medios de verificación y registros administrativos que respalden el avance físico y financiero de los proyectos.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Iniciar oportunamente los procesos administrativos y de contratación, conforme a la programación del ejercicio fiscal, a fin de evitar concentraciones de ejecución en períodos finales y garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras previstas para 2026.

La implementación de estas recomendaciones permitirá mejorar el desempeño global de los proyectos, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar una ejecución coherente con la programación planificada, los lineamientos de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) y los criterios de validación del SNIPH.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
3	1. Inversión Productiva		146,211,267	49,069,353	195,280,620	146,211,267	49,069,353	195,280,620	5,430,988	-	5,430,988	2.8%	46,033,835	-	46,033,835	23.6%	46,033,835	-	46,033,835	23.6%
3	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		146,211,267	49,069,353	195,280,620	146,211,267	49,069,353	195,280,620	5,430,988	-	5,430,988	2.8%	46,033,835	-	46,033,835	23.6%	46,033,835	-	46,033,835	23.6%
1	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICI LA/2021/043-250		4,694,291	4,694,291		4,694,291	4,694,291		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	Total DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGA			4,694,291	4,694,291		4,694,291	4,694,291		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
2	FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	4,734,790	44,375,062	49,109,852	4,734,790	44,375,062	49,109,852	652,623	-	652,623	1.3%	1,301,831	-	1,301,831	2.7%	1,301,831	-	1,301,831	2.7%
	Total FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGID		4,734,790	44,375,062	49,109,852	4,734,790	44,375,062	49,109,852	652,623	-	652,623	1.3%	1,301,831	-	1,301,831	2.7%	1,301,831	-	1,301,831	2.7%
3	Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751	141,476,477		141,476,477	141,476,477		141,476,477	4,778,365		4,778,365	3.4%	44,732,004		44,732,004	31.6%	44,732,004		44,732,004	31.6%
	Total Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrob		141,476,477		141,476,477	141,476,477		141,476,477	4,778,365		4,778,365	3.4%	44,732,004		44,732,004	31.6%	44,732,004		44,732,004	31.6%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		6,300,000		6,300,000	6,300,000		6,300,000	494,167		494,167	7.8%	494,167		494,167	7.8%	2,914,043		2,914,043	46.3%
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		6,300,000		6,300,000	6,300,000		6,300,000	494,167		494,167	7.8%	494,167		494,167	7.8%	2,914,043		2,914,043	46.3%
	ACTIVIDADES CENTRALES		6,300,000		6,300,000	6,300,000		6,300,000	494,167		494,167	7.8%	494,167		494,167	7.8%	2,914,043		2,914,043	46.3%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		6,300,000		6,300,000	6,300,000		6,300,000	494,167		494,167	7.8%	494,167		494,167	7.8%	2,914,043		2,914,043	46.3%
	Total general		152,511,267	49,069,353	201,580,620	152,511,267	49,069,353	201,580,620	5,925,155	-	5,925,155	2.9%	46,528,002	-	46,528,002	23.1%	48,947,877	-	48,947,877	24.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA
DE FINANZAS



ANEXO 2

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecu- ción	Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecu- ción
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en Agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	Sistemas Agroforestales en proceso de establecimiento en fincas de café, que permitan generar condiciones de adaptación al cambio climático e incidencia positiva en los modelos de producción cafetaleros comunitarios	Hectáreas	5,000	3,650	73%	1,257	1,257	100%
	Eventos de capacitación desarrollados con los productores, en temas orientados a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, considerando el enfoque de cambio climático, género y la inclusión de los pueblos indígenas y afrohondureños	Eventos	42	21	50%	21	21	100%
	Plantas producidas en vivero con uso de envases biodegradables y equipo automatizado	Plántula	15,000,000	12,551,936	84%	12,551,936	12,551,936	100%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	Protocolos ambientales y sociales socializados y aplicados en campo	Protocolo	4	2	50%	0	0	0%



PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecu- ción	Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecu- ción
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
	Talleres técnicos (género, conservación y ordenamiento participativo)	Taller	10	5	50%	0	0	0%
	Mecanismo de sugerencias y reclamos implementado	Mecanism o	1	1	50%	0	0	0%
	Planes de acción para fortalecimiento de áreas protegidas – Grupo B	Plan	10	9	90%	5	5	100%
Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH)	Guías metodológicas, censos y tablas técnicas elaboradas y validadas	Document o	1	1	100 %	0	0	0%
	Informes técnicos de avance elaborados	Informe	2	2	100 %	1	1	100%
	Comités interinstitucionales AVA-FLEGT conformados y operando	Comité	1	1	100 %	0	0	0%
	Sistema informático de trazabilidad desarrollado	Sistema	1	1	50 %	0	0	0%
	Implementación piloto del sistema en campo	Piloto	1	0	0 %	0	0	0%

Nota: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de junio de 2026
