



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Registro Nacional de las Personas (RNP)

Informe No. 0180-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)	4
D. PRINCIPALES PROYECTOS	5
D.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre del 2026	6
D.1.1. Principales Adquisiciones al II Trimestre del 2026.....	8
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	8
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026	9
G. CONCLUSIONES	9
H. RECOMENDACIONES.....	10
ANEXO 1.....	12
ANEXO 2	13



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) es la institución responsable de registrar los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Asimismo, tiene a su cargo la identificación de la población hondureña y la emisión del Documento Nacional de Identificación (DNI) para todos los ciudadanos del país.

Al cierre del segundo trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto aprobado de L282.0 millones y un presupuesto vigente de L282.0 millones para la ejecución de proyectos de inversión pública, distribuidos en inversión productiva y formación bruta de capital. Del presupuesto vigente, se ejecutaron L15.23 millones, equivalentes a una ejecución de 5.4%.

Del monto ejecutado, L2.0 millones corresponden a inversión productiva y L13.2 millones a formación bruta de capital, evidenciando una mayor

concentración del gasto en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional. En cuanto al compromiso presupuestario, este alcanzó igualmente L25.79 millones (Se incluye Inversión Productiva y Formación Bruta de Capital), representando el 9.1% del presupuesto vigente, conforme a la información presentada en el Cuadro No. 01.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	282,039,186
Inversión Productiva	185,860,518
Formación Bruta de Capital	96,178,668
Presupuesto Vigente	282,039,186
Inversión Productiva	185,860,518
Formación Bruta de Capital	96,178,668
Ejecutado II Trimestre	15,239,097
Inversión Productiva	2,026,125
Formación Bruta de Capital	13,212,972
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	5.4%
Ejecutado Anual	25,091,797
Inversión Productiva	4,068,770
Formación Bruta de Capital	21,023,027
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	8.9%
Compromiso Aprobado	25,796,369
Inversión Productiva	4,752,544
Formación Bruta de Capital	21,043,825
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	9.1%

Nota: SIAFI, 30/06/2026




SECRETARÍA DE FINANZAS



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El RNP financia sus programas y proyectos a través de dos fuentes de financiamiento (Tesoro Nacional y Crédito Externo). Del presupuesto vigente al segundo trimestre del 2026, la principal fuente de financiamiento es del Crédito Externo con L185.9 millones, seguido del Tesoro Nacional con L96.17 millones, evidenciando una estructura de financiamiento orientada tanto al fortalecimiento institucional como a la ejecución de proyectos estratégicos de inversión pública, como se muestra en el cuadro No.1.

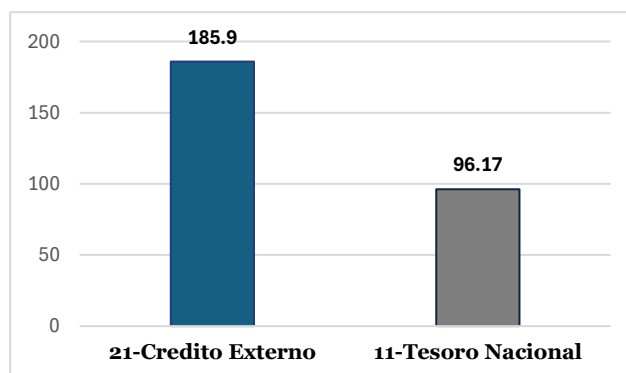

Fuente: SIAFI

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado de las inversiones del Registro Nacional de las Personas (RNP) al cierre del primer trimestre entre los años 2022 a 2026:

- En 2022, el presupuesto vigente ascendió a L87.0 millones, de los cuales se ejecutaron L2.9 millones, alcanzando una ejecución de 3.4%. Este comportamiento refleja un bajo nivel de ejecución asociado principalmente a actividades de cierre y compromisos administrativos vinculados a proyectos anteriores.
- Para el 2023, el presupuesto vigente se incrementa significativamente a L500.0 millones; sin embargo, únicamente se ejecutaron L24.1 millones, equivalentes a 4.8%, evidenciando retrasos en la implementación operativa y financiera de los proyectos programados.
- En el 2024, el presupuesto vigente ascendió a L100.0 millones, registrándose una ejecución de L31.3 millones, equivalentes al 31.3%. Estos recursos continúan relacionados con actividades complementarias y procesos derivados del Proyecto “Identificate”, mostrando una mejora relativa en la capacidad de ejecución institucional respecto a los años previos.
- Al segundo trimestre del 2025, el presupuesto vigente ascendió a L473.9 millones y la ejecución alcanzó L49.1 millones, equivalentes a 10.4%, reflejando un bajo nivel de avance financiero en relación con los recursos programados, condicionado por procesos administrativos, contractuales y cronogramas de ejecución física vinculados a las intervenciones institucionales en materia de identificación ciudadana.
- Al segundo trimestre de 2026, el presupuesto vigente se ubica en L 282 millones, con una ejecución de L25.1 millones, equivalente a 8.9%. Aunque el nivel de ejecución continúa




SECRETARÍA DE FINANZAS



siendo moderado, se observa un comportamiento igual registrado en 2025, evidenciando avances iniciales en la implementación de las actividades y proyectos institucionales.

Gráfico No. 02

**Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0180 - Registro Nacional de las Personas
Cifras en millones de Lempiras**

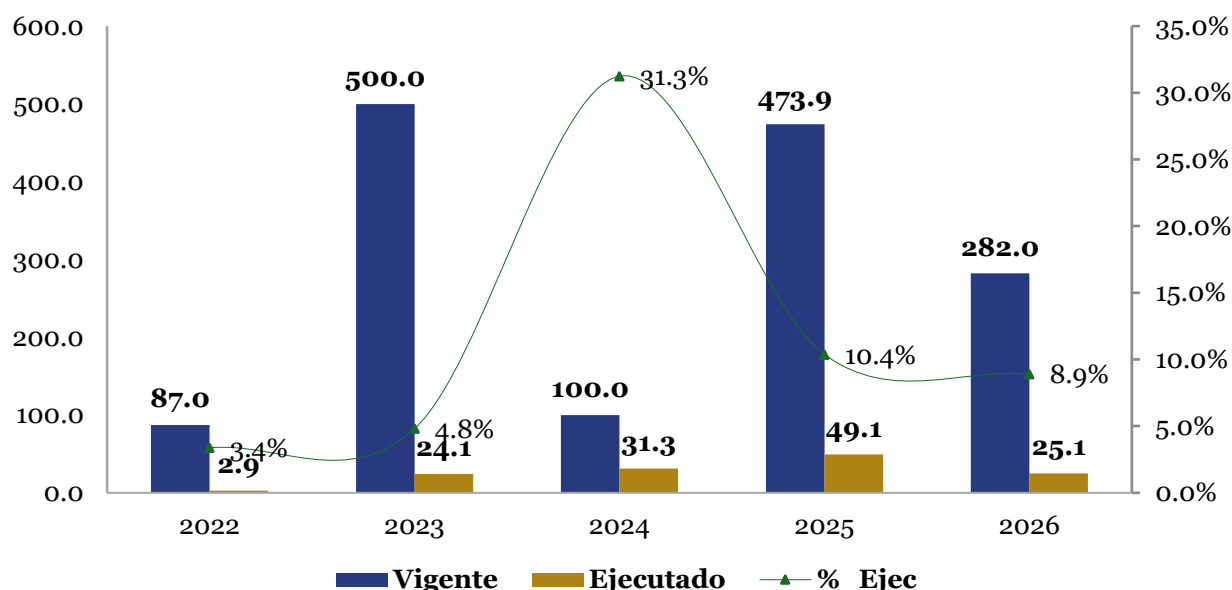

Fuente: SIAFI

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva al segundo trimestre del 2026 se concentra en el proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e identificación en Honduras.

El objetivo fundamental del proyecto es garantizar que toda persona cuente oportunamente con su registro de nacimiento desde la primera infancia y en el caso de la población mayor de edad, con su documento nacional de identificación, priorizando especialmente a la población entre 18 y 17 años. Lo anterior busca asegurar el acceso efectivo a derechos fundamentales como educación, salud, protección social y demás servicios públicos y privados, contribuyendo a reducir los niveles de exclusión social, fortalecer la inclusión ciudadana y promover mayores condiciones de equidad y desarrollo humano en el país.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre del 2026

Al cierre del segundo trimestre del 2026, el proyecto registra avances financieros de L25.1 millones, lo que refleja el inicio de la ejecución de actividades programadas para el presente ejercicio fiscal. En cuanto a los avances físicos, estos corresponden principalmente a la planificación operativa, coordinación interinstitucional y desarrollo de acciones preparatorias orientadas a la implementación de las actividades contempladas en el proyecto, sentando las bases para su ejecución en los siguientes trimestres del año.

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Program.	Ejecución	% Ejec	Program.	Ejecución	% Ejec
0180 - Registro Nacional de las Personas								
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados.	Persona	1,500,000.00	-	0%	1,500,000.00	-	0%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	Centro Municipal	205	-	0%	205	-	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	Persona	1,500.00	-	0%	650	-	0%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	Estrategia	1.00	-	0%	1.00	-	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

Resumen de principales actividades realizadas en el trimestre

Componente 1: Mejora de la cobertura del registro civil e identificación de menores.

Durante el trimestre, se registraron avances significativos en la ejecución del Componente, orientados a fortalecer el registro civil y ampliar la cobertura de identificación de niñas, niños y adolescentes (NNA). En el marco de la modernización del registro de nacimientos, se inició la contratación de la consultoría que diseñará el sistema automatizado de registro y la arquitectura de interoperabilidad entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), sentando las bases técnicas para su futura implementación. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de herramientas tecnológicas para identificar y reducir el subregistro, en la integración de información al Sistema de Identificación Nacional (SIN), en la elaboración de manuales y módulos de capacitación para el personal, y en la implementación de acciones de comunicación para promover el registro oportuno de nacimientos y la identificación de menores.



SECRETARÍA DE FINANZAS



En cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema de identificación, se fortalecieron las capacidades operativas mediante la contratación y capacitación del personal de campo, la adquisición de bienes y servicios logísticos, y la coordinación con la Secretaría de Educación para facilitar las jornadas de identificación en centros educativos. Asimismo, inició el proceso de identificación de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años en Tegucigalpa y San Pedro Sula como fase inicial, mientras se desarrollaron aplicaciones tecnológicas para la validación de información, mecanismos de atención al ciudadano y estrategias de comunicación que respaldarán el despliegue nacional previsto para el segundo semestre del 2026. Estos avances consolidan las condiciones técnicas, operativas e institucionales necesarias para garantizar una implementación eficiente y sostenible del proyecto.

Componente 2: Modernización de los servicios de registro civil e identificación digital. Durante el trimestre, se registraron avances importantes en la ejecución del Componente, enfocados en la modernización tecnológica del Registro Nacional de las Personas (RNP) y en el fortalecimiento de los servicios de registro civil e identificación digital. Se continuó con el diagnóstico institucional para identificar brechas tecnológicas y se inició la elaboración de los términos de referencia para la contratación de especialistas que fortalecerán la administración del SIN sobre Oracle Cloud Infrastructure, con el objetivo de mejorar la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información y la continuidad operativa.

Asimismo, se avanzó en el análisis y diseño de nuevos servicios de identidad digital, incluyendo los mecanismos de verificación y autenticación de identidad, el modelo de certificación para la emisión de firma biométrica y los preparativos para la implementación de la billetera e identificación digitales, prevista para el segundo semestre del 2026.

En el ámbito de la modernización de los servicios al ciudadano, se elaboraron propuestas para fortalecer la interoperabilidad del SIN con instituciones públicas y privadas, el diseño de una estrategia Canales integrados de atención y un mecanismo integral para la gestión de quejas y reclamos. Adicionalmente, se inició el proceso de adquisición de kioscos de autoservicio y la planificación de su instalación en puntos estratégicos del país, mientras que se avanzó en la distribución de equipos tecnológicos destinados a modernizar los Centros de Registro Municipales y Regionales, fortaleciendo la capacidad institucional y mejorando el acceso de la población a los servicios registrales.

Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del RNP. Durante el trimestre, se registraron avances en la ejecución del Componente 3, orientados al fortalecimiento del marco institucional, la transformación organizacional, la ciberseguridad y el desarrollo de capacidades del Registro Nacional de las Personas (RNP). Se realizó el diagnóstico institucional y la identificación de brechas como base para la elaboración del marco legal, el modelo de gobernanza y las reformas necesarias para fortalecer la gestión institucional. Asimismo, se avanzó en la preparación de la Estrategia de Gestión del Cambio, cuya contratación está prevista para el segundo semestre del 2026, y se puso en funcionamiento el Mecanismo de Atención al Ciudadano (MAC), habilitando canales para la recepción y seguimiento de consultas, quejas y reclamos relacionados con la implementación del proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



En materia de ciberseguridad y protección de datos, se inició el diagnóstico institucional que servirá de base para el diseño de la Estrategia de Ciberseguridad y los protocolos para la gestión de datos personales. Paralelamente, comenzó el proceso de adquisición de infraestructura tecnológica para fortalecer el Centro de Datos del RNP, incorporando soluciones de almacenamiento, respaldo, licenciamiento, administración tecnológica y herramientas especializadas de ciberseguridad. Además, se realizaron las gestiones para la contratación de especialistas que impulsarán el diseño del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), fortaleciendo la resiliencia digital y la continuidad operativa de la institución.

Finalmente, en el ámbito del fortalecimiento institucional, se avanzó en la actualización de la plataforma virtual de capacitación y en la elaboración de las especificaciones técnicas para la instalación de dos laboratorios de formación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal y garantizar la sostenibilidad de los procesos de modernización del RNP.

Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras al segundo trimestre del 2026:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	AF-7471-HN	US\$	\$40,000,000	23/02/2024-26/08/2027
		Lempiras	L1,068,732,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	185,860,518	185,860,518	25,091,797	1.1%
Acumulado Vida del Proyecto*	1,068,732,000	1,068,732,000	845,909,293.03	79.15%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183por US\$1.00

D.1.1. Principales Adquisiciones al II Trimestre del 2026

No se registraron adquisiciones durante el II Trimestre del 2026 en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el II Trimestre del 2026, la gestión de la inversión del Registro Nacional de las Personas (RNP) se orientó a consolidar las condiciones técnicas, operativas, administrativas y fiduciarias necesarias para acelerar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras (Convenio de Préstamo IDA 7471-HN).



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Se desarrollaron reuniones técnicas y mesas de trabajo con la Secretaría de Salud (SESAL), orientadas a reactivar y fortalecer los acuerdos necesarios para la automatización del registro de nacidos vivos y el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad entre ambas instituciones.
- Se realizaron reuniones técnicas y de seguimiento con representantes del Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), orientadas a revisar el avance del Proyecto, dar seguimiento a la ejecución financiera y operativa, validar prioridades de implementación y coordinar acciones relacionadas con adquisiciones, planificación y cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de Préstamo IDA 7471-HN.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

Durante el II Trimestre del 2026 se identificaron situaciones que han incidido en el ritmo de ejecución del proyecto, principalmente asociadas a condiciones externas, dependencias técnicas y requerimientos de coordinación interinstitucional. En respuesta, la Unidad Implementadora de Proyectos del RNP impulsó acciones correctivas y de mitigación orientadas a asegurar la continuidad y aceleración de la inversión en los siguientes períodos.

- Acelerar la implementación operativa del proyecto, priorizando el despliegue nacional de las brigadas de enrolamiento y la emisión del documento de identificación para niñas, niños y adolescentes (NNA), aprovechando las capacidades logísticas, tecnológicas y operativas ya desarrolladas.
- Concluir los diagnósticos institucionales para habilitar el inicio de la ejecución de los productos estratégicos relacionados con transformación digital, interoperabilidad, estrategia Canales integrados, ciberseguridad y gobernanza institucional.
- Fortalecer la capacidad técnica del proyecto mediante la contratación de consultores individuales y/o firmas especializadas que apoyen la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y demás insumos requeridos para los procesos de adquisición.
- Validar y estandarizar la documentación técnica, coordinando con las unidades especializadas del RNP la revisión de especificaciones, términos de referencia y criterios técnicos para asegurar uniformidad y reducir tiempos de preparación.
- Priorizar la implementación de los procesos estratégicos del RNP, enfocando los esfuerzos en la automatización de los servicios del SIN, la implementación de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), el registro de nacimientos con interoperabilidad, los servicios de identidad digital y billetera electrónica, y la actualización del marco legal y normativo.

G. CONCLUSIONES

- Al cierre del II trimestre del 2026, el RNP presenta una ejecución de 8.9% del presupuesto vigente, lo que evidencia un inicio lento en la ejecución de la inversión pública, asociado principalmente a actividades preparatorias, procesos de planificación y ajustes técnicos.
- En términos generales, el proyecto presenta avances significativos en la preparación técnica, tecnológica, operativa e institucional para modernizar el registro de nacimientos



SECRETARÍA DE FINANZAS



y ampliar la identificación de niñas, niños y adolescentes. Durante el período se consolidaron las bases para la implementación nacional mediante el desarrollo de sistemas informáticos, la contratación de personal y servicios, la coordinación interinstitucional, la capacitación del recurso humano y la ejecución de estrategias de comunicación, previendo el inicio de las principales actividades de campo durante el segundo semestre de 2026.

- El proyecto presenta avances relevantes en la fase preparatoria, evidenciados en el desarrollo de diagnósticos institucionales, elaboración de términos de referencia, fortalecimiento de capacidades institucionales, contratación de bienes y servicios, y diseño de soluciones tecnológicas que servirán de base para la modernización del Registro Nacional de las Personas (RNP).
- Se registran avances concretos en la implementación operativa, destacando el inicio del proceso de identificación de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el fortalecimiento de la estrategia de comunicación, la puesta en marcha del Mecanismo de Atención al Ciudadano (MAC) y el avance en la modernización de la infraestructura tecnológica y de los centros de atención.
- Los componentes relacionados con transformación e identificación digitales continúan principalmente en etapas de planificación y estructuración, debido a que dependen de la finalización de diagnósticos, consultorías especializadas y procesos de contratación que definirán los modelos tecnológicos, operativos y normativos para su implementación.
- El fortalecimiento institucional constituye un eje transversal del proyecto, mediante el desarrollo de estrategias de gobernanza, gestión del cambio, ciberseguridad, interoperabilidad, capacitación del personal y modernización tecnológica, elementos que contribuirán a garantizar la sostenibilidad de las inversiones y la continuidad de los servicios.

H. RECOMENDACIONES

- Es necesario pasar de la fase preparatoria a la ejecución en campo, priorizando el inicio de actividades de enrolamiento, equipamiento y despliegue territorial para mejorar el nivel de ejecución física y financiera.
- Se recomienda consolidar acuerdos vinculantes y mecanismos de seguimiento operativo que reduzcan la dependencia de cambios administrativos y aseguren la continuidad del sistema de registro de nacidos vivos y la interoperabilidad.
- Priorizar el despliegue nacional de las actividades operativas, especialmente las brigadas de enrolamiento y el proceso de identificación de niñas, niños y adolescentes, aprovechando las capacidades logísticas, tecnológicas e institucionales ya desarrolladas durante el período.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades involucradas para facilitar la interoperabilidad de los sistemas, la implementación de los nuevos servicios digitales y la ejecución eficiente de las actividades previstas.
- Continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad institucional, asegurando la implementación de soluciones que garanticen la continuidad operativa, la



SECRETARÍA DE FINANZAS



protección de la información y la prestación segura de los servicios digitales que desarrollará el RNP.



SECRETARÍA
DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)		
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General
81	1. Inversión Productiva		-	185,860,518	185,860,518	-	185,860,518	185,860,518	-	2,026,125	2,026,125	1.1%	-	4,068,770	4,068,770
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			185,860,518	185,860,518		185,860,518	185,860,518		2,026,125	2,026,125	1.1%		4,068,770	4,068,770
1	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras	AF-7471-HN		185,860,518	185,860,518		185,860,518	185,860,518		2,026,125	2,026,125	1.1%		4,068,770	4,068,770
	Total Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en			185,860,518	185,860,518		185,860,518	185,860,518		2,026,125	2,026,125	1.1%		4,068,770	4,068,770
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		96,178,668	-	96,178,668	96,178,668	-	96,178,668	13,212,972	59,915	13,212,972	13.7%	21,023,027	-	21,023,027
	0180 - Registro Nacional de las Personas		96,178,668		96,178,668	96,178,668		96,178,668	13,212,972		13,212,972	13.7%	21,023,027		21,023,027
	ACTIVIDADES CENTRALES		96,178,668		96,178,668	96,178,668		96,178,668	13,212,972		13,212,972	13.7%	21,023,027		21,023,027
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		96,178,668		96,178,668	96,178,668		96,178,668	13,212,972		13,212,972	13.7%	21,023,027		21,023,027
	Total general		96,178,668	185,860,518	282,039,186	96,178,668	185,860,518	282,039,186	13,212,972	2,086,040	15,239,097	5%	21,023,027	4,068,770	25,091,797

Nota: SIAFI, 30/06/2026



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2026

Nombre del Proyecto	Global			Meta Acumulada a		Programación 2026					% Ejec.	Ejecución 2026					% Ejec.
	Meta (ENTREGABLES)	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre						Trimestre					
						I	II	III	IV	Total		I	II	III	IV	Total	
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras	Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados	PERSONA	1,500,000.00	-	0%				1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00	0.00			-	100%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	CENTRO	205.00	-	0%			205.00		205.00	100%	0.00	0.00			-	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	PERSONA	1,500.00	266.00	18%			650.00		650.00	61%	0.00	0.00			-	0%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	ESTRATEGIA	1.00	-	0%				1.00	1.00	100%	0.00	0.00			-	100%
