SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

Informe No. 0414-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 5
D. PRINCIPALES PROYECTOS 6
D.1 Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad 6
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 8
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 9
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 9
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 9
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 10
G. CONCLUSIONES 10
H. RECOMENDACIONES 10
ANEXO 1 11
ANEXO 2 12

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En el marco del proceso de reorganización de la administración pública impulsado por el Gobierno de la República, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) constituye un órgano desconcentrado de la Administración Central, adscrito a la Presidencia de la República. Esta entidad es responsable de rectorar, ejecutar, supervisar, coordinar y administrar el marco de planes, políticas, programas y proyectos vinculados a la transformación digital del sector público, en áreas como conectividad, trámites y plataformas digitales, economía digital, datos abiertos, talento digital, ciberseguridad y otras tecnologías emergentes, conforme a las prioridades y lineamientos establecidos por la Presidencia de la República. Asimismo, tiene a su cargo la evaluación de la gestión pública a nivel presidencial, sectorial e institucional.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**292,883,675**
Inversión Productiva	249,983,675
Formación Bruta de Capital	42,900,000
Presupuesto Vigente	**398,070,535**
Inversión Productiva	364,058,675
Formación Bruta de Capital	34,011,860
Ejecutado III Trimestre	**112,658,703**
Inversión Productiva	111,300,549
Formación Bruta de Capital	1,358,154
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**28.3%**
Ejecutado Anual	**125,718,679**
Inversión Productiva	124,360,525
Formación Bruta de Capital	1,358,154
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**31.6%**
Compromiso Aprobado	**181,346,716**
Inversión Productiva	179,981,662
Formación Bruta de Capital	1,365,054
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**45.6%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

La DIGER ejerce la rectoría técnica y coordinación estratégica en materia de gestión pública, estableciendo lineamientos, políticas y mecanismos de modernización administrativa, sin asumir funciones operativas, financieras o de ejecución propias de las instituciones responsables. Su labor se orienta a impulsar la transformación digital, la simplificación de procesos, la transparencia y la eficiencia institucional, promoviendo una gestión pública basada en resultados y enfocada en generar valor para la ciudadanía., promoviendo que las instituciones del Estado generen valor público mediante bienes, servicios y resultados verificables en beneficio de la ciudadanía.

En el tercer trimestre del 2026, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de L398.1 millones, de los cuales corresponden a Inversión Productiva L364.1 millones, la Formación Bruta de Capital al tercer trimestre presenta un vigente de L34.0 millones. La ejecución presupuestaria en el tercer trimestre asciende a L112.7 millones representando el 28.3% del Presupuesto Vigente; mientras que la ejecución presupuestaria acumulada

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN


al 30 de septiembre de 2026 asciende a L125.7 millones, la cual representa el 31.6% sobre el Presupuesto Vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

La ejecución productiva se realizó mediante un proyecto de inversión pública orientado a fortalecer la competitividad de Honduras mediante la transformación digital del Estado y la modernización de los servicios públicos. Su propósito es optimizar procesos, ampliar la conectividad y fortalecer las capacidades tecnológicas institucionales, con el fin de mejorar la interacción entre el Gobierno, la ciudadanía y el sector empresarial. Mientras que la formación bruta de capital fijo se identifica en Actividades Centrales y en el Programa de Gestión por Resultados en la actividad Seguimiento y Evaluación de Indicadores Institucionales y Sectoriales donde se identifican objetos del gasto como aplicaciones informáticas, equipos varios de oficina, equipos de computación y de comunicación.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En relación con el financiamiento de la Inversión Pública, al tercer trimestre de 2026, de acuerdo con la información registrada en el SIAFI, se constata que el presupuesto vigente está financiado en un 23.2% con la Fuente 11, Fondos Nacionales, equivalente a L92.5 millones, y en un 76.8% con la Fuente 21, Crédito Externo, equivalente a L305.5 millones. Ambas fuentes conforman el financiamiento de la Inversión Productiva.

Gráfico No. 01
DIGER: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

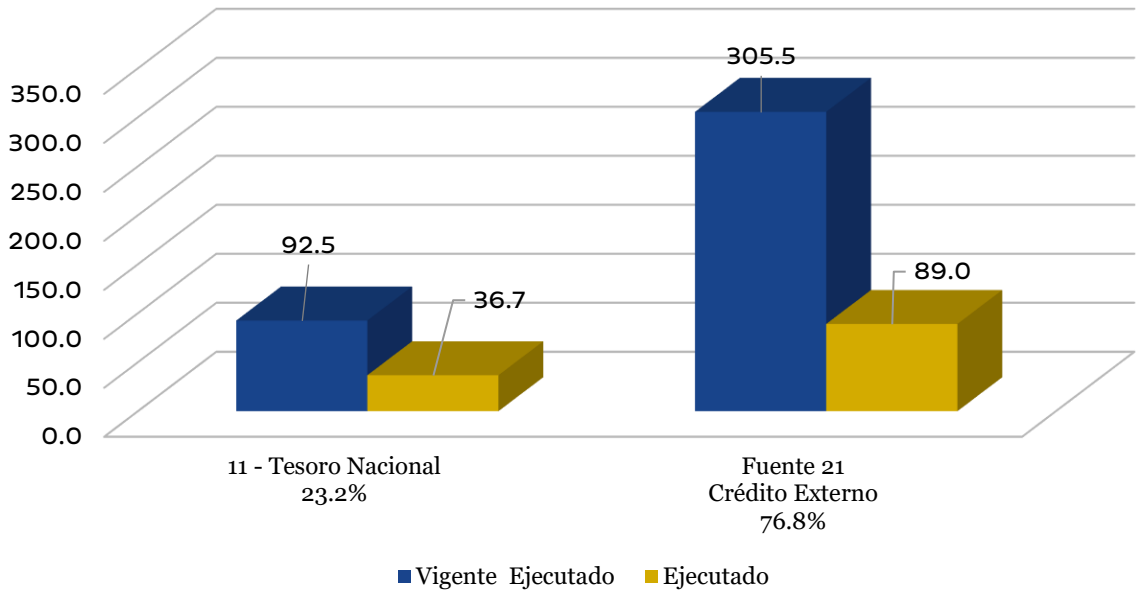

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN


C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

En el Gráfico No.02 se evidencia que, durante el período al tercer trimestre 2022-2026, el presupuesto ejecutado mostró un crecimiento significativo entre 2025 y 2026, al pasar de L42.4 millones a L162.7 millones. Posteriormente, en 2025, el presupuesto vigente disminuyó a L472.1 millones, registrándose una ejecución de L162.7 millones. Para 2026, el presupuesto vigente asciende a L398.1 millones, con un monto devengado de L125.7 millones.

En 2022 no se registró ejecución presupuestaria, mientras que en 2023 y 2024 los niveles de ejecución fueron realmente bajos, con porcentajes de 3.9% y 8.7%, respectivamente. Al tercer trimestre de 2026, la ejecución asciende a L125.7 millones, lo que representa el 31.6% del presupuesto vigente, reflejando un ritmo de ejecución inferior al observado en el mismo período del año anterior; sin embargo, el mismo es sumamente positivo, tomando en cuenta los retrasos generados en la ejecución debido al cambio de gestión gubernamental y que los contratos que trascienden periodo de Gobierno fueron aprobados por el Congreso Nacional a inicios del tercer trimestre.

Gráfico No. 02

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0414 - Dirección de Gestión por Resultados
Cifras en millones de Lempiras

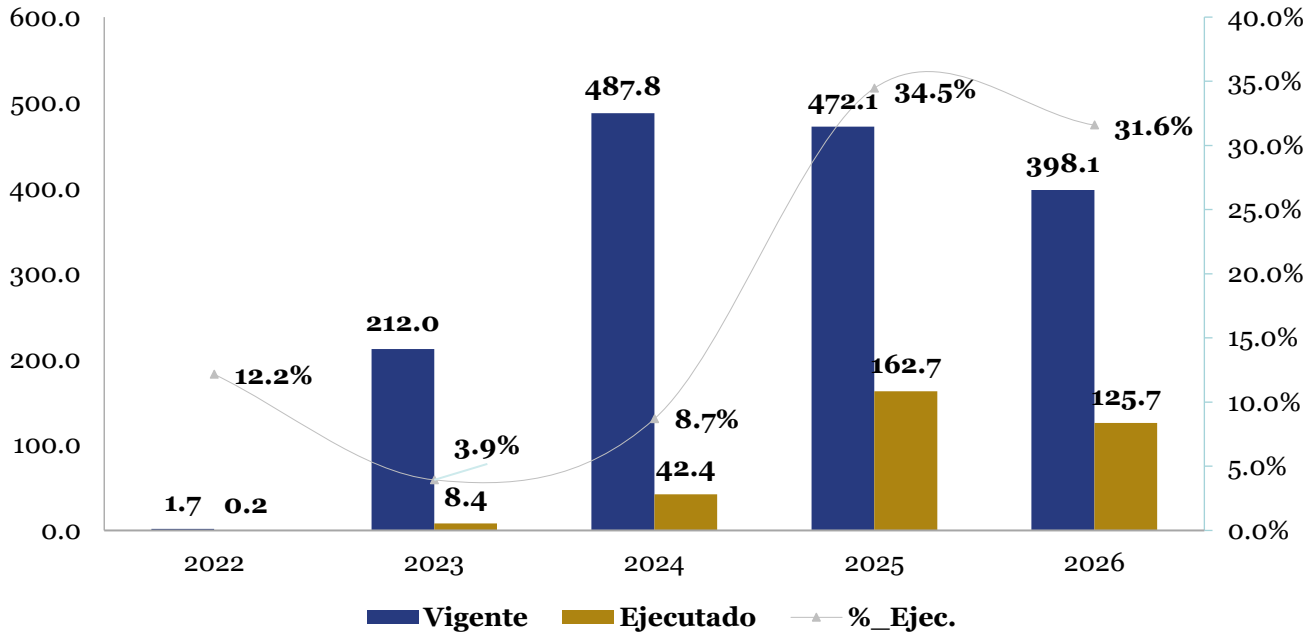

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La DIGER administra e impulsa iniciativas estratégicas de inversión pública, destacando el Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad, financiado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de este proyecto, la Dirección promueve acciones orientadas a ampliar la cobertura y el uso de la conectividad, desarrollar el gobierno digital, reducir costos transaccionales para la ciudadanía, empresas y entidades públicas, así como fortalecer la innovación y la economía digital. Entre los principales ámbitos de intervención reportados se encuentran la conectividad de sitios públicos, la elaboración del marco normativo de banda ancha, la implementación de la identificación digital y la firma electrónica, la digitalización documental, el fortalecimiento de plataformas de gestión pública y el impulso de capacidades vinculadas a la transformación digital del Estado.


D.1 Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad

Con base en la información reportada por la Unidad Ejecutora del Proyecto en el Informe de Ejecución Física al III Trimestre de 2026 se muestra una síntesis del avance físico registrado por componente, considerando los principales productos, resultados operativos y estado de ejecución de las intervenciones desarrolladas en el período reportado.

Componente 1. Cobertura y uso de Banda Ancha.

Sitios y edificios públicos conectados.

A la fecha, se registran 1,608 sitios públicos conectados, distribuidos en 1,499 centros educativos y 109 centros de salud. Para la entrega de estos productos, la DIGER suscribió dos contratos de servicio de conectividad con la empresa Servicios de Comunicación de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM). Al momento de redactar este informe, y debido a que no se asignaron fondos nacionales en el presupuesto de las Secretarías de Educación y Salud ni en el de la Dirección de Gestión por Resultados, la Unidad Ejecutora enmendó el contrato para garantizar la continuidad y evitar la suspensión del servicio en los 1,024 sitios conectados

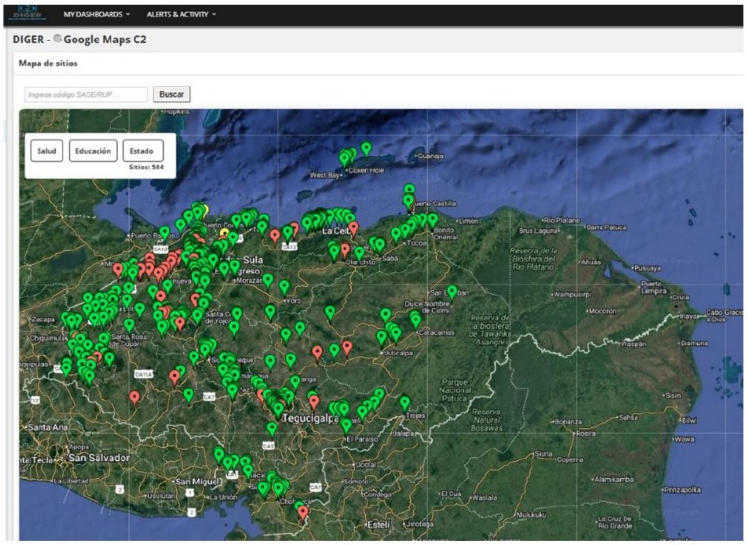

Como respaldo de estas acciones, se muestra en la siguiente imagen los sitios públicos conectados.

a) Primer Contrato suscrito en fecha 18 de octubre del 2023 para la conexión de 1024 sitios, y
b) Segundo Contrato suscrito el 11 de noviembre del año 2025, para la conexión de 608 nuevos sitios públicos en el año 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

El Centro de Operaciones de Red (NOC), integrado por un jefe y cuatro técnicos especializados, supervisa y monitorea la conectividad de los sitios públicos mediante plataformas digitales. Ante fallas, coordina acciones de soporte remoto y, cuando es necesario, escala los casos a SERCOM de Honduras para realizar visitas técnicas y restablecer el servicio. Estas acciones contribuyen a mantener la continuidad y calidad de la conectividad, registrándose avances significativos en la implementación del contrato.

Componente 2. Transformación Digital del Gobierno.

En el Subcomponente 2.1. Calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas. La Coordinación de Gobierno Digital mantiene operativos los principales servicios digitales durante el trimestre:

- Plataforma SOL continúa funcionando, con ajustes derivados de la reestructuración gubernamental y la incorporación de nuevos trámites y ambientes;
- Portal Público PKI para Firma Digital avanza en su fase de consolidación operativa y preparación para su apertura pública.
- Billetera Electrónica Nacional se encuentra en etapa de pruebas y gestión de cambios, con las credenciales de Identificación Nacional, Licencia de Conducir y Permiso para Portar Armas funcionales, y la incorporación de los servicios de Carnet de Residencia y Boleta de Revisión Vehicular.

Apertura de Empresas en Línea: Se encuentra en proceso la firma de un convenio de cooperación entre la DIGER y SENPRENDE para modernizar la plataforma Mi Empresa en Línea, mediante la incorporación de firma digital, inteligencia artificial para extracción de datos, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y contratación de especialistas en desarrollo, redes y ciberseguridad.

Solicitud de antecedentes policiales en línea: Está en gestión un convenio entre la DIGER y la Secretaría de Seguridad para fortalecer la infraestructura digital y los servicios asociados a la billetera electrónica BIEN. Se prevé mejorar las capacidades tecnológicas de la Dirección Policial de Telemática (DPT) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mediante la adquisición de equipo informático y la renovación de licencias y servicios de seguridad informática.

En el Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de la gestión financiera del Estado, DIGER suscribió un contrato con Four Consulting Group de Guatemala, S.A., para la migración de Forms y Reports II y la modernización tecnológica del sistema SIAFI II hacia Oracle APEX y Jasper. El proyecto registra un avance del 27.5 %, con las fases de diagnóstico, planificación, instalación y conexión de ambientes, estandarización y capacitación completadas.

Componente 3. Economía Digital.

Durante el tercer trimestre, continuó el equipamiento del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica para Emprendedores (PRODITE) en la UNAH, con el propósito de fortalecer las capacidades de diseño, electrónica y producción digital. Asimismo, con apoyo del BID, se avanzó en el diseño del modelo de gestión y sostenibilidad del centro. En paralelo, la DIGER y SENPRENDE gestionan un convenio de

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

cooperación para impulsar incubadoras de emprendimientos innovadores, la transformación digital de las MIPYMES y la formación intensiva de talento en habilidades tecnológicas.

Principales hitos:

Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:
1.Conectividad de 1,608 sitios públicos: 1,499 centros educativos y 109 centros de salud. 2.Centro de Operaciones de Red (NOC) en funcionamiento, encargado del monitoreo, mantenimiento y atención de incidentes de conectividad. 3.Gestión de modificaciones contractuales para garantizar la continuidad del servicio en los sitios conectados	1.Continuidad operativa de la plataforma SOL y avances en la implementación del Portal Público PKI para firma digital. 2.Billetera Electrónica Nacional: funcionamiento de las credenciales de identificación nacional, licencia de conducir y permiso para portar armas; incorporación del carné de residencia y la boleta de revisión vehicular. 3.Apertura de empresas en línea: coordinación con SENPRENDE para automatizar trámites mediante firma digital e inteligencia artificial. 4.Digitalización de servicios policiales: coordinación con la Secretaría de Seguridad 5.Modernización del SIAFI II: avance del 27.5 % en la migración tecnológica de Oracle Forms y Reports hacia Oracle APEX y Jasper.	1. Equipamiento del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica para Emprendedores (PRODITE): fortalecimiento de las capacidades de diseño, electrónica y producción digital en la UNAH. 2. Modelo de gobernanza y sostenibilidad: avances en la definición del funcionamiento, administración y continuidad operativa del centro. 3. Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento digital: coordinación con SENPRENDE para impulsar incubadoras de emprendimientos, transformación digital de las MIPYMES y formación intensiva en habilidades tecnológicas.

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Los principales avances físicos programados al 30 de septiembre de 2026 son los siguientes:

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0414 - Dirección de Gestión por Resultados								
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	1.1 Sitios y edificios públicos conectados	Sitios	608	560	69%	138	584	423%
	2.1 Capacidad técnica y operativa de la DIGER incrementada	Personas contratadas	19	28	74%	0	14	74%
	2.4 Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, digitalizados y simplificados	Servicios	1	0	0%	0	0	N/A
	2.6 Actualización del marco normativo de gobierno digital desarrollado	Marco normativo desarrollado	1	0	0%	0	0	N/A

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Progra-mación	Ejecución	% Ejecución	Progra-mación	Ejecución	% Ejecución
0414 - Dirección de Gestión por Resultados								
	2.9 Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	Actividades/ Eventos	4	0	0%	0	2	**59%**
	3.2 Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando	Centro	1	0	0%	0	0	N/A

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto, al 30 de septiembre de 2026

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Transformación Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	US$	48,700,000	30/7/2021
		Lempiras	1,301,181,210	30/7/2028
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	249,983,675	364,058,675	111,300,548.7	30.6%
Acumulado 2026	249,983,675	364,058,675	124,360,525.0	34.2%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,301,181,210	1,301,181,210	564,362,992	43.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026: L26.7183 por US$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

La unidad ejecutora no reporta contratos firmados en el período.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se atendieron solicitudes de modificaciones presupuestarias y se participó en conjunto con la Unidad Ejecutora en la revisión técnica con el organismo financiador.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

La principal problemática identificada corresponde a retrasos en la ejecución física y financiera del proyecto, ocasionados por factores administrativos, presupuestarios e institucionales; entre ellos destacan:

- La demora en la aprobación de modificaciones presupuestarias
- Los ajustes derivados de los cambios institucionales en las entidades beneficiarias y el déficit de fondos de contraparte previstos en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto.

Estos factores han incidido en el ritmo de ejecución durante el tercer trimestre y representan riesgos para el cumplimiento oportuno de las metas programadas en los próximos trimestres.

G. CONCLUSIONES

El Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad presenta avances importantes en sus principales componentes, destacando la conexión de 1,608 sitios públicos mediante el Componente 1, el fortalecimiento de plataformas digitales del Estado como SOL, Firma Digital y Billetera Electrónica Nacional, así como la definición de nuevas intervenciones para impulsar la economía digital mediante el apoyo a emprendimientos y MiPYMEs.

No obstante, la ejecución financiera durante 2026 mantiene un ritmo limitado.

H. RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan recomendaciones técnicas formuladas desde el enfoque de gestión de proyectos del PMBOK y PM4R, orientadas a fortalecer la eficiencia en la ejecución, el control y el cumplimiento de los objetivos institucionales:

Fortalecer la coordinación interinstitucional: formalizar los convenios pendientes y definir responsabilidades, plazos y compromisos entre la DIGER, SEFIN y las instituciones beneficiarias.

Acelerar la ejecución del proyecto física y presupuestaria del: priorizar las contrataciones y adquisiciones críticas para cumplir las metas físicas y financieras programadas.

Fortalecer el seguimiento y control interno: implementar indicadores de avance físico-financiero, responsables y alertas tempranas para identificar retrasos y aplicar medidas correctivas oportunas.

Gestionar los riesgos del proyecto: actualizar la matriz de riesgos y reforzar los controles administrativos, contractuales y tecnológicos.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva	**58,532,398**	**191,451,277**	**249,983,675**	**58,532,398**	**305,526,277**	**364,058,675**	**35,337,500**	**75,963,049**	**111,300,549**	**30.6%**	**35,337,500**	**89,023,025**	**124,360,525**	**34.2%**	**35,342,825**	**144,638,837**	**179,981,662**	**49.4%**
1	**0414 - Dirección de Gestión por Resultados**	**58,532,398**	**191,451,277**	**249,983,675**	**58,532,398**	**305,526,277**	**364,058,675**	**35,337,500**	**75,963,049**	**111,300,549**	**30.6%**	**35,337,500**	**89,023,025**	**124,360,525**	**34.2%**	**35,342,825**	**144,638,837**	**179,981,662**	**49.4%**
1	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad Convenio BID 4942/BL-HO	58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	35,337,500	75,963,049	111,300,549	30.6%	35,337,500	89,023,025	124,360,525	34.2%	35,342,825	144,638,837	179,981,662	49.4%
	TOTAL - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	**58,532,398**	**191,451,277**	**249,983,675**	**58,532,398**	**305,526,277**	**364,058,675**	**35,337,500**	**75,963,049**	**111,300,549**	**30.6%**	**35,337,500**	**89,023,025**	**124,360,525**	**34.2%**	**35,342,825**	**144,638,837**	**179,981,662**	**49.4%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo	**42,900,000**	**-**	**42,900,000**	**34,011,860**	**-**	**34,011,860**	**1,358,154**	**-**	**1,358,154**	**4.0%**	**1,358,154**	**-**	**1,358,154**	**4.0%**	**1,365,054**	**-**	**1,365,054**	**4.0%**
	0414 - Dirección de Gestión por Resultados	**42,900,000**	**-**	**42,900,000**	**34,011,860**	**-**	**34,011,860**	**1,358,154**	**-**	**1,358,154**	**4.0%**	**1,358,154**	**-**	**1,358,154**	**4.0%**	**1,365,054**	**-**	**1,365,054**	**4.0%**
	ACTIVIDADES CENTRALES	42,900,000	-	42,900,000	34,001,860	-	34,001,860	1,358,154	-	1,358,154	4.0%	1,358,154	-	1,358,154	4.0%	1,365,054	-	1,365,054	4.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES	**42,900,000**	**-**	**42,900,000**	**34,001,860**	**-**	**34,001,860**	**1,358,154**	**-**	**1,358,154**	**4.0%**	**1,358,154**	**-**	**1,358,154**	**4.0%**	**1,365,054**	**-**	**1,365,054**	**4.0%**
	PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	TOTAL - PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
	Total general	**101,432,398**	**191,451,277**	**292,883,675**	**92,544,258**	**305,526,277**	**398,070,535**	**36,695,654**	**75,963,049**	**112,658,703**	**28.3%**	**36,695,654**	**89,023,025**	**125,718,679**	**31.6%**	**36,707,879**	**144,638,837**	**181,346,716**	**45.6%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0414 - Dirección de Gestión por Resultados								
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad CONVENIO 4942/BL-HO	1.1 Sitios y edificios públicos conectados	Sitios	608	560	92%	138	584	**423%**
	2.1 Capacidad técnica y operativa de la DIGER incrementada	Personas contratadas	19	28	147%	0	14	**74%**
	2.4 Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, digitalizados y simplificados	Servicios	1	0	0%	0	0	N/A
	2.6 Actualización del marco normativo de gobierno digital desarrollado	Marco normativo desarrollado	1	0	0%	0	0	N/A
	2.9 Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	Actividades/ Eventos	4	0	0%	0	2	**50%**
	3.2 Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando	Centro	1	0	0%	0	0	N/A

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
